

2026・2027年度の広域連系系統等の年間作業停止計画の承認及び公表について
(案)

広域機関が取りまとめ、確認及び承認する広域連系系統等の年間作業停止計画(別紙1)について、業務規程第161条第3項の規定に基づき、別紙2のとおり確認し、承認する。

また、業務規程第168条の規定に基づき、個々の電源の運転状況や需要者の電力使用状況が推測可能な電力設備を除いた広域連系系統等の年間作業停止計画(別紙3)を公表する。

加えて、長期的な予見性を確保するため、2028年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名(別紙4)を別紙2及び別紙3とあわせて別紙5のとおり本機関ウェブサイトにて公表する。

1. 年間作業停止計画の承認

(1) 広域機関が取りまとめ、確認及び承認する年間作業停止計画

別紙1のとおり	
・ 広域調整対象作業停止計画	: 約 1,500 件
・ 一般送配電事業者調整対象作業停止計画	: 約 12,300 件

(2) 確認事項(詳細は別紙2のとおり)

- ① 送配電等業務指針第244条の作業停止計画の調整における考慮事項に基づいていること。
- ② 広域調整対象作業停止計画の調整案に対し、発電計画提出者から再調整の申出がないこと。
- ③ 一般送配電事業者調整対象作業停止計画について、不調がないこと。

(3) 確認結果

確認事項の①～③について確認し、妥当であると判断したことから承認する。

(4) 承認日

2026年1月21日

2. 年間作業停止計画の公表

公表日: 2026年1月30日

以上

【添付資料】

別紙１：２０２６・２０２７年度の年間作業停止計画（承認対象）〔非公表〕

別紙２：広域連系系統等の作業停止計画調整・確認結果について

別紙３：２０２６・２０２７年度の年間作業停止計画

別紙４：２０２８年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名

別紙５：ウェブサイト公表文

※別紙１は、電源線や専用線等の情報が含まれるため業務規程第１６８条の規定及び系統情報の公表の考え方 ２．（２）①の注２)に基づき、非公表とする。

広域連系系統等の作業停止計画 調整・確認結果について (2026・2027年度の年間計画)

2026年 1月21日

電力広域的運営推進機関

1 年間作業停止計画の調整・確認について

2 年間作業停止計画の調整・確認結果

(1) 広域調整対象作業停止計画

a 調整・確認状況

b 調整案に対する申出状況及び不調件名

c 主要作業件名

(2) 一般送配電事業者調整対象作業停止計画

a 調整・確認状況

b 不調の解決に向けた対応の依頼状況

(3) 調整・確認結果

1 年間作業停止計画の調整・確認について

■ 広域機関が取りまとめ、確認、承認する作業停止計画


- 本機関は、広域連系系統及び連系線の運用容量に影響を与える電力設備（広域連系系統等）の作業停止計画の取りまとめを行う（業務規程第156条第1項）
- 本機関は、作業停止計画の最終案を受け取ったときは、広域連系系統等の作業停止計画を取りまとめ、別表 1 1 - 2 で定める期日までに、これを確認の上、承認する。（業務規程第161条3項）

（今回の公表事項）

■ 作業停止計画の調整等

- 本機関は、①広域連系系統等のうち、連系線の運用容量に影響を与える広域連系系統等の作業停止計画の調整（広域調整対象作業停止計画）を行う。（業務規程第156条第2項）
- 一般送配電事業者は、②連系線の運用容量に影響を与えない電力設備の作業停止計画の調整（一般送配電事業者調整対象作業停止計画）を行う。（送配電等業務指針第229条）
- 本機関は、共有された広域連系系統等の作業停止計画の調整案に対して、発電計画提出者から再調整の申出があった場合は、再調整を行い、必要に応じて見直しを求める。
（業務規程第160条第2項）
- 本機関は、一般送配電事業者調整対象作業停止計画について、一般送配電事業者から不調の解決に向けた対応の依頼があった場合は、調整に向けた対応を行う。（業務規程第164条）

■ 原案受領から理事会承認後の公表に至る調整・確認フローは以下のとおり。

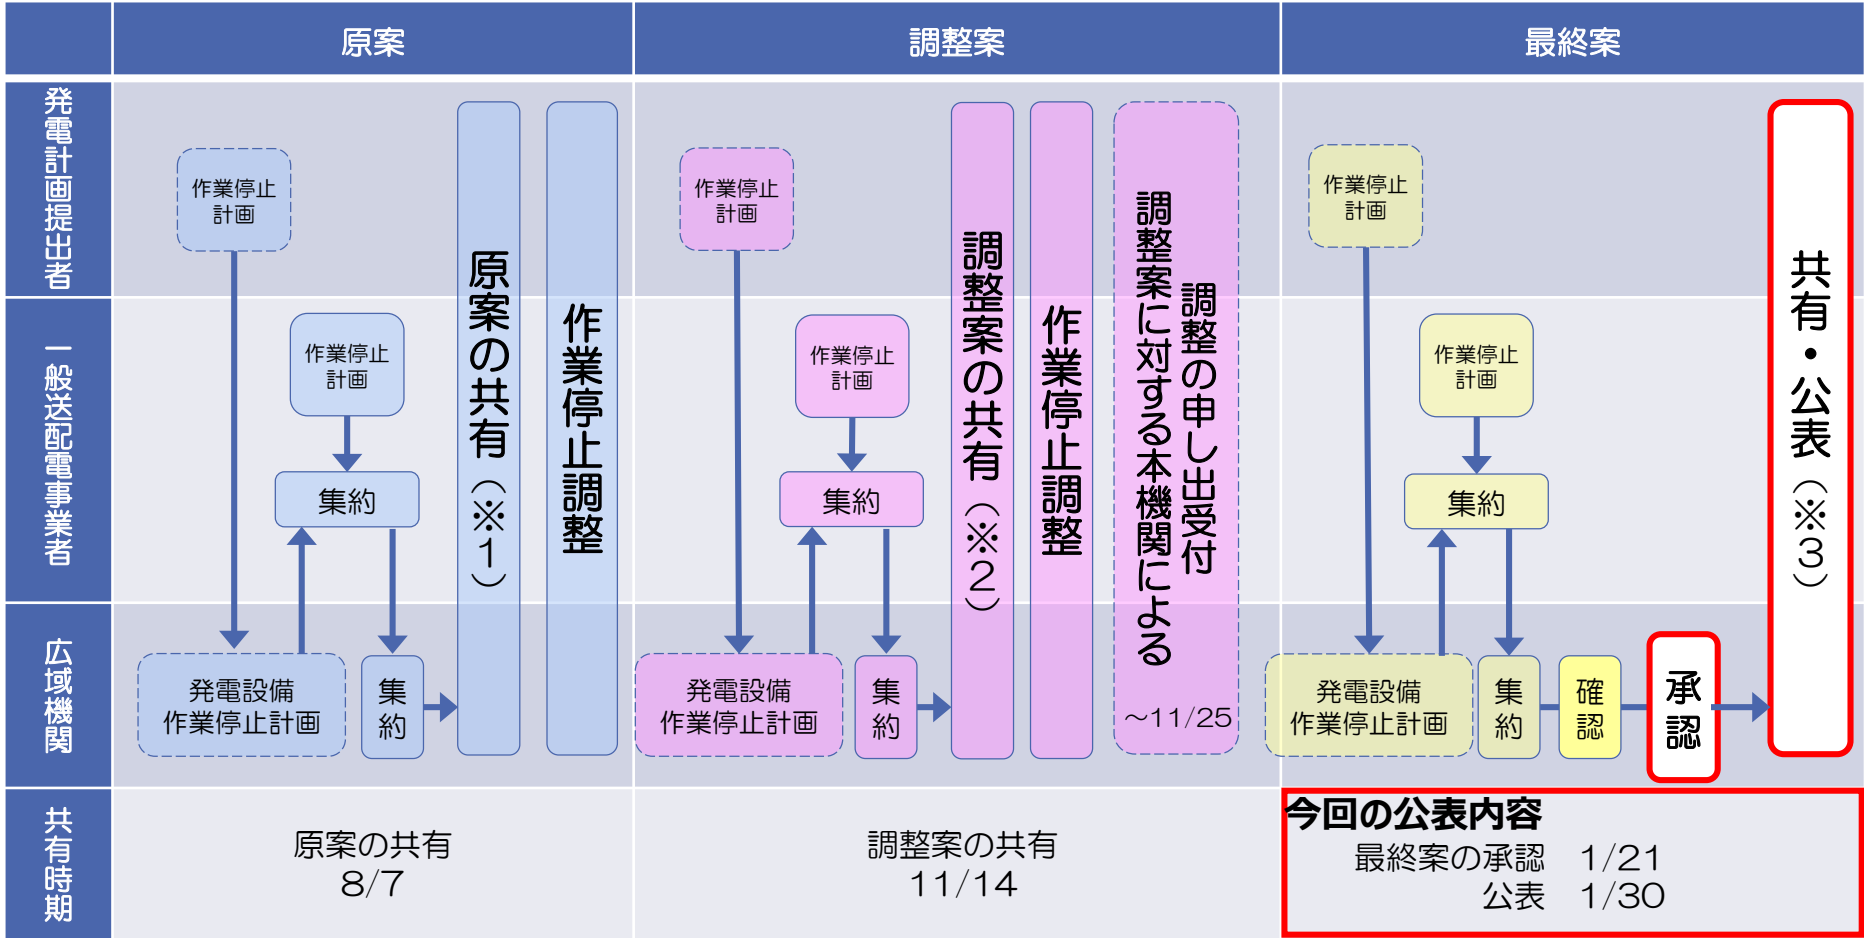


※1：広域連系系統等の作業停止計画原案を会員その他の関係する電気供給事業者その他作業停止計画提出者と共有（業務規程第157条第3項）

※2：広域連系系統等の作業停止計画調整案を会員その他の関係する電気供給事業者その他作業停止計画提出者と共有（業務規程第159条第3項）
（調整案に対して、発電計画提出者から本機関による作業停止調整を申し出る場合の申出期日を11/25として共有）

※3：広域連系系統等の作業停止計画を会員その他の関係する電気供給事業者その他作業停止計画提出者と共有（業務規程第162条第2項）
系統情報の公表（業務規程第168条）

-  広域連系系統等（広域機関が取りまとめ、確認、承認）
-  ① 広域機関調整対象作業停止計画
-  ② 一般送配電事業者調整対象作業停止計画

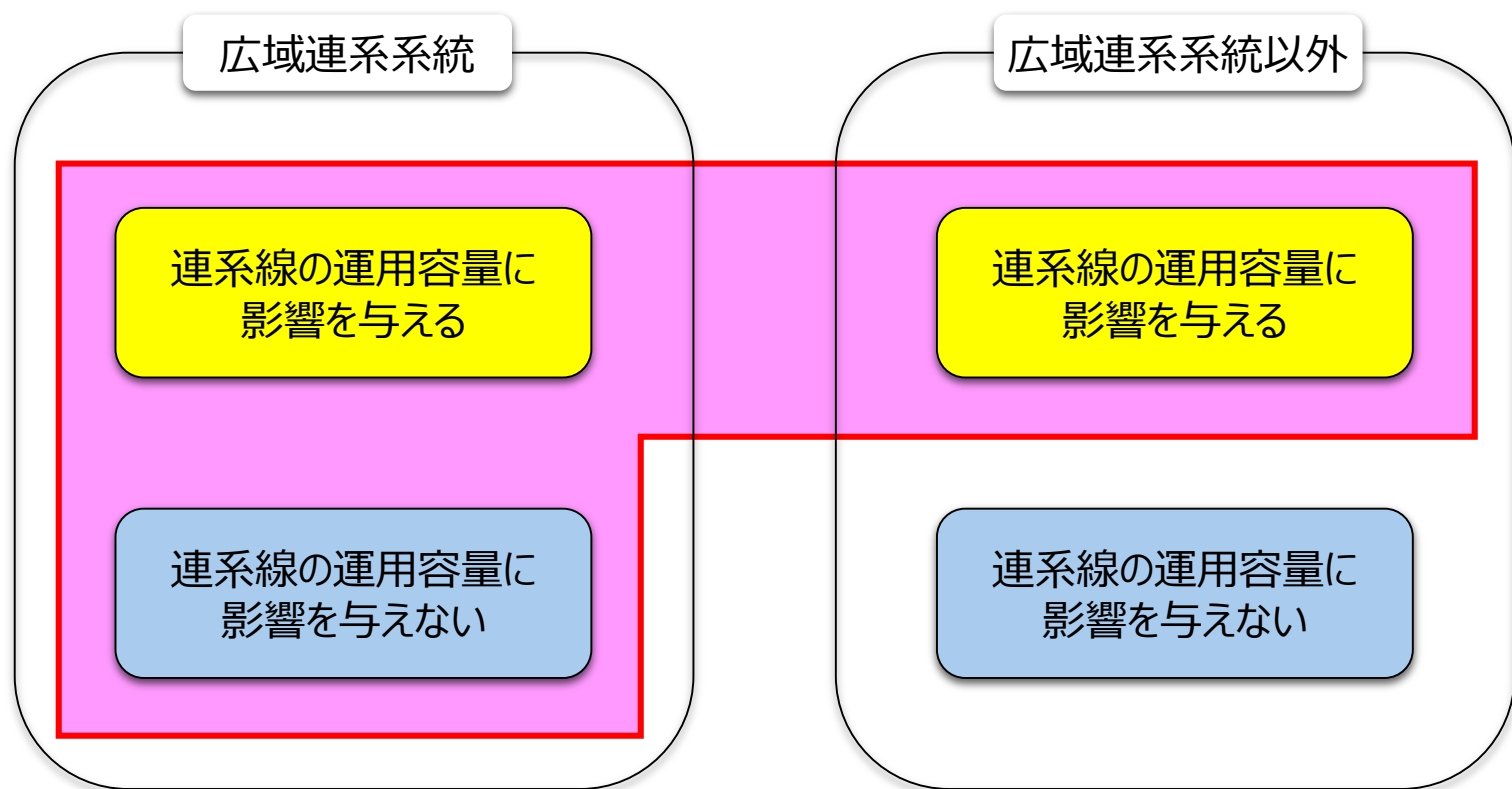

余 白

1 年間作業停止計画の調整・確認について

2 年間作業停止計画の調整・確認結果

(1) 広域調整対象作業停止計画

a 調整・確認状況

b 調整案に対する申出状況

c 主要作業件名

(2) 一般送配電事業者調整対象作業停止計画

a 調整・確認状況

b 不調の解決に向けた対応の依頼状況

(3) 調整・確認結果

- 広域調整対象作業停止計画について、送配電等業務指針第244条（作業停止計画の調整における考慮事項）の規定に基づき、下表のとおり、各項目の内容を確認し、停止時期や期間、同調作業停止の調整を実施した。
- その結果、以下の各項目について妥当なものと判断した。

送配電等業務指針に定める考慮事項 （第 2 4 4 条）	広域調整対象作業停止計画	
	主な確認ポイント	広域機関確認結果
1.公衆安全の確保	・ 作業の必要性 ・ 安全の確保（実施時期、作業期間等）	○
2.作業員の安全確保		
3.電力設備の保全		
4.作業停止期間中の供給信頼度	・ 各エリアにおける複数連系線の同時停止回避 ・ 同一停止区間の作業同調 ・ エリア需給状況を考慮した作業実施時期 ・ 重負荷期作業実施時の供給力、予備力	○
5.作業停止期間中の調整力		
6.作業停止期間中の一般送配電事業者の供給区域の供給力		
7.需要の抑制又は停止を伴う作業停止計画における需要家の操業計画		
8.発電の抑制若しくは停止又は市場分断の回避	・ 発電設備停止作業との同調 ・ 連系線の重潮流時期の回避	○
9.作業停止期間の短縮及び作業の効率化	・ 作業の内容、工程、工法 ・ 同一停止区間の作業同調	○
10.電気供給事業者間の公平性の確保	・ 発電出力抑制時の抑制箇所及び抑制量	○
11.複数の連系線の同時期の停止の回避	・ 各エリアにおける複数連系線の同時停止回避	○

- 2025年11月14日に共有した調整案に対し、発電計画提出者から本機関による再調整の申出（11月25日〆切）は無し。

項目	件数
調整案に対する再調整の申出	0件

- 広域調整対象作業停止計画について、不調件名は無し。

項目	件数
広域調整対象作業停止計画の不調件名	0件

余 白

11


制約箇所		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
北海道間	北本	①5/15~29 第1極,北本上北・七飯線1L 5/29 第2極	5/19~6/12 道南幹線1L	②6/8~13 補線 6/8,13 第1極	③7/9~15 第2極,北本上北・七飯線2L 7/15 第1極								
	新北本	5/19,21,24,28 上北SS	6/13 上北SS	6/29~7/3 大野SS	7/4~6 北本上北線1L	7/9,11~13,15 上北SS 岩手SS	9/9~19 函館幹線1L	9/28 道南幹線1L 9/30~10/23 道南幹線2L	10/26~29 函館幹線1L 11/2~11 函館幹線2L	※青森県東方沖地震による設備障害に伴い北本第1極は停止中 (復旧未定)であるが、2026・2027年度年間計画に支障がない よう復旧を進める方針とし、年間計画においては、北本双極とも に「健全」として計画を策定			
				①6/18~7/3	②7/17~8/3			③8/25~10/6		④9/1~2027/5/31			
東北東京間			①2/27~7/24 西仙台(変)MT1				9/29 新福島4B		④10/5~10/27 新福島4B			3/2~3 相馬双葉幹線1L 3/4~5 相馬双葉幹線2L	
			②3/12~4/30 相馬双葉幹線1L ②5/12~6/30 相馬双葉幹線2L				9/28,29 新福島 甲母線		10/13~15 新福島 甲母線 10/25~27 新福島 乙母線			3/8~9 南相馬 MT2 3/10~11 南相馬 MT3	
			6/8~30 福島山幹線2L			10/3~16 東福島支線(相福幹線)1L	10/17~20 吾妻幹線1L 10/28~11/1 吾妻幹線2L		11/2 福島東幹線山線1L(新福島 乙母線) 11/3 福島東幹線山線2L(新福島 乙母線)		2/26~2027/7/23 西仙台MT2	3/9~31 新福島3B	
東京中部間							①9/10~2028/4/17 FC						
	佐久間												
	新信濃	4/1~2 2FC・RC	4/24~5/2 中信変系統切替 5/18~20 高根馬瀬2L	6/6~8 中信変系統切替	6/22~26,29~30 高根馬瀬1L	9/3~18 1FC 9/3~17 1号調相 9/3~6,9~12 高根馬瀬1L		①9/28~12/10 高根馬瀬1L 10/5~7 高根中信2L	11/25 馬瀬北部1,2L	11/29 1FC ②11/25~12/21 2FC 11/25~12/20 RC=2号調相	3/17 2FC 3/17~29 2号調相		
	東清水		5/7~8 2FC						11/21~24 2FC			①3/1~16 2FC	
	飛騨信濃		4/3,22 第1極 ①4/3~4/22 第2極					10/7 第2極	②10/7~11/20 第1極 11/1~9,11/20 第2極				
中地域交流ループ		3/13~4/2 8TB	①4/11~6/28 越前嶺南線1L					③9/11~12/9 越前嶺南線2L		12/19 三重東近江1L 12/20 三重東近江2L			
		4/4~6 三重東近江1L 4/8~10 三重東近江2L	5/28~29 東部幹線1L		②6/29~9/26 加賀幹線2L			10/14~17 中部北陸連絡母線1L 10/18~21 中部北陸連絡母線2L	12/11~14 越美幹線1L 12/15~18 越美幹線2L	12/21~23 加賀幹線1L			
		4/1~27 豊岐幹線1L 4/9 加賀SS2Tr 4/10 加賀SS3Tr	4/27~5/28 豊岐幹線2L 5/23 西部幹線1L 5/25 西部幹線2L	5/28~6/30 豊岐幹線1L 6/2 岐阜連絡1,2L		7/5 岐阜開甲A,ZA 7/4~8 能越幹線1L 7/9~12 能越幹線2L		9/1~12/23 豊岐幹線2L 11/4~5 東部幹線2L 9/27~10/28 東金津新福井線1L	12/23~31 豊岐幹線1L 12/3~24 三重開甲B,ZB 12/13 三岐幹線1L 12/14 加賀SS2Tr 12/15 加賀SS2Tr 12/16 能登幹線1L 12/17 能登幹線2L 12/18 能登幹線1L	12/23~31 豊岐幹線1L 12/3~24 三重開甲B,ZB 12/13 三岐幹線1L 12/14 加賀SS2Tr 12/15 加賀SS2Tr 12/16 能登幹線1L 12/17 能登幹線2L 12/18 能登幹線1L	3/1~9 加賀SS 2Tr 3/10~12,13~21 加賀SS 3Tr		
		4/1~3,7 越前線1L 4/4~6,8 越前線2L	4/13~6/28 東金津新福井線2L 5/7~6/28 加賀東金津線2L			7/2 加賀福光線1L 7/3 加賀福光線2L	7/17~19 能登幹線1L 7/20~24 能登幹線2L	10/19 山城北線1L	11/11~25 北近江線1L 12/1~15 北近江線2L				
関西中国間		4/6~10 日野幹線1L 4/13~17 日野幹線2L	5/7~8,11 西播東岡山線2L	5/18~22 西播東岡山線1L ①5/27~6/12 西播東岡山線2L	6/15~19 6/22~26,29~30	山崎智頭線1L 山崎智頭線2L		9/16~18 新岡山山幹線1L 9/28~10/2 新岡山山幹線2L	9/21~25 中国東幹線1L ②10/6~11/28 中国東幹線2L		3/20~2027/5/22 新岡山山幹線1L		
関西四国間													
中国四国間		①4/1~6/5 本四連系線1L			②9/1~10/7 本四連系線2L			10/8,15~16 本四連系線1L 10/22~23 本四連系線2L	③2/10~3/26,29 本四連系線2L		3/30~31 本四連系線1L		
中国九州間			①4/9~27 関門連系線1L	②5/8~26 関門連系線2L									

連系線		主な作業	調整内容
北海道本州間	北本	①②③：サイリスタバルブ定期点検ほか	・他直流設備停止との重複を回避
	新北本	①②③：新北本架線工事（広域整備計画関連工事） ④：第1極および共通装置改造ほか（広域整備計画関連工事）	・①②③：冬季重負荷期を避けて実施 ・④：架線工事に可能な限り同調、他直流設備停止との重複回避
東北東京間		①：三次GIS取替 ②：新設送電線の延緊線（広域整備計画関連工事） ③：避圧弁交換・確認試験	・他連系線との重複を可能な限り回避 ・重負荷期を可能な限り回避
東京中部間	佐久間	①：佐久間東幹山線1,2L停止に伴う停止 （広域整備計画関連工事）	・新設・既設ルート of 交差箇所があり、長期間の2回線停止が必要
	新信濃	①：電線張替工事 ②：TC（遠方監視制御装置）取替工事	・①：山間部作業のため、冬季閉鎖期までに工事完了が必要 ・②：他直流設備との重複停止の可能な限り回避
	東清水	①：2FC調相用G S 開放点検他	・重負荷期を避けて実施 ・他直流設備停止との重複を可能な限り回避
	飛騨信濃	①：変換器定期点検 ②：開閉器本体取替	・重負荷期を避けて実施 ・他直流設備停止との重複を可能な限り回避
中地域交流ループ 中部関西間 中部北陸間 北陸関西間		①：近接送電線改良工事に伴う保安停止 ②：電線張替工事 ③：電線張替工事	・①③：重負荷期を回避 ・②：他連系線との重複停止を可能な限り回避
関西中国間		①②③：遮断器ほか取替工事	・重負荷期を避けて実施 ・ループ系統（関中フェンス）を構成する線路の重複停止を回避
中国四国間		①②③：ケーブル接続部細密点検他	・①②：重負荷期及び、他連系線との重複停止を回避 ・③：他連系線との重複停止を回避
中国九州間		①②：電線精密点検・送電線補修工事	・重負荷期を避けて実施

2(1)c 2027年度作業件名 (広域調整対象作業停止計画)

【凡例】
■ : 連続作業
■ : 毎日作業・単日作業
□ : 広域系統整備計画

13

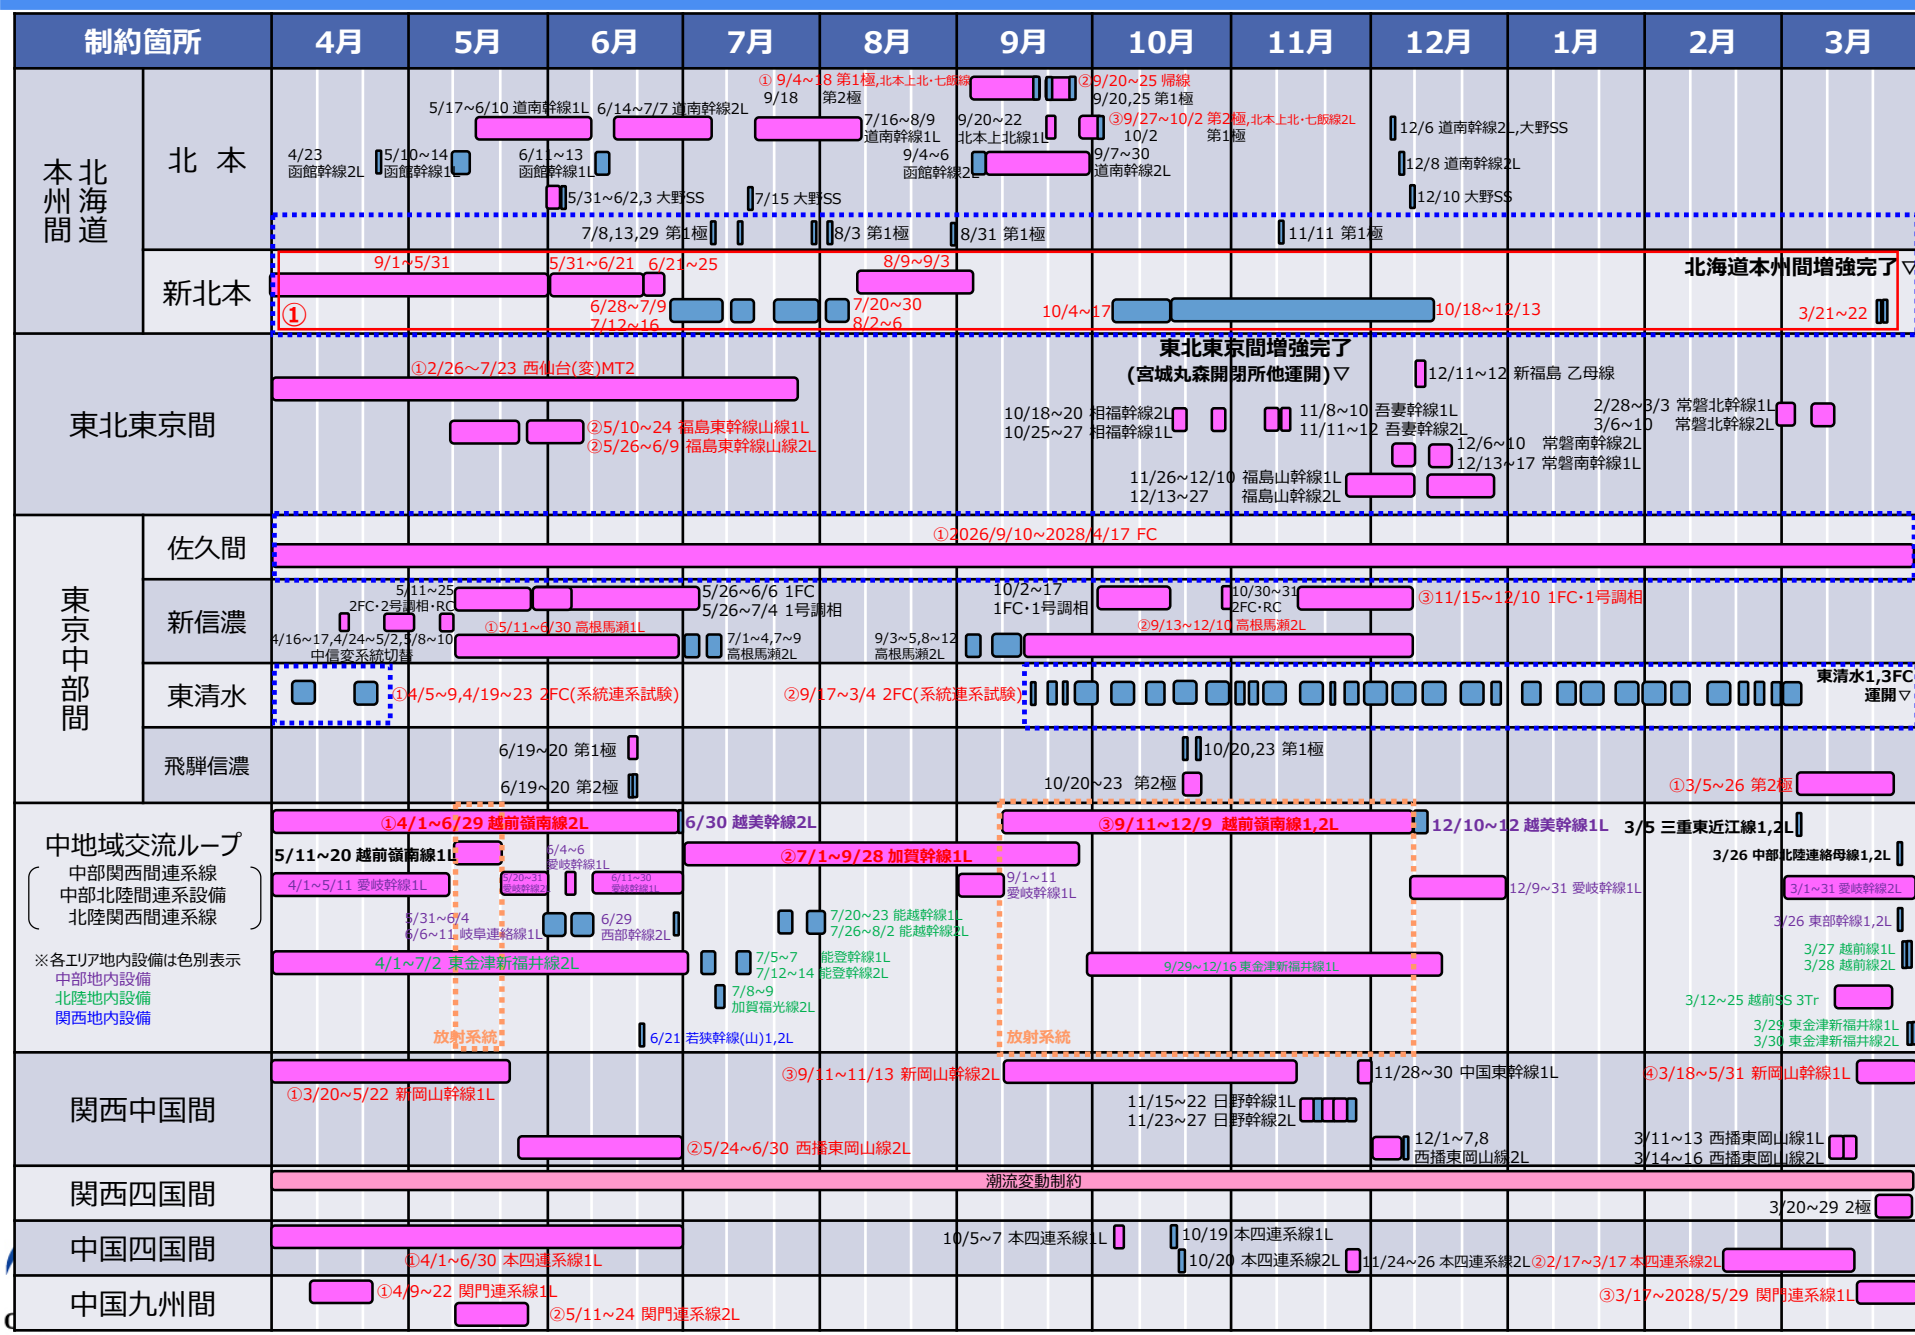

連系線		主な作業	調整内容
北海道本州間	北本	①③：サイリスタバルブ定期点検ほか ②：電線路細密点検	・冬季重負荷期を避けて実施 ・他直流設備停止との重複を回避
	新北本	①第1極および共通装置改造・系統連系試験他 (広域整備計画関連工事)	・冬季重負荷期を避けて実施 ・他直流設備停止との重複を回避 ・定期点検と同調して作業を計画
東北東京間		①：三次GIS取替 ②：鉄塔防錆塗装工事	・他連系線との重複及び重負荷期を可能な限り回避
東京中部間	佐久間	①：佐久間東幹山線1,2L停止に伴う停止 (広域整備計画関連工事)	・新設・既設ルート of 交差箇所があり、長期間の2回線停止が必要
	新信濃	①②：電線張替工事 ③：TC（遠方監視制御装置）取替工事	・①②：新信濃FC作業に可能な限り同調して実施 ・②：山間部作業のため、冬季閉鎖期までに工事完了が必要 ・③：重負荷期を避け、他直流設備との重複停止を可能な限り回避
	東清水	①②：1,3FC系統連系試験に伴う2FC停止（広域整備計画関連工事）	・他直流設備との重複停止を可能な限り回避
	飛騨信濃	①：遮断器取替他	・重負荷期を避けて実施 ・他直流設備との重複停止を可能な限り回避
中地域交流ループ 中部関西間 中部北陸間 北陸関西間		①：送電線改良工事に伴う保安停止 ②：電線張替工事 ③：送電線改良工事（鉄塔組立・架線工事）	・①③：重負荷期を回避 ・②：他連系線との重複停止を可能な限り回避
関西中国間		①③④：電線張替工事 ②：断路器取替工事	・重負荷期を避けて実施 ・ループ系統（関中フェンス）を構成する線路の重複停止を回避
中国四国間		①：ケーブル張替他 ②：ケーブル接続部細密点検他	・①：重負荷期及び、他連系線との重複停止を回避 ・②：他連系線との重複停止を回避
中国九州間		①②③：電線精密点検・送電線補修工事	・重負荷期を避けて実施

- 1 年間作業停止計画の調整・確認について
- 2 年間作業停止計画の調整・確認結果
 - (1) 広域調整対象作業停止計画
 - a 調整・確認状況
 - b 調整案に対する申出状況及び不調件名
 - c 主要作業件名
 - (2) 一般送配電事業者調整対象作業停止計画
 - a 調整・確認状況
 - b 不調の解決に向けた対応の依頼状況
 - (3) 調整・確認結果

- 一般送配電事業者調整対象作業停止計画については、送配電等業務指針第244条（作業停止計画の調整における考慮事項）の規定に基づき、一般送配電事業者が下表のとおり、各項目の内容を確認し、停止時期や期間、同調作業停止の調整を実施。
- 当機関は、その調整が完了していることを、各一般送配電事業者に確認した。
- その結果、以下の各項目について妥当なものと判断した。

送配電等業務指針に定める 考慮事項（第244条）	一般送配電事業者調整対象作業停止計画	
	一般送配電事業者確認結果	広域機関確認結果
1.公衆安全の確保	○	○ (次シート参考のとおり)
2.作業員の安全確保	○	
3.電力設備の保全	○	
4.作業停止期間中の供給信頼度	○	
5.作業停止期間中の調整力	○	
6.作業停止期間中の一般送配電事業者の供給 区域の供給力	○	
7.需要の抑制又は停止を伴う作業停止計画にお ける需要家の操業計画	○	
8.発電の抑制若しくは停止又は市場分断の回避	○	
9.作業停止期間の短縮及び作業の効率化	○	
10.電気供給事業者間の公平性の確保	○	
11.複数の連系線の同時期の停止の回避	—	

- 本機関は、一般送配電事業者調整対象作業停止計画について、送配電等業務指針第244条（作業停止計画の調整における考慮事項）の規定に基づく調整が完了していることを、以下のとおり、最終案として1月7日に確認した。

エリア	北海道	東北	東京	中部	北陸	関西	中国	四国	九州	沖縄	合計
調整完了 件数	1241 件	1154 件	2329 件	2852 件	616 件	1135 件	991 件	767 件	2359 件	323 件	13767 件
調整未完了 件数※	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件

※原案等で提出された件名のうち調整が完了していない作業停止計画

- 一般送配電事業者調整対象作業停止計画について、一般送配電事業者から本機関へ不調の解決に向けた対応の依頼はなかった。

項目	件数
不調の解決に向けた対応の依頼	0 件

1 年間作業停止計画の調整・確認について

2 年間作業停止計画の調整・確認結果

(1) 広域調整対象作業停止計画

a 調整・確認状況

b 調整案に対する申出状況及び不調件名

c 主要作業件名

(2) 一般送配電事業者調整対象作業停止計画

a 調整・確認状況

b 不調の解決に向けた対応の依頼状況

(3) 調整・確認結果

- 広域機関が取りまとめ、確認、承認する年間作業停止計画について
 - ①送配電等業務指針244条の作業停止計画の調整における考慮事項に基づいていること（シート8、16）
 - ②広域調整対象作業停止計画の調整案に対し、発電計画提出者から再調整の申出がないこと（シート9）
 - ③一般送配電事業者調整対象作業停止計画について、不調がないこと（シート17、18）

上記、確認事項①～③を確認し妥当と判断したことから承認する

2026・2027年度の年間作業停止計画

2026年1月21日

-
- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. 広域調整対象作業停止計画 | P 1 ~ 35 |
| 2. 一般送配電事業者調整対象作業停止計画 | P 36 ~ 164 |

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0124885	北海道	2026/05/15 06:30	2026/05/29 20:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	第1極サイリスタバルブ定期点検		変更	
0124886	北海道	2026/05/15 06:30	2026/05/29 16:00	連続	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 1L	第1極全停作業に伴う保安停止		変更	
0124887	北海道	2026/05/15 06:30	2026/05/29 16:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 1L	第1極全停作業に伴う保安停止		変更	
0124899	北海道	2026/05/16 07:00	2026/05/20 17:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124894	北海道	2026/05/18 06:30	2026/05/24 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	汚損測定		変更	
0127677	北海道	2026/05/18 10:00	2026/05/18 16:00	単日	大野変電所	大野変電所 101<大野線1号線>	101CB 動作カウンタ取替	制約有	新規	
0124929	北海道	2026/05/19 08:00	2026/06/12 14:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	電線地線張替		変更	
0124934	北海道	2026/05/19 09:00	2026/05/30 17:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0126821	北海道	2026/05/21 06:30	2026/05/27 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	電線路細密点検		新規	
0124888	北海道	2026/05/29 19:10	2026/05/29 20:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	第1極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約		変更	
0124916	北海道	2026/06/01 09:00	2026/06/11 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	特定点検(電線)		変更	
0124925	北海道	2026/06/02 09:00	2026/06/04 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	腕金改修		変更	
0124898	北海道	2026/06/08 07:00	2026/06/13 18:30	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	電線路細密点検		変更	
0124901	北海道	2026/06/08 07:00	2026/06/08 08:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成		変更	
0124895	北海道	2026/06/09 07:00	2026/06/10 18:30	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	帰線避雷器点検		変更	
0124893	北海道	2026/06/11 07:00	2026/06/12 18:30	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	直流幹線帰線保護装置定期点検		変更	
0127567	北海道	2026/06/11 07:00	2026/06/12 18:30	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	第2極DCVT本体点検		変更	
0124927	北海道	2026/06/12 14:00	2026/06/12 16:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	絶縁抵抗測定		変更	
0124902	北海道	2026/06/13 17:00	2026/06/13 18:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	帰線停止作業終了に伴う双極構成戻し		変更	
0124903	北海道	2026/06/18 08:00	2026/07/03 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	本線架線		変更	
0124936	北海道	2026/06/18 08:00	2026/07/03 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	本線架線		変更	
0124998	北海道	2026/06/18 08:00	2026/06/18 09:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 11<北斗今別直流幹線>	STATCOM運転切替に伴う変換器停止		変更	
0124999	北海道	2026/06/18 08:00	2026/07/03 17:00	連続	今別変換所	今別変換所 11<北斗今別直流幹線>	北斗今別直流幹線停止に伴う変換器停止		変更	
0126825	北海道	2026/06/18 08:00	2026/07/03 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	振動防止ダンパー取替		新規	
0126826	北海道	2026/06/18 08:00	2026/07/03 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	振動防止ダンパー取替		新規	
0124881	北海道	2026/06/22 09:00	2026/06/23 17:00	毎日	大野変電所	大野変電所 201<北斗幹線1号線>	201CB 一般,保全		変更	
0124882	北海道	2026/06/24 09:00	2026/06/25 17:00	毎日	大野変電所	大野変電所 202<北斗幹線2号線>	202CB 一般,保全		変更	
0124915	北海道	2026/06/29 09:00	2026/07/03 17:00	連続	大野変電所	大野変電所 275kV連絡用B変圧器	275kV連絡用B変圧器 一般,内部,保全		変更	
0124906	北海道	2026/07/03 13:00	2026/07/03 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	絶縁抵抗測定		変更	
0124938	北海道	2026/07/03 13:00	2026/07/03 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	絶縁抵抗測定		変更	
0125000	北海道	2026/07/03 13:00	2026/07/03 17:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 11<北斗今別直流幹線>	北斗今別直流幹線停止に伴う変換器停止		変更	
0124889	北海道	2026/07/09 06:30	2026/07/15 20:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	第2極サイリスタバルブ定期点検		変更	
0124890	北海道	2026/07/09 06:30	2026/07/15 16:00	連続	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 2L	第2極全停に伴う保安停止		変更	
0124891	北海道	2026/07/09 06:30	2026/07/15 16:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 2L	第2極全停に伴う保安停止		変更	
0124896	北海道	2026/07/09 06:30	2026/07/15 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	汚損測定		変更	
0124897	北海道	2026/07/09 06:30	2026/07/15 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	電線路細密点検		変更	
0124900	北海道	2026/07/10 07:00	2026/07/14 17:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124892	北海道	2026/07/15 19:10	2026/07/15 20:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	第2極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約		変更	
0124904	北海道	2026/07/17 08:00	2026/08/03 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	本線架線		変更	
0124939	北海道	2026/07/17 08:00	2026/08/03 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	本線架線		変更	
0125001	北海道	2026/07/17 08:00	2026/07/17 09:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 11<北斗今別直流幹線>	STATCOM運転切替に伴う変換器停止		変更	
0125002	北海道	2026/07/17 08:00	2026/08/03 17:00	連続	今別変換所	今別変換所 11<北斗今別直流幹線>	北斗今別直流幹線停止に伴う変換器停止		変更	
0126827	北海道	2026/07/17 08:00	2026/08/03 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	振動防止ダンパー取替		新規	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0126828	北海道	2026/07/17 08:00	2026/08/03 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	振動防止ダンパー取替		新規	
0124907	北海道	2026/08/03 13:00	2026/08/03 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	絶縁抵抗測定		変更	
0124940	北海道	2026/08/03 13:00	2026/08/03 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	絶縁抵抗測定		変更	
0125003	北海道	2026/08/03 13:00	2026/08/03 17:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 11<北斗今別直流幹線>	北斗今別直流幹線停止に伴う変換器停止		変更	
0124905	北海道	2026/08/25 08:00	2026/10/06 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	本線架線		変更	
0124911	北海道	2026/08/25 08:00	2026/10/06 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	特定点検		変更	
0124912	北海道	2026/08/25 08:00	2026/10/06 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	特定点検		変更	
0124937	北海道	2026/08/25 08:00	2026/10/06 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	本線架線		変更	
0125004	北海道	2026/08/25 08:00	2026/08/25 09:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 11<北斗今別直流幹線>	STATCOM運転切替に伴う変換器停止		変更	
0125005	北海道	2026/08/25 08:00	2026/09/01 09:00	連続	今別変換所	今別変換所 11<北斗今別直流幹線>	北斗今別直流幹線停止に伴う変換器停止		変更	
0124931	北海道	2026/08/25 09:00	2026/09/04 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	振動防止ダンパー取替		変更	
0124932	北海道	2026/08/25 09:00	2026/09/04 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	振動防止ダンパー取替		変更	
0124909	北海道	2026/09/01 09:00	2027/05/31 09:00	連続	北斗変換所	北斗変換所 11<北斗今別直流幹線>	第1極および共通装置改造、確認試験		変更	
0124910	北海道	2026/09/01 09:00	2027/05/31 09:00	連続	今別変換所	今別変換所 11<北斗今別直流幹線>	第1極および共通装置改造、確認試験		変更	
0126824	北海道	2026/09/01 09:00	2027/05/31 09:00	連続	今別変換所	今別変換所 11<北斗今別直流幹線>	交直変換器GATE基板 調査・取替		新規	
0126829	北海道	2026/09/01 09:00	2027/05/31 09:00	連続	北斗変換所	北斗変換所 11<北斗今別直流幹線>	交直変換器GATE基板 調査・取替		新規	
0124923	北海道	2026/09/09 09:00	2026/09/18 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	捨れ防止ダンパー取替		変更	
0126935	北海道	2026/09/09 09:00	2026/09/09 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	着雪検知装置新設(ロードセル取付他)		変更	
0124949	北海道	2026/09/10 09:00	2026/09/10 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	着雪検知子装置新設		変更	
0124950	北海道	2026/09/11 09:00	2026/09/11 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	着雪検知子装置新設		変更	
0124917	北海道	2026/09/14 09:00	2026/09/19 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	OPGWJB点検		変更	
0124933	北海道	2026/09/14 09:00	2026/09/19 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	捨れ防止ダンパー取替		変更	
0124942	北海道	2026/09/28 09:00	2026/09/28 17:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 201<道南幹線1号>	VCT回路改修作業		変更	
0124930	北海道	2026/09/30 08:00	2026/10/23 14:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	電線地線張替		変更	
0124926	北海道	2026/09/30 09:00	2026/10/02 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	腕金改修		変更	
0126830	北海道	2026/10/01 09:00	2026/10/02 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	OPGWJB点検		新規	
0124921	北海道	2026/10/05 09:00	2026/10/09 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	OPGWJB点検		変更	
0124908	北海道	2026/10/06 13:00	2026/10/06 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	絶縁抵抗測定		変更	
0124941	北海道	2026/10/06 13:00	2026/10/06 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	絶縁抵抗測定		変更	
0125283	北海道	2026/10/16 09:00	2026/10/16 17:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 202<道南幹線2号>	・VCT回路改修作業		変更	
0125284	北海道	2026/10/23 14:00	2026/10/23 16:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	絶縁抵抗測定		変更	
0124883	北海道	2026/10/26 09:00	2026/10/26 17:00	単日	今別変換所	今別変換所 201<今別幹線1号>	欠相トリップ対策に伴う改造		変更	
0127525	北海道	2026/10/26 09:00	2026/10/29 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	OPGW張替		新規	
0124884	北海道	2026/10/27 09:00	2026/10/27 17:00	単日	今別変換所	今別変換所 202<今別幹線2号>	欠相トリップ対策に伴う改造		変更	
0124919	北海道	2026/11/02 09:00	2026/11/06 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	振動防止ダンパー取替		変更	
0124924	北海道	2026/11/02 09:00	2026/11/11 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	捨れ防止ダンパー取替		変更	
0124961	北海道	2026/11/02 09:00	2026/11/06 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	捨れ防止ダンパー取替		変更	
0126951	北海道	2026/11/02 09:00	2026/11/02 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	着雪検知装置新設(ロードセル取付他)		変更	
0126949	北海道	2026/11/04 09:00	2026/11/04 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) (力)2L	着雪検知子装置新設		変更	
0126950	北海道	2026/11/05 09:00	2026/11/05 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	着雪検知子装置新設		変更	
0126822	北海道	2027/02/17 08:00	2027/02/25 18:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	ケーブル収納		新規	
0126823	北海道	2027/02/17 08:00	2027/02/25 18:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	ケーブル収納		新規	
0126944	北海道	2027/04/23 08:00	2027/04/23 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	気象観測装置点検		変更	
0126843	北海道	2027/05/07 08:00	2027/05/21 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	本線架線		新規	
0126848	北海道	2027/05/07 08:00	2027/05/21 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	本線架線		新規	
0126847	北海道	2027/05/07 09:00	2027/05/21 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	特定点検		変更	
0126852	北海道	2027/05/07 09:00	2027/05/21 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	特定点検		変更	
0126930	北海道	2027/05/10 08:00	2027/05/11 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	電線腐食診断		変更	
0126933	北海道	2027/05/10 09:00	2027/05/14 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	特定点検(電線)		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0126917	北海道	2027/05/17 08:00	2027/06/10 14:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	電線地線張替		変更	
0126918	北海道	2027/05/17 09:00	2027/06/09 17:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124951	北海道	2027/05/20 09:00	2027/05/20 17:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	着雪検知子装置新設		変更	
0126845	北海道	2027/05/21 13:00	2027/05/21 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	絶縁抵抗測定(帰線)		新規	
0126850	北海道	2027/05/21 13:00	2027/05/21 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	絶縁抵抗測定(本線1号)		新規	
0124952	北海道	2027/05/24 09:00	2027/05/24 17:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	着雪検知子装置新設		変更	
0126897	北海道	2027/05/24 09:00	2027/05/25 17:00	連続	大野変電所	大野変電所 201<北斗幹線1号線>	201X.XE.PT.LA 保全(カス圧力計.圧力開閉器交換)		変更	
0126926	北海道	2027/05/24 09:00	2027/05/28 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	振動防止ダンパー取替		変更	
0126898	北海道	2027/05/26 09:00	2027/05/27 17:00	連続	大野変電所	大野変電所 202<北斗幹線2号線>	202X.XE.PT.LA 保全(カス圧力計.圧力開閉器交換)		変更	
0126896	北海道	2027/05/28 15:00	2027/05/28 17:00	単日	北斗変換所	北斗幹線2号線 北斗CS275kVZ母線	第2極変換装置用Tr1次絶縁耐力試験(常規耐電圧)		新規	
0126835	北海道	2027/05/31 09:00	2027/06/14 09:00	連続	今別変換所	今別変換所 11<北斗今別直流幹線>	北斗第1極STATCOM試験に伴う第1極連続停止		新規	
0126853	北海道	2027/05/31 09:00	2027/06/21 09:00	連続	北斗変換所	北斗今別直流幹線(帰線)	北斗・今別第1極STATCOM試験に伴う帰線連続停止		新規	
0126854	北海道	2027/05/31 09:00	2027/06/21 09:00	連続	今別変換所	北斗今別直流幹線(帰線)	北斗・今別第1極STATCOM試験に伴う帰線連続停止		新規	
0126861	北海道	2027/05/31 09:00	2027/06/21 09:00	連続	北斗変換所	北斗変換所 11<北斗今別直流幹線>	北斗・今別第1極STATCOM試験に伴う本線1号連続停止		新規	
0126906	北海道	2027/05/31 09:00	2027/06/02 17:00	連続	大野変電所	大野変電所 275kV連絡用B変圧器	275kV1次GiB 保全(カス圧力計.圧力開閉器交換)	制約有	変更	
0126905	北海道	2027/06/03 09:00	2027/06/03 17:00	単日	大野変電所	大野変電所 275kV連絡用A変圧器	43E.Y 保全(カス圧力計.圧力開閉器交換)	制約有	変更	
0126919	北海道	2027/06/07 09:00	2027/06/07 17:00	単日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 201<道南幹線1号線>	201CB 外部点検・測定試験		変更	
0126920	北海道	2027/06/10 14:00	2027/06/10 16:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	絶縁抵抗測定		変更	
0126934	北海道	2027/06/11 09:00	2027/06/12 17:00	毎日	北七飯変電所	北七飯変電所 101<函館幹線1号線>	結合装置撤去		変更	
0126939	北海道	2027/06/11 09:00	2027/06/11 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	端子取替		変更	
0126940	北海道	2027/06/11 09:00	2027/06/12 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	着雪検知装置新設関連除却		変更	
0126941	北海道	2027/06/13 09:00	2027/06/13 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	着雪検知装置新設		変更	
0126942	北海道	2027/06/13 09:00	2027/06/13 17:00	単日	せたな大里風力発電変電所	せたな大里風力発電変電所 101<函館幹線1号線>	結合装置撤去		変更	
0126921	北海道	2027/06/14 08:00	2027/07/07 14:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	電線地線張替		変更	
0126836	北海道	2027/06/14 09:00	2027/06/21 09:00	連続	今別変換所	今別変換所 11<北斗今別直流幹線>	今別第1極STATCOM試験に伴う本線1号停止		新規	
0126922	北海道	2027/06/14 09:00	2027/07/06 17:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0126923	北海道	2027/06/14 09:00	2027/06/14 17:00	単日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 202<道南幹線2号線>	202CB 外部点検・測定試験		変更	
0126964	北海道	2027/06/15 09:00	2027/06/15 17:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	着雪検知子装置更新		変更	
0126962	北海道	2027/06/16 09:00	2027/06/18 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	特定点検(電線)		変更	
0126846	北海道	2027/06/17 08:00	2027/06/17 18:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	線路定数試験(導体抵抗測定)		新規	
0126851	北海道	2027/06/17 08:00	2027/06/17 18:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	線路定数試験(導体抵抗測定)		新規	
0126965	北海道	2027/06/21 09:00	2027/06/21 17:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	着雪検知子装置新設		変更	
0127419	北海道	2027/06/21 09:00	2027/06/25 17:00	連続	北斗変換所	北斗変換所 11<北斗今別直流幹線>	第1極HVDC試験		新規	
0127420	北海道	2027/06/21 09:00	2027/06/25 17:00	連続	今別変換所	今別変換所 11<北斗今別直流幹線>	第1極HVDC試験		新規	
0126966	北海道	2027/06/22 09:00	2027/06/22 17:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	着雪検知子装置新設		変更	
0126855	北海道	2027/06/28 09:00	2027/07/09 17:00	毎日	北斗変換所	北斗今別直流幹線(帰線)	第2極STATCOM試験に伴う帰線停止		新規	
0126862	北海道	2027/06/28 09:00	2027/07/09 17:00	毎日	北斗変換所	北斗変換所 11<北斗今別直流幹線>	第2極STATCOM試験に伴う第1極停止		新規	
0127584	北海道	2027/06/28 09:00	2027/06/28 17:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	着雪検知子装置更新		新規	
0126924	北海道	2027/07/07 14:00	2027/07/07 16:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	絶縁抵抗測定		変更	
0127560	北海道	2027/07/08 09:00	2027/07/08 18:00	単日	(電発)函館交直変換所 第1極	(電発)函館交直変換所 第1極	高調波試験		新規	
0126899	北海道	2027/07/10 13:00	2027/07/10 13:30	単日	大野変電所	大野変電所101<大野線1号線>	100関係試加圧		変更	
0126900	北海道	2027/07/10 17:00	2027/07/10 17:30	単日	大野変電所	大野変電所101<大野線1号線>	100CB潮流測定		変更	
0126856	北海道	2027/07/12 09:00	2027/07/16 17:00	毎日	北斗変換所	北斗今別直流幹線(帰線)	双極STATCOM試験に伴う帰線停止		新規	
0126863	北海道	2027/07/12 09:00	2027/07/16 17:00	毎日	北斗変換所	北斗変換所 11<北斗今別直流幹線>	双極STATCOM試験に伴う本線1号停止		新規	
0127561	北海道	2027/07/13 08:00	2027/07/13 17:00	単日	(電発)函館交直変換所 第1極	(電発)函館交直変換所 第1極	高調波試験		新規	
0126894	北海道	2027/07/15 09:00	2027/07/15 12:00	単日	大野変電所	大野変電所 275kV 連B/バンク	北斗CS双極STATCOM試験(隣接Tr投入時応動確認試験)		新規	
0126925	北海道	2027/07/16 08:00	2027/08/09 14:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	電線地線張替		変更	
0126837	北海道	2027/07/20 09:00	2027/07/30 17:00	毎日	今別変換所	今別変換所 11<北斗今別直流幹線>	第2極STATCOM試験に伴う第1極停止		新規	
0126857	北海道	2027/07/20 09:00	2027/07/30 17:00	毎日	今別変換所	北斗今別直流幹線(帰線)	第2極STATCOM試験に伴う帰線停止		新規	
0126928	北海道	2027/07/27 09:00	2027/07/29 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	腕金改修		変更	
0127562	北海道	2027/07/29 09:00	2027/07/29 18:00	単日	(電発)函館交直変換所 第1極	(電発)函館交直変換所 第1極	高調波試験		新規	
0126838	北海道	2027/08/02 09:00	2027/08/06 17:00	毎日	今別変換所	今別変換所 11<北斗今別直流幹線>	双極STATCOM試験に伴い本線1号停止		新規	
0126858	北海道	2027/08/02 09:00	2027/08/06 17:00	毎日	今別変換所	北斗今別直流幹線(帰線)	双極STATCOM試験に伴う帰線停止		新規	
0127563	北海道	2027/08/03 08:00	2027/08/03 17:00	単日	(電発)函館交直変換所 第1極	(電発)函館交直変換所 第1極	高調波試験		新規	
0126839	北海道	2027/08/09 09:00	2027/09/03 17:00	連続	今別変換所	今別変換所 11<北斗今別直流幹線>	交直変換器 外部点検・測定試験		新規	
0126840	北海道	2027/08/09 09:00	2027/09/03 17:00	毎日	今別変換所	今別変換所 11<北斗今別直流幹線>	第2極HVDC試験に伴う第1極停止		新規	
0126864	北海道	2027/08/09 09:00	2027/09/03 17:00	毎日	北斗変換所	北斗変換所 11<北斗今別直流幹線>	第2極HVDC試験に伴う第1極停止		新規	
0126865	北海道	2027/08/09 09:00	2027/09/03 17:00	連続	北斗変換所	北斗変換所 11<北斗今別直流幹線>	交直変換器 外部点検・測定試験		新規	
0126929	北海道	2027/08/09 14:00	2027/08/09 16:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	絶縁抵抗測定		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0126849	北海道	2027/08/16 09:00	2027/08/20 17:00	連続	北斗今別直直幹線(北斗～今別)	北斗今別直直幹線(北斗～今別) (本線)	振動防止ダンパー取替		変更	
0127564	北海道	2027/08/16 09:00	2027/08/20 17:00	連続	北斗今別直直幹線(北斗～今別)	北斗今別直直幹線(北斗～今別) (本線)	特定点検		新規	
0127565	北海道	2027/08/31 08:00	2027/08/31 22:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	高調波試験		新規	
0126869	北海道	2027/09/04 06:30	2027/09/18 18:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	第一極サイリスタバルブ精密点検		新規	
0126877	北海道	2027/09/04 06:30	2027/09/18 15:00	連続	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 1L	第1極全停作業に伴う保安停止		新規	
0126879	北海道	2027/09/04 06:30	2027/09/18 15:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 1L	第一極全停作業に伴う保安停止 他		新規	
0126883	北海道	2027/09/04 06:30	2027/09/18 18:30	連続	(電発)北本直直幹線(電函・電上)	(電発)北本直直幹線(電函・電上) 1L	電線張替		新規	
0126953	北海道	2027/09/04 09:00	2027/09/04 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	着雪検知装置新設		変更	
0126958	北海道	2027/09/04 09:00	2027/09/05 17:00	毎日	北七飯変電所	北七飯変電所 102<函館幹線2号線>	結合装置撤去		変更	
0126946	北海道	2027/09/05 09:00	2027/09/05 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	端子取替		変更	
0126959	北海道	2027/09/05 09:00	2027/09/06 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	着雪検知装置新設開連除却		変更	
0126884	北海道	2027/09/06 06:30	2027/09/11 18:30	連続	(電発)北本直直幹線(電函・電上)	(電発)北本直直幹線(電函・電上) 1L	汚損測定		変更	
0126880	北海道	2027/09/06 07:00	2027/09/08 17:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 1L	鉄塔防錆塗装(養生)		新規	
0126952	北海道	2027/09/06 09:00	2027/09/06 17:00	単日	上八雲開閉所	上八雲開閉所102<函館幹線2号線／上八雲支線>	結合装置撤去		変更	
0126960	北海道	2027/09/07 08:00	2027/09/30 14:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	電線地線張替		変更	
0126968	北海道	2027/09/09 08:00	2027/09/09 17:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	着雪検知装置新設		変更	
0126963	北海道	2027/09/14 09:00	2027/09/16 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	腕金改修		変更	
0126873	北海道	2027/09/18 13:00	2027/09/18 15:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	1号線本線張替えに伴う絶縁抵抗測定		新規	
0126874	北海道	2027/09/18 17:10	2027/09/18 18:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	第1極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約		新規	
0126870	北海道	2027/09/20 07:00	2027/09/20 08:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成		新規	
0126887	北海道	2027/09/20 07:00	2027/09/25 18:30	連続	(電発)北本直直幹線帰線(函・上)	(電発)北本直直幹線帰線(函・上) 帰線	電線路細密点検		新規	
0126888	北海道	2027/09/20 07:00	2027/09/25 18:30	連続	(電発)北本直直幹線帰線(函・上)	(電発)北本直直幹線帰線(函・上) 帰線	電線路細密点検		新規	
0126889	北海道	2027/09/21 07:00	2027/09/22 18:30	連続	(電発)北本直直幹線帰線(函・上)	(電発)北本直直幹線帰線(函・上) 帰線	直直幹線帰線保護装置定期点検		新規	
0126890	北海道	2027/09/21 07:00	2027/09/21 18:30	単日	(電発)北本直直幹線帰線(函・上)	(電発)北本直直幹線帰線(函・上) 帰線	帰線避雷器点検		新規	
0126967	北海道	2027/09/21 09:00	2027/09/24 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	特定点検(電線)		変更	
0126891	北海道	2027/09/21 13:00	2027/09/21 16:00	単日	(電発)北本直直幹線帰線(函・上)	(電発)北本直直幹線帰線(函・上) 帰線	細密点検		新規	
0126871	北海道	2027/09/25 17:00	2027/09/25 18:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	帰線停止作業終了に伴う双極構成戻し		新規	
0126875	北海道	2027/09/27 06:30	2027/10/02 20:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	第2極サイリスタバルブ定期点検		新規	
0126878	北海道	2027/09/27 06:30	2027/10/02 17:00	連続	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 2L	第2極全停に伴う保安停止		新規	
0126881	北海道	2027/09/27 06:30	2027/10/02 17:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 2L	第2極全停に伴う保安停止		新規	
0126885	北海道	2027/09/27 06:30	2027/10/02 18:30	連続	(電発)北本直直幹線(電函・電上)	(電発)北本直直幹線(電函・電上) 2L	電線路細密点検		新規	
0126886	北海道	2027/09/27 06:30	2027/10/02 18:30	連続	(電発)北本直直幹線(電函・電上)	(電発)北本直直幹線(電函・電上) 2L	汚損測定		変更	
0126882	北海道	2027/09/27 07:00	2027/09/29 17:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 2L	鉄塔防錆塗装(養生)		新規	
0126969	北海道	2027/09/30 14:00	2027/09/30 16:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	絶縁抵抗測定		変更	
0126872	北海道	2027/10/02 19:10	2027/10/02 20:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	第2極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約		新規	
0126841	北海道	2027/10/04 09:00	2027/10/17 17:00	毎日	今別変換所	今別変換所 11<北斗今別直直幹線>	第2極HVDC試験に伴う第1極停止		変更	
0126866	北海道	2027/10/04 09:00	2027/10/17 17:00	毎日	北斗変換所	北斗変換所 11<北斗今別直直幹線>	第2極HVDC試験に伴う第1極停止		新規	
0127421	北海道	2027/10/18 09:00	2027/12/13 17:00	毎日	北斗変換所	北斗変換所／11<北斗今別直直幹線>	・双極HVDC試験		新規	
0127422	北海道	2027/10/18 09:00	2027/12/13 17:00	毎日	今別変換所	今別変換所／11<北斗今別直直幹線>	双極HVDC試験		新規	
0127566	北海道	2027/11/11 08:00	2027/11/11 16:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	高調波測定		新規	
0126895	北海道	2027/12/06 11:30	2027/12/06 12:00	単日	北斗変換所	道南幹線2号線・大野SS275kV連変B、北斗幹線	第2極HVDC試験(フラクスタート1)に伴う試験系統構成		新規	
0126892	北海道	2027/12/08 13:30	2027/12/08 15:00	単日	北斗変換所	北斗変換所202<道南幹線2号>	第2極HVDC試験(フラクスタート2)に伴う試験系統構成		新規	
0126893	北海道	2027/12/10 13:30	2027/12/10 15:30	単日	北斗変換所	北斗幹線2号線・大野SS275kV連変B、知内線2号線	第2極HVDC試験(フラクスタート3)に伴う試験系統構成		新規	
0126859	北海道	2028/03/21 09:00	2028/03/21 17:00	単日	北斗変換所	北斗今別直直幹線(帰線)	使用前自主検査(遠隔監視制御試験)		新規	
0126868	北海道	2028/03/21 09:00	2028/03/21 17:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 11<北斗今別直直幹線>	使用前自主検査に伴う第1極停止		新規	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0126842	北海道	2028/03/22 09:00	2028/03/22 17:00	単日	今別変換所	今別変換所 11<北斗今別直流幹線>	使用前自主検査に伴う第1極停止		新規	
0126860	北海道	2028/03/22 09:00	2028/03/22 17:00	単日	今別変換所	北斗今別直流幹線(帰線)	使用前自主検査(遠隔監視制御試験)		新規	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0235283	東北	2026/04/14 08:40	2026/04/16 17:20	連続	相馬双葉幹線1号	相馬双葉幹線1号	がいしスベサ補修南相(変)、NO. 1		変更	
0235281	東北	2026/04/15 08:40	2026/04/15 17:20	単日	相馬双葉幹線1号	相馬双葉幹線1号	がいしスベサ補修 No62.南いわき開 2基		変更	
0235299	東北	2026/04/28 08:30	2026/07/31 17:30	連続	今別幹線2号	今別幹線2号	送変電建設センター工事(春)増強に伴う電線張替、総合検査 新設送電線の延緊線 使用前自主検査相馬双葉幹線接続変更 建七福島		変更	
0235278	東北	2026/05/12 08:40	2026/06/30 17:20	連続	相馬双葉幹線2号	相馬双葉幹線2号	相馬双葉幹線リレー整備相馬双葉幹線2号PCMリレー盤取替		変更	
0235279	東北	2026/05/12 08:40	2026/06/30 17:20	連続	南相馬変電所	相馬双葉幹線2号	相馬双葉幹線リレー整備相馬双葉幹線2号PCMリレー盤取替		変更	
0235282	東北	2026/05/12 08:40	2026/05/14 17:20	連続	相馬双葉幹線2号	相馬双葉幹線2号	がいしスベサ補修南相(変)、NO. 1		変更	
0235280	東北	2026/05/13 08:40	2026/05/13 17:20	単日	相馬双葉幹線2号	相馬双葉幹線2号	がいしスベサ補修 No62.南いわき開 2基		変更	
0235296	東北	2026/05/15 08:10	2026/05/29 18:50	連続	上北変電所	北本上北線1号	上北(変)リレー整備(北本1号転送情報)転送情報整理盤更新(信端レス化)		変更	
0235290	東北	2026/05/15 08:40	2026/05/21 17:20	連続	上北変電所	上北変MT53	MT53ブロック点検、Ry点検各種修繕		変更	
0238849	東北	2026/05/19 17:00	2026/05/19 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 3号変圧器投入時	MT3変圧器投入時の運用制約		変更	
0238847	東北	2026/05/21 17:00	2026/05/21 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 53号変圧器投入	MT53変圧器投入時の運用制約		変更	
0235293	東北	2026/05/24 08:30	2026/05/24 18:00	単日	上北変電所	上北変MT53	上北(変)リレー整備(275kVBP)BP盤更新(2系列化)		変更	
0235291	東北	2026/05/24 16:30	2026/05/24 19:00	単日	上北変電所	上北変電所 53号変圧器投入	上北(変)リレー整備(275kVBP)BP盤更新(2系列化)		変更	
0235926	東北	2026/05/25 08:30	2026/05/29 17:30	連続	今別幹線2号	今別幹線2号	支持物点検、架渉線点検、防錆塗装		変更	
0235429	東北	2026/05/28 08:10	2026/05/29 17:50	連続	上北変電所	北本上北線1号	上北(変)リレー整備(275kVBP)BP盤更新(2系列化)		変更	
0238850	東北	2026/05/28 17:00	2026/05/28 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 4号変圧器投入時	MT4変圧器投入時の運用制約		変更	
0235297	東北	2026/06/08 08:40	2026/06/13 17:20	連続	上北変電所	上北変MT2	MT2ブロック点検		変更	
0238848	東北	2026/06/13 17:00	2026/06/13 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 2号変圧器投入時	MT2変圧器投入時の運用制約		変更	
0238051	東北	2026/07/04 08:10	2026/07/06 17:50	連続	上北変電所	北本上北線1号	上北(変)SPC整備操作盤改造・CT回路・制御指令回路接続		変更	
0235295	東北	2026/07/09 08:10	2026/07/15 18:50	連続	上北変電所	北本上北線2号	上北(変)リレー整備(北本2号転送情報)転送情報整理盤更新(信端レス化)		変更	
0238050	東北	2026/07/09 08:10	2026/07/10 17:50	連続	上北変電所	北本上北線2号	上北(変)SPC整備操作盤改造・CT回路・制御指令回路接続		変更	
0235427	東北	2026/07/09 08:30	2026/07/09 18:00	単日	上北変電所	上北変MT2	上北(変)リレー整備(275kVBP)BP盤更新(2系列化)		変更	
0235424	東北	2026/07/09 16:30	2026/07/09 19:00	単日	上北変電所	上北変電所 2号変圧器投入時	上北(変)リレー整備(275kVBP)BP盤更新(2系列化)		変更	
0235426	東北	2026/07/11 08:30	2026/07/11 18:00	単日	上北変電所	上北変MT3	上北(変)リレー整備(275kVBP)BP盤更新(2系列化)		変更	
0235423	東北	2026/07/11 16:30	2026/07/11 19:00	単日	上北変電所	上北変電所 3号変圧器投入時	上北(変)リレー整備(275kVBP)BP盤更新(2系列化)		変更	
0235425	東北	2026/07/12 08:30	2026/07/12 18:00	単日	上北変電所	上北変MT4	上北(変)リレー整備(275kVBP)BP盤更新(2系列化)		変更	
0235422	東北	2026/07/12 16:30	2026/07/12 19:00	単日	上北変電所	上北変電所 4号変圧器投入時	上北(変)リレー整備(275kVBP)BP盤更新(2系列化)		変更	
0235294	東北	2026/07/13 08:30	2026/07/13 18:00	単日	上北変電所	上北変MT52	上北(変)リレー整備(275kVBP)BP盤更新(2系列化)		変更	
0235292	東北	2026/07/13 16:30	2026/07/13 19:00	単日	上北変電所	上北変電所 52号変圧器投入	上北(変)リレー整備(275kVBP)BP盤更新(2系列化)		変更	
0235428	東北	2026/07/14 08:10	2026/07/15 17:50	連続	上北変電所	北本上北線2号	上北(変)リレー整備(275kVBP)BP盤更新(2系列化)		変更	
0236334	東北	2026/07/14 08:30	2026/07/15 17:30	連続	岩手変電所	岩手変MT2	LTC点検		変更	
0236335	東北	2026/07/15 17:00	2026/07/15 17:30	単日	岩手変電所	岩手変電所 2号変圧器投入時	LTC点検		変更	
0239312	東北	2026/08/25 08:30	2026/10/09 17:30	連続	今別幹線1号	今別幹線1号	送変電建設センター工事(秋)増強に伴う電線張替、総合検査		新規	
0235306	東北	2026/10/03 09:20	2026/10/16 16:40	連続	東福島変電所	東福島支線1号	配電盤取替工事東福島支線1号切替		変更	
0235304	東北	2026/10/14 08:30	2026/10/15 17:30	連続	相福幹線1号	相福幹線1号	架渉線点検		変更	
0235317	東北	2026/10/17 08:50	2026/10/19 17:10	連続	米沢変電所	吾妻幹線1号	O5系機器Ry普細点検GCB普通点検		変更	
0235310	東北	2026/10/19 08:40	2026/10/20 17:20	連続	吾妻幹線1号	吾妻幹線1号	防錆塗装		変更	
0235315	東北	2026/10/19 08:40	2026/10/20 17:20	連続	吾妻幹線1号	吾妻幹線1号	引込径間碍子破損対策(地震対策)		変更	
0235301	東北	2026/10/20 08:40	2026/10/22 17:20	連続	いわき幹線1号	いわき幹線1号	がいしスベサ補修 No62.SS 2基		変更	
0235312	東北	2026/10/20 08:40	2026/10/22 17:20	連続	いわき幹線1号	いわき幹線1号	架渉線点検がいしスベサ補修		変更	
0235300	東北	2026/10/26 08:40	2026/10/29 17:20	連続	いわき幹線2号	いわき幹線2号	がいしスベサ補修 No62.SS 2基		変更	
0235311	東北	2026/10/26 08:40	2026/10/29 17:20	連続	いわき幹線2号	いわき幹線2号	架渉線点検がいしスベサ補修		変更	
0235302	東北	2026/10/28 09:10	2026/11/01 17:50	連続	福島変電所	吾妻幹線2号	O8ブッシング修繕技連第361-1号 レベル2対策		変更	
0235309	東北	2026/10/29 08:40	2026/10/30 17:20	連続	吾妻幹線2号	吾妻幹線2号	防錆塗装		変更	
0235623	東北	2026/10/29 08:40	2026/10/30 17:20	連続	吾妻幹線2号	吾妻幹線2号	引込径間碍子破損対策(地震対策)		変更	
0235316	東北	2026/10/30 08:40	2026/11/01 17:20	連続	米沢変電所	吾妻幹線2号	O6系機器Ry普細点検GCB普通点検		変更	
0235927	東北	2026/11/02 08:30	2026/11/06 17:30	連続	今別幹線1号	今別幹線1号	支持物点検、架渉線点検、防錆塗装		変更	
0235305	東北	2026/11/02 09:30	2026/11/15 16:30	連続	東福島変電所	東福島支線2号	配電盤取替工事東福島支線2号切替		変更	
0235303	東北	2026/11/05 08:30	2026/11/06 17:30	連続	相福幹線2号	相福幹線2号	架渉線点検		変更	
0235288	東北	2027/02/26 09:40	2027/07/23 14:20	連続	西仙台(変)MT2	西仙台(変)MT2	LTC修繕冷却ファンベアリング修繕		変更	
0235289	東北	2027/02/26 09:40	2027/07/23 14:20	連続	西仙台(変)MT2	西仙台(変)MT2	三次GIS取替(MT三次GIS取替)		変更	
0238049	東北	2027/03/02 09:40	2027/03/03 17:20	連続	南相馬変電所	相馬双葉幹線1号	SPC整備1ISPC向けCT回路他接続		変更	
0238048	東北	2027/03/04 09:40	2027/03/05 17:20	連続	南相馬変電所	相馬双葉幹線2号	SPC整備1ISPC向けCT回路他接続		変更	
0238021	東北	2027/03/08 09:10	2027/03/09 17:50	連続	南相馬変電所	南相馬MT2	感温部採油(PCB分析)		変更	
0238020	東北	2027/03/10 09:10	2027/03/11 17:50	連続	南相馬変電所	南相馬MT3	感温部採油(PCB分析)		変更	
0238510	東北	2027/05/10 08:30	2027/05/14 17:30	連続	今別幹線1号	今別幹線1号	防錆塗装		変更	
0238509	東北	2027/05/17 08:30	2027/05/21 17:30	連続	今別幹線2号	今別幹線2号	防錆塗装		変更	
0238517	東北	2027/06/07 08:40	2027/06/07 17:20	単日	上北変電所	上北変MT4	SA54修繕		変更	
0238029	東北	2027/07/05 08:40	2027/07/16 17:20	連続	上北変電所	上北変MT52	MT52ブロック他点検、Ry点検塗装、その他修繕		変更	
0238499	東北	2027/07/08 08:40	2027/07/09 18:00	毎日	上北変電所	上北変MT4	上北(変)CB改良(O84)O84・84撤去、リード線切離し		変更	
0238520	東北	2027/09/20 08:10	2027/09/22 17:50	連続	上北変電所	北本上北線1号	O5ブロック点検、Ry点検その他修繕		変更	
0238030	東北	2027/10/01 08:40	2027/11/30 17:20	連続	上北変電所	上北変MT52	上北変500kVMT三次SC設置 募ブ		変更	
0238498	東北	2027/10/04 08:40	2027/10/04 18:00	単日	上北変電所	上北変MT4	上北(変)CB改良(O84)O84据付		変更	
0238497	東北	2027/10/12 08:40	2027/10/12 18:00	単日	上北変電所	上北変MT4	上北(変)CB改良(O84)84据付		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0238212	東北	2027/10/18 08:30	2027/10/20 17:30	連続	相福幹線2号	相福幹線2号	架渉線点検		変更	
0238213	東北	2027/10/25 08:30	2027/10/27 17:30	連続	相福幹線1号	相福幹線1号	架渉線点検		変更	
0238496	東北	2027/10/27 08:40	2027/10/27 18:00	単日	上北変電所	上北変MT4	上北(変)CB改良(O84)LS(84)リード線接続		変更	
0238024	東北	2027/11/08 08:40	2027/11/10 17:20	連続	吾妻幹線1号	吾妻幹線1号	電線サンプル採取		変更	
0238211	東北	2027/11/08 08:40	2027/11/09 17:20	連続	吾妻幹線1号	吾妻幹線1号	防錆塗装		変更	
0238210	東北	2027/11/11 08:40	2027/11/12 17:20	連続	吾妻幹線2号	吾妻幹線2号	防錆塗装		変更	
0238221	東北	2027/12/06 08:50	2027/12/10 18:10	連続	南相馬変電所	常磐南幹線2号	O4ブロック他機器点検		変更	
0238028	東北	2027/12/06 09:30	2027/12/09 17:30	連続	岩手変電所	岩手変MT2	500/275kV AVQC盤切替 他岩手(変)増設・調相 建セ変電		変更	
0238224	東北	2027/12/13 08:50	2027/12/17 18:10	連続	南相馬変電所	常磐南幹線1号	O3ブロック他機器点検		変更	
0238027	東北	2027/12/14 08:30	2027/12/14 17:30	単日	岩手変電所	岩手変MT2	旧275kV BP盤→新BP盤(1系)切替 他岩手(変)増設・調相 建セ変電		変更	
0238274	東北	2028/02/28 08:30	2028/03/03 17:30	連続	常磐北幹線1号	常磐北幹線1号	がいしスベサ補修(西仙台SS)接近木伐採		変更	
0238273	東北	2028/03/06 08:30	2028/03/10 17:30	連続	常磐北幹線2号	常磐北幹線2号	がいしスベサ補修(西仙台SS)接近木伐採		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0343521	東京	2026/04/01 08:00	2028/04/09 09:00	連続	電発佐久間(発)	FC連絡線50Hz/佐久間(発)50Hz母線	FC連絡線50Hz直列機器～50Hz母線接続工事	制約有	変更	
0345240	東京	2026/04/01 08:00	2026/04/02 17:30	連続	中給停止計画G	新信濃2号FC	2号FC停止に伴う運用制約		変更	
0343745	東京	2026/04/01 08:30	2026/04/02 17:00	連続	新信濃変電所	新信濃2号FC	空調設備点検 停止試験		変更	
0343746	東京	2026/04/01 08:30	2026/04/02 17:00	連続	新信濃変電所	RC設備	空調設備点検 簡易点検 普点		変更	
0343753	東京	2026/04/01 09:00	2028/04/09 09:00	連続	佐久間FC	佐久間FC	・FC連絡線主盤及び遠制御更新		変更	
0345587	東京	2026/04/01 09:00	2028/04/09 09:00	連続	電発佐久間(発)	FC連絡線50Hz/FC連絡線60Hz	・佐久間(発)FC連絡線保護制御装置一括更新に伴う 不要信号送出SVロック他 ・主盤、遠制御更新に伴うSV・TM要素停止		変更	
0348101	東京	2026/04/01 09:00	2028/04/09 09:00	連続	佐久間FC	佐久間FC	佐久間FC冷却システム他更新 ・冷却システム更新 ・風洞及びバルブ室床補修 ・東西連系増強に伴う既設盤改修工事 ・屋内外機器定期点検(LS-60細密LS-50) ・サイリスタバルブ他普点(制御保護、冷却装置含)他		変更	
0345227	東京	2026/04/03 07:30	2026/04/03 08:30	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃FC 帰線2L停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0345232	東京	2026/04/03 07:30	2026/04/03 08:30	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃FC 帰線2L停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0345233	東京	2026/04/03 07:30	2026/04/22 16:30	連続	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃2極停止に伴う運用制約		変更	
0343742	東京	2026/04/03 08:30	2026/04/22 10:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極/5Bの3次母線/50Hz5組 ShR1群/50Hz5組ShR2群	L991, L992コンタ外交換、操作機構部取替 O993, O994開閉器本体取替		変更	
0343744	東京	2026/04/03 08:30	2026/04/22 14:30	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極	サイリスタバルブ 停止試験(精密点検) PG・LEC盤停止試験 DC-CT停止試験 DC-VT停止試験 帰線保護盤停止試験 極保護盤、交流過電圧保護盤停止試験 極制御装置 停止試験 純水冷却装置停止試験 風冷冷却器停止試験 バルブ冷却盤停止試験(風令冷却盤含む) バルブホール空調停止試験 バルブホール内清掃 冷却制御盤停止試験 高調波フィルタ(ACF,DCF) 停止試験 電力用コンデンサ(DSC)停止試験 電力用コンデンサ(5組1.2群)停止試験		変更	
0348102	東京	2026/04/03 08:30	2026/04/22 09:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極/50Hz5組ShR1群/50Hz5組 ShR2群	L991, L992割ピン交換		変更	
0351366	東京	2026/04/03 08:30	2026/04/22 14:30	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極	バルブホール空調停止試験 バルブホール内清掃 冷却制御盤停止試験 高調波フィルタ(ACF,DCF) 停止試験 電力用コンデンサ(DSC)停止試験 電力用コンデンサ(5組1.2群)停止試験 2極極制御装置DIO基盤監視機能実装 変換用変圧器シーケンサ変更 2極400V所内1, 2Cub点検		変更	
0343758	東京	2026/04/08 09:00	2026/04/08 17:00	単日	南いわき(開)	相馬双葉幹線1L/相馬双葉幹線1Lの CBO31	・制御ケーブル切り離し		変更	
0343748	東京	2026/04/13 09:00	2026/04/15 17:00	連続	電発佐久間(発)	佐久間(発)50Hz母線/FC連絡線50Hz	・佐久間発電所屋外鉄構補強 (佐久間東西幹線増強工事対応)		変更	
0343759	東京	2026/04/20 08:30	2026/04/24 17:00	連続	新富士(変)	275kV甲1母線/275kV1Uフスタイ CBO30/275kV甲セクションCBO300	【新富士(変)275kV母線鉄構塗装】 ・塗装箇所(275kV甲1母線)		変更	
0343760	東京	2026/04/20 09:00	2026/04/24 17:00	毎日	新富士(変)	275kV甲1母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・275kV甲母線Bg.GIS据付 危険防止		変更	
0343939	東京	2026/04/21 08:30	2026/04/22 17:00	連続	新富士(変)	275kV甲1母線/275kV甲セクションCBO300	【修繕】 ・275kV甲セクションGIS(甲1側)修理		変更	
0343928	東京	2026/04/22 10:00	2026/04/22 11:00	単日	新信濃変電所	50Hz5組SC1群/50Hz5組SC2群/154kV2 極母線	O993, O994コナ・超音波測定 SC投入時の放電確認		変更	
0343927	東京	2026/04/22 11:00	2026/04/22 13:00	単日	新信濃変電所	50Hz5組SC1群/50Hz5組SC2群/154kV2 極母線	SC放電対策機能確認 LA絶縁抵抗測定		変更	
0345231	東京	2026/04/22 13:30	2026/04/22 14:30	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃FC 帰線2L使用のための操作に伴う運用制約		変更	
0345242	東京	2026/04/22 13:30	2026/04/22 14:30	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃FC 帰線2L使用のための操作に伴う運用制約		変更	
0343932	東京	2026/04/22 14:30	2026/04/22 15:30	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極潮流指定(45MW)	1秒起動停止試験 系統併入試験(450MW) A-K間高・低圧側LA外部診断 本線・帰線用直流LA外部診断 高・低圧側ブリッジ用LA外部診断		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0343931	東京	2026/05/15 08:00	2026/06/02 18:00	連続	電発静岡送変電事業所(中西制)	佐久間FC連絡線 50Hz(・60Hz)	《1》電線路細密点検 佐久間PS～《No.》3(4基)50Hz・60Hz 《2》巻付け型光ファイバケーブル更新 佐久間PS～佐久間FC(7径間)		変更	
0348204	東京	2026/06/01 08:30	2026/06/05 17:00	連続	新富士(変)	275kV甲1母線/275kV1Uアスタ CBO30/275kV甲セクションCBO300	【新富士(変)275kV母線鉄構塗装】 ・塗装箇所(275kV甲1母線)		変更	
0343951	東京	2026/06/01 09:00	2026/06/05 15:00	連続	新富士(変)	275kV甲1母線/275kV1Uアスタ CBO30/275kV甲セクションCBO300	【新富士変電所7B増設他工事】 ・275kV佐久間東幹山線1. 2L 分岐架線接続(甲母線)		変更	
0343949	東京	2026/06/05 15:00	2026/06/05 17:00	単日	新富士(変)	275kV甲1母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・275kV佐久間東幹山線1. 2L 試充電(甲母線～GISBg)		変更	
0343947	東京	2026/06/08 08:30	2026/06/12 15:00	連続	新富士(変)	275kV乙1母線/275kV1Uアスタ CBO30/275kV乙セクションCBO400	【新富士(変)275kV母線鉄構塗装】 ・塗装箇所(275kV乙1母線)		変更	
0343935	東京	2026/06/08 09:00	2026/06/08 17:00	単日	南いわき(開)	相馬双葉幹線2L/相馬双葉幹線2Lの CBO32	・制御ケーブル切り離し		変更	
0343948	東京	2026/06/08 09:00	2026/06/12 15:00	連続	新富士(変)	275kV乙1母線/275kV1Uアスタ CBO30/275kV乙セクションCBO400	【新富士変電所7B増設他工事】 ・275kV佐久間東幹山線1. 2L 分岐架線接続(乙母線)		変更	
0344026	東京	2026/06/08 09:00	2026/06/30 17:00	連続	福島山幹線2L	福島山幹線2L	・ジャンパ接続・新No.10～相馬双葉幹線No.88		変更	
0344039	東京	2026/06/08 09:00	2026/06/30 17:00	連続	新福島(変)	福島山幹線2L/福島山幹線2LのCBO2	・制御ケーブル切り離し・接続 ・各種試験 交流回路試験 対向試験 警報、トリップ、操作試験		変更	
0344040	東京	2026/06/08 09:00	2026/06/30 17:00	連続	新いわき(開)	福島山幹線2L/福島山幹線2LのCBO2	・制御ケーブル切り離し・接続 ・各種試験 交流回路試験 対向試験 警報、トリップ、操作試験		変更	
0344080	東京	2026/06/09 08:00	2026/06/09 17:00	単日	福島山幹線2L	福島山幹線2L	《1》電線・地線本体点検《No.》73～74 計1径間		変更	
0343946	東京	2026/06/12 15:00	2026/06/12 17:00	単日	新富士(変)	275kV乙1母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・275kV佐久間東幹山線1. 2L 試充電(乙母線～GISBg)		変更	
0343945	東京	2026/06/15 09:00	2026/06/15 17:00	単日	新富士(変)	275kV甲1母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・275kV佐久間東幹山線1. 2L 使用前自主検査		変更	
0343944	東京	2026/06/16 10:00	2026/06/16 11:00	単日	新富士(変)	275kV甲1母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・275kV佐久間東幹山線1L 試充電(甲母線)		変更	
0343943	東京	2026/06/16 11:00	2026/06/16 12:00	単日	新富士(変)	275kV甲1母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・275kV佐久間東幹山線2L 試充電(甲母線)		変更	
0343942	東京	2026/06/16 14:00	2026/06/16 15:00	単日	新富士(変)	275kV乙1母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・275kV佐久間東幹山線1L 試充電(乙母線)		変更	
0343941	東京	2026/06/16 15:00	2026/06/16 16:00	単日	新富士(変)	275kV乙1母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・275kV佐久間東幹山線2L 試充電(乙母線)		変更	
0343938	東京	2026/06/22 09:00	2026/06/22 17:00	単日	新富士(変)	500kV甲母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・500kV母線鉄構補強部材調査		変更	
0343940	東京	2026/06/23 09:00	2026/06/23 17:00	単日	新富士(変)	500kV乙母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・500kV母線鉄構補強部材調査		変更	
0344041	東京	2026/06/30 17:00	2026/06/30 18:00	単日	新いわき(開)	福島山幹線2L/福島山幹線2LのCBO2	・実系統による電圧電流位相測定試験		変更	
0344042	東京	2026/06/30 17:00	2026/06/30 18:00	単日	新福島(変)	福島山幹線2L/福島山幹線2LのCBO2	・実系統による電圧電流位相測定試験		変更	
0348105	東京	2026/09/01 09:00	2026/09/01 17:00	単日	電発佐久間(発)	佐久間(発)50Hz母線/新豊根佐久間50Hz 線のCBO5	・新豊根佐久間50Hz線 GIS化工事に伴う 母線側断路器(LS-205)切離し		変更	
0345241	東京	2026/09/03 08:00	2026/09/18 15:05	連続	中給停止計画G	新信濃1号FC	新信濃1号FC停止に伴う運用制約		変更	
0341725	東京	2026/09/03 08:30	2026/09/17 16:00	連続	新信濃変電所	60Hz1号調相変圧器/60Hz1号調相設備	60Hz1号調相Tr直接並配電盤および制御回路停止試験 共通直接並停止試験 O954停止試験 O955停止試験 60Hz1組2群SC電力用コンデンサ停止試験 60Hz1組3群SC電力用コンデンサ停止試験 1.2号6kVCub配電盤および制御回路停止試験 1.2号6kVCub停止試験 1.2号6kVCub真空遮断器精密点検 (O801 O810 O815 O816 O802 O826 O827) O957コンタクト・操作器交換交換 O958コンタクト・操作器交換交換 275kVVCケーブル終端接続部防護対策		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0343912	東京	2026/09/03 08:30	2026/09/18 14:00	連続	新信濃変電所	新信濃1号FC	50Hzサイリスタハルブ本体、PG・LEC盤停止試験 サイリスタハルブ冷却制御盤停止試験 純水冷却装置停止試験 自動再起動補助盤停止試験 DC-CT補助盤停止試験 共通制御盤、50Hz12相制御盤停止試験 簡易監視制御盤停止試験 交流50Hz.60Hz中継盤停止試験 直流(1)(2)中継盤停止試験 50HzFC保護盤、変換Tr保護盤LTC制御盤停止試験 50Hz.60HzFC連絡線直接盤停止試験 取引用計量器盤停止試験 275kVGVケーブル終端接続部防護対策		変更	
0343913	東京	2026/09/03 08:30	2026/09/18 14:00	連続	新信濃変電所	新信濃1号FC	50Hz.60Hz高調波フィルター保護停止試験 50Hz5次2号高調波フィルター停止試験 50Hz高調波フィルター停止試験 50Hz高調波フィルター冷却制御盤停止試験 1,2号6kVCub配電盤および制御回路停止試験 1,2号6kVCub停止試験 1,2号6kVCub真空遮断器精密点検 (O801 O810 O815 O816 O802 O826 O827) ハルブホール空調停止試験 ハルブホール内清掃 整流器(AB系)充電器外部診断		変更	
0343918	東京	2026/09/18 14:00	2026/09/18 14:35	単日	新信濃変電所	1号FC潮流指定(30MW)	系統併入試験 A-K間直流LA外部診断		変更	
0343904	東京	2026/09/28 08:00	2026/09/28 18:00	単日	新福島(変)	福島東幹線山線1L/福島東幹線山線1LのCBO3	断路器 福島東幹線山線1号 103 LS(電動操作)停止試験 A【12年】		変更	
0343907	東京	2026/09/28 08:00	2026/09/28 18:00	単日	新福島(変)	500kV甲2母線	断路器 福島東幹線山線1号 103 LS(電動操作)停止試験 A【12年】		変更	
0343898	東京	2026/09/29 08:00	2026/09/29 18:00	単日	新福島(変)	福島東幹線山線2L/福島東幹線山線2LのCBO4	断路器 福島東幹線山線2号 104 LS(電動操作)停止試験 A【12年】		変更	
0343908	東京	2026/09/29 08:00	2026/09/29 18:00	単日	新福島(変)	500kV甲2母線	断路器 福島東幹線山線2号 104 LS(電動操作)停止試験 A【12年】		変更	
0343915	東京	2026/09/29 08:00	2026/09/29 17:00	単日	新福島(変)	4B	ガス遮断器 主変4号2次 O24 GCB(油圧・電動パネ)6年 停止試験【GCB】		変更	
0342060	東京	2026/10/01 09:00	2026/10/01 09:30	単日	新富士(変)	13B	【新富士変電所7B増設他工事】・13B撤去(廃止)		変更	
0343922	東京	2026/10/05 08:30	2026/10/05 17:00	単日	新富士(変)	500kV甲母線	【新富士(変)VQC3取替工事】 (VQ3(1U・2U・3U) 500kV甲母線関係) ・制御ケーブル切り離し・接続 ・シーケンス試験 他		変更	
0343917	東京	2026/10/05 09:00	2026/10/27 17:00	連続	新福島(変)	4B	・避圧弁交換(各相本体用、各相中性点接続箱、各相LVR用) ・確認試験		変更	
0343921	東京	2026/10/06 08:30	2026/10/06 17:00	単日	新富士(変)	500kV乙母線	【新富士(変)VQC3取替工事】 (VQ3(1U・2U・3U) 500kV乙母線関係) ・制御ケーブル切り離し・接続 ・シーケンス試験 他		変更	
0345230	東京	2026/10/07 07:30	2026/10/07 08:30	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃FC 帰線1L停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0345234	東京	2026/10/07 07:30	2026/10/07 08:30	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃FC 帰線1L停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0345238	東京	2026/10/07 07:30	2026/11/20 16:30	連続	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃1極停止に伴う運用制約		変更	
0343900	東京	2026/10/07 08:30	2026/11/20 09:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極/4Bの3次母線/50Hz4組 ShR1群/50Hz4組ShR2群/4B	L981,L982開閉器本体取替 4号連Tr3次GIS CH～50Hz4組1群2群ShR(VGC) CH間ケーブル 張替		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0343901	東京	2026/10/07 08:30	2026/11/20 14:30	連続	新信濃変電所	飛驒信濃FC1極	サイリスタバルブ停止試験(精密点検) PG・LEC盤停止試験 DC-CT停止試験 DC-VT停止試験 帰線保護盤停止試験 極保護盤、交流過電圧保護盤停止試験 極制御装置 停止試験 純水冷却装置停止試験 風冷冷却器停止試験 バルブ冷却盤停止試験(風令冷却盤含む) バルブホール空調停止試験 バルブホール内清掃 冷却制御盤停止試験 高調波フィルタ(ACF,DCF)停止試験 電力用コンデンサ(DSC)停止試験 電力用コンデンサ(4組1.2群)停止試験		変更	
0343919	東京	2026/10/07 08:30	2026/11/20 10:00	連続	新信濃変電所	飛驒信濃FC1極/50Hz4組SC1群/50Hz4組SC2群/154kV1極母線	O983、O984開閉器本体取替 SC放電対策工事		変更	
0351367	東京	2026/10/07 08:30	2026/11/20 14:30	連続	新信濃変電所	飛驒信濃FC1極	バルブホール空調停止試験 バルブホール内清掃 冷却制御盤停止試験 高調波フィルタ(ACF,DCF)停止試験 電力用コンデンサ(DSC)停止試験 電力用コンデンサ(4組1.2群)停止試験 1極極制御装置DIO基板監視機能実装 変換用変圧器シーケンス変更 1極400V所内1、2Cub点検		変更	
0343905	東京	2026/10/07 09:00	2026/10/20 17:00	連続	飛驒信濃直流幹線 本線1L	飛驒信濃直流幹線 本線1L	がいし点検《No.》125～《No.》136 4基		変更	
0343923	東京	2026/10/07 09:00	2026/10/20 17:00	連続	飛驒信濃直流幹線 帰線1L	飛驒信濃直流幹線 帰線1L	がいし点検《No.》125～《No.》136 4基		変更	
0342057	東京	2026/10/12 08:00	2026/10/15 17:00	連続	新富士(変)	11B	・11B LTC細密点検		変更	
0342061	東京	2026/10/13 08:00	2026/10/21 17:00	連続	新富士(変)	11B	【新富士(変)VQC3取替工事】(VQ3(3U) 11B関係)・制御ケーブル切り離し・接続 ・シーケンス試験 他		変更	
0343801	東京	2026/10/13 08:00	2026/10/15 18:00	連続	新福島(変)	500kV甲2母線	・断路器 500KV2Uブスタイ 120 LS(電動操作)停止試験【機能回復 1回/24年】 ・断路器 500KV2Uブスタイ 120 LS(電動操作)停止試験A【12年】		変更	
0342062	東京	2026/10/15 09:00	2026/10/16 17:00	連続	新富士(変)	11B	・11B1次 LS311修理		変更	
0342058	東京	2026/10/20 09:30	2026/10/20 17:00	単日	新富士(変)	11B	・11B L411 LS停止試験(12年)		変更	
0342059	東京	2026/10/22 08:00	2026/10/25 17:00	連続	新富士(変)	12B	・12B LTC細密点検		変更	
0342056	東京	2026/10/22 09:00	2026/10/23 17:00	連続	新富士(変)	12B	・12B O312 GCB停止試験(12年) ・12B LS412 LS停止試験(12年)		変更	
0342055	東京	2026/10/23 08:00	2026/10/28 17:00	連続	新富士(変)	12B	【新富士(変)VQC3取替工事】(VQ3(3U) 12B関係)・制御ケーブル切り離し・接続 ・シーケンス試験 他		変更	
0342054	東京	2026/10/24 09:00	2026/10/25 17:00	連続	新富士(変)	12B	・12B1次 LS312修理		変更	
0343804	東京	2026/10/25 08:00	2026/10/27 18:00	連続	新福島(変)	500kV乙2母線	・断路器 500KV2Uブスタイ 220 LS(電動操作)停止試験【機能回復 1回/24年】 ・断路器 500KV2Uブスタイ 220 LS(電動操作)停止試験A【12年】		変更	
0342051	東京	2026/10/30 08:00	2026/11/06 17:00	連続	新富士(変)	14B	【新富士(変)VQC3取替工事】(VQ3(3U) 14B関係)・制御ケーブル切り離し・接続 ・シーケンス試験 他		変更	
0342052	東京	2026/10/30 09:00	2026/10/30 17:00	単日	新富士(変)	14B	・14B LS414 LS停止試験(12年)		変更	
0345226	東京	2026/11/01 07:30	2026/11/01 08:30	単日	中給停止計画G	飛驒信濃FC2極	飛驒信濃FC 帰線2L停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0345236	東京	2026/11/01 07:30	2026/11/01 08:30	単日	中給停止計画G	飛驒信濃FC1極	飛驒信濃FC 帰線2L停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0345243	東京	2026/11/01 07:30	2026/11/09 18:00	連続	中給停止計画G	飛驒信濃FC2極	飛驒信濃2極停止に伴う運用制約		変更	
0344304	東京	2026/11/01 08:30	2026/11/09 17:00	連続	新信濃変電所	飛驒信濃FC1極/飛驒信濃直流幹線 本線1L/飛驒信濃FC2極/飛驒信濃直流幹線 本線2L/飛驒信濃直流幹線 帰線1L/飛驒信濃直流幹線 帰線2L	双極共通制御盤点検 バルブホール空調設備点検(共通部)		変更	
0345586	東京	2026/11/01 08:30	2026/11/09 17:00	連続	新信濃変電所	飛驒信濃FC2極/50Hz5組ShR1群/50Hz5組ShR2群	L991、L992割ピン交換		変更	
0344305	東京	2026/11/01 09:00	2026/11/09 17:00	連続	飛驒信濃直流幹線 本線2L	飛驒信濃直流幹線 本線2L	がいし点検《No.》125～《No.》136 4基		変更	
0344316	東京	2026/11/01 09:00	2026/11/09 17:00	連続	飛驒信濃直流幹線 帰線2L	飛驒信濃直流幹線 帰線2L	がいし点検《No.》125～《No.》136 4基		変更	
0344301	東京	2026/11/02 08:00	2026/11/02 18:00	単日	新福島(変)	500kV乙2母線	断路器 福島東幹線山線2号 204 LS(電動操作)停止試験A【12年】		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0344315	東京	2026/11/02 08:00	2026/11/02 18:00	単日	新福島(変)	福島東幹線山線1L/福島東幹線山線1LのCBO3	断路器 福島東幹線山線1号 203 LS(電動操作)停止試験 A【12年】		変更	
0344300	東京	2026/11/03 08:00	2026/11/03 18:00	単日	新福島(変)	500kV乙2母線	断路器 福島東幹線山線1号 203 LS(電動操作)停止試験 A【12年】		変更	
0344303	東京	2026/11/03 08:00	2026/11/03 18:00	単日	新福島(変)	福島東幹線山線2L/福島東幹線山線2LのCBO4	断路器 福島東幹線山線2号 204 LS(電動操作)停止試験 A【12年】		変更	
0342053	東京	2026/11/04 09:00	2026/11/05 17:00	連続	新富士(変)	14B	・14B1次 LS312修理		変更	
0344317	東京	2026/11/09 08:30	2026/11/10 17:00	毎日	新富士(変)	500kV甲母線	【修繕】 ・5B LS115修理		変更	
0345229	東京	2026/11/09 17:00	2026/11/09 18:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃FC 帰線2L使用のための操作に伴う運用制約		変更	
0345235	東京	2026/11/09 17:00	2026/11/09 18:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃FC 帰線2L使用のための操作に伴う運用制約		変更	
0344382	東京	2026/11/11 08:30	2026/11/12 17:00	毎日	新富士(変)	500kV乙母線	【修繕】 ・5B LS215修理		変更	
0343667	東京	2026/11/19 08:30	2026/11/20 17:00	毎日	新富士(変)	500kV甲母線	【保守業務】 ・6B LS116 LS停止試験(12年)		変更	
0343647	東京	2026/11/20 09:00	2026/11/20 10:00	単日	新信濃変電所	50Hz4組ShR1群/50Hz4組ShR2群	4号連Tr3次ケーブル張替後の課電試験 L981, L982コナ・超音波測定		変更	
0343642	東京	2026/11/20 10:00	2026/11/20 11:00	単日	新信濃変電所	50Hz4組SC1群/50Hz4組SC2群/154kV1極母線	O983, O984コナ・超音波測定 SC投入時の放電確認		変更	
0343650	東京	2026/11/20 11:00	2026/11/20 13:00	単日	新信濃変電所	50Hz4組SC1群/50Hz4組SC2群/154kV1極母線	SC放電対策機能確認 LA絶縁抵抗測定		変更	
0345228	東京	2026/11/20 11:00	2026/11/20 12:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃FC 帰線1L使用のための操作に伴う運用制約		変更	
0345237	東京	2026/11/20 11:00	2026/11/20 12:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃FC 帰線1L使用のための操作に伴う運用制約		変更	
0343643	東京	2026/11/20 14:30	2026/11/20 15:30	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極潮流指定(45MW)	1秒起動停止試験 系統併入試験(450MW) A-K間高・低圧側LA外部診断 本線・帰線用直流LA外部診断 高・低圧側ブリッジ用LA外部診断		変更	
0342048	東京	2026/11/21 09:00	2026/11/24 17:00	連続	富士川線1, 2L	富士川線1, 2L	【東清水線新設工事】・ジャンパ作成, 接続 富士川線No.2, No.16	制約有	変更	
0345239	東京	2026/11/25 08:00	2026/12/21 15:05	連続	中給停止計画G	新信濃2号FC	2号FC停止に伴う運用制約		変更	
0343651	東京	2026/11/25 08:30	2026/12/20 16:00	連続	新信濃変電所	60Hz275kV2号母線とO40	2-275kV TC取替		変更	
0343652	東京	2026/11/25 08:30	2026/12/20 16:00	連続	新信濃変電所	60Hz2号調相変圧器	400V3.4号Cub停止試験 400V3.4号Cub配電盤および制御回路 停止試験 2-275kV TC取替		変更	
0343653	東京	2026/11/25 08:30	2026/12/20 16:00	連続	新信濃変電所	RC設備	RC精密点検 主軸受上部下部タービン油試験精密点検 RC用高調波フィルタ普通点検 系統電圧制御RC用変流器停止試験 中性点抵抗器 停止試験 中性点RC用変流器停止試験 AVR制御RC用変流器停止試験 RC主保護RC用変流器停止試験 RC保護1RC用変流器停止試験 RC始動装置空調設点検 RC励磁室空調設点検 給排気設備点検 400V3.4号Cub停止試験 400V3.4号Cub配電盤および制御回路 停止試験 2-275kV TC取替		変更	
0343654	東京	2026/11/25 08:30	2026/12/21 14:00	連続	新信濃変電所	新信濃2号FC	60Hzサイリスタバルブ停止試験 60Hzサイリスタバルブ予備モジュール停止試験 予備モジュール用純水冷却装置停止試験 60Hz純水冷却装置停止試験 60Hzバルブ冷却制御盤停止試験 50Hz,60Hz密閉型冷却塔停止試験 バルブホール空調設備停止試験 水質改善装置停止試験 400V3.4号Cub停止試験 400V3.4号Cub配電盤および制御回路 停止試験 2号給水設備圧力ポンプ停止試験 バルブホール内清掃 取引用計量器盤停止試験		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0343655	東京	2026/11/25 08:30	2026/12/21 14:00	連続	新信濃変電所	新信濃2号FC	2号FC取引用電力量計修理 2-275kV TC取替 60HzPGLC盤停止試験 60Hz12相制御盤停止試験 60HzLTC制御盤停止試験 DC-PT盤停止試験 FC系統制御盤停止試験 50HzFCインターフェース盤点検 60HzFCインターフェース盤点検		変更	
0343656	東京	2026/11/25 08:30	2026/12/20 16:00	連続	新信濃変電所	新信濃分岐線2L/新信濃分岐線2LのO42	2-275kV TC取替		変更	
0348106	東京	2026/11/29 07:30	2026/11/29 18:30	単日	中給停止計画G	新信濃1号FC	新信濃60Hz1号母線、1FC停止に伴う運用制約		変更	
0343657	東京	2026/11/29 08:00	2026/11/29 18:00	単日	新信濃変電所	60Hz275kV1号母線/新信濃1号FC/60Hz1号調相変圧器	2-275kV TC取替 ・同期検定VCT回路切離、接続 ・T40開閉試験 ・β進め回路切替		変更	
0343659	東京	2026/12/21 14:00	2026/12/21 14:35	単日	新信濃変電所	2号FC潮流指定(30MW)	系統併入試験 A-K間直流LA外部診断		変更	
0343662	東京	2027/01/06 08:30	2027/01/15 17:00	連続	新富士(変)	500kV甲母線/500kVブスタイCBO10	【新富士変電所7B増設他工事】 ・500kV母線鉄構補強		変更	
0343547	東京	2027/01/07 08:30	2027/01/08 17:00	連続	新富士(変)	1B/500kV甲母線	【修繕】 ・1B LS111修理		変更	
0343663	東京	2027/01/11 08:30	2027/01/15 17:00	連続	新富士(変)	2B	【新富士(変)VQC1取替工事】 (VQ1 2B関係) ・制御ケーブル切り離し・接続 ・シーケンス試験 他 【新富士(変)VQC3取替工事】 (VQ3(1U) 2BSVC関係) ・制御ケーブル切り離し・接続 ・シーケンス試験 他		変更	
0343670	東京	2027/01/11 08:30	2027/01/15 17:00	連続	新富士(変)	2B	【新富士(変)275kV母線鉄構塗装】 ・塗装箇所(2B)		変更	
0343666	東京	2027/01/12 08:30	2027/01/13 17:00	連続	新富士(変)	500kV甲母線/500kVブスタイCBO10	【修繕】 ・500kVブスタイ LS110修理		変更	
0343524	東京	2027/01/15 15:00	2027/01/15 17:00	単日	新富士(変)	500kV甲母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・500kVGIS 試充電(甲母線～GISB _G)		変更	
0343669	東京	2027/01/18 08:30	2027/01/22 15:00	連続	新富士(変)	1B	【新富士(変)275kV母線鉄構塗装】 ・塗装箇所(1B)		変更	
0343664	東京	2027/01/18 09:00	2027/01/27 17:00	連続	新富士(変)	500kV乙母線/500kVブスタイCBO10	【新富士変電所7B増設他工事】 ・500kV母線鉄構補強		変更	
0343531	東京	2027/01/19 08:30	2027/01/20 17:00	連続	新富士(変)	1B/275kV乙1母線	【修繕】 ・1B LS421修理		変更	
0343534	東京	2027/01/19 09:00	2027/01/19 17:00	単日	新富士(変)	1B	【保守業務】 ・1B O21GCB停止試験(12年)		変更	
0343530	東京	2027/01/20 09:00	2027/01/20 17:00	単日	新富士(変)	275kV乙1母線	【新富士(変)VQC3取替工事】 (VQ3(2U) 275kV乙1母線関係) ・制御ケーブル切り離し		変更	
0343533	東京	2027/01/21 08:30	2027/01/22 17:00	連続	新富士(変)	1B/500kV乙母線	【修繕】 ・1B LS211修理		変更	
0343532	東京	2027/01/21 09:00	2027/01/21 17:00	単日	新富士(変)	275kV甲1母線	【新富士(変)VQC3取替工事】 (VQ3(2U) 275kV甲1母線関係) ・制御ケーブル切り離し		変更	
0343665	東京	2027/01/25 08:30	2027/01/26 17:00	連続	新富士(変)	500kV乙母線/500kVブスタイCBO10	【修繕】 ・500kVブスタイ LS210修理		変更	
0343526	東京	2027/01/27 15:00	2027/01/27 17:00	単日	新富士(変)	500kV乙母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・500kVGIS 試充電(乙母線～GISB _G)		変更	
0343527	東京	2027/02/17 09:00	2027/02/17 12:00	単日	新富士(変)	500kV甲母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・7B 使用前自主検査 ・7B 試充電(甲母線)		変更	
0343528	東京	2027/02/17 13:00	2027/02/17 15:00	単日	新富士(変)	500kV乙母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・7B 使用前自主検査 ・7B 試充電(乙母線)		変更	
0342044	東京	2027/03/03 09:00	2027/03/09 17:00	連続	田代幹線中線1L	田代幹線中線1L	【鉄塔塗装工事】・田代幹線 No.201-32、201-33、201-34、201-35 4基 【田代幹線他避雷装置設置工事(その3)】・田代幹線 No.200～227(28基) 【保守業務委託】【駿河変電所GIS化関連引込変更工事】	制約有	変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0343512	東京	2027/03/03 09:30	2027/03/10 17:00	連続	駿河(変)	66kV SVC	【点検】 ・SVCサイリスタバルブ及び関連装置停止試験(3年) ・SVCバルブホール空気調和設備点検		変更	
0345217	東京	2027/03/03 09:30	2027/03/03 16:00	単日	駿河(変)	田代幹線中線1LのCBO3	【駿河(変)154kV1U母線保護リレー取替工事】 ・田代幹線中線1L制御回路切替シーケンス試験	制約有	変更	
0345221	東京	2027/03/04 09:30	2027/03/05 16:00	連続	駿河(変)	富士川線1, 2L	【駿河(変)154kV1U母線保護リレー取替工事】 ・富士川1L:制御回路切替シーケンス試験 ・富士川2L:制御回路切替シーケンス試験	制約有	変更	
0343513	東京	2027/03/09 07:30	2027/03/31 17:00	連続	新福島(変)	3B(運用申合書を参照)	・避圧弁交換(各相本体用、各相中性点接続箱、各相LVR用) ・確認試験	制約有	変更	
0342046	東京	2027/03/10 09:00	2027/03/15 12:00	連続	田代幹線中線2L	田代幹線中線2L	【鉄塔塗装工事】・田代幹線 No.201-32、201-33、201-34、201-35 4基 【田代幹線他避雷装置設置工事(その3)】・田代幹線 No.200～227(28基) 【駿河変電所GIS化関連引込変更工事】【保守業務委託】	制約有	変更	
0345218	東京	2027/03/10 09:30	2027/03/10 16:00	単日	駿河(変)	田代幹線中線2LのCBO4	【駿河(変)154kV1U母線保護リレー取替工事】 ・田代幹線中線2L:制御回路切替シーケンス試験 ・田代幹線中線2L:母線保護リレー切替 (旧盤側切離)	制約有	変更	
0345220	東京	2027/03/11 09:30	2027/03/11 16:00	単日	駿河(変)	富士川線1, 2L	【駿河(変)154kV1U母線保護リレー取替工事】 ・富士川線1L:母線保護リレー切替 (旧盤側切離) ・富士川線2L:母線保護リレー切替 (旧盤側切離)	制約有	変更	
0345219	東京	2027/03/15 13:00	2027/03/15 16:00	単日	駿河(変)	田代幹線中線1LのCBO3	【駿河(変)154kV1U母線保護リレー取替工事】 ・田代幹線中線1L:母線保護リレー切替 (旧盤側切離)	制約有	変更	
0343519	東京	2027/03/17 08:30	2027/03/29 17:00	連続	新信濃変電所	60Hz2号調相変圧器	2-275kV TC取替		変更	
0348104	東京	2027/03/17 08:30	2027/03/17 13:30	単日	中給停止計画G	新信濃2号FC	新信濃60Hz2号母線停止に伴う運用制約		変更	
0343520	東京	2027/03/17 09:00	2027/03/17 13:00	単日	新信濃変電所	60Hz275kV2号母線とO40	2-275kV TC取替		変更	
0343515	東京	2027/03/20 09:00	2027/03/22 17:00	連続	新福島(変)	3B(運用申合書を参照)	風冷式冷却装置点検	制約有	変更	
0343514	東京	2027/03/27 09:00	2027/03/27 17:00	単日	新福島(変)	3B(運用申合書を参照)/3BのCBO23	ガス遮断器 主変3号2次 O23 GCB(油圧・電動バネ)6年停止試験【GCB】	制約有	変更	
0348775	東京	2027/05/10 09:00	2027/05/24 17:00	連続	福島東幹線山線1L	福島東幹線山線1L	《1》福島東幹線《No.》45他鉄塔防錆塗装工事 《No.》45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 計10基 《2》福島東幹線《No.》55他鉄塔防錆塗装工事 《No.》55,56,57,58,59 計5基		変更	
0348986	東京	2027/05/11 08:00	2027/05/25 16:30	連続	中給停止計画G	新信濃2号FC 新信濃2号FC	新信濃2号FC停止に伴う運用制約 6kVCub3号 自社用電力用計量器点検 6kVCub3号 配電盤制御回路停止試験 S3B.S4B 所内Tr停止試験 バルブホール空調停止試験		変更	
0348959	東京	2027/05/11 08:30	2027/05/25 16:00	連続	新信濃変電所		O961.O962.O963操作器交換 60Hz275kV2号BDR取替 O40遮断器部停止試験		変更	
0348960	東京	2027/05/11 08:30	2027/05/25 14:00	連続	新信濃変電所	60Hz2号調相変圧器/60Hz2号調相設備			変更	
0348963	東京	2027/05/11 08:30	2027/05/25 14:00	連続	新信濃変電所	60Hz275kV2号母線とO40			変更	
0348968	東京	2027/05/11 08:30	2027/05/25 14:00	連続	新信濃変電所	RC設備	同期調相機簡易点検 O97遮断器部停止試験 密閉型冷却塔停止試験 冷却水循環水ポンプNo.1～No.3停止試験 6kVCub3号 自社用電力用計量器点検 6kVCub3号 配電盤制御回路停止試験 S3B.S4B 所内Tr停止試験 始動装置Cub、RC-Cub配電盤制御回路停止試験 始動装置フィルター、励磁室空調点検		変更	
0348962	東京	2027/05/25 14:00	2027/05/25 15:00	単日	新信濃変電所	60Hz275kV2号母線とO40/60Hz2号調相変圧器/60Hz2号調相設備	60Hz275kV2号BDR取替後の諸試験		変更	
0348985	東京	2027/05/26 08:00	2027/06/06 17:30	連続	中給停止計画G	新信濃1号FC	新信濃1号FC停止に伴う運用制約		変更	
0348961	東京	2027/05/26 08:30	2027/07/04 16:00	連続	新信濃変電所	60Hz1号調相変圧器/60Hz1号調相設備	O957.O958本体取替		変更	
0348967	東京	2027/05/26 08:30	2027/06/06 17:00	連続	新信濃変電所	新信濃1号FC	60HzACFIアフル送油ポンプ軸受交換 純水冷却装置 停止試験(6年)		変更	
0349043	東京	2027/05/26 09:00	2027/06/09 17:00	連続	福島東幹線山線2L	福島東幹線山線2L	《1》福島東幹線《No.》45他鉄塔防錆塗装工事 《No.》45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 計10基 《2》福島東幹線《No.》55他鉄塔防錆塗装工事 《No.》55,56,57,58,59 計5基		変更	
0348983	東京	2027/06/19 07:30	2027/06/19 08:30	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃FC 帰線1L停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0348984	東京	2027/06/19 07:30	2027/06/20 18:00	連続	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃FC1極に伴う運用制約		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0348974	東京	2027/06/19 08:30	2027/06/20 17:00	連続	新信濃変電所	飛驒信濃FC1極/50Hz4組SC1群/50Hz4組SC2群	L981,L982割ピン交換 バルブホール空調停止試験 バルブホール内清掃		変更	
0348980	東京	2027/06/19 08:30	2027/06/20 17:00	連続	飛驒信濃直流幹線 本線1L	飛驒信濃直流幹線 本線1L	がいし点検《No.》2～《No.》137 11基		変更	
0349065	東京	2027/06/19 08:30	2027/06/20 17:00	連続	飛驒信濃直流幹線 帰線1L	飛驒信濃直流幹線 帰線1L	がいし点検《No.》2～《No.》137 11基		変更	
0348982	東京	2027/06/20 17:00	2027/06/20 18:00	単日	中給停止計画G	飛驒信濃FC2極	飛驒信濃FC 帰線1L使用のための操作に伴う運用制約		変更	
0348973	東京	2027/07/04 16:00	2027/07/04 18:00	単日	新信濃変電所	60Hz1号調相設備	60Hz1号調相設備の諸試験		変更	
0349075	東京	2027/09/01 08:00	2027/09/12 18:00	連続	電発静岡送変電事業所(中西制)	佐久間FC連絡線 50Hz(・60Hz)	《1》鉄塔防錆塗装(ボルト取替含む)《No.》2,3,5,6(《No.》6は飛散防止あり)		変更	
0350879	東京	2027/09/10 08:00	2027/09/17 17:00	連続	電発佐久間(発)	FC連絡線60Hz	FC連絡線60Hz直列機器VT回路切替		変更	
0349085	東京	2027/10/02 08:00	2027/10/17 16:05	連続	中給停止計画G	新信濃1号FC	新信濃1号FC停止に伴う運用制約		変更	
0349078	東京	2027/10/02 08:30	2027/10/17 12:00	連続	新信濃変電所	60Hz275kV1号母線とO40	1-275kV TC取替		変更	
0349079	東京	2027/10/02 08:30	2027/10/17 15:00	連続	新信濃変電所	新信濃1号FC	60Hzサイリスタバルブ停止試験 調相制御盤・調相直接盤停止試験 冷却制御盤停止試験 遮断器部停止試験 密閉型冷却塔停止試験 ほか		変更	
0349087	東京	2027/10/02 08:30	2027/10/17 12:00	連続	新信濃変電所	60Hz1号調相変圧器/60Hz1号調相設備	O954操作器交換 1号調相Tr冷却制御盤停止試験 O951停止試験		変更	
0351536	東京	2027/10/02 08:30	2027/10/17 15:00	連続	新信濃変電所	新信濃1号FC	給水設備 1.2号圧力ポンプ停止試験 バルブホール空調設備停止試験 エアージャワー停止試験 No.1,2 1号FC副所変停止試験 1号FC400Cub1.2停止試験 1号FC連絡線LS251停止試験 DCL冷却制御盤停止試験 6kV1・2号所内自社計量器修理		変更	
0349082	東京	2027/10/17 15:00	2027/10/17 15:35	単日	新信濃変電所	1号FC潮流指定(30MW)	1号FC系統併入試験		変更	
0349528	東京	2027/10/20 07:00	2027/10/23 18:00	連続	中給停止計画G	飛驒信濃FC2極	飛驒信濃FC 帰線2L停止に伴う運用制約		変更	
0349529	東京	2027/10/20 07:00	2027/10/20 08:00	単日	中給停止計画G	飛驒信濃FC1極	飛驒信濃FC 帰線2L停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0349449	東京	2027/10/20 08:00	2027/10/23 17:00	連続	飛驒信濃直流幹線 帰線2L	飛驒信濃直流幹線 帰線2L	がいし点検《No.》2～《No.》137 11基		変更	
0349450	東京	2027/10/20 08:00	2027/10/23 17:00	連続	飛驒信濃直流幹線 本線2L	飛驒信濃直流幹線 本線2L	がいし点検《No.》2～《No.》137 11基		変更	
0349451	東京	2027/10/20 08:00	2027/10/23 17:00	連続	新信濃変電所	飛驒信濃FC2極/50Hz5組SC1群/50Hz5組SC2群	L991,L992割ピン交換 バルブホール空調停止試験 バルブホール内清掃		変更	
0349530	東京	2027/10/23 17:00	2027/10/23 18:00	単日	中給停止計画G	飛驒信濃FC1極	飛驒信濃FC 帰線2L使用のための操作に伴う運用制約		変更	
0349536	東京	2027/10/30 08:00	2027/10/31 17:30	連続	中給停止計画G	新信濃2号FC	新信濃2号FC停止に伴う運用制約		変更	
0349452	東京	2027/10/30 08:30	2027/10/31 17:00	連続	新信濃変電所	新信濃2号FC	バルブホール空調点検		変更	
0349453	東京	2027/10/30 08:30	2027/10/31 17:00	連続	新信濃変電所	RC設備	同期調相機簡易点検		変更	
0349532	東京	2027/11/15 08:00	2027/12/10 17:30	連続	中給停止計画G	新信濃1号FC	新信濃1号FC停止に伴う運用制約		変更	
0349446	東京	2027/11/15 08:30	2027/12/10 17:00	連続	新信濃変電所	新信濃1号FC/60Hz1号調相変圧器	1-275kV TC取替		変更	
0349456	東京	2027/11/15 08:30	2027/12/10 17:00	連続	新信濃変電所	60Hz275kV1号母線とO40	60Hz275kV1号BDR取替		変更	
0349457	東京	2027/11/15 08:30	2027/12/10 17:00	連続	新信濃変電所	新信濃分岐線1L/新信濃分岐線1LのO41 福島山幹線1L	1-275kV TC取替		変更	
0349320	東京	2027/11/26 08:00	2027/12/10 17:00	連続	福島山幹線1L		《1》福島幹線《No.》68他鉄塔鉄塔防錆塗装工事 《No.》68,69,70,71,72 計5基 《2》電線・地線点検 《No.》48～49 1径間		変更	
0349458	東京	2027/11/30 08:00	2027/11/30 17:00	単日	新福島(変)	3B(運用申合書を参照)	・主変3号 O13 GCB(油圧・電動バネ)6年停止試験【GC B】		変更	
0349459	東京	2027/12/01 09:00	2029/04/18 17:00	連続	新福島(変)	4B	4B取替工事		変更	
0349460	東京	2027/12/10 17:00	2027/12/10 18:00	単日	新信濃変電所	60Hz275kV1号母線とO40/60Hz1号調相変圧器/60Hz1号調相設備	60Hz275kV1号BDR取替後の諸試験		変更	
0349527	東京	2027/12/11 09:00	2027/12/12 17:00	連続	新福島(変)	500kV乙2母線	一次架線切離し		変更	
0349397	東京	2027/12/13 08:00	2027/12/13 18:00	単日	新しいわき(開)	福島山幹線2L/福島山幹線2LのCBO2	・福島山幹線2L O2 6年停止試験(油圧・電動バネ)【GIS】 ・福島山幹線2L LS102 停止試験A【12年】		変更	
0349370	東京	2027/12/13 09:00	2027/12/27 17:00	連続	福島山幹線2L		《1》福島幹線《No.》68他鉄塔鉄塔防錆塗装工事 《No.》68,69,70,71,72 計5基 《2》電線・地線点検 《No.》48～49 1径間		変更	
0349400	東京	2027/12/14 08:00	2027/12/14 18:00	単日	新しいわき(開)	福島山幹線2L/福島山幹線2LのCBO2	・福島山幹線2L LS202 停止試験A【12年】		変更	
0349534	東京	2028/02/16 08:00	2028/02/18 18:00	毎日	佐久間FC	変換装置フローティング	新佐久間FC 60Hz片端試験のための運用停止		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0349531	東京	2028/02/21 08:00	2028/02/25 18:00	毎日	佐久間FC	変換装置フローティング	新佐久間FC 60Hz片端試験のための運用停止		変更	
0349535	東京	2028/02/23 08:00	2028/02/24 18:00	毎日	佐久間FC	佐久間FC連絡線 50Hz(・60Hz)/佐久間FC	新佐久間FC 60Hz片端試験のための運用停止		変更	
0347574	東京	2028/03/01 09:00	2028/03/04 17:00	連続	田代幹線中線1L	田代幹線中線1L	【駿河変電所GIS化関連引込み変更工事】 a.《No.》201-30～《No.》201-31～鉄構 山線電線撤去 b.《No.》201-31～鉄構 地線撤去 c.《No.》201-30～新設C鉄構 山線電線架線 上記の危険防止(接地あり) 【田代幹線《No.》190～《No.》198鉄塔建替工事】		変更	
0347579	東京	2028/03/01 09:30	2028/03/01 16:00	単日	駿河(変)	富士川線1, 2L	【駿河(変)154kV1U母線保護リレー取替工事】 ・富士川1L母線VT回路切替 ・富士川2L母線VT回路切替		変更	
0347576	東京	2028/03/02 09:30	2028/03/02 16:00	単日	駿河(変)	田代幹線中線1LのCBO3	【駿河(変)154kV1U母線GIS化工事】 ・田代幹線中線1L母線VT切替		変更	
0349539	東京	2028/03/05 08:00	2028/03/26 16:30	連続	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃2極停止に伴う運用制約		変更	
0349548	東京	2028/03/05 08:30	2028/03/26 16:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極	O993,O994遮断器取替 L991,L992割ピン交換		変更	
0347577	東京	2028/03/05 09:00	2028/03/10 17:00	連続	田代幹線中線2L	田代幹線中線2L	【駿河変電所GIS化関連引込み変更工事】 a.《No.》201-30～《No.》201-31～鉄構 山線電線撤去 b.《No.》201-31～鉄構 地線撤去 c.《No.》201-30～新設C鉄構 山線電線架線 上記の危険防止(接地あり) 【保守業務】 不良がはいし検出 田代幹線《No.》242		変更	
0347580	東京	2028/03/07 09:30	2028/03/07 16:00	単日	駿河(変)	田代幹線中線2LのCBO4	【駿河(変)154kV1U母線GIS化工事】 ・田代幹線中線2L母線VT切替		変更	
0347581	東京	2028/03/11 09:00	2028/03/12 17:00	連続	田代幹線中線1L	田代幹線中線1L	【駿河変電所GIS化関連引込み変更工事】 a.《No.》201-30～《No.》201-31～鉄構 山線電線撤去 b.《No.》201-31～鉄構 地線撤去 c.《No.》201-30～新設C鉄構 山線電線架線 上記の危険防止(接地あり)		変更	
0347578	東京	2028/03/13 09:00	2028/03/16 17:00	連続	田代幹線中線2L	田代幹線中線2L	【駿河変電所GIS化関連引込み変更工事】 a.《No.》201-30～《No.》201-31～鉄構 山線電線撤去 b.《No.》201-31～鉄構 地線撤去 c.《No.》201-30～新設C鉄構 山線電線架線 上記の危険防止(接地あり)		変更	
0349546	東京	2028/03/26 16:00	2028/03/26 17:00	単日	新信濃変電所	50Hz5組SC2群	L991,L992コロナ・超音波測定		変更	
0349547	東京	2028/03/26 16:00	2028/03/26 17:00	単日	新信濃変電所	50Hz5組SC1群	O993,O994遮断器取替後の諸試験		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0478263	中部	2026/04/01 00:00	2026/04/10 18:00	連続	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 線路	電圧上昇対策に伴う愛岐幹 1L 運用停止		新規	
0471869	中部	2026/04/01 08:00	2026/04/01 18:00	単日	北部変	275kV 2 BANK	一次二次CBインターロック試験		更新	
0471886	中部	2026/04/01 08:00	2026/04/01 10:30	単日	北部変	275kV 2 BANK	開閉試験		更新	
0471887	中部	2026/04/01 16:00	2026/04/01 18:30	単日	北部変	275kV 3 BANK	開閉試験		更新	
0472497	中部	2026/04/02 08:00	2026/04/02 14:00	単日	北部変	275kV 甲B BUS	保護盤取替/旧盤電圧切離		更新	
0472498	中部	2026/04/02 12:00	2026/04/02 18:00	単日	北部変	275kV 乙B BUS	保護盤取替/旧盤電圧切離		更新	
0471315	中部	2026/04/03 07:30	2026/04/22 14:30	連続	飛騨変換所	2極 交直流変換装置	飛騨変換所定期点検(2極)		更新	
0471316	中部	2026/04/03 07:30	2026/04/22 14:30	連続	飛騨変換所	2極 交直流変換装置	飛騨変換所定期点検(2極)のうち直流GIS点検		更新	
0471818	中部	2026/04/03 07:30	2026/04/03 10:00	単日	飛騨変換所	2極 交直流変換装置	開閉試験		更新	
0471822	中部	2026/04/03 07:30	2026/04/03 10:00	単日	飛騨変換所	154kV 2 BANK	開閉試験		更新	
0471843	中部	2026/04/03 07:30	2026/04/03 08:30	単日	飛騨変換所	1極 交直流変換装置	帰線操作に伴う双極停止		更新	
0471844	中部	2026/04/03 07:30	2026/04/03 08:30	単日	飛騨変換所	2極 交直流変換装置	帰線操作に伴う双極停止		更新	
0472487	中部	2026/04/03 07:30	2026/04/22 14:30	連続	飛騨変換所	154kV 2-2 交流フィルタ	飛騨変換所定期点検のうち交流フィルタ点検(2極)		更新	
0472488	中部	2026/04/03 07:30	2026/04/22 14:30	連続	飛騨変換所	154kV 2-1 交流フィルタ	飛騨変換所定期点検のうち交流フィルタ点検(2極)		更新	
0475785	中部	2026/04/03 07:30	2026/04/22 14:30	連続	飛騨変換所	77kV 2-2 SHR	2-1・2-2ShR用GS開放点検		新規	
0475788	中部	2026/04/03 07:30	2026/04/22 14:30	連続	飛騨変換所	77kV 2-2 SHR	2-1・2-2ShR用GS開放点検		新規	
0470462	中部	2026/04/04 08:00	2026/04/06 18:00	連続	三重開	500kV 三重東近江 1L 線路	三重東近江 1L 切替		変更	
0471809	中部	2026/04/04 08:00	2026/04/04 18:00	単日	三重開	500kV 三重東近江 1L 線路	三重東近江 1L 機器バレット条件切離		変更	
0471814	中部	2026/04/04 08:00	2026/04/04 10:30	単日	三重開	500kV 三重東近江 1L 構内	開閉試験		変更	
0471884	中部	2026/04/04 08:00	2026/04/17 15:00	連続	信濃変	275kV 3 BANK	信濃変 77kV3-2ShR増設		更新	
0471899	中部	2026/04/04 08:00	2026/04/04 10:30	単日	信濃変	275kV 3 BANK	開閉試験		更新	
0470666	中部	2026/04/07 08:00	2026/04/08 18:00	毎日	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 全線	不良がいついし検出(メガー測定)		変更	
0470672	中部	2026/04/07 08:00	2026/04/10 18:00	連続	岐阜開	500kV 愛岐幹 1L 全線	制御・保護盤取替/愛岐幹 1L		変更	
0471226	中部	2026/04/07 08:00	2026/04/07 10:30	単日	岐阜開	500kV 愛岐幹 1L 構内	開閉試験		変更	
0471439	中部	2026/04/07 08:00	2026/04/07 10:30	単日	愛知変	500kV 愛岐幹 1L 構内	開閉試験		変更	
0475841	中部	2026/04/07 08:00	2026/04/07 15:00	単日	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 全線	架線金具補修		変更	
0470463	中部	2026/04/08 08:00	2026/04/10 18:00	連続	三重開	500kV 三重東近江 2L 線路	三重東近江 2L 切替		変更	
0471808	中部	2026/04/08 08:00	2026/04/08 18:00	単日	三重開	500kV 三重東近江 2L 線路	三重東近江 2L 機器バレット条件切離		変更	
0471815	中部	2026/04/08 08:00	2026/04/08 10:30	単日	三重開	500kV 三重東近江 2L 構内	開閉試験		変更	
0470951	中部	2026/04/09 07:00	2026/04/10 19:00	連続	愛知変	500kV 愛岐幹 1L 線路	愛岐幹 1L GCB5042 作動油交換		変更	
0478265	中部	2026/04/10 19:00	2026/04/27 07:00	連続	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 線路	電圧上昇対策に伴う愛岐幹 1L 運用停止		新規	
0471317	中部	2026/04/22 13:30	2026/04/22 16:30	単日	飛騨変換所	2極 交直流変換装置	飛騨変換所定期点検(2極)に伴う系統連系試験		変更	
0471845	中部	2026/04/22 13:30	2026/04/22 14:30	単日	飛騨変換所	1極 交直流変換装置	帰線操作に伴う双極停止		更新	
0471846	中部	2026/04/22 13:30	2026/04/22 14:30	単日	飛騨変換所	2極 交直流変換装置	帰線操作に伴う双極停止		更新	
0471841	中部	2026/04/24 00:00	2026/05/02 23:59	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保		更新	
0472491	中部	2026/04/24 07:00	2026/04/28 18:00	連続	信濃変	500kV 信濃幹 2L 全線	5024ブロック機器点検(信濃幹 2L)		更新	
0471890	中部	2026/04/25 07:00	2026/04/25 09:30	単日	南信変	500kV 南信幹 1L 構内	開閉試験		更新	
0471903	中部	2026/04/25 07:00	2026/04/25 09:30	単日	豊根開	500kV 南信幹 1L 構内	開閉試験		更新	
0472507	中部	2026/04/25 07:00	2026/04/27 18:00	毎日	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 全線	南信幹線不良がいついし検出		更新	
0471878	中部	2026/04/25 08:00	2026/04/28 18:00	連続	南信変	500kV 信濃幹 2L 線路	信濃幹 2L 切替		更新	
0470950	中部	2026/04/27 07:00	2026/04/28 19:00	連続	愛知変	500kV 愛岐幹 2L 線路	愛岐幹 2L GCB5044 作動油交換		変更	
0471227	中部	2026/04/27 07:00	2026/04/27 09:30	単日	岐阜開	500kV 愛岐幹 2L 構内	開閉試験		変更	
0471440	中部	2026/04/27 07:00	2026/04/27 09:30	単日	愛知変	500kV 愛岐幹 2L 構内	開閉試験		変更	
0470667	中部	2026/04/27 08:00	2026/04/28 18:00	毎日	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 全線	不良がいついし検出(メガー測定)		変更	
0470673	中部	2026/04/27 08:00	2026/04/30 18:00	連続	岐阜開	500kV 愛岐幹 2L 全線	制御・保護盤取替/愛岐幹 2L		変更	
0475842	中部	2026/04/27 08:00	2026/04/28 18:00	毎日	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 全線	架線金具補修		変更	
0478264	中部	2026/04/27 08:00	2026/04/30 17:00	連続	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 線路	電圧上昇対策に伴う愛岐幹 2L 運用停止		変更	
0471891	中部	2026/04/28 07:00	2026/04/28 09:30	単日	南信変	500kV 南信幹 2L 構内	開閉試験		更新	
0471904	中部	2026/04/28 07:00	2026/04/28 09:30	単日	豊根開	500kV 南信幹 2L 構内	開閉試験		更新	
0472508	中部	2026/04/28 07:00	2026/04/30 18:00	毎日	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 全線	南信幹線不良がいついし検出		更新	
0471900	中部	2026/04/28 16:00	2026/04/28 18:30	単日	信濃変	275kV BUS TIE	開閉試験	制約有	更新	
0471901	中部	2026/04/28 16:00	2026/04/28 18:30	単日	信濃変	275kV 信濃中信 1L 構内	開閉試験		更新	
0471942	中部	2026/04/28 16:00	2026/04/28 18:30	単日	中信変	275kV 信濃中信 1L 構内	開閉試験		更新	
0471860	中部	2026/04/28 16:30	2026/04/28 19:00	単日	中信変	275kV 信濃中信 2L 構内	開閉試験		更新	
0471894	中部	2026/04/28 16:30	2026/04/28 19:00	単日	信濃変	500kV BUS TIE	開閉試験		更新	
0471902	中部	2026/04/28 16:30	2026/04/28 19:00	単日	信濃変	275kV 信濃中信 2L 構内	開閉試験		更新	
0471877	中部	2026/04/29 08:00	2026/05/02 18:00	連続	南信変	500kV 信濃幹 1L 線路	信濃幹 1L 切替		更新	
0471892	中部	2026/04/29 08:00	2026/04/29 10:30	単日	南信変	500kV 信濃幹 1L 構内	開閉試験		更新	
0471895	中部	2026/04/29 08:00	2026/04/29 10:30	単日	信濃変	500kV 信濃幹 1L 構内	開閉試験		更新	
0472933	中部	2026/04/30 07:00	2026/04/30 18:00	単日	信濃幹 1L	500kV 信濃幹 1L 全線	信濃幹線架空地線補修		更新	
0478284	中部	2026/04/30 18:00	2026/05/23 07:00	連続	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 線路	電圧上昇対策に伴う愛岐幹 2L 運用停止		変更	
0472505	中部	2026/05/01 07:00	2026/05/02 18:00	毎日	信濃幹 1L	500kV 信濃幹 1L 全線	信濃幹線不良がいついし検出		更新	
0471320	中部	2026/05/07 08:00	2026/05/08 18:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	東清水FC増設/2FC取込・実機結合(3FC)		更新	
0471321	中部	2026/05/07 08:00	2026/05/08 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	東清水FC増設/2FC取込・実機結合(3FC)		更新	
0478342	中部	2026/05/07 08:00	2026/05/08 18:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	2FC変換Tr一次 CB554開放点検		新規	
0478343	中部	2026/05/07 08:00	2026/05/08 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	2FC変換Tr一次 CB554開放点検		新規	
0478344	中部	2026/05/07 08:00	2026/05/08 18:00	連続	東清水変	154kV 富士川 1L 構内	2FC変換Tr一次 CB554開放点検		新規	
0478345	中部	2026/05/07 08:00	2026/05/08 18:00	連続	東清水変	154kV 富士川 2L 構内	2FC変換Tr一次 CB554開放点検		新規	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0470464	中部	2026/05/08 08:00	2026/05/08 14:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検(上期分)		更新	
0470465	中部	2026/05/08 08:00	2026/05/08 14:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検(上期分)		更新	
0472495	中部	2026/05/09 07:00	2026/05/09 19:00	単日	北部変	275kV 甲B BUS	200関係機器点検(甲200普、箱普、電装品)		更新	
0472496	中部	2026/05/10 07:00	2026/05/10 19:00	単日	北部変	275kV 乙B BUS	200関係機器点検(乙200普、箱普、電装品)		更新	
0472494	中部	2026/05/15 07:00	2026/05/15 19:00	単日	北部変	275kV 4 BANK	4B関係機器点検(LST740箱細、B977箱細点)		更新	
0470470	中部	2026/05/18 07:00	2026/05/20 19:00	連続	高根一水開	275kV 高根馬瀬 2L 構内	014関係機器点検		更新	
0471806	中部	2026/05/18 07:00	2026/05/18 18:00	単日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	架空地線張替に伴う架線金具調査		変更	
0471825	中部	2026/05/18 07:00	2026/05/18 09:30	単日	馬瀬一水開	275kV 高根馬瀬 2L 構内	開閉試験		更新	
0471829	中部	2026/05/18 07:00	2026/05/18 09:30	単日	高根一水開	275kV 高根馬瀬 2L 構内	開閉試験		更新	
0479030	中部	2026/05/18 07:00	2026/05/18 18:00	単日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	架線金具スケッチ		新規	
0472351	中部	2026/05/19 07:00	2026/05/19 19:00	単日	馬瀬一水開	275kV 高根馬瀬 2L 構内	GCB044圧力計修理		更新	
0471854	中部	2026/05/23 09:00	2026/05/23 11:30	単日	北部変	500kV 西部幹 1L 構内	開閉試験		変更	
0471939	中部	2026/05/23 09:00	2026/05/23 11:30	単日	西部変	500kV 西部幹 1L 構内	開閉試験		変更	
0478266	中部	2026/05/23 11:30	2026/05/25 07:00	連続	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 線路	電圧上昇対策に伴う愛岐幹2L運用停止		新規	
0471897	中部	2026/05/25 07:00	2026/05/25 09:30	単日	信濃変	275kV 1 BANK	開閉試験		更新	
0472492	中部	2026/05/25 07:00	2026/05/31 19:00	連続	信濃変	275kV 1 BANK	1BTブロック機器点検		更新	
0471853	中部	2026/05/25 09:00	2026/05/25 11:30	単日	西部変	500kV 西部幹 2L 構内	開閉試験		変更	
0471855	中部	2026/05/25 09:00	2026/05/25 11:30	単日	北部変	500kV 西部幹 2L 構内	開閉試験		変更	
0478267	中部	2026/05/25 11:30	2026/05/28 08:00	連続	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 線路	電圧上昇対策に伴う愛岐幹2L運用停止		新規	
0470664	中部	2026/05/28 08:00	2026/05/29 18:00	毎日	東部幹 1L	500kV 東部幹 1L 全線	不良がいろいろ検出(メガー測定)	制約有	変更	
0471251	中部	2026/05/28 08:00	2026/05/28 10:30	単日	北部変	500kV 東部幹 1L 構内	開閉試験	制約有	変更	
0471475	中部	2026/05/28 08:00	2026/05/28 10:30	単日	東部変	500kV 東部幹 1L 構内	開閉試験	制約有	変更	
0478278	中部	2026/05/28 18:00	2026/05/29 08:00	連続	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 線路	電圧上昇対策に伴う愛岐幹1L運用停止		新規	
0478268	中部	2026/05/29 18:00	2026/06/02 06:30	連続	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 線路	電圧上昇対策に伴う愛岐幹1L運用停止		変更	
0471898	中部	2026/05/31 17:00	2026/05/31 19:30	単日	信濃変	275kV 2 BANK	開閉試験		更新	
0471931	中部	2026/06/02 06:30	2026/06/02 08:00	単日	岐阜開	500kV 岐阜連絡 2L 構内	開閉試験		変更	
0471941	中部	2026/06/02 06:30	2026/06/02 08:00	単日	北部変	500kV 岐阜連絡 2L 構内	開閉試験		変更	
0471930	中部	2026/06/02 08:00	2026/06/02 09:30	単日	岐阜開	500kV 岐阜連絡 1L 構内	開閉試験		変更	
0471940	中部	2026/06/02 08:00	2026/06/02 09:30	単日	北部変	500kV 岐阜連絡 1L 構内	開閉試験		変更	
0479408	中部	2026/06/02 09:30	2026/06/30 23:59	連続	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 線路	電圧上昇対策に伴う愛岐幹1L運用停止		新規	
0471842	中部	2026/06/06 00:00	2026/06/08 23:59	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保		更新	
0471876	中部	2026/06/06 07:00	2026/06/08 19:00	連続	南信変	500kV 信濃幹 2L 全線	GCB5038作動油交換		更新	
0471893	中部	2026/06/06 07:00	2026/06/06 09:30	単日	南信変	500kV 信濃幹 2L 構内	開閉試験		更新	
0471896	中部	2026/06/06 07:00	2026/06/06 09:30	単日	信濃変	500kV 信濃幹 2L 構内	開閉試験		更新	
0472506	中部	2026/06/06 07:00	2026/06/08 18:00	毎日	信濃幹 2L	500kV 信濃幹 2L 全線	信濃幹線不良がいろいろ検出他		更新	
0471879	中部	2026/06/07 08:00	2026/06/07 14:00	単日	南信変	500kV 甲A BUS	500kV PT切離	制約有	更新	
0471880	中部	2026/06/07 08:00	2026/06/07 14:00	単日	南信変	500kV 甲B BUS	500kV PT切離	制約有	更新	
0471888	中部	2026/06/07 08:00	2026/06/07 10:30	単日	南信変	500kV 甲AB BUS SECT	開閉試験		更新	
0471881	中部	2026/06/07 12:00	2026/06/07 17:00	単日	南信変	500kV Z A BUS	500kV PT切離	制約有	更新	
0471882	中部	2026/06/07 12:00	2026/06/07 17:00	単日	南信変	500kV Z B BUS	500kV PT切離	制約有	更新	
0471889	中部	2026/06/07 12:00	2026/06/07 14:30	単日	南信変	500kV ZAB BUS SECT	開閉試験		更新	
0471839	中部	2026/06/22 07:00	2026/06/26 18:00	毎日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	高根馬瀬線No24—No32間電線張替に伴う鉄塔改造		変更	
0471836	中部	2026/06/29 07:00	2026/06/30 18:00	毎日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	高根馬瀬線No24—No32間電線張替に伴う鉄塔改造		変更	
0471922	中部	2026/07/01 07:00	2026/07/01 09:30	単日	東栄変	275kV 新豊根東栄線 構内	開閉試験		更新	
0471923	中部	2026/07/01 07:00	2026/11/06 19:00	連続	新豊根東栄線	275kV 新豊根東栄線 全線	【TZA-26-001】移線、延線、緊線工事ほか		変更	
0470674	中部	2026/07/05 08:00	2026/07/05 10:30	単日	岐阜開	500kV 甲A BUS	制御・保護盤取替/PT切離		変更	
0470675	中部	2026/07/05 10:30	2026/07/05 13:00	単日	岐阜開	500kV Z A BUS	制御・保護盤取替/PT切離		変更	
0472511	中部	2026/07/30 08:00	2026/08/04 20:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 構内	【TNA-26-001】断路器(LS-171,172)点検、所内低圧遮断器点検他		変更	
0471813	中部	2026/07/31 06:00	2026/08/01 15:00	毎日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	【TNA-26-052】秋二線GIS化工事に伴う架線接続		変更	
0475782	中部	2026/08/03 08:00	2026/08/04 18:00	毎日	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 1L	【TNA-26-053】秋二線GIS化工事に伴う確認試験		新規	
0478277	中部	2026/09/01 00:00	2026/11/04 08:00	連続	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 線路	電圧上昇対策に伴う愛岐幹2L運用停止		変更	
0471837	中部	2026/09/03 07:00	2026/09/06 18:00	毎日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	高根馬瀬線No24—No32間電線張替に伴う鉄塔改造		変更	
0471840	中部	2026/09/09 07:00	2026/09/12 18:00	毎日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	高根馬瀬線No24—No32間電線張替に伴う鉄塔改造		変更	
0471856	中部	2026/09/11 07:00	2026/09/11 09:30	単日	高根一水開	275kV 高根中信 1L 構内	開閉試験		変更	
0471858	中部	2026/09/11 07:00	2026/09/11 09:30	単日	中信変	275kV 高根中信 1L 構内	開閉試験		変更	
0472489	中部	2026/09/11 07:00	2026/09/13 19:00	連続	高根一水開	275kV 高根中信 1L 全線	高根第一水開断路器操作箱取替/LE022操作箱取替		更新	
0472500	中部	2026/09/11 07:00	2026/09/13 19:00	連続	高根一水開	275kV 高根中信 1L 構内	022関係機器点検		更新	
0472878	中部	2026/09/11 07:00	2026/09/12 18:00	毎日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	高根中信線防錆塗装		更新	
0472485	中部	2026/09/11 08:00	2026/09/11 18:00	単日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	架線金具補修他		更新	
0471319	中部	2026/09/28 07:00	2026/12/10 14:00	連続	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	高根馬瀬線No24～No32間電線張替		更新	
0470469	中部	2026/10/01 07:00	2026/10/03 19:00	連続	高根一水開	275kV 高根馬瀬 1L 構内	012関係機器点検		更新	
0471824	中部	2026/10/01 07:00	2026/10/01 09:30	単日	馬瀬一水開	275kV 高根馬瀬 1L 構内	開閉試験		更新	
0471828	中部	2026/10/01 07:00	2026/10/01 09:30	単日	高根一水開	275kV 高根馬瀬 1L 構内	開閉試験		更新	
0471831	中部	2026/10/01 07:30	2026/10/07 18:00	連続	高根一水開	275kV 甲 BUS	B010、020取替		更新	
0471832	中部	2026/10/01 07:30	2026/10/07 18:00	連続	高根一水開	275kV 甲 BUS	高根第一水開断路器操作箱取替/B024、103操作箱取替		更新	
0471917	中部	2026/10/01 07:30	2026/10/07 18:00	連続	高根一水開	275kV 高根中信 2L 構内	B010、020取替		更新	
0471918	中部	2026/10/01 07:30	2026/10/07 18:00	連続	高根一水開	275kV 高根中信 2L 構内	高根第一水開断路器操作箱取替/B024、103操作箱取替		更新	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0471807	中部	2026/10/05 07:00	2026/10/06 18:00	毎日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	架空地線張替に伴う架線金具調査		変更	
0471857	中部	2026/10/05 07:00	2026/10/05 09:30	単日	高根一水開	275kV 高根中信 2L 構内	開閉試験		更新	
0471859	中部	2026/10/05 07:00	2026/10/05 09:30	単日	中信変	275kV 高根中信 2L 構内	開閉試験		更新	
0472490	中部	2026/10/05 07:00	2026/10/07 19:00	連続	高根一水開	275kV 高根中信 2L 全線	高根第一水開断路器操作箱取替/LEO24操作箱取替		更新	
0472501	中部	2026/10/05 07:00	2026/10/07 19:00	連続	高根一水開	275kV 高根中信 2L 構内	024関係機器点検		更新	
0472875	中部	2026/10/05 07:00	2026/10/06 18:00	毎日	高根中信 2L	275kV 高根中信 2L 全線	高根中信線防錆塗装		更新	
0472486	中部	2026/10/05 08:00	2026/10/05 18:00	単日	高根中信 2L	275kV 高根中信 2L 全線	架線金具補修他		更新	
0470471	中部	2026/10/07 07:30	2026/11/20 12:00	連続	飛騨変換所	1極 交直流変換装置	飛騨変換所定期点検(1極)		更新	
0470472	中部	2026/10/07 07:30	2026/11/20 12:00	連続	飛騨変換所	1極 交直流変換装置	飛騨変換所定期点検(1極)のうち直流GIS点検		更新	
0471796	中部	2026/10/07 07:30	2026/11/20 12:00	連続	飛騨変換所	154kV 1-2 交流フィルタ	飛騨変換所定期点検のうち交流フィルタ点検(1極)		更新	
0471816	中部	2026/10/07 07:30	2026/10/07 10:00	単日	飛騨変換所	1極 交直流変換装置	開閉試験		更新	
0471821	中部	2026/10/07 07:30	2026/10/07 10:00	単日	飛騨変換所	154kV 1 BANK	開閉試験		更新	
0471847	中部	2026/10/07 07:30	2026/10/07 08:30	単日	飛騨変換所	1極 交直流変換装置	帰線操作に伴う双極停止		更新	
0471848	中部	2026/10/07 07:30	2026/10/07 08:30	単日	飛騨変換所	2極 交直流変換装置	帰線操作に伴う双極停止		更新	
0472874	中部	2026/10/07 07:30	2026/11/20 12:00	連続	飛騨変換所	154kV 1-1 交流フィルタ	飛騨変換所定期点検のうち交流フィルタ点検(1極)		更新	
0475783	中部	2026/10/07 07:30	2026/11/20 12:00	連続	飛騨変換所	77kV 1-1 SHR	1-1・1-2 ShR用GS開放点検		新規	
0475784	中部	2026/10/07 07:30	2026/11/20 12:00	連続	飛騨変換所	77kV 1-2 SHR	1-1・1-2 ShR用GS開放点検		新規	
0470613	中部	2026/10/14 08:00	2026/10/17 18:00	連続	南福光変	500kV 中部北陸連絡母線 1L	制御・保護盤取替/中北連絡母線1L切替		変更	
0470982	中部	2026/10/14 08:00	2026/10/14 10:30	単日	南福光変	500kV 中部北陸連絡母線 1L 構内	開閉試験		変更	
0475810	中部	2026/10/15 08:00	2026/10/15 18:00	単日	南福光変	500kV 中部北陸連絡母線 1L 構内	(北陸作業)LBC用TT取替 A系・B系ケーブル切替試験		変更	
0470614	中部	2026/10/18 08:00	2026/10/21 18:00	連続	南福光変	500kV 中部北陸連絡母線 2L	制御・保護盤取替/中北連絡母線2L切替		変更	
0470983	中部	2026/10/18 08:00	2026/10/18 10:30	単日	南福光変	500kV 中部北陸連絡母線 2L 構内	開閉試験		変更	
0471861	中部	2026/10/19 08:00	2026/10/19 10:30	単日	中信変	275kV SVC	開閉試験		更新	
0472493	中部	2026/10/19 08:00	2026/10/25 18:00	連続	中信変	275kV SVC	SVCブロック機器点検		更新	
0471862	中部	2026/10/19 09:00	2026/10/19 11:30	単日	中信変	77kV 8 調相一括	開閉試験(8調相)		更新	
0475811	中部	2026/10/20 08:00	2026/10/20 18:00	単日	南福光変	500kV 中部北陸連絡母線 2L 構内	(北陸作業)LBC用TT取替 A系・B系ケーブル切替試験		変更	
0471810	中部	2026/11/04 07:30	2026/11/05 18:00	連続	飛騨変換所	1極 交直流変換装置	INV負荷遮断検出装置点検に伴う双極停止		更新	
0471811	中部	2026/11/04 07:30	2026/11/05 18:00	連続	飛騨変換所	2極 交直流変換装置	INV負荷遮断検出装置点検に伴う双極停止		更新	
0470665	中部	2026/11/04 08:00	2026/11/05 18:00	毎日	東部幹 2L	500kV 東部幹 2L 全線	不良がよい検出(メガー測定)	制約有	変更	
0471252	中部	2026/11/04 08:00	2026/11/04 10:30	単日	北部変	500kV 東部幹 2L 構内	開閉試験	制約有	変更	
0471476	中部	2026/11/04 08:00	2026/11/04 10:30	単日	東部変	500kV 東部幹 2L 構内	開閉試験	制約有	変更	
0475843	中部	2026/11/04 08:00	2026/11/05 15:00	毎日	東部幹 2L	500kV 東部幹 2L 全線	架線金具補修	制約有	変更	
0479406	中部	2026/11/04 18:00	2026/11/05 08:00	連続	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 線路	電圧上昇対策に伴う愛岐幹2L運用停止		新規	
0479407	中部	2026/11/05 18:00	2026/12/23 08:00	連続	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 線路	電圧上昇対策に伴う愛岐幹2L運用停止		新規	
0475786	中部	2026/11/06 08:00	2026/11/06 12:00	単日	飛騨変換所	1極 交直流変換装置	CPU基板修理(双極・500kV-A)		新規	
0475787	中部	2026/11/06 08:00	2026/11/06 12:00	単日	飛騨変換所	2極 交直流変換装置	CPU基板修理(双極・500kV-A)		新規	
0471849	中部	2026/11/20 11:00	2026/11/20 12:00	単日	飛騨変換所	1極 交直流変換装置	帰線操作に伴う双極停止		更新	
0471944	中部	2026/11/20 11:00	2026/11/20 12:00	単日	飛騨変換所	2極 交直流変換装置	帰線操作に伴う双極停止		更新	
0470473	中部	2026/11/20 13:30	2026/11/20 16:30	単日	飛騨変換所	1極 交直流変換装置	飛騨変換所定期点検(1極)に伴う系統連系試験		変更	
0471322	中部	2026/11/21 08:00	2026/11/24 18:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	東清水FC増設/2FC取込・実機結合(1FC)		更新	
0471323	中部	2026/11/21 08:00	2026/11/24 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	東清水FC増設/2FC取込・実機結合(1FC)		更新	
0471819	中部	2026/11/25 09:00	2026/11/25 10:30	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 1L 構内	開閉試験		変更	
0471826	中部	2026/11/25 09:00	2026/11/25 10:30	単日	馬瀬一水開	275kV 馬瀬北部 1L 構内	開閉試験		変更	
0471820	中部	2026/11/25 10:30	2026/11/25 12:00	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 2L 構内	開閉試験		変更	
0471827	中部	2026/11/25 10:30	2026/11/25 12:00	単日	馬瀬一水開	275kV 馬瀬北部 2L 構内	開閉試験		変更	
0471838	中部	2026/12/10 12:00	2026/12/10 14:10	単日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	高根馬瀬線No24~No32間電線張替に伴う試加圧試験		変更	
0471313	中部	2026/12/11 08:00	2026/12/14 18:00	連続	南福光変	500kV 越美幹 1L 全線	制御・保護盤取替/越美幹1L切替		変更	
0471932	中部	2026/12/11 08:00	2026/12/11 10:30	単日	岐阜開	500kV 越美幹 1L 構内	開閉試験		変更	
0471934	中部	2026/12/11 08:00	2026/12/11 10:30	単日	南福光変	500kV 越美幹 1L 構内	開閉試験		変更	
0471936	中部	2026/12/11 08:00	2026/12/11 10:30	単日	飛騨変換所	500kV 飛騨分岐 1L 構内	開閉試験		更新	
0475880	中部	2026/12/11 08:00	2026/12/11 18:00	単日	南福光変	500kV 越美幹 1L 構内	(北陸作業)LBC用TT取替 A系・B系ケーブル切替試験		変更	
0475881	中部	2026/12/11 08:00	2026/12/11 18:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 1L 構内	(北陸作業)LBC用TT取替 A系・B系ケーブル切替試験		新規	
0471314	中部	2026/12/15 08:00	2026/12/18 18:00	連続	南福光変	500kV 越美幹 2L 全線	制御・保護盤取替/越美幹2L切替		変更	
0471850	中部	2026/12/15 08:00	2026/12/15 10:30	単日	飛騨変換所	500kV 飛騨分岐 2L 構内	開閉試験		更新	
0471933	中部	2026/12/15 08:00	2026/12/15 10:30	単日	岐阜開	500kV 越美幹 2L 構内	開閉試験		変更	
0471935	中部	2026/12/15 08:00	2026/12/15 10:30	単日	南福光変	500kV 越美幹 2L 構内	開閉試験		変更	
0475882	中部	2026/12/15 08:00	2026/12/15 18:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 2L 構内	(北陸作業)LBC用TT取替 A系・B系ケーブル切替試験		新規	
0475883	中部	2026/12/15 08:00	2026/12/15 15:00	単日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	架線金具補修		新規	
0475884	中部	2026/12/15 08:00	2026/12/15 18:00	単日	南福光変	500kV 越美幹 2L 構内	(北陸作業)LBC用TT取替 A系・B系ケーブル切替試験		変更	
0471833	中部	2026/12/19 08:00	2026/12/19 18:00	単日	三重開	500kV 三重東近江 1L 構内	BP仮工事戻し		変更	
0471834	中部	2026/12/20 08:00	2026/12/20 18:00	単日	三重開	500kV 三重東近江 2L 構内	BP仮工事戻し		変更	
0471301	中部	2026/12/23 08:00	2026/12/23 18:00	単日	三重開	500kV 甲B BUS	旧盤電圧要素切離し		変更	
0471306	中部	2026/12/23 08:00	2026/12/23 18:00	単日	三重開	500kV 三岐幹 1L 構内	BP仮工事戻し		変更	
0471874	中部	2026/12/23 08:00	2026/12/23 18:00	単日	三重開	500kV 三岐幹 1L 線路	新FB BP条件取込・三岐幹1Lパレット条件切離		変更	
0471924	中部	2026/12/23 08:00	2026/12/23 10:30	単日	三重開	500kV 三岐幹 1L 構内	開閉試験		変更	
0471928	中部	2026/12/23 08:00	2026/12/23 10:30	単日	岐阜開	500kV 三岐幹 1L 構内	開閉試験		変更	
0472513	中部	2026/12/23 08:00	2026/12/23 18:00	単日	三重開	500kV 甲B BUS	新FB BP条件取込・三岐幹1Lパレット条件切離		変更	
0478279	中部	2026/12/23 18:00	2026/12/24 08:00	連続	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 線路	電圧上昇対策に伴う愛岐幹2L運用停止		新規	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0471302	中部	2026/12/24 08:00	2026/12/24 18:00	単日	三重開	500kV ZB BUS	旧盤電圧要素切離し		変更	
0471307	中部	2026/12/24 08:00	2026/12/24 18:00	単日	三重開	500kV 三岐幹 2L 構内	BP仮工事戻し		変更	
0471875	中部	2026/12/24 08:00	2026/12/24 18:00	単日	三重開	500kV 三岐幹 2L 線路	新FB BP条件取込、三岐幹2L機器バレット条件切離		変更	
0471925	中部	2026/12/24 08:00	2026/12/24 10:30	単日	三重開	500kV 三岐幹 2L 構内	開閉試験		変更	
0471929	中部	2026/12/24 08:00	2026/12/24 10:30	単日	岐阜開	500kV 三岐幹 2L 構内	開閉試験		変更	
0472514	中部	2026/12/24 08:00	2026/12/24 18:00	単日	三重開	500kV ZB BUS	新FB BP条件取込、三岐幹2L機器バレット条件切離		変更	
0478282	中部	2026/12/24 18:00	2026/12/31 23:59	連続	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 線路	電圧上昇対策に伴う愛岐幹1L運用停止		新規	
0471920	中部	2027/01/07 07:30	2027/01/07 10:00	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 2L 構内	開閉試験		変更	
0471916	中部	2027/01/07 08:00	2027/09/20 10:00	連続	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 2L 線路	【TNA-26-092】GISユニット設置(佐久間西幹山2L)ほか		変更	
0471919	中部	2027/01/07 08:00	2027/01/07 10:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 1L 構内	開閉試験		変更	
0475781	中部	2027/01/07 08:00	2027/01/07 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 2L 構内	【TNA-26-131】佐久間西幹山2LGIS化工事に伴う母線側断路器切離		新規	
0471830	中部	2027/02/01 08:00	2027/02/02 18:00	毎日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	【TNA-26-091】佐久間川根1・2LGIS化工事に伴う母線側断路器切離		変更	
0478283	中部	2027/03/01 00:00	2027/03/31 23:59	連続	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 線路	電圧上昇対策に伴う愛岐幹2L運用停止		変更	
0472349	中部	2027/03/01 08:00	2027/03/16 15:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	2FC調相用GS開放点検		更新	
0472350	中部	2027/03/01 08:00	2027/03/16 15:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	2FC調相用GS開放点検		更新	
0472517	中部	2027/03/01 08:00	2027/03/01 10:30	単日	東清水変	275kV 2 FC	開閉試験		更新	
0472518	中部	2027/03/01 08:00	2027/03/01 10:30	単日	東清水変	77kV 52 調相	開閉試験		更新	
0472519	中部	2027/03/01 08:00	2027/03/01 10:30	単日	東清水変	77kV 62 調相	開閉試験		更新	
0472520	中部	2027/03/01 08:00	2027/03/01 10:30	単日	東清水変	154kV BUS	開閉試験		更新	
0470466	中部	2027/03/03 08:00	2027/03/16 15:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	2FCサイリスタバルブ点検他(60定期点検)		更新	
0470467	中部	2027/03/03 08:00	2027/03/16 15:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	2FCサイリスタバルブ点検他(60定期点検)		更新	
0472499	中部	2027/03/03 08:00	2027/03/03 13:00	単日	東栄変	275kV 1 BANK	実負荷試験(1B)		更新	
0471921	中部	2027/03/03 11:00	2027/03/03 13:30	単日	東栄変	275kV 1 BANK	開閉試験		更新	
0478072	中部	2027/03/04 08:00	2027/03/04 18:00	単日	東栄変	275kV 1 BANK	所内回路切替		新規	
0471308	中部	2027/03/05 08:00	2027/03/05 14:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検(下期分)		更新	
0471309	中部	2027/03/05 08:00	2027/03/05 14:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検(下期分)		更新	
0471885	中部	2027/03/10 08:00	2027/03/23 15:00	連続	信濃変	275kV 1 BANK	信濃変77kV1-2ShR増設		更新	
0470468	中部	2027/03/16 13:00	2027/03/16 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	60サイリスタバルブ定期点検後の系統連系試験		更新	
0479091	中部	2027/03/25 08:00	2027/03/26 18:00	連続	北部変	275kV 2 BANK	北部変GCB020高低圧漏油修理		新規	
0479403	中部	2027/03/25 08:00	2027/03/25 18:00	単日	北部変	275kV 2 BANK	北部変400V気中遮断器取替(421)		新規	
0479404	中部	2027/03/26 08:00	2027/03/26 18:00	単日	北部変	275kV 2 BANK	北部変400V気中遮断器取替(42T)		新規	
0478327	中部	2027/04/01 00:00	2027/05/11 08:00	連続	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 線路	電圧上昇対策に伴う愛岐幹2L運用停止		新規	
0475963	中部	2027/04/01 07:00	2027/09/19 19:00	連続	佐久間西幹山 1L	275kV 佐久間西幹山 1L 全線	【TZA-27-001】建替工事 部材補強、改造工事、絶縁耐力試験等		変更	
0475964	中部	2027/04/01 07:00	2027/09/19 19:00	連続	佐久間西幹山 2L	275kV 佐久間西幹山 2L 全線	【TZA-27-001】建替工事 部材補強、改造工事、絶縁耐力試験等		変更	
0475876	中部	2027/04/01 08:00	2027/04/02 18:00	毎日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	【TNA-27-034】佐久間西幹山線1L GIS化に伴う母線側断路器切離		変更	
0475965	中部	2027/04/01 08:00	2027/09/20 10:00	連続	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 1L 線路	【TNA-27-002】佐久間西幹山線1LGIS化工事ほか		変更	
0475966	中部	2027/04/01 08:00	2027/09/20 10:00	連続	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 2L 線路	【TNA-27-002】佐久間西幹山線1LGIS化工事ほか		変更	
0475971	中部	2027/04/01 08:00	2027/04/02 18:00	毎日	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 1L 構内	【TNA-27-034】佐久間西幹山線1L GIS化に伴う母線側断路器切離		変更	
0475887	中部	2027/04/05 08:00	2027/04/09 22:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	1FC 60Hz側片端系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0475888	中部	2027/04/05 08:00	2027/04/09 22:00	毎日	東清水変	77kV 62 調相	1FC 60Hz側片端系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0475889	中部	2027/04/05 08:00	2027/04/09 22:00	毎日	東清水変	77kV 52 調相	1FC 60Hz側片端系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0475927	中部	2027/04/16 00:00	2027/04/17 23:59	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保		新規	
0475958	中部	2027/04/16 07:00	2027/04/22 19:00	連続	信濃変	275kV 2 BANK	2BTブロック機器点検		新規	
0475977	中部	2027/04/16 07:00	2027/04/16 19:00	単日	豊根開	500kV 甲B BUS	甲5062・LE5062電装品取替		新規	
0475991	中部	2027/04/16 07:00	2027/04/16 09:30	単日	信濃変	275kV 2 BANK	開閉試験		新規	
0475970	中部	2027/04/16 08:00	2027/04/17 18:00	毎日	信濃幹 2L	500kV 信濃幹 2L 全線	不良がはいし検出(メガー測定)		新規	
0475987	中部	2027/04/16 08:00	2027/04/16 10:30	単日	南信変	500kV 信濃幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0475989	中部	2027/04/16 08:00	2027/04/16 10:30	単日	信濃変	500kV 信濃幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0475978	中部	2027/04/17 07:00	2027/04/17 19:00	単日	豊根開	500kV ZB BUS	Z5062電装品取替		新規	
0475982	中部	2027/04/17 08:00	2027/04/17 10:30	単日	南信変	500kV 甲AB BUS SECT	開閉試験		新規	
0475983	中部	2027/04/17 08:00	2027/04/17 10:30	単日	南信変	500kV ZAB BUS SECT	開閉試験		新規	
0475890	中部	2027/04/19 08:00	2027/04/23 22:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	3FC 60Hz側片端系統連系試験に伴う2FC停止		変更	
0475891	中部	2027/04/19 08:00	2027/04/23 22:00	毎日	東清水変	77kV 62 調相	3FC 60Hz側片端系統連系試験に伴う2FC停止		変更	
0475892	中部	2027/04/19 08:00	2027/04/23 22:00	毎日	東清水変	77kV 52 調相	3FC 60Hz側片端系統連系試験に伴う2FC停止		更新	
0475916	中部	2027/04/21 08:00	2027/04/21 14:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検(上期分)		変更	
0475932	中部	2027/04/21 08:00	2027/04/21 14:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検(上期分)		変更	
0475990	中部	2027/04/22 17:00	2027/04/22 19:30	単日	信濃変	275kV 1 BANK	開閉試験		新規	
0475992	中部	2027/04/22 17:30	2027/04/22 20:00	単日	信濃変	275kV 3 BANK	開閉試験		新規	
0475928	中部	2027/04/24 00:00	2027/05/02 23:59	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保		新規	
0475946	中部	2027/04/24 07:00	2027/04/28 18:00	連続	信濃変	500kV 信濃幹 1L 全線	5022ブロック機器点検(信濃幹1L)		新規	
0475950	中部	2027/04/24 07:00	2027/04/24 19:00	単日	豊根開	500kV 甲B BUS	甲・L・E5064電装品取替、CB5064電装品取替		新規	
0475952	中部	2027/04/24 07:00	2027/04/26 19:00	連続	南信変	500kV 南信幹 2L 全線	GCB5034作動油交換		新規	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0475985	中部	2027/04/24 07:00	2027/04/24 09:30	単日	南信変	500kV 南信幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0475986	中部	2027/04/24 07:00	2027/04/24 09:30	単日	南信変	500kV 信濃幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0475988	中部	2027/04/24 07:00	2027/04/24 09:30	単日	信濃変	500kV 信濃幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0475997	中部	2027/04/24 07:00	2027/04/25 18:00	毎日	信濃幹 1L	500kV 信濃幹 1L 全線	信濃幹線架空地線補修他		新規	
0476000	中部	2027/04/24 07:00	2027/04/26 18:00	毎日	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 全線	碍子他補修		新規	
0476017	中部	2027/04/24 07:00	2027/04/24 09:30	単日	豊根開	500kV 南信幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0475969	中部	2027/04/24 08:00	2027/04/25 18:00	毎日	信濃幹 1L	500kV 信濃幹 1L 全線	不良がいし検出(メガー測定)		新規	
0475951	中部	2027/04/25 07:00	2027/04/25 19:00	単日	豊根開	500kV 乙B BUS	乙5064電装品取替		新規	
0475998	中部	2027/04/25 07:00	2027/04/26 18:00	毎日	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 全線	南信幹線架空地線補修他		新規	
0475960	中部	2027/04/29 07:00	2027/04/29 19:00	単日	中信変	275kV 信濃中信 2L 全線	068ブロック機器点検(CB、甲L-LS)		新規	
0475968	中部	2027/04/29 07:00	2027/04/30 19:00	連続	中信変	275kV 信濃中信 2L 構内	068ブロック機器点検(CB、甲L-LS)		新規	
0475995	中部	2027/04/29 07:00	2027/04/29 09:30	単日	信濃変	275kV 信濃中信 2L 構内	開閉試験		新規	
0479343	中部	2027/04/29 07:00	2027/04/29 09:30	単日	中信変	275kV 信濃中信 2L 構内	開閉試験		新規	
0476005	中部	2027/04/29 09:00	2027/04/29 11:30	単日	信濃変	500kV BUS TIE	開閉試験		新規	
0475993	中部	2027/04/29 09:30	2027/04/29 12:00	単日	信濃変	275kV BUS TIE	開閉試験	制約有	変更	
0476010	中部	2027/04/30 08:00	2027/04/30 18:00	単日	信濃中信 2L	275kV 信濃中信 2L 全線	架線金具補修		新規	
0475961	中部	2027/05/01 07:00	2027/05/02 19:00	連続	中信変	275kV 信濃中信 1L 構内	066ブロック機器点検(CB、甲L-LS)		新規	
0475962	中部	2027/05/01 07:00	2027/05/01 19:00	単日	中信変	275kV 信濃中信 1L 全線	066ブロック機器点検(CB、甲L-LS)		新規	
0475994	中部	2027/05/01 07:00	2027/05/01 09:30	単日	信濃変	275kV 信濃中信 1L 構内	開閉試験		新規	
0479342	中部	2027/05/01 07:00	2027/05/01 09:30	単日	中信変	275kV 信濃中信 1L 構内	開閉試験		新規	
0476011	中部	2027/05/01 08:00	2027/05/01 18:00	単日	信濃中信 1L	275kV 信濃中信 1L 全線	架線金具補修		新規	
0475929	中部	2027/05/08 00:00	2027/05/10 23:59	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保		新規	
0475984	中部	2027/05/08 07:00	2027/05/08 09:30	単日	南信変	500kV 南信幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0475999	中部	2027/05/08 07:00	2027/05/10 18:00	毎日	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 全線	碍子他補修		新規	
0476016	中部	2027/05/08 07:00	2027/05/08 09:30	単日	豊根開	500kV 南信幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0475910	中部	2027/05/11 07:00	2027/06/30 14:00	連続	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	高根馬瀬線No24—No32間電線張替		新規	
0475935	中部	2027/05/11 07:00	2027/05/11 09:30	単日	馬瀬一水開	275kV 高根馬瀬 1L 構内	開閉試験		新規	
0475937	中部	2027/05/11 07:00	2027/05/11 09:30	単日	高根一水開	275kV 高根馬瀬 1L 構内	開閉試験		新規	
0475920	中部	2027/05/11 08:00	2027/05/12 18:00	毎日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	架線金具補修他		新規	
0475941	中部	2027/05/11 09:00	2027/05/11 10:30	単日	馬瀬一水開	275kV 馬瀬北部 1L 構内	開閉試験		変更	
0475943	中部	2027/05/11 09:00	2027/05/11 10:30	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 1L 構内	開閉試験		変更	
0475940	中部	2027/05/11 10:30	2027/05/11 12:00	単日	馬瀬一水開	275kV 馬瀬北部 2L 構内	開閉試験		変更	
0475944	中部	2027/05/11 10:30	2027/05/11 12:00	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 2L 構内	開閉試験		変更	
0475921	中部	2027/05/15 08:00	2027/05/16 18:00	連続	高根一水開	275kV 乙 BUS	高一水開LS操作箱取替／101、B022		新規	
0476008	中部	2027/05/15 08:00	2027/05/16 18:00	連続	高根一水開	275kV 高根中信 1L 構内	高一水開LS操作箱取替／101、B022		新規	
0476451	中部	2027/05/15 08:00	2027/05/16 18:00	連続	高根一水開	275kV BUS TIE	高一水開LS操作箱取替／101、B022		変更	
0476569	中部	2027/05/15 08:00	2027/05/15 10:30	単日	高根一水開	275kV BUS TIE	開閉試験		変更	
0479338	中部	2027/05/15 08:00	2027/05/15 10:30	単日	高根一水開	275kV 高根中信 1L 構内	開閉試験		新規	
0475945	中部	2027/05/18 09:00	2027/05/19 18:00	毎日	東栄変	275kV 新豊根東栄線 線路	新豊根東栄線PCM対向試験、幹線遮断検出装置取込		新規	
0475996	中部	2027/05/18 09:00	2027/05/18 18:00	単日	東栄変	275kV 1 BANK	幹線遮断検出装置取込		新規	
0476020	中部	2027/05/18 09:00	2027/05/18 11:30	単日	東栄変	275kV 新豊根東栄線 構内	開閉試験		新規	
0476023	中部	2027/05/18 09:00	2027/05/18 11:30	単日	東栄変	275kV 1 BANK	開閉試験		新規	
0476648	中部	2027/05/20 18:00	2027/05/20 19:30	単日	岐阜開	500kV 愛岐幹 2L 構内	開閉試験		変更	
0478328	中部	2027/05/20 18:00	2027/05/31 07:00	連続	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 線路	電圧上昇対策に伴う愛岐幹2L運用停止		新規	
0478333	中部	2027/05/20 18:00	2027/05/20 19:30	単日	愛知変	500kV 愛岐幹 2L 構内	開閉試験		変更	
0475976	中部	2027/05/24 07:00	2027/05/25 18:00	毎日	高根中信 2L	275kV 高根中信 2L 全線	高根中信線防錆塗装		新規	
0479339	中部	2027/05/24 07:00	2027/05/24 09:30	単日	高根一水開	275kV 高根中信 2L 構内	開閉試験		新規	
0479341	中部	2027/05/24 07:00	2027/05/24 09:30	単日	中信変	275kV 高根中信 2L 構内	開閉試験		新規	
0475980	中部	2027/05/25 07:00	2027/05/25 09:30	単日	北部変	275kV 3 BANK	開閉試験		新規	
0475947	中部	2027/05/25 08:00	2027/05/28 18:00	連続	北部変	275kV 3 BANK	3B関係機器点検(T730箱細・電装、GCB730普・電装)		新規	
0475979	中部	2027/05/28 16:00	2027/05/28 18:30	単日	北部変	275kV 2 BANK	開閉試験		新規	
0475981	中部	2027/05/28 16:30	2027/05/28 19:00	単日	北部変	275kV 4 BANK	開閉試験		新規	
0476556	中部	2027/05/31 07:00	2027/06/04 18:00	毎日	北部変	500kV 岐阜連絡 1L 全線	Bプスタイ GCS改造		新規	
0476570	中部	2027/05/31 07:00	2027/05/31 09:30	単日	岐阜開	500kV 岐阜連絡 1L 構内	開閉試験		変更	
0478618	中部	2027/05/31 07:00	2027/05/31 09:30	単日	北部変	500kV 岐阜連絡 1L 構内	開閉試験		新規	
0476560	中部	2027/05/31 08:00	2027/05/31 18:00	単日	岐阜連絡 1L	500kV 岐阜連絡 1L 全線	架線金具補修		新規	
0476647	中部	2027/06/04 18:00	2027/06/04 19:30	単日	岐阜開	500kV 愛岐幹 1L 構内	開閉試験		変更	
0478329	中部	2027/06/04 18:00	2027/06/06 07:00	連続	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 線路	電圧上昇対策に伴う愛岐幹1L運用停止		新規	
0478332	中部	2027/06/04 18:00	2027/06/04 19:30	単日	愛知変	500kV 愛岐幹 1L 構内	開閉試験		変更	
0476557	中部	2027/06/06 07:00	2027/06/11 18:00	毎日	北部変	500kV 岐阜連絡 1L 全線	Bプスタイ GCS改造		新規	
0479033	中部	2027/06/07 07:00	2027/06/18 18:00	連続	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	架空地線張替		新規	
0475959	中部	2027/06/08 07:00	2027/06/10 19:00	連続	中信変	275kV SVC	SVCブロック機器点検		新規	
0479344	中部	2027/06/08 07:00	2027/06/08 09:30	単日	中信変	275kV SVC	開閉試験		新規	
0478330	中部	2027/06/11 18:00	2027/06/29 13:00	連続	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 線路	電圧上昇対策に伴う愛岐幹1L運用停止		新規	
0475922	中部	2027/06/12 08:00	2027/06/13 18:00	連続	高根一水開	275kV 高根馬瀬 2L 構内	高一水開LS操作箱取替／B012、B014		新規	
0475923	中部	2027/06/12 08:00	2027/06/13 18:00	連続	高根一水開	275kV 乙 BUS	高一水開LS操作箱取替／B012、B014		新規	
0475933	中部	2027/06/12 08:00	2027/06/13 18:00	連続	高根一水開	275kV 高根馬瀬 1L 構内	高一水開LS操作箱取替／B012、B014		新規	
0475924	中部	2027/06/15 08:00	2027/06/16 18:00	連続	高根一水開	275kV 高根馬瀬 1L 線路	高一水開LS操作箱取替／L・E012		新規	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0475911	中部	2027/06/19 08:00	2027/06/19 10:30	単日	飛驒変換所	154kV 1 BANK	開閉試験		新規	
0475912	中部	2027/06/19 08:00	2027/06/19 10:30	単日	飛驒変換所	1極 交直流変換装置	開閉試験		新規	
0476031	中部	2027/06/29 12:00	2027/06/29 15:00	単日	北部変	500kV 西部幹 2L 全線	Bプスタイ GCS改造 試加圧試験		新規	
0476032	中部	2027/06/29 13:00	2027/06/29 18:00	単日	北部変	500kV 西部幹 2L 全線	Bプスタイ GCS改造 実負荷測定		新規	
0478331	中部	2027/06/29 18:00	2027/06/30 23:59	連続	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 線路	電圧上昇対策に伴う愛岐幹 1L運用停止		新規	
0476559	中部	2027/06/30 08:00	2027/06/30 15:00	単日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	がいし絶縁抵抗測定		新規	
0476567	中部	2027/06/30 08:00	2027/06/30 10:30	単日	岐阜開	500kV 越美幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0476605	中部	2027/06/30 08:00	2027/06/30 10:30	単日	南福光変	500kV 越美幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0476677	中部	2027/06/30 08:00	2027/06/30 10:30	単日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L 構内	開閉試験		新規	
0475901	中部	2027/06/30 12:00	2027/06/30 14:10	単日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	高根馬瀬線No24ーNo32間電線張替に伴う試加圧試験		変更	
0475906	中部	2027/07/01 07:00	2027/07/04 18:00	毎日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	高根馬瀬線No24ーNo32間電線張替に伴う鉄塔改造		変更	
0479031	中部	2027/07/01 07:00	2027/07/04 18:00	毎日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	架空地線張替		新規	
0475907	中部	2027/07/07 07:00	2027/07/09 18:00	毎日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	高根馬瀬線No24ーNo32間電線張替に伴う鉄塔改造		変更	
0476014	中部	2027/08/03 08:00	2027/08/03 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 1L 全線	【TZB-27-028.29】FC転送ブロック制御用ケーブル接続		新規	
0476015	中部	2027/08/03 08:00	2027/08/03 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 2L 全線	【TZB-27-028.29】FC転送ブロック制御用ケーブル接続		新規	
0478288	中部	2027/09/01 00:00	2027/09/11 08:00	連続	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 線路	電圧上昇対策に伴う愛岐幹 2L運用停止		変更	
0475908	中部	2027/09/03 07:00	2027/09/05 18:00	毎日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	高根馬瀬線No24ーNo32間電線張替に伴う鉄塔改造		変更	
0475917	中部	2027/09/03 08:00	2027/09/05 18:00	毎日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	架線金具補修他		新規	
0475919	中部	2027/09/03 08:00	2027/09/05 18:00	毎日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	鉄塔塗装		新規	
0475909	中部	2027/09/08 07:00	2027/09/12 18:00	毎日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	高根馬瀬線No24ーNo32間電線張替に伴う鉄塔改造		変更	
0479032	中部	2027/09/08 07:00	2027/09/11 18:00	毎日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	架空地線張替		新規	
0475918	中部	2027/09/08 08:00	2027/09/10 18:00	毎日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	架線金具補修他		新規	
0475939	中部	2027/09/08 08:00	2027/09/08 18:00	単日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	鉄塔塗装		新規	
0475878	中部	2027/09/10 07:00	2027/09/17 18:00	連続	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS 全線	【TZB-27-031】FC連絡線60Hz直列機器VT回路切替		変更	
0475974	中部	2027/09/10 07:00	2027/09/19 19:00	連続	新豊根東栄線	275kV 新豊根東栄線 全線	【TZA-27-002】既設ジャンパー撤去、新設ジャンパー取付		新規	
0475879	中部	2027/09/10 08:00	2027/09/10 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	【TNA-27-128】FL撤去		変更	
0475972	中部	2027/09/10 08:00	2027/09/18 19:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 線路	【TNA-27-032】新豊根東栄線 保護継電装置2系列化改造工事		新規	
0475973	中部	2027/09/10 08:00	2027/09/20 17:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 構内	【TNA-27-012】新豊根佐久間60Hz線構内保護継電装置更新工事ほか		新規	
0478600	中部	2027/09/10 08:00	2027/09/10 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	【TNA-27-129】新豊根佐久間60Hz線GIS化に伴う母線側断路器切離		変更	
0475903	中部	2027/09/13 07:00	2027/09/13 14:00	単日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	高根馬瀬線No24ーNo32間電線張替に伴うジャンパーオフ		変更	
0475936	中部	2027/09/13 07:00	2027/09/13 09:30	単日	馬瀬一水開	275kV 高根馬瀬 2L 構内	開閉試験		新規	
0475942	中部	2027/09/13 07:00	2027/09/13 09:30	単日	高根一水開	275kV 高根馬瀬 2L 構内	開閉試験		新規	
0475902	中部	2027/09/13 12:00	2027/12/10 09:00	連続	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 区間停止	高根馬瀬線No24ーNo32間電線張替		新規	
0475925	中部	2027/09/14 08:00	2027/09/15 18:00	連続	高根一水開	275kV 高根馬瀬 2L 線路	高一水開LS操作箱取替／L・E014		新規	
0475938	中部	2027/09/14 08:00	2027/09/15 18:00	毎日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 区間停止	架線金具補修他		新規	
0476009	中部	2027/09/14 08:00	2027/09/15 18:00	連続	東栄変	275kV 新豊根東栄線 FL盤取込	新豊根東栄線FL盤取込		新規	
0475893	中部	2027/09/17 08:00	2027/09/17 22:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		変更	
0475894	中部	2027/09/17 08:00	2027/09/17 22:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		変更	
0475895	中部	2027/09/17 08:00	2027/09/17 22:00	単日	東清水変	77kV 52 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		変更	
0475872	中部	2027/09/20 12:00	2027/09/21 18:00	連続	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	【TNA-27-019】佐久間西幹山線1・2LGIS化工事に伴う試験使用		新規	
0475967	中部	2027/09/20 12:00	2027/09/21 18:00	連続	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 1L	【TNA-27-019】佐久間西幹山線1・2LGIS化工事に伴う試験使用		新規	
0477473	中部	2027/09/21 08:00	2027/09/22 22:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		変更	
0477494	中部	2027/09/21 08:00	2027/09/22 22:00	毎日	東清水変	77kV 62 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		変更	
0477499	中部	2027/09/21 08:00	2027/09/22 22:00	毎日	東清水変	77kV 52 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		変更	
0478179	中部	2027/09/21 08:00	2027/09/21 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	【TNA-27-022】佐久間川根線2LGIS化工事に伴う確認試験		新規	
0478051	中部	2027/09/24 08:00	2027/09/24 22:00	単日	東清水変	77kV 52 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0478070	中部	2027/09/24 08:00	2027/09/24 22:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0478071	中部	2027/09/24 08:00	2027/09/24 22:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0477470	中部	2027/09/27 08:00	2027/10/01 22:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		変更	
0477471	中部	2027/09/27 08:00	2027/10/01 22:00	毎日	東清水変	77kV 62 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		変更	
0477472	中部	2027/09/27 08:00	2027/10/01 22:00	毎日	東清水変	77kV 52 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		変更	
0478180	中部	2027/09/27 08:00	2027/09/27 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	【TNA-27-021】佐久間川根線1LGIS化工事に伴う確認試験		新規	
0475975	中部	2027/10/04 07:00	2027/10/05 18:00	毎日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	高根中信線防錆塗装		新規	
0479340	中部	2027/10/04 07:00	2027/10/04 09:30	単日	中信変	275kV 高根中信 1L 構内	開閉試験		新規	
0476004	中部	2027/10/04 08:00	2027/10/05 18:00	毎日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	架線金具補修		新規	
0476006	中部	2027/10/04 08:00	2027/10/08 18:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 構内	【TNA-27-041】新豊根佐久間60Hz線保護Ry移設に伴うケーブル切離		新規	
0477474	中部	2027/10/04 08:00	2027/10/08 22:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0477475	中部	2027/10/04 08:00	2027/10/08 22:00	毎日	東清水変	77kV 62 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0477500	中部	2027/10/04 08:00	2027/10/08 22:00	毎日	東清水変	77kV 52 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0477476	中部	2027/10/12 08:00	2027/10/15 22:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		変更	
0477477	中部	2027/10/12 08:00	2027/10/15 22:00	毎日	東清水変	77kV 62 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		変更	
0477478	中部	2027/10/12 08:00	2027/10/15 22:00	毎日	東清水変	77kV 52 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0477479	中部	2027/10/18 08:00	2027/10/22 22:00	毎日	東清水変	77kV 62 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0477480	中部	2027/10/18 08:00	2027/10/22 22:00	毎日	東清水変	77kV 52 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0477513	中部	2027/10/18 08:00	2027/10/22 22:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0475913	中部	2027/10/20 07:00	2027/10/20 09:30	単日	飛騨変換所	154kV 2 BANK	開閉試験		変更	
0475914	中部	2027/10/20 07:00	2027/10/20 09:30	単日	飛騨変換所	2極 交流変換装置	開閉試験		変更	
0477481	中部	2027/10/25 08:00	2027/10/29 22:00	毎日	東清水変	77kV 52 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0477514	中部	2027/10/25 08:00	2027/10/29 22:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0477515	中部	2027/10/25 08:00	2027/10/29 22:00	毎日	東清水変	77kV 62 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0476007	中部	2027/10/29 08:00	2027/11/02 18:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 構内	【TNA-27-131】新豊根佐久間60Hz線保護Ry移設に伴うケーブル接続		変更	
0477482	中部	2027/11/01 08:00	2027/11/02 22:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		変更	
0477483	中部	2027/11/01 08:00	2027/11/02 22:00	毎日	東清水変	77kV 62 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		変更	
0477516	中部	2027/11/01 08:00	2027/11/02 22:00	毎日	東清水変	77kV 52 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		変更	
0478052	中部	2027/11/04 08:00	2027/11/05 22:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0478053	中部	2027/11/04 08:00	2027/11/05 22:00	毎日	東清水変	77kV 62 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0478069	中部	2027/11/04 08:00	2027/11/05 22:00	毎日	東清水変	77kV 52 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0477484	中部	2027/11/08 08:00	2027/11/12 22:00	毎日	東清水変	77kV 52 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0477517	中部	2027/11/08 08:00	2027/11/12 22:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0477518	中部	2027/11/08 08:00	2027/11/12 22:00	毎日	東清水変	77kV 62 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0475875	中部	2027/11/11 08:00	2027/11/11 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 60Hz BUS	【TNA-27-023】新豊根佐久間60Hz線GIS化工事に伴う潮流測定		変更	
0477485	中部	2027/11/15 08:00	2027/11/19 22:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0477486	中部	2027/11/15 08:00	2027/11/19 22:00	毎日	東清水変	77kV 62 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0477487	中部	2027/11/15 08:00	2027/11/19 22:00	毎日	東清水変	77kV 52 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0477488	中部	2027/11/22 08:00	2027/11/22 22:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		変更	
0477489	中部	2027/11/22 08:00	2027/11/22 22:00	単日	東清水変	77kV 52 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		変更	
0477519	中部	2027/11/22 08:00	2027/11/22 22:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		変更	
0478054	中部	2027/11/24 08:00	2027/11/26 22:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0478055	中部	2027/11/24 08:00	2027/11/26 22:00	毎日	東清水変	77kV 62 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0478056	中部	2027/11/24 08:00	2027/11/26 22:00	毎日	東清水変	77kV 52 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0477490	中部	2027/11/29 08:00	2027/12/03 22:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0477491	中部	2027/11/29 08:00	2027/12/03 22:00	毎日	東清水変	77kV 62 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0477492	中部	2027/11/29 08:00	2027/12/03 22:00	毎日	東清水変	77kV 52 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0477493	中部	2027/12/06 08:00	2027/12/10 22:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0477495	中部	2027/12/06 08:00	2027/12/10 22:00	毎日	東清水変	77kV 62 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0477496	中部	2027/12/06 08:00	2027/12/10 22:00	毎日	東清水変	77kV 52 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0478287	中部	2027/12/09 18:00	2027/12/31 23:59	連続	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 線路	電圧上昇対策に伴う愛岐幹 1L 運用停止		新規	
0475904	中部	2027/12/10 07:00	2027/12/10 14:00	単日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	高根馬瀬線No24—No32間電線張替に伴うジャンパイン		変更	
0476558	中部	2027/12/10 08:00	2027/12/12 15:00	毎日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	がいし絶縁抵抗測定		新規	
0476568	中部	2027/12/10 08:00	2027/12/10 10:30	単日	南福光変	500kV 越美幹 1L 構内	開閉試験		変更	
0476571	中部	2027/12/10 08:00	2027/12/10 10:30	単日	岐阜開	500kV 越美幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0476676	中部	2027/12/10 08:00	2027/12/10 10:30	単日	飛騨変換所	500kV 飛騨分岐 1L 構内	開閉試験		新規	
0475905	中部	2027/12/10 12:00	2027/12/10 14:10	単日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	高根馬瀬線No24—No32間電線張替に伴う試加圧試験		変更	
0477497	中部	2027/12/13 08:00	2027/12/17 22:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0477498	中部	2027/12/13 08:00	2027/12/17 22:00	毎日	東清水変	77kV 62 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0477501	中部	2027/12/13 08:00	2027/12/17 22:00	毎日	東清水変	77kV 52 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0477502	中部	2027/12/20 08:00	2027/12/24 22:00	毎日	東清水変	77kV 52 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0477520	中部	2027/12/20 08:00	2027/12/24 22:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0477521	中部	2027/12/20 08:00	2027/12/24 22:00	毎日	東清水変	77kV 62 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0478057	中部	2027/12/27 08:00	2027/12/28 22:00	毎日	東清水変	77kV 52 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0478067	中部	2027/12/27 08:00	2027/12/28 22:00	毎日	東清水変	77kV 62 調相	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0478068	中部	2027/12/27 08:00	2027/12/28 22:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	1FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0475930	中部	2028/01/04 08:00	2028/01/07 22:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	1. 3FC系統連系試験に伴う2FC停止		変更	
0475931	中部	2028/01/04 08:00	2028/01/07 22:00	毎日	東清水変	77kV 62 調相	1. 3FC系統連系試験に伴う2FC停止		変更	
0476659	中部	2028/01/04 08:00	2028/01/07 22:00	毎日	東清水変	77kV 52 調相	1. 3FC系統連系試験に伴う2FC停止		変更	
0477503	中部	2028/01/11 08:00	2028/01/14 22:00	毎日	東清水変	77kV 52 調相	3FC系統連系試験に伴う2FC停止		変更	
0477522	中部	2028/01/11 08:00	2028/01/14 22:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	3FC系統連系試験に伴う2FC停止		変更	
0477523	中部	2028/01/11 08:00	2028/01/14 22:00	毎日	東清水変	77kV 62 調相	3FC系統連系試験に伴う2FC停止		更新	
0477504	中部	2028/01/17 08:00	2028/01/21 22:00	毎日	東清水変	77kV 52 調相	3FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0477524	中部	2028/01/17 08:00	2028/01/21 22:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	3FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0477525	中部	2028/01/17 08:00	2028/01/21 22:00	毎日	東清水変	77kV 62 調相	3FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0475948	中部	2028/01/18 07:00	2028/01/18 19:00	単日	岐阜開	500kV 岐阜連絡 1L 全線	5042関係機器点検(CB5042A点、欠相、甲5042箱)		新規	
0475949	中部	2028/01/19 08:00	2028/01/20 18:00	連続	岐阜開	500kV 岐阜連絡 2L 全線	5044関係機器点検(CB5044A点、アキュムレータ交換)		新規	
0476649	中部	2028/01/19 08:00	2028/01/19 10:30	単日	岐阜開	500kV 岐阜連絡 2L 構内	開閉試験		変更	
0478619	中部	2028/01/19 08:00	2028/01/19 10:30	単日	北部変	500kV 岐阜連絡 2L 構内	開閉試験		新規	
0477505	中部	2028/01/24 08:00	2028/01/28 22:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	3FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0477506	中部	2028/01/24 08:00	2028/01/28 22:00	毎日	東清水変	77kV 62 調相	3FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0477507	中部	2028/01/24 08:00	2028/01/28 22:00	毎日	東清水変	77kV 52 調相	3FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0477508	中部	2028/01/31 08:00	2028/02/04 22:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	3FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0477509	中部	2028/01/31 08:00	2028/02/04 22:00	毎日	東清水変	77kV 62 調相	3FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0477526	中部	2028/01/31 08:00	2028/02/04 22:00	毎日	東清水変	77kV 52 調相	3FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0475899	中部	2028/02/01 08:00	2028/02/01 14:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検(下期分)		新規	
0475900	中部	2028/02/01 08:00	2028/02/01 14:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検(下期分)		新規	
0477510	中部	2028/02/07 08:00	2028/02/10 22:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	3FC系統連系試験に伴う2FC停止		変更	
0477511	中部	2028/02/07 08:00	2028/02/10 22:00	毎日	東清水変	77kV 62 調相	3FC系統連系試験に伴う2FC停止		変更	
0477512	中部	2028/02/07 08:00	2028/02/10 22:00	毎日	東清水変	77kV 52 調相	3FC系統連系試験に伴う2FC停止		変更	
0478060	中部	2028/02/14 08:00	2028/02/17 22:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	3FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0478061	中部	2028/02/14 08:00	2028/02/17 22:00	毎日	東清水変	77kV 62 調相	3FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0478065	中部	2028/02/14 08:00	2028/02/17 22:00	毎日	東清水変	77kV 52 調相	3FC系統連系試験に伴う2FC停止		新規	
0476664	中部	2028/02/18 08:00	2028/02/18 22:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	1FC・3FC系統連系試験(2FC組合せ含む)		変更	
0476665	中部	2028/02/18 08:00	2028/02/18 22:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	1FC・3FC系統連系試験(2FC組合せ含む)		変更	
0476668	中部	2028/02/18 08:00	2028/02/18 22:00	単日	東清水変	77kV 52 調相	1FC・3FC系統連系試験(2FC組合せ含む)		変更	
0476667	中部	2028/02/21 08:00	2028/02/22 22:00	毎日	東清水変	77kV 52 調相	1FC・3FC系統連系試験(2FC組合せ含む)		変更	
0476669	中部	2028/02/21 08:00	2028/02/22 22:00	毎日	東清水変	77kV 62 調相	1FC・3FC系統連系試験(2FC組合せ含む)		変更	
0476672	中部	2028/02/21 08:00	2028/02/22 22:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	1FC・3FC系統連系試験(2FC組合せ含む)		変更	
0478058	中部	2028/02/24 08:00	2028/02/25 22:00	毎日	東清水変	77kV 62 調相	1FC・3FC系統連系試験(2FC組合せ含む)		新規	
0478059	中部	2028/02/24 08:00	2028/02/25 22:00	毎日	東清水変	77kV 52 調相	1FC・3FC系統連系試験(2FC組合せ含む)		新規	
0478066	中部	2028/02/24 08:00	2028/02/25 22:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	1FC・3FC系統連系試験(2FC組合せ含む)		新規	
0476670	中部	2028/02/28 08:00	2028/02/29 22:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	1FC・3FC系統連系試験(2FC組合せ含む)		新規	
0476671	中部	2028/02/28 08:00	2028/02/29 22:00	毎日	東清水変	77kV 62 調相	1FC・3FC系統連系試験(2FC組合せ含む)		新規	
0476673	中部	2028/02/28 08:00	2028/02/29 22:00	毎日	東清水変	77kV 52 調相	1FC・3FC系統連系試験(2FC組合せ含む)		新規	
0478286	中部	2028/03/01 00:00	2028/03/26 07:00	連続	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 線路	電圧上昇対策に伴う愛岐幹2L運用停止		変更	
0478062	中部	2028/03/01 08:00	2028/03/04 22:00	毎日	東清水変	77kV 62 調相	1. 3FC系統連系試験(BS)に伴う2FC停止		新規	
0478063	中部	2028/03/01 08:00	2028/03/04 22:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	1. 3FC系統連系試験(BS)に伴う2FC停止		新規	
0478064	中部	2028/03/01 08:00	2028/03/04 22:00	毎日	東清水変	77kV 52 調相	1. 3FC系統連系試験(BS)に伴う2FC停止		新規	
0476021	中部	2028/03/05 09:00	2028/03/05 10:30	単日	三重開	500kV 三重東近江 1L 構内	開閉試験		変更	
0476022	中部	2028/03/05 10:30	2028/03/05 12:00	単日	三重開	500kV 三重東近江 2L 構内	開閉試験		変更	
0476001	中部	2028/03/13 08:00	2028/03/16 18:00	連続	東米変	275kV 1 BANK	新1-2ShR(既設2-1ShR)切替に伴う諸試験		新規	
0476002	中部	2028/03/16 16:00	2028/03/16 18:30	単日	東米変	275kV 1 BANK	新1-2ShR(既設2-1ShR)試加圧		新規	
0476003	中部	2028/03/16 16:30	2028/03/16 19:00	単日	東米変	275kV 1 BANK	新1-2ShR(既設2-1ShR)実負荷潮流		新規	
0478084	中部	2028/03/22 08:00	2028/03/24 22:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	法定使用前自主検査に伴う2FC フローティング		新規	
0478085	中部	2028/03/22 08:00	2028/03/24 22:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	法定使用前自主検査に伴う2FC フローティング		新規	
0476654	中部	2028/03/26 07:00	2028/03/26 08:30	単日	北部変	500kV 東部幹 1L 構内	開閉試験	制約有	変更	
0476655	中部	2028/03/26 07:00	2028/03/26 08:30	単日	東部変	500kV 東部幹 1L 構内	開閉試験	制約有	変更	
0476656	中部	2028/03/26 08:30	2028/03/26 10:00	単日	北部変	500kV 東部幹 2L 構内	開閉試験	制約有	変更	
0476657	中部	2028/03/26 08:30	2028/03/26 10:00	単日	東部変	500kV 東部幹 2L 構内	開閉試験	制約有	変更	
0476360	中部	2028/03/26 10:00	2028/03/26 11:30	単日	南福光変	500kV 中部北陸連絡母線 1L 構内	開閉試験		変更	
0476361	中部	2028/03/26 11:30	2028/03/26 13:00	単日	南福光変	500kV 中部北陸連絡母線 2L 構内	開閉試験		変更	
0478285	中部	2028/03/26 13:00	2028/03/31 23:59	連続	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 線路	電圧上昇対策に伴う愛岐幹2L運用停止		変更	
0478082	中部	2028/03/27 08:00	2028/03/29 22:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	法定使用前自主検査に伴う2FC フローティング		新規	
0478083	中部	2028/03/27 08:00	2028/03/29 22:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	法定使用前自主検査に伴う2FC フローティング		新規	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0516101	北陸	2026/04/01 07:00	2026/04/03 19:00	連続	越前変電所	越前線1L/越前線1L構内(越前)	越前線1LGIS(CB077) 開閉・点検・各種手入6年・操作機構分点12年		更新	
0513986	北陸	2026/04/01 08:00	2026/04/03 18:00	毎日	送電線	越前線1L	防錆塗装(No.20.25.27.28)		更新	
0516102	北陸	2026/04/02 07:00	2026/04/02 19:00	単日	越前変電所	越前線1L構内(越前)/越前275丙母線	越前線1LGIS(LS51) 開閉・点検・各種手入6年		更新	
0516103	北陸	2026/04/03 07:00	2026/04/03 19:00	単日	越前変電所	越前線1L構内(越前)/越前275丁母線	越前線1LGIS(LS52) 開閉・点検・各種手入6年		更新	
0516104	北陸	2026/04/04 07:00	2026/04/06 19:00	連続	越前変電所	越前線2L/越前線2L構内(越前)	越前線2LGIS(CB078) 開閉・点検・各種手入6年・操作機構分点12年		更新	
0513987	北陸	2026/04/04 08:00	2026/04/06 18:00	毎日	送電線	越前線2L	防錆塗装(No.20.25.27.28)		更新	
0516105	北陸	2026/04/05 07:00	2026/04/05 19:00	単日	越前変電所	越前線2L構内(越前)/越前275丙母線	越前線2LGIS(LS49) 開閉・点検6年		更新	
0516106	北陸	2026/04/06 07:00	2026/04/06 19:00	単日	越前変電所	越前線2L構内(越前)/越前275丁母線	越前線2LGIS(LS50) 開閉・点検6年		更新	
0513988	北陸	2026/04/07 08:00	2026/04/07 18:00	単日	送電線	越前線1L	防錆塗装(No.20.25.27.28)		更新	
0513989	北陸	2026/04/08 08:00	2026/04/08 18:00	単日	送電線	越前線2L	防錆塗装(No.20.25.27.28)		更新	
0513895	北陸	2026/04/09 08:00	2026/04/09 18:00	単日	加賀変電所	加賀2Tr/加賀77-2Tr3次母線/加賀2-1ShR/2Tr1次43TPA/2Tr1次43TPB/2Tr2次43TPA/2Tr2次43TPB	2TrA・B系リレー6年点検他		更新	
0513897	北陸	2026/04/10 08:00	2026/04/10 18:00	単日	加賀変電所	加賀3Tr/加賀77-3Tr3次母線/加賀3-1ShR/加賀3-2ShR/3Tr1次43TPA/3Tr1次43TPB/3Tr2次43TPA/3Tr2次43TPB	3TrA・B系リレー6年点検他		更新	
0513956	北陸	2026/04/13 07:00	2026/06/28 09:00	連続	送電線	東金津新福井線2L	東金津新福井線鉄塔建替No.10 [~] 13に伴う停止		更新	
0514083	北陸	2026/04/21 08:00	2026/04/21 18:00	単日	越前変電所	越前嶺南線1L/越前嶺南1L構内(越前)	越前嶺南線1L PT・CT MOF点検12年		更新	
0513957	北陸	2026/05/07 07:00	2026/06/28 18:00	連続	送電線	加賀東金津線2L	加賀東金津線電線地線張替他No.134 [~] 143、地線張替(No.143-144)に伴う停止		更新	
0513959	北陸	2026/05/07 07:00	2026/06/28 18:00	連続	送電線	加賀東金津線2L	加賀東金津線電線張替他No.134 [~] 143に伴う停止、地線張替(No.143-144)		更新	
0513975	北陸	2026/05/07 07:00	2026/06/07 18:00	連続	送電線	加賀東金津線2L	定期点検123.129.136 鉄塔防錆塗装47.48.50.51.111.112.131		更新	
0513965	北陸	2026/05/18 07:00	2026/05/19 18:00	毎日	送電線	加賀東金津線2L	測定点検		更新	
0514087	北陸	2026/06/01 06:00	2026/06/01 18:00	単日	越前変電所	越前嶺南線1L/越前嶺南1L構内(越前)/越嶺1L143CA(越前)/越嶺143RCB0(越前)/越嶺1L143CB(越前)/越嶺143RCB0(越前)/越嶺1L143D56(越前)	越前嶺南線PSC装置撤去/越前嶺南線1L制御ケーブル撤去		更新	
0513983	北陸	2026/06/10 08:00	2026/06/10 18:00	単日	送電線	越前嶺南線1L	電線調査(No.9-10)		更新	
0514260	北陸	2026/06/15 08:00	2026/06/15 18:00	単日	加賀変電所	加賀東金津線2L/加賀金津2L構内(加賀)/加賀275丁母線/加賀275母連	鳥害対策修理		更新	
0516097	北陸	2026/06/28 09:00	2026/06/28 13:00	単日	送電線	東金津新福井線2L	東金津新福井線鉄塔建替No.10 [~] 13使用前社内検査(絶縁抵抗測定)		更新	
0516098	北陸	2026/06/28 13:00	2026/06/28 18:00	単日	送電線	東金津新福井線2L	東金津新福井線鉄塔建替No.10 [~] 13使用前社内検査(絶縁耐力試験他)		更新	
0513958	北陸	2026/06/29 07:00	2026/09/26 18:00	連続	送電線	加賀幹線2L	加賀幹線電線地線張替他No.121 [~] 130に伴う停止		更新	
0513960	北陸	2026/06/29 07:00	2026/09/26 18:00	連続	送電線	加賀幹線2L	加賀幹線電線地線張替他No.53 [~] 60に伴う停止、職能教育		更新	
0513961	北陸	2026/06/29 07:00	2026/06/30 18:00	毎日	送電線	加賀幹線2L	測定点検、がいしスベサ修理		更新	
0513984	北陸	2026/06/29 08:00	2026/07/01 18:00	毎日	送電線	加賀幹線2L	測定点検、がいし連スベサ取付(No.174.999)、防錆塗装		更新	
0513968	北陸	2026/07/02 07:00	2026/07/02 18:00	単日	送電線	加賀福光線1L	がいしスベサ修理		更新	
0513969	北陸	2026/07/03 07:00	2026/07/03 18:00	単日	送電線	加賀福光線2L	がいしスベサ修理		更新	
0514258	北陸	2026/07/04 08:00	2026/07/08 18:00	毎日	送電線	能越幹線1L	地線修理		更新	
0514012	北陸	2026/07/06 08:00	2026/07/08 18:00	毎日	送電線	加賀幹線2L	測定点検、防錆塗装(No.129.174)		更新	
0513972	北陸	2026/07/08 07:00	2026/07/08 18:00	単日	送電線	能越幹線1L	がいし連スベサ取付、職能教育(宙乗り訓練)		更新	
0513973	北陸	2026/07/09 07:00	2026/07/09 18:00	単日	送電線	能越幹線2L	がいし連スベサ取付		更新	
0514259	北陸	2026/07/09 08:00	2026/07/12 18:00	毎日	送電線	能越幹線2L	地線修理		更新	
0513963	北陸	2026/07/17 07:00	2026/07/19 18:00	毎日	送電線	能登幹線1L	測定点検、地線修理		更新	
0513964	北陸	2026/07/22 07:00	2026/07/24 18:00	毎日	送電線	能登幹線2L	測定点検		更新	
0513870	北陸	2026/08/25 08:00	2026/08/25 18:00	単日	加賀変電所	加賀幹線2L構内(加賀)/加賀幹線2L/加賀幹線2L43CA(加賀)/加賀幹線2L43CB(加賀)/加賀幹線2L43RCA0(加賀)/加賀幹線2L43RCB0(加賀)/加賀幹線2L43RCAM(加賀)/加賀幹線2L43RCBM(加賀)	加賀幹線2L BCU 6年点検他		更新	
0513907	北陸	2026/09/16 08:00	2026/09/16 18:00	単日	越前変電所	加賀幹線2L/加賀幹線2L構内(越前)	加賀幹線2LGIS(LS454甲)(CB5454) 開閉・点検・各種手入・操作機構トルク測定6年		更新	
0513908	北陸	2026/09/17 08:00	2026/09/17 18:00	単日	越前変電所	加賀幹線2L構内(越前)/越前500甲母線	加賀幹線2LGIS(LS421) 開閉・点検・各種手入6年		更新	
0513909	北陸	2026/09/18 08:00	2026/09/18 18:00	単日	越前変電所	加賀幹線2L構内(越前)/越前500乙母線	加賀幹線2LGIS(LS422) 開閉・点検・各種手入6年		更新	
0513996	北陸	2026/09/27 07:00	2026/10/28 09:00	連続	送電線	東金津新福井線1L	東金津新福井線鉄塔建替No.10 [~] 13に伴う停止		更新	
0513997	北陸	2026/09/27 07:00	2026/11/09 18:00	連続	送電線	加賀東金津線1L	加賀東金津線電線地線張替他No.134 [~] 143に伴う停止		更新	
0513998	北陸	2026/09/27 07:00	2026/11/09 18:00	連続	送電線	加賀東金津線1L	加賀東金津線電線張替他No.134 [~] 143に伴う停止		更新	
0514009	北陸	2026/09/27 07:00	2026/10/10 18:00	連続	送電線	加賀東金津線1L	定期点検 123.129.136 鉄塔防錆塗装 80		更新	
0514084	北陸	2026/10/01 08:00	2026/10/01 18:00	単日	越前変電所	越前嶺南線2L/越前嶺南2L構内(越前)	越前嶺南線2L PT・CT MOF点検12年		更新	
0513999	北陸	2026/10/05 07:00	2026/10/06 18:00	毎日	送電線	加賀東金津線1L	測定点検		更新	
0514092	北陸	2026/10/14 08:00	2026/10/14 18:00	単日	南福光変電所	南福光中北連1L構内/南福光中部北陸連絡	LBC用TTケーブル切替試験		更新	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0513873	北陸	2026/10/15 08:00	2026/10/15 18:00	単日	加賀変電所	加賀東金津線1L/加賀金津1L構内(加賀)/加賀275丙母線/加賀275母連	鳥害対策修理		更新	
0514095	北陸	2026/10/19 08:00	2026/10/19 18:00	単日	南福光変電所	南福光中北連2L構内/南福光中部北陸連絡	LBC用TTケーブル切替試験		更新	
0516099	北陸	2026/10/28 09:00	2026/10/28 13:00	単日	送電線	東金津新福井線1L	東金津新福井線鉄塔建替No.10 ¹³ 使用前社内検査(絶縁抵抗測定)		更新	
0516100	北陸	2026/10/28 13:00	2026/10/28 18:00	単日	送電線	東金津新福井線1L	東金津新福井線鉄塔建替No.10 ¹³ 使用前社内検査(絶縁耐力試験他)		更新	
0514089	北陸	2026/11/06 06:00	2026/11/06 18:00	単日	越前変電所	越前嶺南線2L/越前嶺南2L構内(越前)/越嶺2L243CA(越前)/越嶺243RCA0(越前)/越嶺2L243CB(越前)/越嶺243RCA0(越前)/越嶺2L243D56(越前)	越前嶺南線PSC装置撤去]越前嶺南線2L制御ケーブル撤去		更新	
0513900	北陸	2026/11/10 08:00	2026/11/16 17:00	連続	加賀変電所	加賀2Tr/加賀77-2Tr3次母線/加賀2-1ShR	2Tr本体 6年点検, Tr1・3次電力ケーブル 6年点検他		更新	
0513903	北陸	2026/11/23 08:00	2026/11/30 18:00	連続	越前変電所	越前2Tr/越前2Tr3次母線/越前2-2ShR/越前2-3ShR	[地震対策]2Tr主保護盤改修		更新	
0514085	北陸	2026/12/01 08:00	2026/12/01 18:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/H2-STr, 2所内Cub	2Tr1次GIS(LS423)(CB5472) 開閉・点検・各種手入・操作機構トルク測定6年		更新	
0514086	北陸	2026/12/02 08:00	2026/12/02 18:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/H2-STr, 2所内Cub	2Tr1次GIS(LS424) 開閉・点検・各種手入6年, 2Tr1次 周辺GIS 点検6年		更新	
0513910	北陸	2026/12/03 08:00	2026/12/03 18:00	単日	越前変電所	越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/H2-STr, 2所内Cub	2Tr (R相) 点検・各種手入・冷却装置点検・絶縁油耐圧酸価測定6年		更新	
0513911	北陸	2026/12/04 08:00	2026/12/04 18:00	単日	越前変電所	越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/H2-STr, 2所内Cub	2Tr (S相) 点検・各種手入・冷却装置点検・絶縁油耐圧酸価測定6年		更新	
0513912	北陸	2026/12/05 08:00	2026/12/05 18:00	単日	越前変電所	越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/H2-STr, 2所内Cub	2Tr (T相) 点検・各種手入・冷却装置点検・絶縁油耐圧酸価測定6年		更新	
0513913	北陸	2026/12/06 08:00	2026/12/06 18:00	単日	越前変電所	越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/H2-STr, 2所内Cub	2Tr1次・中性点・3次 電力ケーブル点検6年, 3次GIS 開閉・点検・各種手入6年		更新	
0513915	北陸	2026/12/07 08:00	2026/12/07 18:00	単日	越前変電所	越前275丙母線/越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/H2-STr, 2所内Cub	2Tr2次GIS(LS33) 開閉・点検・各種手入6年, 275kVPT切替盤 点検6年		更新	
0513914	北陸	2026/12/08 08:00	2026/12/08 18:00	単日	越前変電所	越前275丁母線/越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/H2-STr, 2所内Cub	2Tr2次GIS(LS34) 開閉・点検・各種手入6年, 275kVPT切替盤 点検6年		更新	
0514256	北陸	2026/12/13 08:00	2026/12/13 18:00	単日	南福光変電所	加賀福光線1L(構内)	LBC用TTケーブル切替試験		更新	
0514257	北陸	2026/12/14 08:00	2026/12/14 18:00	単日	南福光変電所	加賀福光線2L(構内)	LBC用TTケーブル切替試験		更新	
0513933	北陸	2026/12/15 09:00	2026/12/15 17:00	単日	加賀変電所	能登幹線1L構内(加賀)/加賀500甲母線/加賀500母連	電力振幅Ry(PSC)撤去		更新	
0513934	北陸	2026/12/16 09:00	2026/12/16 17:00	単日	加賀変電所	能登幹線2L構内(加賀)/加賀500乙母線/加賀500母連	電力振幅Ry(PSC)撤去		更新	
0514255	北陸	2026/12/17 08:00	2026/12/17 18:00	単日	南福光変電所	能越幹線2L(構内)	LBC用TTケーブル切替試験		更新	
0514254	北陸	2026/12/18 08:00	2026/12/18 18:00	単日	南福光変電所	能越幹線1L(構内)	LBC用TTケーブル切替試験		更新	
0514008	北陸	2026/12/21 07:00	2026/12/22 18:00	毎日	送電線	加賀幹線1L	測定点検、がいしスベサ修理		更新	
0513906	北陸	2026/12/21 08:00	2026/12/21 18:00	単日	越前変電所	加賀幹線1L/加賀幹線1L構内(越前)	加賀幹線1LGIS(LS5453甲)(CB5453) 開閉・点検・各種手入・操作機構トルク測定6年		更新	
0513931	北陸	2026/12/21 08:00	2026/12/21 18:00	単日	加賀変電所	加賀幹線1L構内(加賀)/加賀幹線1L/加賀幹1L43CA(加賀)/加賀幹1L43CB(加賀)/加賀幹1L43RCA0(加賀)/加賀幹1L43RCB0(加賀)/加賀幹1L43RCAM(加賀)/加賀幹1L43RCBM(加賀)	加賀幹線1L BCU 6年点検他		更新	
0514010	北陸	2026/12/21 08:00	2026/12/22 18:00	毎日	送電線	加賀幹線1L	がいし連スベサ取付(No.174.999)		更新	
0513904	北陸	2026/12/22 08:00	2026/12/22 18:00	単日	越前変電所	加賀幹線1L構内(越前)/越前500甲母線	加賀幹線1LGIS(LS417) 開閉・点検・各種手入6年		更新	
0513905	北陸	2026/12/23 08:00	2026/12/23 18:00	単日	越前変電所	加賀幹線1L構内(越前)/越前500乙母線	加賀幹線1LGIS(LS418) 開閉・点検・各種手入6年		更新	
0513867	北陸	2027/03/01 08:00	2027/03/09 18:00	連続	加賀変電所	加賀2Tr/加賀77-2Tr3次母線/加賀2-1ShR	GIS 2Trユニット 6年点検・電装部品修理		更新	
0513876	北陸	2027/03/01 08:00	2027/03/02 18:00	連続	加賀変電所	加賀2Tr/加賀77-2Tr3次母線/加賀2-1ShR/加賀500甲母線/加賀500母連	GIS 2Trユニット(LS333) 6年点検・電装部品修理		更新	
0513894	北陸	2027/03/03 08:00	2027/03/03 18:00	単日	加賀変電所	加賀2Tr/加賀77-2Tr3次母線/加賀2-1ShR	GCB034 開閉試験・6年点検他		更新	
0513879	北陸	2027/03/05 08:00	2027/03/06 18:00	連続	加賀変電所	加賀2Tr/加賀77-2Tr3次母線/加賀2-1ShR/加賀500乙母線/加賀500母連	GIS 2Trユニット(LS334) 6年点検・電装部品修理		更新	
0513869	北陸	2027/03/10 08:00	2027/03/12 18:00	連続	加賀変電所	加賀3Tr/加賀77-3Tr3次母線/加賀3-1ShR/加賀3-2ShR	GCB035 開閉試験・6年点検他		更新	
0513877	北陸	2027/03/13 08:00	2027/03/21 18:00	連続	加賀変電所	加賀3Tr/加賀77-2Tr3次母線/加賀3-1ShR/加賀3-2ShR/3Tr43-D56	GIS 3Trユニット 6年点検・電装部品修理		更新	
0513878	北陸	2027/03/14 08:00	2027/03/15 18:00	連続	加賀変電所	加賀3Tr/加賀77-2Tr3次母線/加賀3-1ShR/加賀3-2ShR/加賀500甲母線/加賀500母連	GIS 3Trユニット(LS323) 6年点検・電装部品修理		更新	
0513875	北陸	2027/03/15 08:00	2027/03/15 18:00	単日	加賀変電所	加賀3Tr/加賀3-1ShR/加賀3-2ShR/加賀275丁母線/加賀275母連	鳥害対策修理		更新	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0513880	北陸	2027/03/16 08:00	2027/03/17 18:00	連続	加賀変電所	加賀3Tr/加賀77-2Tr3次母線/加賀3-1ShR/加賀3-2ShR/加賀500乙母線/加賀500母連	GIS 3Trユニット(LS324) 6年点検・電装部品修理		更新	
0513896	北陸	2027/03/25 08:00	2027/03/31 17:00	連続	加賀変電所	加賀3Tr/加賀77-3Tr3次母線/加賀3-1ShR/加賀3-2ShR	3Tr本体 6年点検, Tr1・3次電力ケーブル 6年点検他		更新	
0516040	北陸	2027/04/01 07:00	2027/07/02 18:00	連続	送電線	東金津新福井線2L	東金津新福井線電線張替他(No10~新福井S/S) [275kVPD自切盤取替]東金津新福井線2L切替		更新	
0516073	北陸	2027/04/02 08:00	2027/04/02 18:00	単日	東金津変電所	東金津新井2L構内(東)/東金津新243CA(東金津/東金津新243CB(東金津/東金津新243RCA0(東金/東金津新243RCAM(東金/東金津新243RCB0(東金/東金津新243RCBM(東金/東金津新福井線2L			更新	
0516039	北陸	2027/05/11 07:00	2027/05/14 19:00	連続	越前変電所	越前嶺南線1L/越前嶺南1L構内(越前)	越前嶺南線1LGIS 開閉・点検・操作機構トルク測定・各種手入6年 GIS現場盤 点検6		更新	
0516088	北陸	2027/05/11 08:00	2027/05/14 18:00	毎日	送電線	越前嶺南線1L	がいし連SP取付(No.000.1)定期点検(No.5.11)		更新	
0516090	北陸	2027/05/11 08:00	2027/05/14 18:00	毎日	送電線	越前嶺南線1L	防錆塗装(No.1)		更新	
0516086	北陸	2027/05/12 07:00	2027/05/12 19:00	単日	越前変電所	越前嶺南1L構内(越前)/越前500甲母線	越前嶺南線1LGIS(LS431) 開閉・点検6年		更新	
0516087	北陸	2027/05/13 07:00	2027/05/13 19:00	単日	越前変電所	越前嶺南1L構内(越前)/越前500乙母線	越前嶺南線1LGIS(LS432) 開閉・点検6年		更新	
0516083	北陸	2027/05/17 07:00	2027/05/20 19:00	連続	越前変電所	越前嶺南線2L/越前嶺南2L構内(越前)	越前嶺南線2LGIS 開閉・点検・操作機構トルク測定・各種手入6年 GIS現場盤 点検6		更新	
0516089	北陸	2027/05/17 08:00	2027/05/20 18:00	毎日	送電線	越前嶺南線2L	がいし連SP取付(No.000.1)定期点検(No.5.11)		更新	
0516091	北陸	2027/05/17 08:00	2027/05/20 18:00	毎日	送電線	越前嶺南線2L	防錆塗装(No.1)		更新	
0516084	北陸	2027/05/18 07:00	2027/05/18 19:00	単日	越前変電所	越前嶺南2L構内(越前)/越前500甲母線	越前嶺南線2LGIS(LS425) 開閉・点検6年		更新	
0516085	北陸	2027/05/19 07:00	2027/05/19 19:00	単日	越前変電所	越前嶺南2L構内(越前)/越前500乙母線	越前嶺南線2LGIS(LS426) 開閉・点検6年		更新	
0516093	北陸	2027/06/01 08:00	2027/06/03 18:00	毎日	送電線	東金津新福井線2L	定期点検(No.5.11.17.23)がいし連SP(No.000.1)		更新	
0516042	北陸	2027/07/01 07:00	2027/09/28 18:00	連続	送電線	加賀幹線1L	加賀幹線電線張替他(No152~No.161)他		更新	
0516043	北陸	2027/07/01 07:00	2027/09/28 18:00	連続	送電線	加賀幹線1L	加賀幹線電線張替他(No.53~No.60)		更新	
0516053	北陸	2027/07/01 07:00	2027/07/03 18:00	毎日	送電線	加賀幹線1L	測定点検		更新	
0516059	北陸	2027/07/01 07:00	2027/07/01 18:00	単日	送電線	加賀幹線1L	定期点検No.93, 99		更新	
0516055	北陸	2027/07/05 07:00	2027/07/07 18:00	毎日	送電線	能登幹線1L	測定点検		更新	
0516096	北陸	2027/07/05 08:00	2027/07/09 18:00	毎日	送電線	加賀幹線1L	測定点検(No.124.130.136.142.148.154.160.166.172)防錆塗装(No.129.174)		更新	
0516052	北陸	2027/07/08 07:00	2027/07/09 18:00	毎日	送電線	加賀福光線2L	地線修理		更新	
0516056	北陸	2027/07/12 07:00	2027/07/14 18:00	毎日	送電線	能登幹線2L	測定点検		更新	
0516535	北陸	2027/07/20 08:00	2027/07/23 18:00	毎日	送電線	能越幹線1L	地線修理、電線乗り出し訓練		更新	
0516536	北陸	2027/07/26 08:00	2027/08/02 18:00	毎日	送電線	能越幹線2L	地線修理		更新	
0516044	北陸	2027/09/01 08:00	2027/09/09 18:00	連続	加賀変電所	加賀幹線1L/加賀幹線1L構内(加賀)	GIS加賀幹線1Lユニット 6年点検・電装部品修理 他		更新	
0516045	北陸	2027/09/02 08:00	2027/09/03 18:00	連続	加賀変電所	加賀500甲母線/加賀幹線1L構内(加賀)/加賀500母連	GIS加賀幹線1Lユニット(LS335) 6年点検・電装部品修理		更新	
0516046	北陸	2027/09/04 08:00	2027/09/05 18:00	連続	加賀変電所	加賀500乙母線/加賀幹線1L構内(加賀)/加賀500母連	GIS加賀幹線1Lユニット(LS336) 6年点検・電装部品修理		更新	
0516051	北陸	2027/09/10 08:00	2027/09/10 18:00	単日	加賀変電所	加賀幹線1L構内(加賀)/加賀幹線1L/加賀幹1L43CA(加賀)/加賀幹1L43CB(加賀)/加賀幹1L43RCA0(加賀)/加賀幹1L43RCB0(加賀)/加賀幹1L43RCAM(加賀)/加賀幹1L43RCBM(加賀)	加賀幹線1L BCU 6年点検他		更新	
0516041	北陸	2027/09/29 07:00	2027/12/16 18:00	連続	送電線	東金津新福井線1L	東金津新福井線電線張替他No10~新福井S/S		更新	
0516071	北陸	2028/03/12 07:00	2028/03/25 14:00	連続	越前変電所	越前3Tr/越前3-1ShR/越前3STr/3B43-56(越前)/越前3-1ShR	[3号変圧器保護盤取替]ケーブル切替・試験		更新	
0516076	北陸	2028/03/24 07:00	2028/03/24 12:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前3Tr/越前3STr	[3号変圧器保護盤取替]新設3Tr統合盤 甲母線BPT2次電圧取込、LS429開閉試験		更新	
0516078	北陸	2028/03/24 07:00	2028/03/24 12:00	単日	越前変電所	越前275丙母線/越前3Tr/越前3STr	[3号変圧器保護盤取替]新設3Tr統合盤 丙母線BPT2次電圧取込、LS53開閉試験		更新	
0516077	北陸	2028/03/24 12:00	2028/03/24 18:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前3Tr/越前3STr	[3号変圧器保護盤取替]新設3Tr統合盤 乙母線BPT2次電圧取込、LS430開閉試験		更新	
0516079	北陸	2028/03/24 12:00	2028/03/24 18:00	単日	越前変電所	越前275丁母線/越前3Tr/越前3STr	[3号変圧器保護盤取替]新設3Tr統合盤 丁母線BPT2次電圧取込、LS54開閉試験		更新	
0516080	北陸	2028/03/25 13:00	2028/03/25 16:00	単日	越前変電所	越前3Tr/越前500乙母線/越前3-1ShR/越前3Tr3次母線/越前500乙母線/[試験使用]	[3号変圧器保護盤取替]1Tr1次~3次潮流試験(方向試験)		更新	
0516081	北陸	2028/03/25 15:00	2028/03/25 19:00	単日	越前変電所	越前3Tr/越前275丁母線/越前3-1ShR/越前3Tr3次母線/越前275丁母線/[試験使用]	[3号変圧器保護盤取替]1Tr2次~3次潮流試験(方向試験)		更新	
0516082	北陸	2028/03/25 15:00	2028/03/25 19:00	単日	越前変電所	越前3Tr/越前275丁母線/越前3-1ShR/越前3Tr3次母線/越前275丁母線/[試験使用]	[3号変圧器保護盤取替]1Tr1次~3次潮流試験(方向試験)		更新	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0516063	北陸	2028/03/27 08:00	2028/03/27 13:00	単日	新福井変電所	越前線1L構内(新福井)/新福井275甲母線/越前線143CA(新福井)/越前線143CB(新福井)/越前線143RCAS(新福井/越前線143RCBS(新福井	[275kV母線保護装置取替]越前線1Lケーブル切替、甲母線LSバレット取込		更新	
0516064	北陸	2028/03/27 13:00	2028/03/27 18:00	単日	新福井変電所	越前線1L構内(新福井)/新福井275乙母線/越前線143CA(新福井)/越前線143CB(新福井)/越前線143RCAS(新福井/越前線143RCBS(新福井	[275kV母線保護装置取替]越前線1Lケーブル切替、乙母線LSバレット取込		更新	
0516065	北陸	2028/03/28 08:00	2028/03/28 13:00	単日	新福井変電所	越前線2L構内(新福井)/新福井275甲母線/越前線243CA(新福井)/越前線243CB(新福井)/越前線243RCAS(新福井/越前線243RCBS(新福井	[275kV母線保護装置取替]越前線2Lケーブル切替、甲母線LSバレット取込		更新	
0516066	北陸	2028/03/28 13:00	2028/03/28 18:00	単日	新福井変電所	越前線2L構内(新福井)/新福井275乙母線/越前線243CA(新福井)/越前線243CB(新福井)/越前線243RCAS(新福井/越前線243RCBS(新福井	[275kV母線保護装置取替]越前線2Lケーブル切替、乙母線LSバレット取込		更新	
0516067	北陸	2028/03/29 08:00	2028/03/29 13:00	単日	新福井変電所	東金新福井1L構内(新)/新福井275甲母線/東金津新143CA(新福井/東金津新143CB(新福井/東金津新143RCAS(新福/東金津新143RCBS(新福	[275kV母線保護装置取替]東金津新福井線1Lケーブル切替、甲母線LSバレット取込		更新	
0516068	北陸	2028/03/29 13:00	2028/03/29 18:00	単日	新福井変電所	東金新福井1L構内(新)/新福井275乙母線/東金津新143CA(新福井/東金津新143CB(新福井/東金津新143RCAS(新福/東金津新143RCBS(新福	[275kV母線保護装置取替]東金津新福井線1Lケーブル切替、乙母線LSバレット取込		更新	
0516069	北陸	2028/03/30 08:00	2028/03/30 13:00	単日	新福井変電所	東金新福井2L構内(新)/新福井275甲母線/東金津新243CA(新福井/東金津新243CB(新福井/東金津新243RCAS(新福/東金津新243RCBS(新福	[275kV母線保護装置取替]東金津新福井線2Lケーブル切替、甲母線LSバレット取込		更新	
0516070	北陸	2028/03/30 13:00	2028/03/30 18:00	単日	新福井変電所	東金新福井2L構内(新)/新福井275乙母線/東金津新243CA(新福井/東金津新243CB(新福井/東金津新243RCAS(新福/東金津新243RCBS(新福	[275kV母線保護装置取替]東金津新福井線2Lケーブル切替、乙母線LSバレット取込		更新	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0662492	関西	2026/04/01 00:00	2027/04/01 09:00	連続	阿南紀北直流幹線	阿南紀北直流幹線1ノ2L(1LN、2LD、2LN)運用容量1400MW	阿南紀北直流幹線1LN・2LD・2LN潮流変動対策に伴う運用制約		変更	
0662508	関西	2026/04/01 00:00	2027/04/01 09:00	連続	阿南紀北直流幹線1L	阿南紀北直流幹線1L(阿南変換所～由良開閉所(1LD))	阿南紀北直流幹線1LN・2LD・2LN双極運転1極帰線の本線運用に伴う1LD停止		変更	
0662813	関西	2026/04/04 09:00	2026/04/05 18:00	毎日	東近江開閉所	三重東近江線1L 線路及び構内	三重東近江線1L 553LPD直下のCF(カップリングフィルタ)撤去		変更	
0661289	関西	2026/04/07 08:00	2026/04/08 18:00	毎日	山城北線1L1	京都～京北	塗装(No. 7)		変更	
0655105	関西	2026/04/07 09:00	2026/04/10 18:00	毎日	京都変電所	山城北線1L線路及び構内	【京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線1LPCMRy(A)ケーブル切替・試験		変更	
0655117	関西	2026/04/07 09:00	2026/04/10 18:00	毎日	京北開閉所	山城北線1L線路及び構内	【京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線1LPCMRy(A)ケーブル切替・試験		変更	
0662814	関西	2026/04/08 09:00	2026/04/09 18:00	毎日	東近江開閉所	三重東近江線2L 線路及び構内	三重東近江線2L 563LPD直下のCF(カップリングフィルタ)撤去		変更	
0660732	関西	2026/04/11 08:00	2026/06/28 18:00	連続	越前嶺南線1L	越前SノS～嶺南SノS	湖東線改良工事(基礎工事)に伴う保安停止		変更	
0660733	関西	2026/04/13 08:00	2026/04/17 18:00	毎日	嶺南変電所	越前嶺南線1L線路	【越前嶺南線改良工事】屋外鉄構(BA13)改造		変更	
0661291	関西	2026/04/13 08:00	2026/04/14 18:00	毎日	山城北線2L1	京都～京北	塗装(No. 7)		変更	
0655108	関西	2026/04/13 09:00	2026/04/16 18:00	毎日	京都変電所	山城北線2L線路及び構内	【京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線2LPCMRy(A)ケーブル切替・試験		変更	
0655120	関西	2026/04/13 09:00	2026/04/16 18:00	毎日	京北開閉所	山城北線2L線路及び構内	【京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線2LPCMRy(A)ケーブル切替・試験		変更	
0655111	関西	2026/04/21 09:00	2026/04/24 18:00	毎日	京都変電所	山城北線1L線路及び構内	【京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線1LPCMRy(B)ケーブル切替・試験		変更	
0655123	関西	2026/04/21 09:00	2026/04/24 18:00	毎日	京北開閉所	山城北線1L線路及び構内	【京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線1LPCMRy(B)ケーブル切替・試験		変更	
0655114	関西	2026/04/27 09:00	2026/04/30 18:00	毎日	京都変電所	山城北線2L線路及び構内	【京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線2LPCMRy(B)ケーブル切替・試験		変更	
0655126	関西	2026/04/27 09:00	2026/04/30 18:00	毎日	京北開閉所	山城北線2L線路及び構内	【京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線2LPCMRy(B)ケーブル切替・試験		変更	
0655347	関西	2026/05/07 08:00	2026/05/08 18:00	毎日	西播変電所	西播東岡山線2L線路及び構内	西播変電所CB512他取替工事に伴うAノB系制御ケーブル切離し		変更	
0655348	関西	2026/05/11 08:00	2026/05/11 18:00	単日	西播変電所	西播東岡山線2L線路及び構内	西播変電所CB512他取替工事に伴うLS514、ES514E?1インターロック回路切離し・試験		変更	
0660843	関西	2026/05/18 09:00	2026/05/19 17:00	毎日	阿南紀北直流幹線1L	阿南変換所～由良開閉所(1LD)	地中接続箱他油採取作業(油中ガス分析)		変更	
0655349	関西	2026/05/27 08:00	2026/06/12 18:00	連続	西播変電所	西播東岡山線2L線路及び構内	西播変電所CB512他取替工事に伴うLS513側ベローズ切離し		変更	
0655356	関西	2026/06/15 08:00	2026/06/19 18:00	毎日	山崎智頭線1L	山崎SWノS～智頭SノS	2026防錆塗装工事(山崎智頭線No16、17、23、27、29、39、40)		変更	
0655357	関西	2026/06/22 08:00	2026/06/26 18:00	毎日	山崎智頭線2L	山崎SWノS～智頭SノS	2026防錆塗装工事(山崎智頭線No16、17、23、27、29、39、40)		変更	
0655358	関西	2026/06/29 08:00	2026/06/30 18:00	毎日	山崎智頭線2L	山崎SWノS～智頭SノS	2026防錆塗装工事(山崎智頭線No16、17、23、27、29、39、40)		変更	
0655343	関西	2026/09/11 08:00	2026/12/09 18:00	連続	越前嶺南線2L	越前SノS～嶺南SノS	越前嶺南線2LNo75～No116電力線他張替工事(3工区:N o101～No116)		変更	
0655344	関西	2026/09/11 08:00	2026/12/09 18:00	連続	越前嶺南線2L	越前SノS～嶺南SノS	越前嶺南線2LNo75～No116電力線他張替工事(4工区:N o75～No81)		変更	
0656762	関西	2026/09/11 08:00	2026/12/09 18:00	連続	越前嶺南線2L	越前SノS～嶺南SノS	湖東線改良工事(基礎工事)に伴う保安停止		変更	
0660734	関西	2026/09/14 08:00	2026/09/18 18:00	毎日	嶺南変電所	越前嶺南線2L線路	【越前嶺南線改良工事】屋外鉄構(BA14)改造		変更	
0661290	関西	2026/10/19 08:00	2026/10/19 18:00	単日	山城北線1L1	京都～京北	1. クランプ取替(No. 16)		変更	
0655334	関西	2026/11/11 08:00	2026/11/25 18:00	毎日	北近江線1L1	嶺南～東近江	Z.No39ほかがいし装置取替		変更	
0656544	関西	2026/11/11 08:00	2026/11/25 18:00	毎日	北近江線1L1	嶺南～東近江	1. No76ほか10径間スペースサ取替 2. No63ほか5基の鉄塔防錆塗装		変更	
0661288	関西	2026/11/11 08:00	2026/11/15 18:00	毎日	嶺南変電所	北近江線1L線路	【越前嶺南線改良工事】屋外鉄構(BA15)補強		変更	
0655350	関西	2026/11/30 08:00	2026/12/18 18:00	連続	西播変電所	西播東岡山線2L線路及び構内	西播変電所CB512他取替工事に伴うLS513側ベローズ取付他		変更	
0655335	関西	2026/12/01 08:00	2026/12/15 18:00	毎日	北近江線2L1	嶺南～東近江	1. No76ほか10径間スペースサ取替 2. No63ほか5基の鉄塔防錆塗装		変更	
0655336	関西	2026/12/01 08:00	2026/12/15 18:00	毎日	北近江線2L1	嶺南～東近江	Z.No40ほかがいし装置取替		変更	
0657351	関西	2026/12/07 08:00	2026/12/11 18:00	毎日	嶺南変電所	北近江線2L線路	屋外鉄構(BA16)補強		変更	
0655352	関西	2026/12/21 09:00	2026/12/21 18:00	単日	西播変電所	西播東岡山線2L線路及び構内～LS513～LS511試験系統	西播変電所CB512他取替工事に伴うLS511～LS513試充電試験およびGIS内部診断測定		変更	
0655353	関西	2027/03/02 08:00	2027/03/03 18:00	毎日	西播変電所	西播東岡山線2L線路及び構内	西播変電所CB515他取替工事に伴うAノB系制御ケーブル切離し		変更	
0655354	関西	2027/03/04 08:00	2027/03/04 18:00	単日	西播変電所	西播東岡山線2L線路及び構内	西播変電所CB515他取替工事に伴うLS513、ES514E?1インターロック回路切離し・試験		変更	
0660865	関西	2027/04/01 08:00	2027/06/29 18:00	連続	越前嶺南線2L	越前SノS～嶺南SノS	越前嶺南線一部改良工事(基礎工事)に伴う保安停止		変更	
0662501	関西	2027/04/01 09:00	2028/03/20 05:00	連続	阿南紀北直流幹線	阿南紀北直流幹線1ノ2L(1LN、2LD、2LN)運用容量1400MW	阿南紀北直流幹線1LN・2LD・2LN潮流変動対策に伴う運用制約		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0662517	関西	2027/04/01 09:00	2028/03/20 05:00	連続	阿南紀北直流幹線1L	阿南紀北直流幹線1L(阿南変換所～由良開閉所(1LD))	阿南紀北直流幹線1LN・2LD・2LN双極運転1極帰線の本線運用に伴う1LD停止		変更	
0660861	関西	2027/05/11 08:00	2027/05/20 18:00	連続	越前嶺南線1L	越前S/S～嶺南S/S	越前嶺南線一部改良工事(横断箇所架線時の防護対策)に伴う保安停止		変更	
0660866	関西	2027/05/11 08:00	2027/05/20 18:00	連続	越前嶺南線2L	越前S/S～嶺南S/S	越前嶺南線一部改良工事(横断箇所架線時の防護対策)に伴う保安停止		変更	
0660877	関西	2027/05/24 08:00	2027/06/30 18:00	連続	西播変電所	西播東岡山線2L線路及び構内	西播変電所CB515他取替工事に伴うLS514撤去、据付		変更	
0660858	関西	2027/06/21 09:00	2027/06/21 14:00	単日	京北開閉所	若狭幹線(山)1L線路及び構内	集約TM盤除却に伴う若狭幹線(山)1L要素切り離し、試験		変更	
0660859	関西	2027/06/21 14:00	2027/06/21 18:00	単日	京北開閉所	若狭幹線(山)2L線路及び構内	集約TM盤除却に伴う若狭幹線(山)2L要素切り離し、試験		変更	
0660862	関西	2027/09/11 08:00	2027/12/09 18:00	連続	越前嶺南線1L	越前S/S～嶺南S/S	越前嶺南線一部改良工事(鉄塔組立・架線工事)		変更	
0660863	関西	2027/09/11 08:00	2027/12/09 18:00	連続	越前嶺南線1L	越前S/S～嶺南S/S	湖東線一部改良工事(組立工事)		変更	
0660867	関西	2027/09/11 08:00	2027/12/09 18:00	連続	越前嶺南線2L	越前S/S～嶺南S/S	越前嶺南線一部改良工事(鉄塔組立・架線工事)		変更	
0660868	関西	2027/09/11 08:00	2027/12/09 18:00	連続	越前嶺南線2L	越前S/S～嶺南S/S	湖東線一部改良工事(組立工事)		変更	
0660864	関西	2027/09/14 08:00	2027/12/09 18:00	連続	越前嶺南線1L	越前S/S～嶺南S/S	越前嶺南線38～75電力線他張替工事(5工区)		変更	
0660879	関西	2027/12/01 08:00	2027/12/07 18:00	連続	西播変電所	西播東岡山線2L線路及び構内	西播変電所CB515他取替工事に伴うLS514、ES514E?1インターロック回路切替、試験		変更	
0660880	関西	2027/12/08 09:00	2027/12/08 18:00	単日	西播変電所	西播東岡山線2L線路及び構内～LS513～LS511試験系統	西播変電所CB515他取替工事に伴う試充電試験およびGIS内部診断		変更	
0662507	関西	2028/03/20 05:00	2028/03/29 22:00	連続	阿南紀北直流幹線1L	阿南紀北直流幹線1L(1LD、1LN)潮流上限140MW	阿南紀北直流幹線1LD／1LNケーブル熱挙動に伴う運用制約		変更	
0660871	関西	2028/03/20 06:00	2028/03/29 17:00	連続	紀北変換所	2ThyVおよび2TrB(LS123～LS2. 9 2. 22～LS55)ならびに阿南紀北直流幹線本線、帰線2L	2極定期点検		変更	
0661287	関西	2028/03/21 07:00	2028/03/22 19:00	毎日	阿南紀北直流幹線2L	阿南変換所～由良開閉所(2LN)	地中接続箱他油採取作業(油中ガス分析)		変更	
0661292	関西	2028/03/22 09:00	2028/03/23 17:00	連続	紀北変換所	2ACF(LS921～2?11ACF、2?13AC F、2?HPACF)	CB920定期点検		変更	
0660872	関西	2028/03/29 17:00	2028/03/29 22:00	単日	紀北変換所	2ThyV試験系統	2ThyV他点検に伴う実系統試験		変更	
0662502	関西	2028/03/29 22:00	2028/04/01 09:00	連続	阿南紀北直流幹線	阿南紀北直流幹線1／2L(1LN、2LD、2LN)運用容量1400MW	阿南紀北直流幹線1LN・2LD・2LN潮流変動対策に伴う運用制約		変更	
0662518	関西	2028/03/29 22:00	2028/04/01 09:00	連続	阿南紀北直流幹線1L	阿南紀北直流幹線1L(阿南変換所～由良開閉所(1LD))	阿南紀北直流幹線1LN・2LD・2LN双極運転1極帰線の本線運用に伴う1LD停止		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0722487	中国	2026/04/06 08:30	2026/04/10 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0722748	中国	2026/04/06 08:30	2026/04/10 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線1L	圧縮形直線スリーブ内部点検ほか工事		変更	
0722537	中国	2026/04/08 08:30	2026/04/10 19:00	連続	新岡山変電所	日野幹線1L	日野幹線1L関係切替 【新岡山(変)DCS取替工事】		変更	
0722488	中国	2026/04/13 08:30	2026/04/17 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0722749	中国	2026/04/13 08:30	2026/04/17 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線2L	圧縮形直線スリーブ内部点検工事		変更	
0722792	中国	2026/04/13 08:30	2026/04/16 17:30	毎日	関門連系線	関門連系線1L	細密点検工事		変更	
0722641	中国	2026/04/14 08:30	2026/04/14 17:30	単日	新山口変電所	関門連系線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	関門連系線1号遮断器センサ取付ほか普通点検		変更	
0722538	中国	2026/04/15 08:30	2026/04/17 19:00	連続	新岡山変電所	日野幹線2L	日野幹線2L関係切替 【新岡山(変)DCS取替工事】		変更	
0725279	中国	2026/05/08 08:30	2026/05/09 17:30	連続	新山口変電所	関門連系線2L	500kV関門連系線2号CB作動油漏油修理工事		変更	
0722793	中国	2026/05/11 08:30	2026/05/14 17:30	毎日	関門連系線	関門連系線2L	細密点検工事		変更	
0725273	中国	2026/05/11 08:30	2026/05/12 17:30	毎日	新山口変電所	関門連系線2L	500kV乙母線端子取替工事(関門連系線2号)		変更	
0722853	中国	2026/05/13 08:30	2026/05/15 17:30	毎日	新山口変電所	関門連系線2L/500kV甲母線	500kV甲母線端子取替工事(関門連系線2号)		変更	
0722642	中国	2026/05/14 08:30	2026/05/14 17:30	単日	新山口変電所	関門連系線2L	関門連系線2号遮断器センサ取付ほか普通点検		変更	
0722475	中国	2026/05/18 08:30	2026/05/22 16:30	毎日	西播東岡山線	西播東岡山線1L	地線ダンパ取替工事ほか		変更	
0722476	中国	2026/06/08 08:30	2026/06/12 16:30	毎日	西播東岡山線	西播東岡山線2L	地線ダンパ取替工事ほか		変更	
0722645	中国	2026/06/15 09:00	2026/06/19 17:00	毎日	智頭変電所	山崎智頭線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	山崎智頭線1号GIS臨時点検		変更	
0722489	中国	2026/09/16 08:30	2026/09/18 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0722491	中国	2026/09/16 08:30	2026/09/18 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0722529	中国	2026/09/16 08:30	2026/09/18 19:00	連続	新岡山変電所	新岡山幹線1L	新岡山幹線1L関係切替 【新岡山(変)DCS取替工事】		変更	
0724426	中国	2026/09/16 08:30	2026/09/16 17:30	単日	新岡山幹線	新岡山幹線1L	がいし連スベーサ取付工事		変更	
0722644	中国	2026/09/21 09:00	2026/09/25 17:00	毎日	智頭変電所	中国東幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	中国東幹線1号GIS臨時点検		変更	
0723186	中国	2026/09/24 09:00	2026/09/24 17:00	単日	中国東幹線	中国東幹線1L	がいし連スベーサ取付		変更	
0724447	中国	2026/09/24 09:00	2026/09/25 17:00	毎日	日野変電所	中国東幹線1L	中国東幹線1L705GCBブッシングフランジボルト発錆		変更	
0722490	中国	2026/09/28 08:30	2026/10/02 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0722492	中国	2026/09/28 08:30	2026/10/02 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0722530	中国	2026/09/28 08:30	2026/09/30 19:00	連続	新岡山変電所	新岡山幹線2L	新岡山幹線2L関係切替 【新岡山(変)DCS取替工事】		変更	
0724425	中国	2026/09/28 08:30	2026/09/29 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線2L	設備点検作業ほか		変更	
0722745	中国	2026/09/29 08:30	2026/10/02 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線2L	圧縮形直線スリーブ改修工事		変更	
0724446	中国	2026/10/01 08:30	2026/10/01 17:30	単日	新岡山変電所	新岡山幹線2L	新岡山幹線2L102LE臨時点検		変更	
0722504	中国	2026/10/06 08:30	2026/11/28 17:30	連続	日野変電所	中国東幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV中国東幹線2L遮断器ほか取替工事		変更	
0723187	中国	2026/10/14 08:30	2026/10/14 17:30	単日	中国東幹線	中国東幹線2L	がいし連スベーサ取付		変更	
0722855	中国	2026/10/26 08:30	2026/11/12 17:30	毎日	日野変電所	500kV甲母線/500kV乙母線/中国東幹線2L	中国東幹線2L 鉄構塗装		変更	
0725284	中国	2027/03/08 08:30	2027/03/10 17:30	連続	日野変電所	中国東幹線1L	IP-DCS取替(中国東幹線1号)		変更	
0725286	中国	2027/03/08 08:30	2027/03/09 17:30	連続	日野変電所	中国東幹線1L	制御電源盤取替(500kV中国東幹線1L) ※IP-DCS取替同調		変更	
0725285	中国	2027/03/11 08:30	2027/03/13 17:30	連続	日野変電所	中国東幹線2L	IP-DCS取替(中国東幹線2号)		変更	
0725287	中国	2027/03/11 08:30	2027/03/12 17:30	連続	日野変電所	中国東幹線2L	制御電源盤取替(500kV中国東幹線2L) ※IP-DCS取替同調		変更	
0722615	中国	2027/03/15 08:30	2027/03/19 17:30	毎日	東岡山変電所	本四連系線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	本四連系線2L関係機器点検		変更	
0722796	中国	2027/03/15 08:30	2027/03/17 16:30	毎日	東岡山変電所	本四連系線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	本四連系線2L関係母線細密点検		変更	
0722477	中国	2027/03/20 07:30	2027/05/22 17:30	連続	新岡山幹線	新岡山幹線1L	新岡山幹線電線張替工事【1工区1L】		変更	
0724630	中国	2027/04/05 08:30	2027/04/23 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0724564	中国	2027/04/06 07:30	2027/04/15 17:30	毎日	新岡山変電所	新岡山幹線1L/500kV甲2母線	新岡山幹線1L鉄構塗装		変更	
0724713	中国	2027/04/12 08:30	2027/04/16 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線1L	圧縮形引留クランプ改修ほか工事		変更	
0724911	中国	2027/04/12 08:30	2027/04/15 17:30	毎日	関門連系線	関門連系線1L	細密点検工事		変更	
0724912	中国	2027/05/11 08:30	2027/05/14 17:30	毎日	関門連系線	関門連系線2L	細密点検工事		変更	
0725289	中国	2027/05/19 09:00	2027/05/22 17:00	連続	東岡山変電所	新岡山幹線1L	新岡山幹線1L関係切替 【東岡山(変)DCS取替工事】		変更	
0724502	中国	2027/05/21 08:30	2027/05/22 17:30	毎日	新岡山変電所	新岡山幹線1L	500・220kVARE取替工事(新岡山幹線1L切替)		変更	
0724514	中国	2027/09/11 07:30	2027/11/13 17:30	連続	新岡山幹線	新岡山幹線2L	新岡山幹線電線張替【1工区2L】		変更	
0724631	中国	2027/09/13 08:30	2027/10/01 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0724844	中国	2027/09/13 08:30	2027/09/14 16:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線2L	設備点検作業		変更	
0724868	中国	2027/10/04 08:00	2027/10/25 17:30	毎日	東岡山変電所	新岡山幹線2L/500kV甲母線	新岡山幹線2L関係鉄構塗装		変更	
0724772	中国	2027/10/04 08:30	2027/10/08 17:30	毎日	新岡山変電所	新岡山幹線2L/500kV甲2母線/500kV乙2母線	新岡山幹線2L関係機器点検		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0724493	中国	2027/10/05 09:00	2027/10/07 17:00	連続	東岡山変電所	本四連系線1L	本四連系線1L関係切替 【東岡山(変)DCS取替工事】		変更	
0724490	中国	2027/11/10 09:00	2027/11/13 17:00	連続	東岡山変電所	新岡山幹線2L	新岡山幹線2L関係切替 【東岡山(変)DCS取替工事】		変更	
0724503	中国	2027/11/12 08:30	2027/11/13 17:30	毎日	新岡山変電所	新岡山幹線2L	500・220kVARE取替工事(新岡山幹線2L切替)		変更	
0724614	中国	2027/11/15 08:30	2027/11/19 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0724890	中国	2027/11/15 08:30	2027/11/17 17:30	連続	日野変電所	日野幹線1L	日野幹線1L(701L、LE)修理工事		変更	
0724893	中国	2027/11/15 08:30	2027/11/17 16:30	連続	日野変電所	日野幹線1L	日野幹線1L701GCB臨時点検		変更	
0724831	中国	2027/11/16 08:30	2027/11/19 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線1L	圧縮形引留クランプ改修ほか工事		変更	
0724891	中国	2027/11/16 08:30	2027/11/17 17:30	毎日	日野変電所	日野幹線1L/500kV甲母線	日野幹線1L(701甲)修理工事		変更	
0724892	中国	2027/11/18 08:30	2027/11/19 17:30	毎日	日野変電所	日野幹線1L	日野幹線1L(701乙)修理工事		変更	
0724500	中国	2027/11/20 08:30	2027/11/20 17:30	単日	新岡山変電所	日野幹線1L	500・220kVARE取替工事(日野幹線1L切替)		変更	
0724670	中国	2027/11/20 08:30	2027/11/22 17:30	連続	日野変電所	日野幹線1L	IP-DCS取替(日野幹線1号)		変更	
0724905	中国	2027/11/20 08:30	2027/11/21 17:30	連続	日野変電所	日野幹線1L	制御電源盤取替(500kV日野幹線1L) ※IP-DCS取替同調		変更	
0724615	中国	2027/11/23 08:30	2027/11/27 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0724906	中国	2027/11/23 08:30	2027/11/24 17:30	連続	日野変電所	日野幹線2L	制御電源盤取替(500kV日野幹線2L) ※IP-DCS取替同調		変更	
0725291	中国	2027/11/23 08:30	2027/11/25 17:30	連続	日野変電所	日野幹線2L	IP-DCS取替(日野幹線2号)		変更	
0724501	中国	2027/11/24 08:30	2027/11/24 18:30	単日	新岡山変電所	日野幹線2L	500・220kVARE取替工事(日野幹線2L切替)		変更	
0725290	中国	2027/11/24 09:00	2027/11/26 17:00	連続	東岡山変電所	本四連系線2L	本四連系線2L関係切替 【東岡山(変)DCS取替工事】		変更	
0724832	中国	2027/11/26 08:30	2027/11/26 17:30	単日	日野幹線	日野幹線2L	圧縮形引留クランプ改修ほか工事		変更	
0724896	中国	2027/11/28 08:30	2027/11/30 16:30	連続	日野変電所	中国東幹線1L	中国東幹線1L705GCB臨時点検		変更	
0724491	中国	2028/03/11 09:00	2028/03/13 17:00	連続	東岡山変電所	西播東岡山線1L	西播東岡山線1L関係切替 【東岡山(変)DCS取替工事】		変更	
0724492	中国	2028/03/14 09:00	2028/03/16 17:00	連続	東岡山変電所	西播東岡山線2L	西播東岡山線2L関係切替 【東岡山(変)DCS取替工事】		変更	
0724515	中国	2028/03/18 07:30	2028/05/31 17:30	連続	新岡山幹線	新岡山幹線1L	新岡山幹線電線張替工事【2工区1L】		変更	
0724771	中国	2028/03/20 08:30	2028/03/24 17:30	毎日	新岡山変電所	新岡山幹線1L/500kV甲2母線/500kV乙2母線	新岡山幹線1L関係機器点検		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0818699	四国	2026/04/01 08:00	2026/06/05 19:00	連続	送電線	本四連系線1L	1. ケーブル接続部細密点検 2. ケーブル部内部点検 3. 電線路細密点検 4. 不良がい子検出 5. がいい子清掃 6. 鉄塔ボルト取替[腕金]		更新	
0818702	四国	2026/04/01 08:00	2026/04/01 17:30	単日	讃岐SS	本四連系線1L	本四連系線1L L-LS修繕		変更	
0819255	四国	2026/04/07 08:00	2026/04/09 18:00	連続	讃岐SS	本四連系線1L	本四連系線1L E-LS密閉箱電装品修繕		変更	
0817271	四国	2026/09/01 08:00	2026/10/07 19:30	連続	送電線	本四連系線2L	1. ケーブル接続部細密点検 2. 電線路細密点検 3. 不良がい子検出 4. がいい子清掃 5. 鉄塔ボルト取替[腕金]		更新	
0816966	四国	2026/09/15 08:30	2026/09/16 17:30	毎日	阿波SS	阿波幹線1L	阿波SS 橋湾系SCS取替工事 阿波幹線1Lケーブル切替		更新	
0817008	四国	2026/09/15 09:00	2026/09/16 17:00	毎日	讃岐SS	阿波幹線1L	【讃岐SS橋湾系SCS取替】SCS検出制御装置 阿波幹線1L 制御ケーブル切替(15日 A系、16日 B系)		更新	
0816975	四国	2026/09/15 17:30	2026/09/15 20:30	単日	阿波SS	阿波幹線1L	阿波SS 阿波幹線1Lリレー(A系)方向試験に伴う設備専有		更新	
0816977	四国	2026/09/16 17:30	2026/09/16 20:30	単日	阿波SS	阿波幹線1L	阿波SS 阿波幹線1Lリレー(B系)方向試験に伴う設備専有		更新	
0816967	四国	2026/09/17 08:30	2026/09/18 17:30	毎日	阿波SS	阿波幹線2L	阿波SS 橋湾系SCS取替工事 阿波幹線2Lケーブル切替		更新	
0817020	四国	2026/09/17 08:30	2026/09/18 18:00	連続	阿波SS	阿波幹線2L	阿波SS 阿波幹線2LGIS電装品修繕		更新	
0817009	四国	2026/09/17 09:00	2026/09/18 17:00	毎日	讃岐SS	阿波幹線2L	【讃岐SS橋湾系SCS取替】SCS検出制御装置 阿波幹線2L 制御ケーブル切替(18日 A系、19日 B系)		更新	
0816980	四国	2026/09/17 17:30	2026/09/17 20:30	単日	阿波SS	阿波幹線2L	阿波SS 阿波幹線2Lリレー(A系)方向試験に伴う設備専有		更新	
0816981	四国	2026/09/18 17:30	2026/09/18 20:30	単日	阿波SS	阿波幹線2L	阿波SS 阿波幹線2Lリレー(B系)方向試験に伴う設備専有		更新	
0818101	四国	2026/10/06 08:00	2026/10/07 17:00	連続	讃岐SS	本四連系線2L/No. 5ShR	【讃岐SS本四連系線OLR更新】ケーブル切替・確認試験		変更	
0817270	四国	2026/10/08 07:30	2026/10/08 17:30	単日	送電線	本四連系線1L	1. ケーブル接続部再点検		更新	
0818102	四国	2026/10/08 08:00	2026/10/08 15:00	単日	讃岐SS	本四連系線1L	【讃岐SS本四連系線OLR更新】ケーブル切替(SCSリセット信号取込、CT回路変更)		変更	
0817273	四国	2026/10/15 07:00	2026/10/16 17:00	毎日	讃岐SS	本四連系線1L	【讃岐SS橋湾系SPS,SCS取替】SPS中央判定装置,SCS検出制御装置 本四連系線1L 制御ケーブル切替		更新	
0816968	四国	2026/10/19 08:30	2026/10/20 17:30	毎日	阿波SS	南阿波幹線1L	阿波SS 橋湾系SCS取替工事 南阿波幹線1Lケーブル切替		更新	
0816970	四国	2026/10/19 08:30	2026/10/20 17:30	毎日	阿南CS	南阿波幹線1L	阿南CS 橋湾系SCS取替工事 南阿波幹線1Lケーブル切替		更新	
0816988	四国	2026/10/19 17:30	2026/10/19 20:30	単日	阿南CS	南阿波幹線1L	阿南CS 南阿波幹線1Lリレー(B系)方向試験に伴う設備専有		更新	
0816989	四国	2026/10/20 17:30	2026/10/20 20:30	単日	阿南CS	南阿波幹線1L	阿南CS 南阿波幹線1Lリレー(A系)方向試験に伴う設備専有		更新	
0816969	四国	2026/10/21 08:30	2026/10/22 17:30	毎日	阿波SS	南阿波幹線2L	阿波SS 橋湾系SCS取替工事 南阿波幹線2Lケーブル切替		更新	
0816971	四国	2026/10/21 08:30	2026/10/22 17:30	毎日	阿南CS	南阿波幹線2L	阿南CS 橋湾系SCS取替工事 南阿波幹線2Lケーブル切替		更新	
0816990	四国	2026/10/21 17:30	2026/10/21 20:30	単日	阿南CS	南阿波幹線2L	阿南CS 南阿波幹線2Lリレー(B系)方向試験に伴う設備専有		更新	
0817274	四国	2026/10/22 07:00	2026/10/23 17:00	毎日	讃岐SS	本四連系線2L/No. 5ShR	【讃岐SS橋湾系SPS,SCS取替】SPS中央判定装置,SCS検出制御装置 本四連系線2L 制御ケーブル切替		更新	
0816991	四国	2026/10/22 17:30	2026/10/22 20:30	単日	阿南CS	南阿波幹線2L	阿南CS 南阿波幹線2Lリレー(A系)方向試験に伴う設備専有		更新	
0818709	四国	2026/11/09 08:30	2026/11/15 17:30	連続	阿南CS	南阿波幹線1L	500kV交流GIS操作機構分解補修他(南阿波幹線1L)		更新	
0816356	四国	2026/11/10 08:30	2026/11/12 17:30	連続	阿波SS	南阿波幹線1L	【阿波変電所 南阿波幹線1LGIS電装品修繕】南阿波幹線1LGIS電装品(ハレット)修繕、スロークリッチ清掃		更新	
0816997	四国	2026/11/10 08:30	2026/11/13 17:30	毎日	送電線	南阿波幹線1L	腕金塗装 No.53～55 計3基		更新	
0816998	四国	2026/11/16 08:30	2026/11/19 17:30	毎日	送電線	南阿波幹線2L	腕金塗装 No.53～55 計3基		更新	
0818710	四国	2026/11/17 08:30	2026/11/23 17:30	連続	阿南CS	南阿波幹線2L	500kV交流GIS操作機構分解補修他(南阿波幹線2L)		更新	
0817269	四国	2027/02/10 08:00	2027/03/26 19:00	連続	送電線	本四連系線2L	1. ケーブル接続部細密点検 2. ケーブル部内部点検 3. 電線路細密点検 4. 不良がい子検出 5. がいい子清掃 6. 鉄塔ボルト取替[腕金] 7. 鉄塔防錆塗装[飛散防止]		更新	
0817562	四国	2027/02/16 08:00	2027/02/19 17:00	連続	送電線	本四連系線2L	児島CH GIS定期細密点検トランスデューサ定期点検		更新	
0818701	四国	2027/02/23 08:00	2027/02/26 17:00	連続	送電線	本四連系線2L	坂出CH GIS定期細密点検トランスデューサ定期点検		新規	
0818697	四国	2027/03/26 08:30	2027/03/26 17:00	単日	讃岐SS	本四連系線2L/No. 5ShR	【讃岐SS橋湾系SPS,SCS取替】SPS中央判定装置,SCS検出制御装置 本四連系線2L 制御ケーブル離線(CT回路変更有)		変更	
0819259	四国	2027/03/29 08:30	2027/03/29 17:00	単日	讃岐SS	本四連系線2L/No. 5ShR	【讃岐SS橋湾系SPS,SCS取替】SPS中央判定装置,SCS検出制御装置 本四連系線2L 制御ケーブル離線(CT回路変更有)		更新	
0818720	四国	2027/03/29 09:00	2027/04/02 17:30	連続	阿波SS	南阿波幹線1L	南阿波幹線1L(A系)リレー取替(レトロフィット)		更新	
0818725	四国	2027/03/29 09:00	2027/04/02 17:30	連続	阿南CS	南阿波幹線1L	南阿波幹線1L(A系)リレー取替(レトロフィット)		更新	
0818696	四国	2027/03/30 08:30	2027/03/31 17:00	毎日	讃岐SS	本四連系線1L	【讃岐SS橋湾系SPS,SCS取替】SPS中央判定装置,SCS検出制御装置 本四連系線1L 制御ケーブル離線・接続(CT回路変更有)		変更	
0818687	四国	2027/04/01 08:00	2027/06/30 09:00	連続	送電線	本四連系線1L	1. ケーブル張替 2. ケーブル接続部細密点検 3. ケーブル内部点検 4. 電線路細密点検 5. 不良がい子検出 6. がいい子清掃 7. 鉄塔ボルト取替[腕金] 8. 鉄塔防錆塗装[飛散防止]		新規	
0818777	四国	2027/04/05 09:00	2027/04/09 17:30	連続	阿波SS	南阿波幹線1L	南阿波幹線1L(B系)リレー取替(レトロフィット)		新規	
0818778	四国	2027/04/05 09:00	2027/04/09 17:30	連続	阿南CS	南阿波幹線1L	南阿波幹線1L(B系)リレー取替(レトロフィット)		変更	
0818761	四国	2027/04/12 09:00	2027/04/16 17:30	連続	阿南CS	南阿波幹線2L	南阿波幹線2L(A系)リレー取替(レトロフィット)		変更	
0818776	四国	2027/04/12 09:00	2027/04/16 17:30	連続	阿波SS	南阿波幹線2L	南阿波幹線2L(A系)リレー取替(レトロフィット)		新規	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0818779	四国	2027/04/19 09:00	2027/04/23 17:30	連続	阿南CS	南阿波幹線2L	南阿波幹線2L(B系)リレー取替(レトロフィット)		変更	
0818780	四国	2027/04/19 09:00	2027/04/23 17:30	連続	阿波SS	南阿波幹線2L	南阿波幹線2L(B系)リレー取替(レトロフィット)		新規	
0818758	四国	2027/04/21 09:00	2027/04/21 16:30	単日	讃岐SS	阿波幹線1L	【讃岐SS橋湾系SPS,SCS取替】SPS中央判定装置,SCS検出制御装置 阿波幹線1L 制御ケーブル離線		新規	
0818759	四国	2027/04/22 09:00	2027/04/22 16:30	単日	讃岐SS	阿波幹線2L	【讃岐SS橋湾系SPS,SCS取替】SPS中央判定装置,SCS検出制御装置 阿波幹線2L 制御ケーブル撤去		新規	
0818784	四国	2027/04/27 09:00	2027/04/28 17:00	毎日	電発橋湾PS	橋湾火力線2L	SCS除却(制御ケーブル切替、確認試験)		新規	
0818693	四国	2027/05/10 08:00	2027/05/13 17:00	連続	送電線	本四連系統1L	児島CH GIS定期細密点検		新規	
0818762	四国	2027/05/10 08:30	2027/05/11 17:30	毎日	阿波SS	阿波幹線1L	阿波SS 橋湾系SCS除却工事 阿波幹線1Lケーブル切替		新規	
0818763	四国	2027/05/10 17:30	2027/05/10 20:30	単日	阿波SS	阿波幹線1L	阿波SS 阿波幹線1Lリレー(A系)方向試験に伴う設備専有		新規	
0818764	四国	2027/05/11 17:30	2027/05/11 20:30	単日	阿波SS	阿波幹線1L	阿波SS 阿波幹線1Lリレー(B系)方向試験に伴う設備専有		新規	
0818698	四国	2027/05/12 08:00	2027/05/15 18:00	連続	讃岐SS	本四連系統1L	本四連係線1L GIS・L-LS細密点検、丙丁LS細密点検		変更	
0818765	四国	2027/05/12 08:30	2027/05/13 17:30	毎日	阿波SS	阿波幹線2L	阿波SS 橋湾系SCS除却工事 阿波幹線2Lケーブル切替		新規	
0818766	四国	2027/05/12 17:30	2027/05/12 20:30	単日	阿波SS	阿波幹線2L	阿波SS 阿波幹線2Lリレー(A系)方向試験に伴う設備専有		新規	
0818767	四国	2027/05/13 17:30	2027/05/13 20:30	単日	阿波SS	阿波幹線2L	阿波SS 阿波幹線2Lリレー(B系)方向試験に伴う設備専有		新規	
0818694	四国	2027/05/17 08:00	2027/05/20 17:00	連続	送電線	本四連系統1L	坂出CH GIS定期細密点検		新規	
0818783	四国	2027/05/19 08:30	2027/05/20 17:30	毎日	阿南CS	橋湾火力線2L	阿南CS 橋湾系SCS除却工事 橋湾火力線2Lケーブル切替		新規	
0818768	四国	2027/05/21 08:30	2027/05/22 17:30	毎日	阿波SS	南阿波幹線1L	阿波SS 橋湾系SCS除却工事 南阿波幹線1Lケーブル離線		新規	
0818775	四国	2027/05/21 08:30	2027/05/21 17:30	単日	阿南CS	南阿波幹線1L	阿南CS 橋湾系SCS、SPS除却工事 南阿波幹線1Lケーブル切替		新規	
0818769	四国	2027/05/21 17:30	2027/05/21 20:30	単日	阿南CS	南阿波幹線1L	阿南CS 南阿波幹線1Lリレー(A系)方向試験に伴う設備専有		新規	
0818770	四国	2027/05/22 17:30	2027/05/22 20:30	単日	阿南CS	南阿波幹線1L	阿南CS 南阿波幹線1Lリレー(B系)方向試験に伴う設備専有		新規	
0818771	四国	2027/05/24 08:30	2027/05/25 17:30	毎日	阿波SS	南阿波幹線2L	阿波SS 橋湾系SCS除却工事 南阿波幹線2Lケーブル離線		新規	
0818772	四国	2027/05/24 08:30	2027/05/25 17:30	毎日	阿南CS	南阿波幹線2L	阿南CS 橋湾系SCS、SPS除却工事 南阿波幹線2Lケーブル切替		新規	
0818773	四国	2027/05/24 17:30	2027/05/24 20:30	単日	阿南CS	南阿波幹線2L	阿南CS 南阿波幹線2Lリレー(A系)方向試験に伴う設備専有		新規	
0818774	四国	2027/05/25 17:30	2027/05/25 20:30	単日	阿南CS	南阿波幹線2L	阿南CS 南阿波幹線2Lリレー(B系)方向試験に伴う設備専有		新規	
0818690	四国	2027/06/30 09:00	2027/06/30 17:00	単日	送電線	本四連系統1L	1. ケーブル張替に伴う絶縁耐力他試験		新規	
0818781	四国	2027/10/04 08:30	2027/10/15 17:30	毎日	送電線	南阿波幹線1L	ジャンパ線他点検 No.64,68,69,71～73,75,76 計8基 腕金塗装 南阿波幹線 No.76～78 計3基		新規	
0818691	四国	2027/10/19 07:30	2027/10/19 17:30	単日	送電線	本四連系統1L	1. ケーブル接続部再点検		新規	
0818756	四国	2027/10/19 08:30	2027/10/20 17:30	連続	阿南CS	南阿波幹線1L	【交流DAC盤他取替工事】制御ケーブル切替・試験(南阿波幹線1L)		新規	
0818692	四国	2027/10/20 07:30	2027/10/20 13:30	単日	送電線	本四連系統2L	1. ケーブル接続部再点検		新規	
0818782	四国	2027/10/20 08:30	2027/10/29 17:30	毎日	送電線	南阿波幹線2L	ジャンパ線他点検 No.64,68,69,71～73,75,76 計8基 腕金塗装 南阿波幹線 No.76～78 計3基		新規	
0818757	四国	2027/10/21 08:30	2027/10/22 17:30	連続	阿南CS	南阿波幹線2L	【交流DAC盤他取替工事】制御ケーブル切替・試験(南阿波幹線2L)		新規	
0818760	四国	2027/11/10 08:30	2027/11/12 17:30	連続	阿波SS	南阿波幹線2L	【阿波変電所 南阿波幹線2LGIS電装品修繕】南阿波幹線2LGIS電装品(ハレット以外)修繕、スローリーク清掃		新規	
0818695	四国	2028/02/17 08:00	2028/03/17 19:00	連続	送電線	本四連系統2L	1. ケーブル接続部細密点検 2. 接続箱残可動代確保 3. 電線路細密点検 4. 不良がい子検出 5. がい子清掃 6. 鉄塔ボルト取替[腕金] 7. 鉄塔防錆塗装[飛散防止]		変更	
0818688	四国	2028/03/01 08:00	2028/03/03 17:00	連続	送電線	本四連系統2L	児島CH リアクトル制御盤改造(遠方制御機能追加)		変更	
0818689	四国	2028/03/07 08:00	2028/03/09 17:00	連続	送電線	本四連系統2L	坂出CH リアクトル制御盤改造(遠方制御機能追加)		変更	
0818785	四国	2028/03/20 05:00	2028/03/29 20:00	連続	阿南CS	直流幹線2L/直流幹線2L/No. 2変換用Tr/2群交流フィルタ	2極変換設備普通点検、2極設備普通点検、2群変TR普点、電動操作機構電装品修繕、Bgガス分析他		変更	
0818787	四国	2028/03/20 08:00	2028/03/27 17:00	連続	阿南CS	No. 2調相用Tr/No. 2-1SC/No. 2-2SC/No. 2ShR	【No.2調Tr保護装置他取替工事】制御ケーブル切替・試験(No.2調Tr, No.2SC・ShR)		変更	
0818788	四国	2028/03/21 08:30	2028/03/21 17:30	単日	阿南CS	No. 2変換用Tr	No.2変換用TR1次ZLS操作機構部修繕		変更	
0818786	四国	2028/03/23 08:00	2028/03/24 18:00	連続	阿南CS	No. 2調相用Tr	No.2調TR2次,3次,SC,SHRGIS操作箱電装品修繕 No.21,22SC, No.2SHR保護トリップ試験他		変更	

広域調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0935959	九州	2026/04/09 08:00	2026/04/27 17:00	連続	北九州ss	北九州ss 500kV 関門連系線 43WTF A・43WTFB [ロック]	500kV関門連系線連続停止に伴う北九州ss周波数上昇対策システム起動装置ロック		変更	
0936493	九州	2026/04/09 08:00	2026/04/22 18:00	連続	500kV 関門連系線1L	500kV 関門連系線1L	関門連系線(JPTN)送電線補修工事(1号線)		変更	
0936497	九州	2026/04/09 09:00	2026/04/22 17:00	連続	北九州ss	北九州ss 500kV 関門連系線1L	北九州ss500kVVGIS取替工事(関門連系線1L付近の杭打設工事)		変更	
0936512	九州	2026/04/09 09:00	2026/04/22 17:00	連続	500kV 関門連系線1L[予防停止]	500kV 関門連系線1L[予防停止]	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		変更	
0936498	九州	2026/04/13 09:00	2026/04/13 17:00	単日	北九州ss	北九州ss 50-30[加圧停止]/北九州ss 500kV 関門連系線1L UF盤/北九州ss 転送遮断装置 起動装置(A)443JA [ロック]/北九州ss SSC起動装置(B)443JB [ロック]/北九州ss SSC起動装置(A)443JA [ロック]/北九州ss 転送遮断装置 起動装置(B)443JB [ロック]	北九州ss 関門連系線周波数分離1L 動作試験を行う。 ・機構点検 ・継電器特性試験(タイマー) ・模擬故障試験 ・遮断器結合試験 ・電圧電流測定 以上		変更	
0936494	九州	2026/04/14 09:00	2026/04/27 17:00	連続	500kV 関門連系線1L	500kV 関門連系線1L	関門連系線電線精密点検(1L)		変更	
0935960	九州	2026/05/08 08:00	2026/05/26 17:00	連続	北九州ss	北九州ss 500kV 関門連系線 43WTF A・43WTFB [ロック]	500kV関門連系線連続停止に伴う北九州ss周波数上昇対策システム起動装置ロック		変更	
0936495	九州	2026/05/08 08:00	2026/05/21 18:00	連続	500kV 関門連系線2L	500kV 関門連系線2L	関門連系線(JPTN)送電線補修工事(2号線)		変更	
0936499	九州	2026/05/08 09:00	2026/05/21 17:00	連続	北九州ss	北九州ss 500kV 関門連系線2L	北九州ss500kVVGIS取替工事(関門連系線2L付近の杭打設工事)		変更	
0936513	九州	2026/05/08 09:00	2026/05/21 17:00	連続	500kV 関門連系線2L[予防停止]	500kV 関門連系線2L[予防停止]	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		変更	
0936500	九州	2026/05/11 09:00	2026/05/11 17:00	単日	北九州ss	北九州ss 50-40[加圧停止]/北九州ss 500kV 関門連系線2L UF盤/北九州ss 転送遮断装置 起動装置(A)543JA [ロック]/北九州ss 転送遮断装置 起動装置(B)543JB [ロック]/北九州ss SSC起動装置(A)543JA [ロック]/北九州ss SSC起動装置(B)543JB [ロック]	北九州ss 関門連系線周波数分離2L 動作試験を行う。 ・機構点検 ・継電器特性試験(タイマー) ・模擬故障試験 ・遮断器結合試験 ・電圧電流測定 以上		変更	
0936496	九州	2026/05/12 09:00	2026/05/26 17:00	連続	500kV 関門連系線2L	500kV 関門連系線2L	関門連系線電線精密点検(2L)		変更	
0935961	九州	2027/04/09 09:00	2027/04/22 17:00	連続	北九州ss	北九州ss 500kV 関門連系線 43WTF A・43WTFB [ロック]	500kV関門連系線連続停止に伴う北九州ss周波数上昇対策システム起動装置ロック		変更	
0936501	九州	2027/04/09 09:00	2027/04/22 17:00	連続	500kV 関門連系線1L	500kV 関門連系線1L	関門連系線電線精密点検(1L)		変更	
0936502	九州	2027/04/09 09:00	2027/04/22 17:00	連続	500kV 関門連系線1L	500kV 関門連系線1L	関門連系線(JPTN)送電線補修工事(1号線)		変更	
0936510	九州	2027/04/09 09:00	2027/04/22 17:00	連続	500kV 関門連系線1L[予防停止]	500kV 関門連系線1L[予防停止]	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		変更	
0935962	九州	2027/05/11 08:30	2027/05/24 17:00	連続	北九州ss	北九州ss 500kV 関門連系線 43WTF A・43WTFB [ロック]	500kV関門連系線連続停止に伴う北九州ss周波数上昇対策システム起動装置ロック		変更	
0936504	九州	2027/05/11 09:00	2027/05/24 17:00	連続	500kV 関門連系線2L	500kV 関門連系線2L	関門連系線電線精密点検(2L)		変更	
0936505	九州	2027/05/11 09:00	2027/05/24 17:00	連続	500kV 関門連系線2L	500kV 関門連系線2L	関門連系線(JPTN)送電線補修工事(2号線)		変更	
0936511	九州	2027/05/11 09:00	2027/05/24 17:00	連続	500kV 関門連系線2L[予防停止]	500kV 関門連系線2L[予防停止]	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		変更	
0936503	九州	2028/03/17 09:00	2028/05/29 17:00	連続	500kV 関門連系線1L	500kV 関門連系線1L	関門連系線(JPTN)送電線補修工事(1号線)		変更	
0936524	九州	2028/03/17 09:00	2028/05/29 17:00	連続	北九州ss	北九州ss 500kV 関門連系線 43WTF A・43WTFB [ロック]	500kV関門連系線連続停止に伴う北九州ss周波数上昇対策システム起動装置ロック		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0124767	北海道	2026/04/02 09:00	2026/04/14 17:00	連続	追分線(追分・南早来)	追分線(追分・南早来) 1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124561	北海道	2026/04/13 09:00	2026/04/17 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 1L	SRリング取替		変更	
0124472	北海道	2026/04/14 10:00	2026/04/14 12:00	単日	西野変電所	西野変電所 104<西小樽線2号線>	104CB 無停電点検		変更	
0126543	北海道	2026/04/14 10:00	2026/04/14 12:00	単日	西小樽変電所	西小樽変電所 102<西小樽線2号線>	102CB 無停電点検		変更	
0126542	北海道	2026/04/14 13:00	2026/04/14 14:00	単日	西小樽変電所	西小樽変電所 101<西小樽線1号線>	101CB 無停電点検		変更	
0124576	北海道	2026/04/20 09:00	2026/04/24 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 2L	SRリング取替		変更	
0124479	北海道	2026/04/21 09:00	2026/04/22 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124480	北海道	2026/04/23 09:00	2026/04/24 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0122199	北海道	2026/04/24 15:00	2026/04/24 16:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 101<釧路北線1号線>	新14甲試加圧		変更	
0122210	北海道	2026/04/27 09:00	2026/04/28 17:00	毎日	奈井江幹線(北江別・西奈井江)	奈井江幹線(北江別・西奈井江) 1L	感温シール取付		変更	
0122200	北海道	2026/04/27 15:00	2026/04/27 16:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 101<釧路北線1号線>	新14乙試加圧		変更	
0126536	北海道	2026/04/30 09:00	2026/05/01 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	複導体スベーサ取替		変更	
0126746	北海道	2026/05/06 09:00	2026/05/22 17:00	連続	追分線(追分・南早来)	追分線(追分・南早来) 1L	鉄塔防錆塗装		新規	
0126537	北海道	2026/05/07 09:00	2026/05/08 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	複導体スベーサ取替		変更	
0127605	北海道	2026/05/07 09:00	2026/05/07 17:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 102<釧路北線2号線>	187kV乙母線延長(新連変B母線部)に伴う隣接回線停止		新規	
0127606	北海道	2026/05/07 17:00	2026/05/07 17:30	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 101<釧路北線1号線>	187kV乙母線(新連変B母線部)試加圧		新規	
0127608	北海道	2026/05/08 09:00	2026/05/08 17:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 102<釧路北線2号線>	187kV甲母線延長(新連変B母線部)に伴う隣接回線停止		新規	
0127609	北海道	2026/05/08 17:00	2026/05/08 17:30	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 101<釧路北線1号線>	187kV甲母線(新連変B母線部)試加圧		新規	
0126648	北海道	2026/05/12 09:00	2026/05/15 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 1L	鉄塔防錆塗装		新規	
0124550	北海道	2026/05/14 11:00	2026/05/14 13:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所101<釧路北線1号線>	連変B絶縁耐力試験【使用前自主検査】		変更	
0124552	北海道	2026/05/14 13:00	2026/05/14 14:30	単日	東釧路変電所	東釧路変電所101<釧路北線1号線>	低圧換相		変更	
0124501	北海道	2026/05/18 08:00	2026/06/01 17:00	連続	(電発)新得追分線(北新得・追分)	(電発)新得追分線(北新得・追分) 1L	電線補修工事		変更	
0126641	北海道	2026/05/18 09:00	2026/05/22 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 1L	鉄塔防錆塗装		新規	
0126649	北海道	2026/05/18 09:00	2026/05/21 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 1L	鉄塔防錆塗装		新規	
0124506	北海道	2026/05/19 09:00	2026/05/22 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 2L	【難着雪リング取替】		変更	
0126465	北海道	2026/05/19 09:00	2026/05/21 16:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 2L	アークホーン捻れ補修		変更	
0124507	北海道	2026/05/19 10:00	2026/05/19 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 112<南九条線2号線>	112CB 一般点検		変更	
0127611	北海道	2026/05/20 09:00	2026/05/20 17:30	単日	春別開閉所	春別開閉所 187kV母線	運用停止		変更	
0124513	北海道	2026/05/21 09:00	2026/05/21 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 101<篠路線1号線>	101CB 無停電点検		変更	
0124515	北海道	2026/05/22 09:00	2026/05/22 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 102<篠路線2号線>	102CB 無停電点検		変更	
0126650	北海道	2026/05/22 09:00	2026/05/22 17:00	単日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 2L	鉄塔防錆塗装		新規	
0124519	北海道	2026/05/25 09:00	2026/05/26 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124671	北海道	2026/05/25 09:00	2026/05/28 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	地線金具取替		変更	
0126651	北海道	2026/05/25 09:00	2026/05/29 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 2L	鉄塔防錆塗装		新規	
0126464	北海道	2026/05/26 09:00	2026/05/28 16:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 1L	アークホーン捻れ補修		変更	
0124490	北海道	2026/05/26 10:00	2026/05/29 18:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 1L	難着雪リング取替		変更	
0124494	北海道	2026/05/28 10:00	2026/05/28 17:00	単日	苫小牧変電所	苫小牧変電所 103<室蘭東幹線1号線>	103TL 通信LT撤去に伴う上母線修繕(赤・白相)		変更	
0124503	北海道	2026/06/01 09:00	2026/06/05 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0126654	北海道	2026/06/01 09:00	2026/06/04 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 2L	鉄塔防錆塗装		新規	
0124560	北海道	2026/06/08 09:00	2026/06/09 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124673	北海道	2026/06/08 09:00	2026/06/10 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 2L	地線金具取替		変更	
0126529	北海道	2026/06/08 09:00	2026/06/12 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 2L	SRリング取替		新規	
0124577	北海道	2026/06/08 10:00	2026/06/12 17:00	毎日	北幌延線(西名寄・西中川)	北幌延線(西名寄・西中川) 1L	捻れ防止ダンパ取替		変更	
0124575	北海道	2026/06/13 09:00	2026/06/20 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124802	北海道	2026/06/15 09:00	2026/06/30 17:00	連続	追分線(追分・南早来)	追分線(追分・南早来) 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0126528	北海道	2026/06/15 09:00	2026/06/19 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 1L	SRリング取替		変更	
0124597	北海道	2026/06/15 10:00	2026/06/19 17:00	毎日	北幌延線(西名寄・西中川)	北幌延線(西名寄・西中川) 2L	捻れ防止ダンパ取替		変更	
0124657	北海道	2026/06/16 09:00	2026/06/16 17:00	単日	日勝幹線(北新得・新冠SWS)	日勝幹線(北新得・新冠SWS) 2L	直線スリーブ改修		変更	
0126655	北海道	2026/06/16 09:00	2026/06/19 17:00	毎日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 1L	鉄塔防錆塗装		新規	
0124474	北海道	2026/06/16 10:00	2026/06/16 10:10	単日	南早来変電所	南早来変電所 211<狩勝幹線1号線>	211CB 無停電点検		変更	
0124602	北海道	2026/06/16 16:30	2026/06/18 17:00	毎日	宇門別変電所	宇門別変電所 187kV乙母線	187kV乙母線試加圧		変更	
0126495	北海道	2026/06/17 09:00	2026/06/17 17:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	相順確認		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0126496	北海道	2026/06/18 09:00	2026/06/18 17:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	相順確認		新規	
0124590	北海道	2026/06/18 18:00	2026/06/18 19:00	単日	西札幌変電所	西札幌変電所／103<室蘭西幹線1号線>／187KV甲母線	24甲試加圧		変更	
0124593	北海道	2026/06/19 18:00	2026/06/19 19:00	単日	西札幌変電所	西札幌変電所／104<室蘭西幹線2号線>／187KV乙母線	24乙試加圧		変更	
0124595	北海道	2026/06/21 09:00	2026/06/21 17:00	単日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0126659	北海道	2026/06/22 09:00	2026/06/25 17:00	毎日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0127598	北海道	2026/06/22 09:00	2026/06/22 17:00	単日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 2L	鉄塔防錆塗装		新規	
0126214	北海道	2026/06/22 10:00	2026/06/22 11:00	単日	北新得変電所	北新得変電所 202<狩勝幹線2号線>	202CB定期点検(無停電点検)		変更	
0124611	北海道	2026/06/23 09:00	2026/06/23 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 113<追分線1号線>	高速後備保護継電器盤設置に伴う既設Ry盤改造		変更	
0127599	北海道	2026/06/23 09:00	2026/06/28 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 2L	鉄塔防錆塗装		新規	
0124475	北海道	2026/06/23 10:20	2026/06/23 10:30	単日	南早来変電所	南早来変電所 212<狩勝幹線2号線>	212CB 無停電点検		変更	
0124614	北海道	2026/06/24 09:00	2026/06/24 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 114<追分線2号線>	高速後備保護継電器盤設置に伴う既設Ry盤改造		変更	
0124617	北海道	2026/06/26 14:00	2026/06/26 15:00	単日	西札幌変電所	西札幌変電所 187KV甲母線／101<西札幌線1号線>	187kV連変D使用前自主検査(絶縁耐力試験)		変更	
0127616	北海道	2026/06/29 09:00	2026/06/30 17:00	毎日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 2L	鉄塔防錆塗装		新規	
0126764	北海道	2026/06/30 09:00	2026/07/03 17:00	毎日	西旭川変電所	西旭川変電所 173<名寄幹線1L(旭川・旭川)＞	174CB基礎作成		変更	
0124628	北海道	2026/07/02 09:00	2026/07/03 17:00	毎日	道央西幹線(西双葉・西野)	道央西幹線(西双葉・西野) 1L	地線金具取替		変更	
0124629	北海道	2026/07/02 09:00	2026/07/02 17:00	単日	北芽室変電所	北芽室変電所 101<岩松西線1号線>	101CB 外部点検・測定試験・保全		変更	
0124468	北海道	2026/07/02 10:00	2026/07/02 12:00	単日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 205<道央西幹線1号線>	205CB 無停電点検		変更	
0124630	北海道	2026/07/03 09:00	2026/07/03 17:00	単日	北芽室変電所	北芽室変電所 102<岩松西線2号線>	102CB 外部点検・測定試験・保全		変更	
0124637	北海道	2026/07/06 09:00	2026/07/07 17:00	毎日	道央西幹線(西双葉・西野)	道央西幹線(西双葉・西野) 2L	地線金具取替		変更	
0126747	北海道	2026/07/06 09:00	2026/07/18 17:00	連続	追分線(追分・南早来)	追分線(追分・南早来) 2L	鉄塔防錆塗装		新規	
0124469	北海道	2026/07/06 13:00	2026/07/06 15:00	単日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 206<道央西幹線2号線>	206CB 無停電点検		変更	
0124639	北海道	2026/07/07 10:00	2026/07/07 12:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 103<西春別線1号線>	103CB 無停電点検		変更	
0124640	北海道	2026/07/07 13:00	2026/07/07 15:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 104<西春別線2号線>	104CB 無停電点検		変更	
0124646	北海道	2026/07/13 09:00	2026/07/17 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) (力)2L	相間スベークランプ取替		変更	
0124527	北海道	2026/07/14 09:00	2026/07/15 17:00	毎日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	電線点検		変更	
0127386	北海道	2026/07/17 17:00	2026/07/17 18:00	単日	西小樽変電所	101<西小樽線1号線>／187kV甲母線	新17甲試加圧		新規	
0124653	北海道	2026/07/21 09:00	2026/07/22 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 1L	予防停電		変更	
0124654	北海道	2026/07/21 09:00	2026/07/22 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	地線金具取替		変更	
0126324	北海道	2026/07/21 09:00	2026/07/22 17:00	毎日	北新得変電所	北新得変電所 113<道東幹線1号線>	ケーブルビットコア抜きに伴う予防停電(GIS側)	制約有	変更	
0126593	北海道	2026/07/21 09:00	2026/07/22 17:00	毎日	道東幹線(北新得・宇円別)	道東幹線(北新得・宇円別) 1L	不良端子検出	制約有	変更	
0124669	北海道	2026/07/23 09:00	2026/07/24 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 2L	予防停電		変更	
0124670	北海道	2026/07/23 09:00	2026/07/24 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	地線金具取替		変更	
0126583	北海道	2026/07/23 09:00	2026/07/24 17:00	毎日	北新得変電所	北新得変電所 114<道東幹線2号線>	ケーブルビットコア抜きに伴う予防停電(GIS側)	制約有	変更	
0126594	北海道	2026/07/23 09:00	2026/07/24 17:00	毎日	道東幹線(北新得・宇円別)	道東幹線(北新得・宇円別) 2L	不良端子検出	制約有	変更	
0127387	北海道	2026/07/24 11:00	2026/07/24 14:00	単日	西小樽変電所	101<西小樽線1号線>／187kV甲母線	新連変C 絶縁耐力試験		新規	
0127388	北海道	2026/07/24 14:00	2026/07/24 14:30	単日	西小樽変電所	101<西小樽線1号線>／187kV乙母線	低圧検相		新規	
0127389	北海道	2026/07/24 14:30	2026/07/24 15:30	単日	西小樽変電所	101<西小樽線1号線>／187kV甲母線	潮流測定		新規	
0124491	北海道	2026/07/28 09:00	2026/07/28 17:00	単日	北江別変電所	北江別変電所 103<南札幌幹線1号線>	103CB外部点検・測定試験		変更	
0124566	北海道	2026/07/28 09:00	2026/07/29 17:00	毎日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	電線点検		変更	
0126325	北海道	2026/07/28 09:00	2026/07/29 17:00	毎日	北新得変電所	北新得変電所 113<道東幹線1号線>	ケーブルビットコア抜きに伴う予防停電(オープン側)	制約有	変更	
0126804	北海道	2026/07/28 09:00	2026/07/29 17:00	毎日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 2L	運用停止		変更	
0124497	北海道	2026/07/29 09:00	2026/07/29 17:00	単日	北江別変電所	北江別変電所 104<南札幌幹線2号線>	104CB外部点検・測定試験		変更	
0126584	北海道	2026/07/30 09:00	2026/07/31 17:00	毎日	北新得変電所	北新得変電所 114<道東幹線2号線>	ケーブルビットコア抜きに伴う予防停電(オープン側)	制約有	変更	
0127363	北海道	2026/08/05 09:00	2026/08/05 17:30	単日	春別開閉所	春別開閉所 187kV母線	運用停止		変更	
0124674	北海道	2026/08/07 09:00	2026/08/07 17:00	単日	双葉幹線(苫小牧SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧SS・双葉) 1L	電線劣化診断		変更	
0124648	北海道	2026/08/10 08:00	2026/08/15 18:00	連続	西野変電所	西野変電所 205<道央西幹線1号線>	205CB 一般点検・内部点検・保全		変更	
0124631	北海道	2026/08/17 08:00	2026/08/22 18:00	連続	西野変電所	西野変電所 203<道央北幹線1号線>	203CB 一般点検・内部点検・油圧シリンダー取替		変更	
0124675	北海道	2026/08/17 08:00	2026/09/05 17:00	連続	(電発)恵庭南札幌線(南札幌・恵庭)	(電発)恵庭南札幌線(南札幌・恵庭) 1L	電線路細密点検		変更	
0124695	北海道	2026/08/18 09:00	2026/09/17 14:00	連続	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 1L	電線地線張替(がいし取替含む)		変更	
0122219	北海道	2026/08/26 09:30	2026/08/26 16:00	単日	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 104<室蘭西幹線2号線(室蘭)>	104CB 外部点検・測定試験		変更	
0124700	北海道	2026/09/01 09:00	2026/09/02 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124713	北海道	2026/09/03 09:00	2026/09/04 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124715	北海道	2026/09/03 09:00	2026/09/03 17:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 103<名寄幹線1L(旭川・旭川)＞	遠方監視制御装置取替		変更	
0124718	北海道	2026/09/04 09:00	2026/09/04 17:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 104<名寄幹線2L(旭川・旭川)＞	遠方監視制御装置取替		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0124721	北海道	2026/09/07 08:00	2026/09/26 17:00	連続	(電発)恵庭南札線(南札幌・恵庭)	(電発)恵庭南札線(南札幌・恵庭) 2L	電線路細密点検		変更	
0124724	北海道	2026/09/07 09:00	2026/09/11 17:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	AGクランプ取替		変更	
0124726	北海道	2026/09/07 09:00	2026/09/07 17:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 107<旭川南線1L>	遠方監視制御装置取替		変更	
0124730	北海道	2026/09/08 09:00	2026/09/11 17:00	連続	南早来変電所	南早来変電所 208<道央南幹線2号線>	208CB一般点検		変更	
0124732	北海道	2026/09/08 09:00	2026/09/08 17:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 108<旭川南線2L>	遠方監視制御装置取替		変更	
0126695	北海道	2026/09/09 09:00	2026/09/09 17:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 1L	不良端子検出		新規	
0124738	北海道	2026/09/14 08:00	2026/09/16 18:00	連続	西旭川変電所	西旭川変電所 173<名寄幹線1L(旭川嵐山・西旭川)>	173CB据付		変更	
0124746	北海道	2026/09/14 09:00	2026/09/18 17:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	AGクランプ取替		変更	
0124750	北海道	2026/09/15 09:00	2026/09/16 17:00	毎日	釧路北線(宇田別・東釧路)	釧路北線(宇田別・東釧路) 2L	電力線復元		変更	
0124751	北海道	2026/09/15 09:00	2026/09/15 17:00	単日	宇田別変電所	宇田別変電所 104<釧路北線2号線>	ライントラップ撤去:青相		変更	
0126571	北海道	2026/09/15 09:00	2026/09/15 17:00	単日	宇田別変電所	宇田別変電所 104<釧路北線2号線>	結合装置撤去(白相)		新規	
0126696	北海道	2026/09/15 09:00	2026/09/18 17:00	連続	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	設備点検		新規	
0124757	北海道	2026/09/16 09:00	2026/09/16 17:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 102<釧路北線2号線>	ライントラップ他撤去:青相、白相		変更	
0127590	北海道	2026/09/16 18:00	2026/10/05 09:00	連続	西旭川変電所	西旭川変電所 173<名寄幹線1L(旭川嵐山・西旭川)>	173CB据付調整		新規	
0124701	北海道	2026/09/17 09:00	2026/09/17 17:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 101<道北幹線1L>	遠方監視制御装置取替		変更	
0124773	北海道	2026/09/17 14:00	2026/09/17 15:30	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 1L	絶縁抵抗測定		変更	
0124774	北海道	2026/09/17 15:30	2026/09/17 16:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 1L	絶縁耐力試験		変更	
0124709	北海道	2026/09/18 09:00	2026/09/18 17:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 102<道北幹線2L>	遠方監視制御装置取替		変更	
0124596	北海道	2026/09/20 09:00	2026/09/26 17:00	連続	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	鉄塔防錆塗装		変更	
0124800	北海道	2026/09/23 09:00	2026/09/25 17:00	毎日	日勝幹線(北新得・新冠SWS)	日勝幹線(北新得・新冠SWS) 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124853	北海道	2026/09/24 09:00	2026/09/25 17:00	毎日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	鉄塔組立に伴う予防停電		変更	
0124783	北海道	2026/09/25 09:00	2026/10/30 14:00	連続	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 2L	電線地線張替(がいし取替含む)		変更	
0124769	北海道	2026/09/28 08:00	2026/09/30 17:00	毎日	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭)	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭) 1L	鉄塔防錆塗装工事		変更	
0124607	北海道	2026/09/28 09:00	2026/10/03 17:00	連続	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	鉄塔防錆塗装		変更	
0124770	北海道	2026/09/28 09:00	2026/10/02 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0127591	北海道	2026/09/29 08:00	2026/09/29 18:00	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 173<名寄幹線1L(旭川嵐山・西旭川)>	旧173CB撤去		新規	
0124771	北海道	2026/09/29 09:00	2026/09/29 17:00	単日	西春別変電所	西春別変電所 101<西春別線1号線>	101CB外部点検、測定試験		変更	
0124789	北海道	2026/09/30 08:00	2026/10/01 17:00	毎日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	着雪検知装置新設		変更	
0124777	北海道	2026/09/30 09:00	2026/09/30 17:00	単日	西春別変電所	西春別変電所 102<西春別線2号線>	102CB外部点検、測定試験		変更	
0124781	北海道	2026/10/01 08:00	2026/10/03 17:00	毎日	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭)	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭) 2L	鉄塔防錆塗装工事		変更	
0124782	北海道	2026/10/05 08:00	2026/10/10 17:00	毎日	(電発)新得追分線(北新得・追分)	(電発)新得追分線(北新得・追分) 2L	電線補修工事		変更	
0126806	北海道	2026/10/05 08:00	2026/10/10 17:00	毎日	(電発)新得追分線(北新得・追分)	(電発)新得追分線(北新得・追分) 2L	電線路細密点検		新規	
0124620	北海道	2026/10/05 09:00	2026/10/10 17:00	連続	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	鉄塔防錆塗装		変更	
0124759	北海道	2026/10/05 09:00	2026/10/09 17:00	連続	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 105<名寄幹線1L(旭川嵐山・西旭川)>	105保護継電器盤取替(主・後備)		変更	
0124760	北海道	2026/10/05 09:00	2026/10/09 17:00	連続	西旭川変電所	西旭川変電所 173<名寄幹線1L(旭川嵐山・西旭川)>	173保護継電器盤取替(主・後備)		変更	
0124761	北海道	2026/10/05 09:00	2026/10/09 17:00	連続	西旭川変電所	西旭川変電所 173<名寄幹線1L(旭川嵐山・西旭川)>	リード線・制御ケーブル接続		変更	
0124786	北海道	2026/10/05 09:00	2026/10/08 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0126409	北海道	2026/10/07 09:00	2026/10/08 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 2L	73号鉄塔 新着雪検知装置新設		新規	
0124795	北海道	2026/10/07 13:00	2026/10/07 13:30	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 171<旭川幹線1L>	173CB 試加圧		変更	
0124796	北海道	2026/10/07 13:30	2026/10/07 14:00	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 171<旭川幹線1L>	173CB 潮流測定		変更	
0124534	北海道	2026/10/08 10:00	2026/10/08 16:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 105<名寄幹線1L(旭川嵐山・西旭川)>	105CB点検(外部・測定)		変更	
0124797	北海道	2026/10/13 09:00	2026/10/15 17:00	毎日	西旭川変電所	西旭川変電所 174<名寄幹線2L(旭川嵐山・西旭川)>	174CB据付		変更	
0124804	北海道	2026/10/13 09:00	2026/10/16 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0127592	北海道	2026/10/13 18:00	2026/11/09 09:00	連続	西旭川変電所	西旭川変電所 174<名寄幹線2L(旭川嵐山・西旭川)>	174CB据付調整		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0127593	北海道	2026/10/14 08:00	2026/10/16 18:00	毎日	西旭川変電所	西旭川変電所 174<名寄幹線2L(旭川 嵐山・西旭川)>	旧174CB撤去		新規	
0124805	北海道	2026/10/14 09:00	2026/10/18 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124542	北海道	2026/10/14 10:00	2026/10/14 16:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 106<名寄幹線2L(旭 川嵐山・西旭川)>	106CB点検(外部・測定)		変更	
0124808	北海道	2026/10/14 10:00	2026/10/14 16:00	単日	室蘭変電所	室蘭変電所 104<室蘭西幹線2号線>	104CB 外部点検・測定試験		変更	
0126314	北海道	2026/10/14 10:00	2026/10/14 16:00	単日	西野変電所	西野変電所 113<南九条線3号線>	113GIS-RY盤間 制御ケーブル張替		新規	
0122104	北海道	2026/10/19 09:00	2026/10/30 17:00	連続	西野変電所	西野変電所 203<道央北幹線1号線>	203保護継電器盤取替		変更	
0122105	北海道	2026/10/19 09:00	2026/10/30 17:00	連続	西当別変電所	西当別変電所 201<道央北幹線1号線 >	201保護継電器盤取替		変更	
0124814	北海道	2026/10/19 09:00	2026/10/23 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124815	北海道	2026/10/19 09:00	2026/10/23 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0126688	北海道	2026/10/19 09:00	2026/11/05 12:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	電線張替		新規	
0124509	北海道	2026/10/20 09:00	2026/10/20 17:00	単日	西音更変電所	西音更変電所 101<西音更線1号線>	101CB 外部点検・測定試験他		変更	
0126697	北海道	2026/10/20 09:00	2026/10/20 17:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 2L	不良碍子検出		新規	
0124512	北海道	2026/10/21 09:00	2026/10/21 17:00	単日	西音更変電所	西音更変電所 102<西音更線2号線>	102CB 外部点検・測定試験他		変更	
0124828	北海道	2026/10/30 14:00	2026/10/30 15:30	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 2L	絶縁抵抗測定		変更	
0124829	北海道	2026/10/30 15:30	2026/10/30 16:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 2L	絶縁耐力試験		変更	
0126703	北海道	2026/11/05 12:00	2026/11/05 14:00	単日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	絶縁抵抗測定		新規	
0126702	北海道	2026/11/05 14:00	2026/11/05 16:00	単日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	絶縁耐力試験		新規	
0125394	北海道	2026/11/05 16:00	2026/11/05 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 201<道央北幹線1号線 >	201保護継電器盤取替		変更	
0125395	北海道	2026/11/05 16:00	2026/11/05 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 203<道央北幹線1号線>	203保護継電器盤取替		変更	
0124811	北海道	2026/11/09 09:00	2026/11/13 17:00	連続	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 106<名寄幹線2L(旭 川嵐山・西旭川)>	106保護継電器盤取替(主・後備)		変更	
0124812	北海道	2026/11/09 09:00	2026/11/13 17:00	連続	西旭川変電所	西旭川変電所 174<名寄幹線2L(旭川 嵐山・西旭川)>	174保護継電器盤取替(主・後備)		変更	
0124813	北海道	2026/11/09 09:00	2026/11/13 17:00	連続	西旭川変電所	西旭川変電所 174<名寄幹線2L(旭川 嵐山・西旭川)>	リード線・制御ケーブル接続		変更	
0124839	北海道	2026/11/10 09:00	2026/11/13 17:00	毎日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 1L	AGクランプ取替		変更	
0124826	北海道	2026/11/13 17:00	2026/11/13 17:30	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 172<旭川幹線2L>	174CB 試加圧		変更	
0124827	北海道	2026/11/13 17:30	2026/11/13 18:00	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 172<旭川幹線2L>	174CB 潮流測定		変更	
0124842	北海道	2026/11/16 08:00	2026/11/17 17:00	毎日	苫小牧変電所	苫小牧変電所 103<室蘭東幹線1号線 >	結合装置撤去(基礎含む)		変更	
0122115	北海道	2026/11/16 09:00	2026/11/27 17:00	連続	西野変電所	西野変電所 204<道央北幹線2号線>	204保護継電器盤取替		変更	
0122116	北海道	2026/11/16 09:00	2026/11/27 17:00	連続	西当別変電所	西当別変電所 202<道央北幹線2号線 >	202保護継電器盤取替		変更	
0126690	北海道	2026/11/16 09:00	2026/12/04 12:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	電線張替		新規	
0124495	北海道	2026/11/18 08:00	2026/11/19 17:00	毎日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	電力線復元		変更	
0124846	北海道	2026/11/18 08:00	2026/11/19 17:00	毎日	室蘭変電所	室蘭変電所 101<室蘭東幹線1号線>	結合装置撤去(基礎含む)		変更	
0124817	北海道	2026/11/18 09:00	2026/11/20 16:00	毎日	岩松西線(北新得・北芽室)	岩松西線(北新得・北芽室) 1L	直線スリーブ改修		変更	
0126693	北海道	2026/11/19 09:00	2026/11/20 17:00	毎日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 1L	AGクランプ取替(捻じれ防止ダンパ)		新規	
0124530	北海道	2026/11/19 10:00	2026/11/19 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 204<道央北幹線2号線>	204CB 一般点検		変更	
0126694	北海道	2026/11/24 09:00	2026/11/25 17:00	毎日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 2L	AGクランプ取替(捻じれ防止ダンパ)		新規	
0126772	北海道	2026/12/04 12:00	2026/12/04 14:00	単日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	絶縁抵抗測定		新規	
0126773	北海道	2026/12/04 14:00	2026/12/04 16:00	単日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	絶縁耐力試験		新規	
0125396	北海道	2026/12/04 16:00	2026/12/04 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 202<道央北幹線2号線 >	202保護継電器盤取替		変更	
0125397	北海道	2026/12/04 16:00	2026/12/04 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 204<道央北幹線2号線>	204保護継電器盤取替		変更	
0124859	北海道	2026/12/11 09:00	2026/12/15 17:00	毎日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	延線に伴う予防停電		変更	
0124861	北海道	2027/01/22 09:00	2027/01/29 17:00	連続	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 2L	予防停電		変更	
0124868	北海道	2027/02/08 09:00	2027/02/15 17:00	連続	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 1L	予防停電		変更	
0124508	北海道	2027/02/15 09:00	2027/02/15 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 203<道央東幹線1号線 >	203CB 作動油・インラインフィルター交換		変更	
0124511	北海道	2027/02/18 09:00	2027/02/18 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 204<道央東幹線2号線 >	204CB 作動油・インラインフィルター交換		変更	
0124603	北海道	2027/02/18 09:00	2027/02/18 17:00	単日	道央東幹線(西当別・南早 来)	道央東幹線(西当別・南早来) 2L	感温シール貼付		変更	
0124872	北海道	2027/02/18 09:00	2027/02/25 17:00	連続	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 2L	予防停電		変更	
0124625	北海道	2027/02/24 09:00	2027/02/26 17:00	毎日	日高幹線(南早来・岩清水 SWS)	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	設備点検		変更	
0124601	北海道	2027/03/01 09:00	2027/03/01 17:00	単日	道央東幹線(西当別・南早 来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	感温シール貼付		変更	
0124856	北海道	2027/03/01 09:00	2027/03/08 17:00	連続	道央東幹線(西当別・南早 来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	地線張替		変更	
0124857	北海道	2027/03/01 09:00	2027/03/08 17:00	連続	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 1L	地線張替に伴う予防停電		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0124699	北海道	2027/03/09 09:00	2027/03/10 17:00	毎日	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 1L	振動防止ダンパー取替		変更	
0124712	北海道	2027/03/11 09:00	2027/03/12 17:00	毎日	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 2L	振動防止ダンパー取替		変更	
0126803	北海道	2027/03/11 10:00	2027/03/11 16:00	単日	今別変換所	今別変換所 275kV乙母線	275kV母線保護装置に伴う275kV乙母線運用停止		新規	
0126730	北海道	2027/04/06 09:00	2027/04/09 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 1L	鉄塔防錆塗装		新規	
0126664	北海道	2027/04/06 10:00	2027/04/06 16:00	単日	道央西幹線(西双葉・西野)	道央西幹線(西双葉・西野) 1L	不良碍子検出		新規	
0126731	北海道	2027/04/12 09:00	2027/04/15 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 1L	鉄塔防錆塗装		新規	
0126666	北海道	2027/04/13 10:00	2027/04/13 15:00	単日	西小樽線(西野・西小樽)	西小樽線(西野・西小樽) 1L	不良碍子検出		新規	
0126667	北海道	2027/04/14 10:00	2027/04/14 15:00	単日	西小樽線(西野・西小樽)	西小樽線(西野・西小樽) 2L	不良碍子検出		新規	
0126316	北海道	2027/04/15 10:00	2027/04/15 11:00	単日	西札幌変電所	西札幌変電所 102<西札幌線2号線>	102CB無停電点検		新規	
0126733	北海道	2027/04/16 09:00	2027/04/16 17:00	単日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 2L	鉄塔防錆塗装		新規	
0126315	北海道	2027/04/16 10:00	2027/04/16 17:00	単日	西札幌変電所	西札幌変電所 101<西札幌線1号線>	101CB一般点検		新規	
0126732	北海道	2027/04/19 09:00	2027/04/23 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 2L	鉄塔防錆塗装		新規	
0126710	北海道	2027/04/21 09:00	2027/04/21 17:00	単日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 1L	不良碍子検出		新規	
0126317	北海道	2027/04/21 10:00	2027/04/21 17:00	単日	西札幌変電所	西札幌変電所 103<室蘭西幹線1号線>	103CB 一般点検		新規	
0126712	北海道	2027/04/22 09:00	2027/04/22 17:00	単日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 2L	不良碍子検出		新規	
0126318	北海道	2027/04/22 10:00	2027/04/22 17:00	単日	西札幌変電所	西札幌変電所 104<室蘭西幹線2号線>	104CB 一般点検		新規	
0126734	北海道	2027/04/26 09:00	2027/04/27 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 2L	鉄塔防錆塗装		新規	
0126380	北海道	2027/04/27 10:00	2027/04/27 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 111<南九条線1号線>	111CB一般点検		新規	
0126482	北海道	2027/05/12 07:00	2027/05/14 17:00	毎日	西名寄変電所	西名寄変電所 171<名寄幹線1L(旭川 嵐山・西名寄)>	171CB主回路バイパス		新規	
0126526	北海道	2027/05/18 07:00	2027/05/18 17:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 171<名寄幹線1L(旭川 嵐山・西名寄)>	171CBブッシング組立		新規	
0126486	北海道	2027/05/24 07:00	2027/05/28 11:00	連続	西名寄変電所	西名寄変電所 171<名寄幹線1L(旭川 嵐山・西名寄)>	171保護継電器盤取替(主・後備)		新規	
0126382	北海道	2027/05/24 09:00	2027/05/28 10:00	連続	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 103<名寄幹線1L(旭 川嵐山・西名寄)>	103保護継電器盤取替(主・後)		新規	
0126499	北海道	2027/05/24 09:00	2027/05/28 17:00	連続	西双葉開閉所	西双葉開閉所 203<道央南幹線1号線>	203CB 外部点検・測定試験・操作機構細密点検		新規	
0126550	北海道	2027/05/25 10:00	2027/05/27 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 1L	アークホーン捻れ補修		新規	
0126627	北海道	2027/05/28 09:00	2027/05/28 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 107<北江別線1号線>	107CB 一般点検		新規	
0126521	北海道	2027/05/28 11:00	2027/05/28 12:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 171<名寄幹線1L(旭川 嵐山・西名寄)>	171CB試加圧		新規	
0126485	北海道	2027/05/28 12:00	2027/05/28 13:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 103<名寄幹線1L(旭 川嵐山・西名寄)>	103TL低圧検相		新規	
0126522	北海道	2027/05/28 12:00	2027/05/28 13:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 171<名寄幹線1L(旭川 嵐山・西名寄)>	171TL実潮流測定		新規	
0126487	北海道	2027/05/28 13:00	2027/05/28 14:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 103<名寄幹線1L(旭 川嵐山・西名寄)>	103TL実潮流測定		新規	
0126628	北海道	2027/05/31 09:00	2027/05/31 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 108<北江別線2号線>	108CB 一般点検		新規	
0126326	北海道	2027/06/01 09:00	2027/07/03 17:00	連続	北新得変電所	北新得変電所 113<道東幹線1号線>	道東幹線1号線187kV電力ケーブル取替	制約有	新規	
0126737	北海道	2027/06/01 09:00	2027/06/04 17:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	素導体スベーサー取替		新規	
0126551	北海道	2027/06/01 10:00	2027/06/03 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 2L	アークホーン捻れ補修		新規	
0126517	北海道	2027/06/02 07:00	2027/06/04 17:00	毎日	西名寄変電所	西名寄変電所 172<名寄幹線2L(旭川 嵐山・西名寄)>	172CB主回路バイパス		新規	
0126328	北海道	2027/06/02 10:30	2027/06/02 10:40	単日	苫小牧変電所	苫小牧変電所 103<室蘭東幹線1号線>	103CB 一般点検		新規	
0126329	北海道	2027/06/02 10:40	2027/06/02 10:50	単日	苫小牧変電所	苫小牧変電所 104<室蘭東幹線2号線>	104CB 一般点検		新規	
0126771	北海道	2027/06/03 09:00	2027/06/03 17:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 1L	電線劣化診断		新規	
0126624	北海道	2027/06/07 09:00	2027/06/07 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 201<道央北幹線1号線>	201CB 無停電点検		変更	
0126738	北海道	2027/06/07 09:00	2027/06/11 17:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	素導体スベーサー取替		新規	
0126518	北海道	2027/06/08 07:00	2027/06/08 17:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 172<名寄幹線2L(旭川 嵐山・西名寄)>	172CBブッシング組立		新規	
0126625	北海道	2027/06/08 09:00	2027/06/08 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 202<道央北幹線2号線>	202CB 動作油・インラインフィルター交換		変更	
0126765	北海道	2027/06/09 09:00	2027/06/09 15:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山・西旭川)	名寄幹線(旭川嵐山・西旭川) 1L	碍子点検		新規	
0126242	北海道	2027/06/09 11:00	2027/06/09 12:00	単日	北新得変電所	北新得106<日勝幹線2号線>	106CB 機器点検		新規	
0126766	北海道	2027/06/10 09:00	2027/06/10 15:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山・西旭川)	名寄幹線(旭川嵐山・西旭川) 2L	碍子点検		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0126519	北海道	2027/06/14 07:00	2027/06/18 11:00	連続	西名寄変電所	西名寄変電所 172<名寄幹線2L(旭川 嵐山・西名寄)>	172保護継電器盤取替(主・後備)		新規	
0126383	北海道	2027/06/14 09:00	2027/06/18 10:00	連続	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 104<名寄幹線2L(旭 川嵐山・西名寄)>	104保護継電器盤取替(主・後)		新規	
0126739	北海道	2027/06/14 09:00	2027/06/14 17:00	単日	道北幹線(西当別・旭川嵐 山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	素導体スベサー取替		新規	
0126552	北海道	2027/06/14 10:00	2027/06/18 17:00	毎日	北幌延線(西名寄 西中川)	北幌延線(西名寄 西中川) 1L	捻れ防止ダンパ取替		新規	
0126621	北海道	2027/06/15 10:00	2027/06/15 16:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 103<名寄幹線1L(旭 川嵐山・西名寄)>	103CB 外部点検・測定試験		新規	
0126762	北海道	2027/06/15 10:00	2027/06/18 18:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山・西名 寄)	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 1L	難着雪リング取替		新規	
0126740	北海道	2027/06/16 09:00	2027/06/18 17:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐 山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	素導体スベサー取替		新規	
0126622	北海道	2027/06/16 10:00	2027/06/16 16:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 104<名寄幹線2L(旭 川嵐山・西名寄)>	104CB 外部点検・測定試験		新規	
0126488	北海道	2027/06/18 11:00	2027/06/18 12:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 104<名寄幹線2L(旭 川嵐山・西名寄)>	104TL低圧検相		新規	
0126532	北海道	2027/06/18 11:00	2027/06/18 12:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 172<名寄幹線2L(旭川 嵐山・西名寄)>	172CB試加圧		新規	
0126489	北海道	2027/06/18 12:00	2027/06/18 13:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 104<名寄幹線2L(旭 川嵐山・西名寄)>	104TL実潮流確認		新規	
0126533	北海道	2027/06/18 12:00	2027/06/18 13:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 172<名寄幹線2L(旭川 嵐山・西名寄)>	172TL実潮流測定		新規	
0126399	北海道	2027/06/21 09:00	2027/06/22 17:00	毎日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	架線金物補修		新規	
0126500	北海道	2027/06/21 09:00	2027/06/25 17:00	連続	西双葉開閉所	西双葉開閉所 204<道央南幹線2号線 >	204CB 外部点検・測定試験・操作機構細点検		新規	
0126741	北海道	2027/06/21 09:00	2027/06/25 17:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐 山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	素導体スベサー取替		新規	
0126674	北海道	2027/06/22 09:00	2027/06/22 15:00	単日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 1L	電線点検		変更	
0126675	北海道	2027/06/22 09:00	2027/06/22 15:00	単日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 1L	苗穂北線電線点検(過流探傷)に伴う予防停電		変更	
0126698	北海道	2027/06/22 09:00	2027/06/24 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 1L	AGクランプ取替		変更	
0126700	北海道	2027/06/22 09:00	2027/06/24 17:00	毎日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 1L	AGクランプ取替		変更	
0126763	北海道	2027/06/22 10:00	2027/06/25 18:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山・西名 寄)	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 2L	難着雪リング取替		新規	
0126398	北海道	2027/06/23 09:00	2027/06/24 17:00	毎日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	架線金物補修		新規	
0126475	北海道	2027/06/24 09:00	2027/06/24 16:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 101<釧路北線1号線>	187KV母線保護継電器盤101回線切替		新規	
0126483	北海道	2027/06/24 10:00	2027/06/24 12:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 101<釧路北線1号線>	101CB一般(無停電)点検		新規	
0126474	北海道	2027/06/24 16:00	2027/06/24 17:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 101<釧路北線1号線>	187KV母線保護継電器盤101回線潮流測定		新規	
0126476	北海道	2027/06/25 09:00	2027/06/25 16:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 102<釧路北線2号線>	187KV母線保護継電器盤102回線切替		新規	
0126484	北海道	2027/06/25 10:00	2027/06/25 12:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 102<釧路北線2号線>	102CB一般(無停電)点検		新規	
0126477	北海道	2027/06/26 09:00	2027/06/26 16:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 103<西春別線1号線>	187KV母線保護継電器盤103回線切替		新規	
0126709	北海道	2027/06/27 08:00	2027/06/28 17:00	連続	南早来変電所	南早来変電所 113<追分線1号線>	113TL各旧盤⇒新盤切替		新規	
0126480	北海道	2027/06/28 09:00	2027/06/28 16:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 104<西春別線2号線>	187KV母線保護継電器盤104回線切替		新規	
0126742	北海道	2027/06/28 09:00	2027/06/29 17:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐 山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	素導体スベサー取替		新規	
0126553	北海道	2027/06/28 10:00	2027/07/02 17:00	毎日	北幌延線(西名寄 西中川)	北幌延線(西名寄 西中川) 2L	捻れ防止ダンパ取替		新規	
0126711	北海道	2027/06/29 08:00	2027/06/30 17:00	連続	南早来変電所	南早来変電所 114<追分線2号線>	114TL各旧盤⇒新盤切替		新規	
0126348	北海道	2027/06/29 10:00	2027/06/29 10:30	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 174<名寄幹線2L(旭川 嵐山・西旭川)>	200CB 試加圧		新規	
0126349	北海道	2027/06/29 10:30	2027/06/29 11:30	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 174<名寄幹線2L(旭川 嵐山・西旭川)>	200CB 実潮流測定		新規	
0126215	北海道	2027/07/01 08:00	2027/07/20 14:00	連続	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 1L	電線地線張替(がいし取替含む)		新規	
0126713	北海道	2027/07/01 08:00	2027/07/02 17:00	連続	南早来変電所	南早来変電所 107<日高幹線>	107TL各旧盤⇒新盤切替		新規	
0126330	北海道	2027/07/03 17:00	2027/07/03 17:30	単日	北新得変電所	北新得変電所 113<道東幹線1号線>	道東幹線1号線187kV電力ケーブル試加圧	制約有	新規	
0126632	北海道	2027/07/04 09:00	2027/07/09 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 1L	鉄塔防錆塗装		新規	
0126341	北海道	2027/07/05 09:00	2027/07/16 17:00	毎日	西旭川変電所	西旭川変電所 172<旭川幹線2L>	172CB基礎作成に伴う予防停電		新規	
0126327	北海道	2027/07/06 09:00	2027/08/07 17:00	連続	北新得変電所	北新得変電所 114<道東幹線2号線>	道東幹線2号線187kV電力ケーブル取替	制約有	新規	
0126758	北海道	2027/07/09 09:00	2027/07/09 17:00	単日	双葉幹線(苫小牧SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧SS・双葉) 2L	着雪検知装置点検		新規	
0124636	北海道	2027/07/12 09:00	2027/07/16 17:00	毎日	道央西幹線(西双葉・西野)	道央西幹線(西双葉・西野) 2L	相間スベサークランプ取替		変更	
0126332	北海道	2027/07/12 09:00	2027/07/17 17:00	連続	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	延線に伴う予防停電		新規	
0126631	北海道	2027/07/12 09:00	2027/07/17 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 2L	鉄塔防錆塗装		新規	
0126776	北海道	2027/07/20 09:00	2027/07/23 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 2L	相間スベサークランプ取替		新規	
0126216	北海道	2027/07/20 14:00	2027/07/20 15:30	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 1L	絶縁抵抗測定		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0126217	北海道	2027/07/20 15:30	2027/07/20 16:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 1L	絶縁耐力試験		新規	
0126218	北海道	2027/07/21 08:00	2027/08/06 14:00	連続	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 2L	電線地線張替(がいし取替含む)		新規	
0126361	北海道	2027/07/21 09:00	2027/07/21 17:00	単日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 3L	絶縁油採油		新規	
0126752	北海道	2027/07/21 09:00	2027/07/21 17:00	単日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 1L	地線金具取替		新規	
0126362	北海道	2027/07/22 09:00	2027/07/22 17:00	単日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 3L	絶縁油採油		新規	
0126753	北海道	2027/07/22 09:00	2027/07/22 17:00	単日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 2L	地線金具取替		新規	
0126363	北海道	2027/07/23 09:00	2027/07/23 17:00	単日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 3L	絶縁油採油		新規	
0126473	北海道	2027/07/27 09:00	2027/07/30 17:00	毎日	日勝幹線(北新得・新冠SWS)	日勝幹線(北新得・新冠SWS) 2L	直線スリプ改修		新規	
0126520	北海道	2027/07/27 09:00	2027/07/27 18:00	単日	西滝川変電所	西滝川変電所 103<旭川幹線1号線>	103CB外部点検		新規	
0126523	北海道	2027/07/28 09:00	2027/07/28 18:00	単日	西滝川変電所	西滝川変電所 104<旭川幹線2号線>	104CB外部点検		新規	
0126372	北海道	2027/07/30 11:00	2027/07/30 14:00	単日	北江別変電所	北江別変電所 187kV乙母線	連絡用C変圧器 試加圧(使用前自主検査)		新規	
0126369	北海道	2027/08/02 10:00	2027/08/05 17:00	連続	西野変電所	西野変電所 204<道央北幹線2号線>	204CB 内部点検		新規	
0126402	北海道	2027/08/03 08:00	2027/08/03 17:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 1L	電力線復元		新規	
0126219	北海道	2027/08/06 14:00	2027/08/06 15:30	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 2L	絶縁抵抗測定		新規	
0126220	北海道	2027/08/06 15:30	2027/08/06 16:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 2L	絶縁耐力試験		新規	
0126331	北海道	2027/08/07 17:00	2027/08/07 17:30	単日	北新得変電所	北新得変電所 114<道東幹線2号線>	道東幹線2号線187kV電力ケーブル試加圧	制約有	新規	
0126812	北海道	2027/08/16 08:00	2027/09/04 17:00	連続	(電発)恵庭南札線(南札幌・恵庭)	(電発)恵庭南札線(南札幌・恵庭) 1L	電線路細密点検		新規	
0126668	北海道	2027/08/18 09:00	2027/08/18 17:00	単日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 1L	営業撤去		新規	
0126333	北海道	2027/08/19 09:00	2027/08/27 10:00	連続	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	相入れ替え		新規	
0126669	北海道	2027/08/19 09:00	2027/08/19 17:00	単日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 2L	営業撤去		新規	
0126335	北海道	2027/08/27 10:00	2027/08/27 13:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	使用前自主検査(絶縁抵抗測定)		新規	
0126336	北海道	2027/08/27 13:00	2027/08/27 14:30	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	使用前自主検査(絶縁耐力試験ほか)		新規	
0126337	北海道	2027/08/31 09:00	2027/09/08 10:00	連続	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	相入れ替え		新規	
0126342	北海道	2027/09/01 09:00	2027/09/07 17:00	毎日	西旭川変電所	西旭川変電所 172<旭川幹線2L>	172CB据付に伴う予防停電		新規	
0126243	北海道	2027/09/02 09:00	2027/09/02 16:00	単日	北新得変電所	北新得変電所 101<新得追分線1号線>	101CB関係 制御ケーブル切替・各種試験		新規	
0126289	北海道	2027/09/02 16:00	2027/09/02 16:30	単日	北新得変電所	北新得変電所 101<新得追分線1号線>	101TL BP潮流測定		新規	
0126246	北海道	2027/09/03 09:00	2027/09/03 16:00	単日	北新得変電所	北新得変電所 102<新得追分線2号線>	102CB関係 制御ケーブル切替・各種試験		新規	
0126290	北海道	2027/09/03 16:00	2027/09/03 16:30	単日	北新得変電所	北新得変電所 102<新得追分線2号線>	102TL BP潮流測定		新規	
0126813	北海道	2027/09/06 08:00	2027/09/25 17:00	連続	(電発)恵庭南札線(南札幌・恵庭)	(電発)恵庭南札線(南札幌・恵庭) 2L	電線路細密点検		新規	
0126554	北海道	2027/09/06 09:00	2027/09/10 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 1L	SRリング取替		新規	
0126788	北海道	2027/09/06 09:00	2027/09/10 17:00	連続	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 1L	電線張替		変更	
0126530	北海道	2027/09/06 10:00	2027/10/08 15:00	連続	双葉開閉所	双葉開閉所 101(室蘭西幹線1号線(双葉・西野))	101CB~101X間リード線張替		新規	
0126346	北海道	2027/09/08 09:00	2027/10/01 10:00	連続	西旭川変電所	西旭川変電所 172<旭川幹線2L>	172保護継電器盤取替(主・後備)		新規	
0126338	北海道	2027/09/08 10:00	2027/09/08 13:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	使用前自主検査(絶縁抵抗測定)		新規	
0126339	北海道	2027/09/08 13:00	2027/09/08 14:30	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	使用前自主検査(絶縁耐力試験ほか)		新規	
0126258	北海道	2027/09/09 09:00	2027/09/09 16:00	単日	北新得変電所	北新得変電所 106<日勝幹線2号線(新冠・北新得)>	106CB関係 制御ケーブル切替・各種試験		新規	
0126381	北海道	2027/09/09 10:00	2027/09/09 17:00	単日	苫小牧変電所	苫小牧変電所 111<双葉幹線1号線>	111TL 通信LT撤去に伴う上母線修繕(青相)		新規	
0126294	北海道	2027/09/09 16:00	2027/09/09 16:30	単日	北新得変電所	北新得変電所 106<日勝幹線2号線(新冠・北新得)>	106TL BP潮流測定		新規	
0126620	北海道	2027/09/10 09:00	2027/09/10 17:00	単日	岩松西線(北新得・北芽室)	岩松西線(北新得・北芽室) 1L	着雪検知装置除却		新規	
0126647	北海道	2027/09/10 09:00	2027/09/10 17:00	単日	岩松西線(北新得・北芽室)	岩松西線(北新得・北芽室) 1L	着雪検知装置除却		新規	
0126264	北海道	2027/09/13 09:00	2027/09/13 16:00	単日	北新得変電所	北新得変電所 111<岩松西線1号線>	111CB関係 制御ケーブル切替・各種試験		新規	
0126555	北海道	2027/09/13 09:00	2027/09/17 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 2L	SRリング取替		新規	
0126581	北海道	2027/09/13 09:00	2027/10/01 17:00	連続	西滝川変電所	西滝川変電所 104<旭川幹線2号線>	既設104Ry盤撤去		新規	
0126296	北海道	2027/09/13 16:00	2027/09/13 16:30	単日	北新得変電所	北新得変電所 111<岩松西線1号線>	111TL BP潮流測定		新規	
0126297	北海道	2027/09/14 09:00	2027/09/14 16:00	単日	北新得変電所	北新得変電所 112<岩松西線2号線>	112CB関係 制御ケーブル切替・各種試験		新規	
0126298	北海道	2027/09/14 16:00	2027/09/14 16:30	単日	北新得変電所	北新得変電所 112<岩松西線2号線>	112TL BP潮流測定		新規	
0126267	北海道	2027/09/15 09:00	2027/09/15 16:00	単日	北新得変電所	北新得変電所 113<道東幹線1号線>	113CB関係 制御ケーブル切替・各種試験		新規	
0126307	北海道	2027/09/15 16:00	2027/09/15 16:30	単日	北新得変電所	北新得変電所 113<道東幹線1号線>	113TL BP潮流測定	制約有	新規	
0126274	北海道	2027/09/16 09:00	2027/09/16 16:00	単日	北新得変電所	北新得変電所 114<道東幹線2号線>	114CB関係 制御ケーブル切替・各種試験		新規	
0126308	北海道	2027/09/16 16:00	2027/09/16 16:30	単日	北新得変電所	北新得変電所 114<道東幹線2号線>	114TL BP潮流測定	制約有	新規	
0126277	北海道	2027/09/17 09:00	2027/09/17 16:00	単日	北新得変電所	北新得変電所 117<西音更線1号線>	117CB関係 制御ケーブル切替・各種試験		新規	
0126309	北海道	2027/09/17 16:00	2027/09/17 16:30	単日	北新得変電所	北新得変電所 117<西音更線1号線>	117TL BP潮流測定		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0126280	北海道	2027/09/21 09:00	2027/09/21 16:00	単日	北新得変電所	北新得変電所 118<西音更線2号線>	118CB関係 制御ケーブル切替・各種試験		新規	
0126310	北海道	2027/09/21 16:00	2027/09/21 16:30	単日	北新得変電所	北新得変電所 118<西音更線2号線>	118TL BP潮流測定		新規	
0126814	北海道	2027/09/27 08:00	2027/09/29 17:00	毎日	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭)	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭) 1L	引留クランプ抵抗測定		新規	
0126636	北海道	2027/09/27 09:00	2027/10/03 17:00	毎日	西音更線(北新得・西音更)	西音更線(北新得・西音更) 1L	鉄塔防錆塗装		新規	
0126356	北海道	2027/10/01 12:00	2027/10/01 13:00	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 173<名寄幹線1L(旭川嵐山・西旭川)>	172TL試加圧		新規	
0126466	北海道	2027/10/01 13:00	2027/10/01 14:00	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 174<名寄幹線2L(旭川嵐山・西旭川)>	172TL 実潮流測定		新規	
0126815	北海道	2027/10/04 08:00	2027/10/06 17:00	毎日	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭)	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭) 2L	引留クランプ抵抗測定		新規	
0126637	北海道	2027/10/04 09:00	2027/10/08 17:00	毎日	西音更線(北新得・西音更)	西音更線(北新得・西音更) 2L	鉄塔防錆塗装		新規	
0126759	北海道	2027/10/04 09:00	2027/10/22 17:00	連続	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	鉄塔防錆塗装		新規	
0126240	北海道	2027/10/04 10:00	2027/10/15 17:00	連続	岩清水開閉所	岩清水開閉所 101<日高幹線・高見線1号線>	日高幹線リレー盤取替		新規	
0126404	北海道	2027/10/04 10:00	2027/10/15 17:00	連続	南早来変電所	南早来変電所 107<日高幹線>	日高幹線(107)保護継電器盤取替(主・後)		新規	
0126527	北海道	2027/10/05 08:00	2027/10/06 17:00	毎日	双葉幹線(苫小牧SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧SS・双葉) 2L	着雪検知装置更新		新規	
0126400	北海道	2027/10/05 09:00	2027/10/06 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 1L	振動防止ダンパ取替		新規	
0126502	北海道	2027/10/07 08:00	2027/10/07 17:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	着雪検知装置撤去		新規	
0126401	北海道	2027/10/07 09:00	2027/10/08 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 2L	振動防止ダンパ取替		新規	
0126534	北海道	2027/10/08 15:00	2027/10/08 15:20	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 101(室蘭西幹線1号線(双葉・西野))	101CB絶縁耐力試験(常規対地電圧印加試験)		新規	
0126603	北海道	2027/10/08 15:20	2027/10/08 15:40	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 101(室蘭西幹線1号線(双葉・西野))	101CB低圧検相		新規	
0126604	北海道	2027/10/08 15:40	2027/10/08 16:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 101(室蘭西幹線1号線(双葉・西野))	101CB潮流測定		新規	
0126638	北海道	2027/10/12 09:00	2027/10/13 17:00	毎日	西音更線(北新得・西音更)	西音更線(北新得・西音更) 2L	鉄塔防錆塗装		新規	
0126531	北海道	2027/10/12 10:00	2027/11/12 15:00	連続	双葉開閉所	双葉開閉所 102(室蘭西幹線2号線(双葉・西野))	102CB~102X間リード線張替		新規	
0126353	北海道	2027/10/13 09:00	2027/10/26 10:00	連続	西旭川変電所	西旭川変電所 171<旭川幹線1L>	171保護継電器盤取替(主・後備)		新規	
0126470	北海道	2027/10/13 09:00	2027/10/15 17:00	毎日	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	振動防止ダンパ取替		新規	
0126538	北海道	2027/10/13 09:00	2027/10/14 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 1L	着換装置除却		新規	
0126582	北海道	2027/10/13 09:00	2027/10/26 17:00	連続	西滝川変電所	西滝川変電所 103<旭川幹線1号線>	既設103Ry盤撤去		新規	
0126540	北海道	2027/10/15 08:00	2027/10/15 17:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 2L	着雪検知装置新設		新規	
0126407	北海道	2027/10/15 17:00	2027/10/15 18:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 107<日高幹線>	充電検相		新規	
0126715	北海道	2027/10/18 09:00	2027/10/22 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 1L	鉄塔防錆塗装		新規	
0126351	北海道	2027/10/19 08:00	2027/10/21 18:00	毎日	恵庭変電所	恵庭変電所 101<恵庭南札線1号線>	101甲 導電部銀メッキ修繕		新規	
0126541	北海道	2027/10/20 08:00	2027/10/20 17:00	単日	苫小牧変電所	苫小牧変電所 111<双葉幹線1号線>	結合装置撤去		新規	
0126539	北海道	2027/10/20 09:00	2027/10/21 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) (力)1L	着換装置除却		新規	
0126716	北海道	2027/10/25 09:00	2027/10/29 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 2L	鉄塔防錆塗装		新規	
0126357	北海道	2027/10/26 11:00	2027/10/26 11:30	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 171<旭川幹線1L>	171TL低圧検相		新規	
0126358	北海道	2027/10/26 11:30	2027/10/26 12:30	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 171<旭川幹線1L>	171TL実潮流測定		新規	
0126791	北海道	2027/11/01 09:00	2027/11/05 17:00	連続	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 2L	電線張替		変更	
0126408	北海道	2027/11/05 13:00	2027/11/05 14:00	単日	西野変電所	西野変電所101(室蘭西幹線1号線(西野・西札幌))	100CB絶縁耐力試験(常規対地電圧印加試験)		新規	
0126422	北海道	2027/11/05 14:00	2027/11/05 16:00	単日	西野変電所	西野変電所101(室蘭西幹線1号線(西野・西札幌))	100CB潮流測定		新規	
0126816	北海道	2027/11/08 08:00	2027/11/12 17:00	連続	(電発)新得追分線(北新得・追分)	(電発)新得追分線(北新得・追分) 1L	電線線細密点検		新規	
0126454	北海道	2027/11/09 09:00	2027/11/11 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 1L	捻れ防止ダンパ取替		新規	
0126757	北海道	2027/11/10 09:00	2027/11/11 17:00	連続	双葉幹線(苫小牧SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧SS・双葉) 1L	電力線復元		新規	
0126535	北海道	2027/11/12 15:00	2027/11/12 15:20	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 102(室蘭西幹線2号線(双葉・西野))	102CB絶縁耐力試験(常規対地電圧印加試験)		新規	
0126605	北海道	2027/11/12 15:20	2027/11/12 15:40	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 102(室蘭西幹線2号線(双葉・西野))	102CB低圧検相		新規	
0126606	北海道	2027/11/12 15:40	2027/11/12 16:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 102(室蘭西幹線2号線(双葉・西野))	102CB潮流測定		新規	
0126455	北海道	2027/11/15 09:00	2027/11/19 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 2L	捻れ防止ダンパ取替		新規	
0126670	北海道	2027/11/15 09:00	2027/11/16 17:00	毎日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 1L	振動防止ダンパ		変更	
0126350	北海道	2027/11/16 08:00	2027/11/18 18:00	毎日	南札幌変電所	南札幌変電所 102<恵庭南札線2号線>	102X ローラヒンジ部取替		新規	
0126671	北海道	2027/11/17 09:00	2027/11/18 17:00	毎日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 2L	振動防止ダンパ		変更	
0127617	北海道	2027/11/18 09:00	2027/11/18 17:00	単日	春別開閉所	春別開閉所 187kV母線	運用停止		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0126672	北海道	2027/12/07 09:00	2027/12/10 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 1L	AGクランプ取替		変更	
0126673	北海道	2027/12/13 09:00	2027/12/16 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 1L	AGクランプ取替		変更	
0126677	北海道	2028/01/11 09:00	2028/01/21 17:00	連続	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 1L	予防停電		新規	
0126678	北海道	2028/01/26 09:00	2028/02/05 17:00	連続	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 2L	予防停電		新規	
0126682	北海道	2028/02/14 09:00	2028/02/21 17:00	連続	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 1L	予防停電		新規	
0126683	北海道	2028/02/24 09:00	2028/03/02 17:00	連続	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 2L	予防停電		新規	
0127618	北海道	2028/03/07 10:00	2028/03/07 16:00	単日	春別開閉所	春別開閉所 187kV母線	運用停止		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0235513	東北	2026/04/01 09:00	2026/05/15 17:00	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	がいし取替 No99~154間 22基がいし点検99~190 18基 接近木伐採4箇所		変更	
0235754	東北	2026/04/06 08:40	2026/04/10 17:20	連続	鳴瀬幹線1号	鳴瀬幹線1号	架渉線点検立下げ線補修		変更	
0235810	東北	2026/04/13 08:30	2026/04/16 17:30	連続	大湯幹線2号	大湯幹線2号	防錆塗装 No.115~119 4基ボルト緩み止め No.99~134 4基		変更	
0235811	東北	2026/04/13 08:30	2026/04/17 17:30	連続	大湯幹線1号	大湯幹線1号	防錆塗装 No.116~117, 119~120 4基ボルト緩み止め_113, 118, 130, 134 4基		変更	
0235753	東北	2026/04/13 08:40	2026/04/17 17:20	連続	鳴瀬幹線2号	鳴瀬幹線2号	架渉線点検立下げ線補修		変更	
0235801	東北	2026/05/09 08:30	2026/05/28 17:30	連続	秋田幹線1号	秋田幹線1号	保安停止秋田河辺支線新設 建せ秋田		変更	
0235809	東北	2026/05/11 08:30	2026/05/13 17:30	連続	秋田幹線1号	秋田幹線1号	防錆塗装 No.1, No.4~6 4基ボルト取替 No.7~No.10 4基		変更	
0235634	東北	2026/05/11 08:40	2026/05/15 17:20	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	定期点検		変更	
0235771	東北	2026/05/12 09:10	2026/05/15 17:20	連続	仙台変電所	仙台幹線1号	275ITC切替		変更	
0235800	東北	2026/05/29 08:30	2026/05/30 17:30	連続	秋田幹線2号	秋田幹線2号	保安停止秋田河辺支線新設 建せ秋田		変更	
0235712	東北	2026/06/01 08:30	2026/06/05 17:30	連続	青葉幹線1号	青葉幹線1号	定期点検, 防錆塗装, がいし連スベサ補修		変更	
0235808	東北	2026/06/01 08:30	2026/06/03 17:30	連続	秋田幹線2号	秋田幹線2号	防錆塗装 No.1, No.4~6 4基ボルト取替 No.7~No.10 4基		変更	
0235636	東北	2026/06/08 08:30	2026/06/12 17:30	連続	朝日幹線1号	朝日幹線1号	定期点検		変更	
0235711	東北	2026/06/08 08:30	2026/06/12 17:30	連続	青葉幹線2号	青葉幹線2号	定期点検, 防錆塗装, がいし連スベサ補修		変更	
0235736	東北	2026/06/08 08:30	2026/06/09 16:30	連続	朝日幹線1号	朝日幹線1号	がいし取替		変更	
0235635	東北	2026/06/15 08:30	2026/06/19 17:30	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	定期点検		変更	
0235735	東北	2026/06/15 08:30	2026/06/16 16:30	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	がいし取替		変更	
0235750	東北	2026/06/24 08:40	2026/07/15 17:20	連続	宮城幹線1号	宮城幹線1号	No51 仮アーム取付宮城幹線保安対策47工事		変更	
0235637	東北	2026/07/21 08:30	2026/07/24 17:30	連続	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	No72~93防錆塗装		変更	
0238869	東北	2026/07/21 08:30	2026/09/18 17:30	連続	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	鉄塔組立, 移線, 緊線他蔵王幹線保安対策128		変更	
0238870	東北	2026/07/21 08:30	2026/07/21 17:30	単日	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	No. 143 JP開放蔵王幹線保安対策128		変更	
0235747	東北	2026/07/21 08:40	2026/09/11 17:20	連続	宮城幹線2号	宮城幹線2号	No. 73 鉄塔新設・移線宮城幹線保安対策72		変更	
0235749	東北	2026/07/21 08:40	2026/09/18 17:20	連続	宮城幹線2号	宮城幹線2号	No51 鉄塔組立, 2号線移線, 緊線宮城幹線保安対策47工事		変更	
0235512	東北	2026/08/03 09:00	2026/09/07 17:00	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	がいし取替 No99~154間 22基架渉線点検194-215, がいし点検99~190間		変更	
0235633	東北	2026/08/24 08:40	2026/08/28 17:20	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	定期点検		変更	
0235659	東北	2026/09/02 09:30	2026/09/03 17:30	連続	宮城変電所	北上幹線1号	宮城(変)SPC整備ISPC向けトリップ回路他接続		変更	
0235507	東北	2026/09/07 08:40	2026/11/17 17:20	連続	越後開閉所	中越幹線1号	中越幹線配開改良開連:CB,LS,CVT取替試充電,VCT組合せ試験		変更	
0235658	東北	2026/09/09 09:30	2026/09/10 17:30	連続	宮城変電所	北上幹線2号	宮城(変)SPC整備ISPC向けトリップ回路他接続		変更	
0235869	東北	2026/09/14 08:30	2026/09/15 17:30	連続	早池峰幹線1号	早池峰幹線1号	防錆塗装		変更	
0235868	東北	2026/09/16 08:20	2026/09/17 17:40	連続	早池峰幹線2号【岩手接地現地	早池峰幹線2号【岩手接地現地	防錆塗装		変更	
0238868	東北	2026/09/18 08:30	2026/09/18 17:30	単日	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	No. 143 JP接続蔵王幹線保安対策128		変更	
0235731	東北	2026/09/29 08:40	2026/10/08 16:20	連続	仙台幹線2号	仙台幹線2号	定期点検, 防錆塗装		変更	
0235799	東北	2026/09/30 08:30	2026/10/19 17:30	連続	秋盛幹線2号	秋盛幹線2号	鉄塔建替秋盛河辺支線新設 建せ秋田		変更	
0235812	東北	2026/10/05 08:30	2026/10/07 17:30	連続	秋盛幹線2号	秋盛幹線2号	防錆塗装 No.57~No.61 5基ボルト取替 No.62~No.64 3基		変更	
0235770	東北	2026/10/15 09:10	2026/10/21 17:20	連続	仙台変電所	仙台幹線2号	275ITC切替		変更	
0235819	東北	2026/10/19 08:30	2026/10/20 17:30	連続	岩手変電所	北上幹線1号	SPC整備工事SPC向けケーブル接続・試験		変更	
0235813	東北	2026/10/21 08:30	2026/10/23 17:30	連続	秋盛幹線1号	秋盛幹線1号	防錆塗装 No.52~No.59 5基ボルト取替 No.60~No.64 5基		変更	
0235818	東北	2026/10/21 08:30	2026/10/22 17:30	連続	岩手変電所	北上幹線2号	SPC整備工事SPC向けケーブル接続・試験		変更	
0235657	東北	2026/10/27 09:30	2026/10/28 17:30	連続	宮城変電所	青葉幹線1号	宮城(変)SPC整備ISPC向けトリップ回路他接続		変更	
0238873	東北	2026/10/27 09:30	2026/10/28 17:30	連続	宮城中央変電所	宮城中央支線1号	バレット接続, 試験他盤トリップ, CT接続【ISPC】建せ変電		変更	
0235656	東北	2026/10/29 09:30	2026/10/30 17:30	連続	宮城変電所	青葉幹線2号	宮城(変)SPC整備ISPC向けトリップ回路他接続		変更	
0238871	東北	2026/10/29 09:30	2026/10/30 17:30	連続	宮城中央変電所	宮城中央支線2号	バレット, 他盤トリップ, CT回路接続【ISPC】建せ変電		変更	
0235859	東北	2026/11/09 08:30	2026/11/10 17:30	連続	岩手幹線1号	岩手幹線1号	がいし連スベサ補修 岩手変電所鉄構1基		変更	
0235858	東北	2026/11/11 08:30	2026/11/12 17:30	連続	岩手幹線2号	岩手幹線2号	がいし連スベサ補修 岩手変電所鉄構1基		変更	
0235638	東北	2026/11/16 08:40	2026/11/27 16:20	連続	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	No72~93防錆塗装		変更	
0235666	東北	2026/11/16 08:40	2026/12/23 17:20	連続	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	電線張替 No. 104~NO. 109蔵王幹線経年化対策104		変更	
0238867	東北	2026/11/16 08:40	2027/02/12 17:20	連続	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	鉄塔組立, 移線, 緊線他蔵王幹線保安対策128		変更	
0235607	東北	2026/11/16 09:30	2026/11/16 17:30	単日	福島変電所	阿武隈幹線1号	リレー整備(BP二重化)		変更	
0235606	東北	2026/11/17 09:30	2026/11/17 17:30	単日	福島変電所	阿武隈幹線2号	リレー整備(BP二重化)		変更	
0235821	東北	2026/11/24 08:30	2026/11/25 17:30	連続	岩手変電所	十和田幹線1号	SPC整備工事SPC向けケーブル接続・試験		変更	
0235895	東北	2026/11/24 08:30	2026/11/25 17:30	連続	上北変電所	十和田幹線1号	上北(変)SPC整備CT回路接続・接点接続・事故情報接続		変更	
0235746	東北	2026/11/24 08:40	2026/12/24 17:20	連続	宮城幹線1号	宮城幹線1号	No. 73 移線・既設鉄塔撤去宮城幹線保安対策72		変更	
0235748	東北	2026/11/24 08:40	2026/12/24 17:20	連続	宮城幹線1号	宮城幹線1号	No51 1号線移線, 緊線宮城幹線保安対策47工事		変更	
0235820	東北	2026/11/26 08:30	2026/11/27 17:30	連続	岩手変電所	十和田幹線2号	SPC整備工事SPC向けケーブル接続・試験		変更	
0235890	東北	2026/11/26 08:30	2026/11/27 17:30	連続	上北変電所	十和田幹線2号	上北(変)SPC整備CT回路接続・接点接続・事故情報接続		変更	
0235506	東北	2026/12/14 08:40	2026/12/14 13:20	単日	新潟変電所	飯豊幹線1号	BP他リレー整備・BP盤, オンシロ盤更新VCT組合せ試験		変更	
0235734	東北	2026/12/14 08:40	2026/12/18 16:20	連続	名取幹線1号	飯豊幹線1号	定期点検, 防錆塗装		変更	
0235505	東北	2026/12/14 13:40	2026/12/14 18:20	単日	新潟変電所	飯豊幹線2号	BP他リレー整備・BP盤, オンシロ盤更新VCT組合せ試験		変更	
0235504	東北	2026/12/15 08:40	2026/12/15 13:20	単日	新潟変電所	新潟幹線1号	BP他リレー整備・BP盤, オンシロ盤更新VCT組合せ試験		変更	
0235503	東北	2026/12/15 13:40	2026/12/15 18:20	単日	新潟変電所	新潟幹線2号	BP他リレー整備・BP盤, オンシロ盤更新VCT組合せ試験		変更	
0235502	東北	2026/12/17 08:40	2026/12/17 13:20	単日	新潟変電所	五頭幹線1号	BP他リレー整備・BP盤, オンシロ盤更新VCT組合せ試験		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0235501	東北	2026/12/17 13:40	2026/12/17 18:20	単日	新潟変電所	五頭幹線2号	BP他リレー整備・BP盤、オシロ盤更新		変更	
0235733	東北	2026/12/21 08:40	2026/12/25 16:20	連続	名取幹線2号	名取幹線2号	定期点検、防錆塗装		変更	
0239324	東北	2026/12/22 09:10	2026/12/22 17:20	単日	米沢変電所	蔵王幹線1号	油ポンプカウンター他修繕		新規	
0235732	東北	2027/01/18 08:40	2027/01/22 16:20	連続	仙台幹線1号	仙台幹線1号	定期点検、防錆塗装		変更	
0238865	東北	2027/02/15 08:30	2027/03/29 17:30	連続	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	鉄塔解体、移線、張替蔵王幹線保安対策128		変更	
0238866	東北	2027/02/15 08:30	2027/02/15 17:30	単日	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	No. 143 JP開放蔵王幹線保安対策128		変更	
0239327	東北	2027/03/16 09:00	2027/03/16 17:30	単日	米沢変電所	蔵王幹線2号	油ポンプカウンター他修繕		新規	
0235665	東北	2027/03/16 09:30	2027/03/17 16:30	連続	西仙台変電所	青葉幹線2号	ISPC切替		変更	
0235664	東北	2027/03/18 09:30	2027/03/19 16:30	連続	西仙台変電所	青葉幹線1号	ISPC切替		変更	
0238864	東北	2027/03/29 08:30	2027/03/29 17:30	単日	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	No. 143 JP接続蔵王幹線保安対策128		変更	
0238934	東北	2027/04/17 08:40	2027/07/11 17:20	連続	米沢変電所	蔵王幹線1号	米沢(変)配開改良X1・Y1取替		変更	
0238380	東北	2027/05/06 08:30	2027/05/20 17:30	連続	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	蔵王幹線終年化対策88工事		変更	
0238314	東北	2027/05/10 08:30	2027/05/11 17:30	連続	北上幹線1号	北上幹線1号	がいしスペースサ補修		変更	
0238313	東北	2027/05/12 08:30	2027/05/13 17:30	連続	北上幹線2号	北上幹線2号	がいしスペースサ補修		変更	
0238382	東北	2027/06/06 08:30	2027/06/20 17:30	連続	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	蔵王幹線保安対策189(共同)		変更	
0238308	東北	2027/06/14 08:30	2027/06/18 17:30	連続	青葉幹線1号	青葉幹線1号	防錆塗装		変更	
0238449	東北	2027/06/14 08:30	2027/08/18 17:30	連続	北上幹線1号	北上幹線1号	架渉線点検		変更	
0238345	東北	2027/06/15 09:00	2027/06/16 17:30	連続	宮城変電所	北上幹線1号	S3ブロック点検		変更	
0238342	東北	2027/06/17 09:00	2027/06/18 17:30	連続	宮城変電所	北上幹線2号	S4ブロック点検		変更	
0238307	東北	2027/06/21 08:30	2027/06/25 17:30	連続	青葉幹線2号	青葉幹線2号	防錆塗装		変更	
0238504	東北	2027/06/22 08:30	2027/06/25 17:30	連続	十和田幹線1号	十和田幹線1号	架渉線点検		変更	
0238339	東北	2027/06/22 09:00	2027/06/23 17:30	連続	宮城変電所	青葉幹線1号	S1ブロック点検Ry修繕		変更	
0238336	東北	2027/06/24 09:00	2027/06/25 17:30	連続	宮城変電所	青葉幹線2号	S2ブロック点検Ry修繕		変更	
0238383	東北	2027/06/25 08:40	2027/07/07 17:20	連続	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	蔵王幹線保安対策189(共同)		変更	
0238503	東北	2027/06/29 08:30	2027/07/02 17:30	連続	十和田幹線2号	十和田幹線2号	架渉線点検		変更	
0238234	東北	2027/07/07 08:40	2027/07/22 17:20	連続	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	地線張替(蔵王幹線地線張替50)		変更	
0238272	東北	2027/07/07 08:40	2027/07/08 17:20	連続	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	接近木伐採		変更	
0238381	東北	2027/07/11 08:40	2027/07/25 17:20	連続	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	蔵王幹線終年化対策88工事		変更	
0238247	東北	2027/07/12 08:40	2027/07/16 17:20	連続	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	がいしスペースサ補修(西仙台SS)防錆塗装		変更	
0238245	東北	2027/07/26 08:30	2027/07/30 17:30	連続	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	防錆塗装、接近木伐採		変更	
0238246	東北	2027/07/26 08:30	2027/07/26 17:30	単日	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	No145 JP開放		変更	
0238379	東北	2027/07/29 08:40	2027/09/11 17:20	連続	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	蔵王幹線終年化対策70(電張)工事		変更	
0238244	東北	2027/07/30 08:30	2027/07/30 17:30	単日	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	No145 JP接続		変更	
0238450	東北	2027/08/07 08:30	2027/08/10 17:30	連続	十和田幹線2号	十和田幹線2号	架渉線点検		変更	
0239330	東北	2027/09/29 09:00	2027/10/03 17:00	連続	田子倉本名線1号	田子倉本名線1号	電線路細密点検、電線補修鉄塔防錆塗装		新規	
0238262	東北	2027/10/18 09:00	2027/10/22 17:30	連続	西仙台変電所	青葉幹線1号	O5ブロック点検、UT点検、Ry点検		変更	
0238261	東北	2027/10/25 09:00	2027/10/29 17:30	連続	西仙台変電所	青葉幹線2号	O6ブロック点検、UT点検、Ry点検		変更	
0238280	東北	2027/11/09 09:00	2027/11/10 17:30	連続	宮城中央変電所	宮城中央支線1号	S1ブロック点検		変更	
0238277	東北	2027/11/11 09:00	2027/11/12 17:30	連続	宮城中央変電所	宮城中央支線2号	S2ブロック点検		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0342109	東京	2026/04/01 08:00	2026/04/30 17:00	連続	新座線1L	新座線1L	1.防錆塗装:《No.》6,7,12,14,16～19,25～27 計11基 2.劣化部材補修:《No.》17,19,25,26 計4基 3.パイプホーン補修:鉄構,《No.》1～5,8,10,11,13,15,28～32,鉄構 計17基 4.がいし点検:《No.》6～8,10～12 計6基 5.電線腐食診断:《No.》11～12 6.電線・地線点検:《No.》18～19,23～24,28～29 計3区間		変更	
0342110	東京	2026/04/01 08:00	2026/04/30 17:00	連続	南狭山線1L	南狭山線1L	1.パイプホーン補修: 18,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 計23基「技術」 2.がいし点検:《No.》3,4,5,6,18,19,43,南狭山(変) 計8基 2.電線・地線点検:《No.》17～18,18～19,23～24 計3区間		変更	
0342111	東京	2026/04/01 08:00	2026/12/18 18:00	連続	佐久間東幹中線1L	佐久間東幹中線1L/佐久間東幹中線2L	《1》佐久間東西幹線増強工事 電線張替・支持点変更・腕金改造等(新富士SS～293) 《2》不良碍子検出(メガ測定) 分11～分15(10基cct) 《3》電線圧縮接続部抵抗測定(クランプ) 1L:新富士st(1基)、2L:新富士st,分16,分2-3,分2-2(4基)		変更	
0348276	東京	2026/04/01 08:00	2026/04/01 12:00	単日	豊島	東内幸町線1L	電源回路改修の危険防止	制約有	変更	
0342108	東京	2026/04/01 09:00	2026/04/03 17:00	連続	港北線2L	港北線2L	【保修】《No.》42鉄塔改造工事 《No.》35, G腕金取替, C1吊材取替, 斜材取替 《No.》42地中分岐変更 《No.》36鉄塔防錆塗装工事 【保全】電線腐食点検危険防止《No.》42～《No.》43	制約有	変更	
0342115	東京	2026/04/01 09:00	2026/04/24 17:00	連続	京浜線1L	京浜線1L	部材取替, 防雪塗装:No.1001～No.1008 アーム下面点検:No.1006,1026	制約有	変更	
0342454	東京	2026/04/01 09:00	2026/04/01 22:00	単日	北多摩	新宿線1L	・CBO903取替(ABM→GCB) ・CBO903取替に伴う危険防止(新宿線1L) ・CH～LS903リード線切離し		変更	
0343786	東京	2026/04/01 09:00	2026/05/28 17:00	連続	印旛線2L	印旛線2L	印旛線No93～No.102 計17基		変更	
0352306	東京	2026/04/01 09:00	2026/04/01 17:00	単日	城南	新宿城南線1L	・主変5号1次構連OFケーブル点検、絶縁油採取、分析		変更	
0342118	東京	2026/04/02 09:00	2026/04/02 17:00	単日	南狭山(変)	南狭山線1LのCBO5	1. CBO5 12年停止試験		変更	
0342300	東京	2026/04/03 08:00	2026/04/27 17:00	連続	河北線3L	河北線3L	1.防錆塗装:《No.》13,《No.》15,《No.》22～《No.》28,《No.》30,《No.》35,《No.》38 計12基 2.停止ががいし検出:《No.》37～39 計4基		変更	
0342122	東京	2026/04/03 09:00	2026/04/03 17:00	単日	南狭山(変)	新座線1LのCBO3	1. CBO3 12年停止試験		変更	
0342123	東京	2026/04/03 09:30	2026/04/03 17:00	単日	東内幸町線2L	東内幸町線2L	【絶縁油採取】 豊2D(W)(傾向監視対象) 豊3D(B)(アランク) 文6D(R)(アランク改修対象)	制約有	変更	
0342124	東京	2026/04/04 09:00	2026/05/02 17:00	連続	港北線1L	港北線1L	【保修】《No.》35部材取替, 《No.》34ほか防錆塗装工事【保全】 電線腐食点検20～23, 41～43	制約有	変更	
0342130	東京	2026/04/06 09:00	2026/04/10 17:00	連続	西東京(変)	西南多摩線1L	《1》電線路細密点検(多摩ST～《No.》520,544,545,547,548,571／14基) 《2》鉄塔部材・ボルト取替(《No.》551,570／2基) 《3》電線補修(実施箇所検討中)	制約有	変更	
0342239	東京	2026/04/06 09:00	2026/04/06 17:00	単日	北多摩	新宿線2L	・新宿線2LShRShR側電力ケーブル(OFケーブル停止試験) ・新宿線2LShRShR側電力ケーブル(OFケーブル停止試験) ・新宿線2LShR線路側電力OFケーブル採油(絶縁油特性試験)		変更	
0343787	東京	2026/04/06 09:00	2026/04/06 17:00	単日	新栃木線1L	新栃木線1L	電線・地線点検 No.118～No.119		変更	
0343783	東京	2026/04/07 08:00	2026/04/10 18:00	連続	新福島(変)	福島東幹線山線1L/福島東幹線山線1LのCBO3	・断路器 福島東幹線山線1号 3 LS(電動操作)停止試験B 【機能回復 1回/24年】 ・E3、E3B不具合修理 ・福島東幹線山線1L 3 LS(電動操作)停止試験A【12年】		変更	
0342394	東京	2026/04/07 09:00	2026/04/10 17:00	連続	墨東線1L	墨東線1L	【作業内容】 伸縮継手部分パッキン取替 【作業場所】 葛25X		変更	
0343785	東京	2026/04/07 09:00	2026/04/07 17:00	単日	新栃木線2L	新栃木線2L	電線・地線点検 No.118～No.119		変更	
0343772	東京	2026/04/08 09:00	2026/04/30 17:00	連続	新福島(変)	福島山幹線1L/福島山幹線1LのCBO1	・制御ケーブル切り離し・接続 ・各種試験 交流回路試験 対向試験 警報、トリップ、操作試験		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0343792	東京	2026/04/08 09:00	2026/04/30 17:00	連続	新しいわき(開)	福島山幹線1L/福島山幹線1LのCBO1	・制御ケーブル切り離し・接続 ・各種試験 交流回路試験 対向試験 警報、トリップ、操作試験		変更	
0343984	東京	2026/04/08 09:00	2026/04/30 17:00	連続	福島山幹線1L	福島山幹線1L	・ジャンパ接続・新No.10～相馬双葉幹線No.88(東北電力)		変更	
0345503	東京	2026/04/10 09:00	2026/04/27 17:00	連続	東京南線4L	東京南線4L	架空地線カウンターウェイト補修:No.46～No.47ほか58径間		変更	
0342141	東京	2026/04/11 08:00	2026/04/25 18:00	連続	西東京(変)	港北線1L	・保護制御モジュール更新 ・O-7普通点検・LS7普通点検 ・VT点検・垂直碍子連点検 ・LA点検	制約有	変更	
0348213	東京	2026/04/11 20:00	2026/04/12 06:00	連続	墨東線1L	墨東線1L	鋼管電位法調査に伴う危険防止		変更	
0343784	東京	2026/04/13 08:00	2026/04/16 18:00	連続	新福島(変)	福島東幹線山線2L/福島東幹線山線2LのCBO4	・断路器 福島東幹線山線2号 4 LS(電動操作)停止試験 【機能回復 1回/24年】 ・E4 不具合修理 ・断路器 福島東幹線山線2号 4 LS(電動操作)停止試験A 【12年】		変更	
0342321	東京	2026/04/13 09:00	2026/04/13 17:00	単日	北多摩	新宿線2LのCBO4	・新宿線2L104GIS(母線側断路器)12年停止試験		変更	
0343767	東京	2026/04/14 09:00	2026/04/20 17:00	毎日	新赤城線1L	新赤城線1L/新赤城線2L	不良碍子検出		変更	
0346012	東京	2026/04/15 09:00	2026/04/15 17:00	単日	港北	港北線1LのCBO1	港北1L LS201修理	制約有	変更	
0342150	東京	2026/04/17 09:00	2026/04/19 17:00	連続	新所沢(変)	南狭山線1L/南狭山線1LのCBO35	1.LS35ELS35停止試験(36年)Mg交換 2.Ls135停止試験(36年)Mg交換 3.LS235停止試験(36年)Mg交換		変更	
0342327	東京	2026/04/18 08:00	2026/04/18 13:00	単日	北多摩	新宿線1L/新宿線1LのCBO3	・新宿線1LO3, 103,203GIS12年点検 ・新宿線1LVT絶縁抵抗測定		変更	
0345504	東京	2026/04/18 13:00	2026/04/18 18:00	単日	北多摩	新宿線1L/新宿線1LのCBO3	・新宿線1LO3, 203 GIS12年点検 ・新宿線1LVT絶縁抵抗測定		変更	
0348228	東京	2026/04/18 20:00	2026/04/19 06:00	連続	墨東線2L	墨東線2L	鋼管電位法調査に伴う危険防止		変更	
0343780	東京	2026/04/19 08:00	2026/04/21 18:00	連続	新しいわき(開)	福島東幹線山線1L/福島東幹線山線1LのCBO3	福島東幹線山線1L 3 LS(電動操作)停止試験A【機能回復1回/24年】		変更	
0342144	東京	2026/04/20 09:00	2026/04/22 17:00	連続	京浜(変)	京浜線1L/京浜線1LのCBO5	京浜線1L TC・KC・IF切替 【275kV2U間係切替】	制約有	変更	
0344126	東京	2026/04/21 08:00	2026/04/21 17:00	単日	福島山幹線1L	福島山幹線1L	①電線・地線本体点検《No.》73～74 計1径間		変更	
0352308	東京	2026/04/21 09:00	2026/04/21 17:00	単日	城南	新宿城南線3L	・主変7号1次構連OFケーブル点検、絶縁油採取、分析		変更	
0343781	東京	2026/04/22 08:00	2026/04/22 18:00	単日	新しいわき(開)	福島東幹線山線1L/福島東幹線山線1LのCBO3	福島東幹線山線1L 203 LS(電動操作)停止試験A【12年】		変更	
0343975	東京	2026/04/22 08:00	2026/04/22 17:00	単日	福島東幹線山線1L	福島東幹線山線1L	①電線地線本体点検 ・福島東幹線《No.》44～45, 74～75 計2径間		変更	
0352305	東京	2026/04/22 09:00	2026/04/23 17:00	毎日	新所沢(変)	南狭山線1L/南狭山線1LのCBO35	1.中継盤(IF盤)改造 43LP制御回路追加 2.275kV1U簡易監視制御盤改造		変更	
0344018	東京	2026/04/23 08:00	2026/04/23 17:00	単日	福島東幹線山線2L	福島東幹線山線2L	①電線地線本体点検 ・福島東幹線《No.》44～45, 74～75 計2径間		変更	
0342267	東京	2026/04/23 09:00	2026/04/24 20:00	毎日	新宿	新宿線3L/新宿城南線3L	275kV3U GIS点検(EB3.R3.R7.O3.O7)		変更	
0342296	東京	2026/04/24 09:00	2026/04/24 17:00	単日	北多摩	新宿線3L	・新宿線3LSHRCBO905 3年停止試験 ・主回路接触抵抗測定		変更	
0348229	東京	2026/04/25 20:00	2026/04/26 06:00	連続	墨東線3L	墨東線3L	鋼管電位法調査に伴う危険防止		変更	
0343978	東京	2026/04/27 08:00	2026/04/27 18:00	単日	新しいわき(開)	福島東幹線山線1L/福島東幹線山線1LのCBO3	福島東幹線山線1L 103 LS(電動操作)停止試験A【12年】		変更	
0342159	東京	2026/04/27 09:00	2026/04/27 17:00	単日	新富士(変)	佐久間東幹中線1LのCBO33	【保守業務】 ・佐久間東幹中線1L LS433 LS停止試験(12年)		変更	
0342160	東京	2026/04/27 09:00	2026/05/01 17:00	連続	荏田	港北線1L/港北線1LのCBO1	港北線1L切替、ケーブル切離・接続・シーケンス試験	制約有	変更	
0343960	東京	2026/04/27 09:00	2026/04/28 17:00	毎日	西群馬(開)	西上武幹線2L/西上武幹線2LのCBO36	ガス絶縁開閉装置(GIS)(油圧操作方式) 西上武幹線2号停止試験(12年)		変更	
0342161	東京	2026/04/28 09:00	2026/04/28 17:00	単日	新富士(変)	佐久間東幹中線2LのCBO34	【保守業務】 ・佐久間東幹中線2L LS434 LS停止試験(12年)		変更	
0348231	東京	2026/04/28 09:00	2026/04/28 20:00	単日	城南	新宿城南線3L	・275kV3号ブスセクション(O300・R300・S300・ER300・ES300) GIS(油圧・電動パネ)停止試験12年【GIS】 ・275kV3号ブスセクション(O300)計器用変成器 絶縁抵抗測定		変更	
0342163	東京	2026/04/30 09:00	2026/04/30 17:00	単日	荏田	港北線1LのCBO1	港北1LGIS6年点検		変更	
0343991	東京	2026/04/30 17:00	2026/04/30 18:00	単日	新福島(変)	福島山幹線1L/福島山幹線1LのCBO1	・実系統による電圧電流位相測定試験		変更	
0344117	東京	2026/04/30 17:00	2026/04/30 18:00	単日	新しいわき(開)	福島山幹線1L/福島山幹線1LのCBO1	・実系統による電圧電流位相測定試験		変更	
0342165	東京	2026/05/01 08:00	2026/05/30 17:00	連続	南狭山線2L	南狭山線2L	1.パイプホーン補修: 18,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 計23基「技術」 2.がいし点検:《No.》3,4,5,6,18,19,43,南狭山(変) 計8基 3.特定点検:電線 《No.》17～18,18～19,23～24 計3径間		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0342166	東京	2026/05/01 08:00	2026/05/30 17:00	連続	新座線2L	新座線2L	1.防錆塗装:《No.》6,7,12,14,16,17,18,19,25,26,27 計11基「技術」 2.劣化部材補修:《No.》17,19,25,26 計4基「技術」 3.パイプホーン補修:鉄構,《No.》1,2,3,4,5,8,10,11,13,15,28,29,30,31,32,鉄構 計17基「技術」 4.がいにし点検:《No.》6,7,8,10,11,12 計6基		変更	
0342306	東京	2026/05/01 09:00	2026/05/01 17:00	単日	新宿城南線3L	新宿城南線3L	終端部シリコン油採取 作業場所:城南変電所		変更	
0342305	東京	2026/05/02 09:00	2026/05/02 17:00	単日	新宿城南線2L	新宿城南線2L	終端部シリコン油採取 作業場所:城南変電所		変更	
0342170	東京	2026/05/03 09:00	2026/05/31 17:00	連続	港北線2L	港北線2L	【保修】《No.》35部材取替,《No.》34ほか防錆塗装工事【保全】 電線腐食点検20～23, 41～43	制約有	変更	
0342313	東京	2026/05/03 09:00	2026/05/04 20:00	連続	北多摩	新宿線1L	・CBO903取替後の諸試験 ・CH～LS903リード線接続 ・LS操作試験(架線接続後に実施)		変更	
0342477	東京	2026/05/03 09:00	2026/05/03 17:00	単日	新宿城南線1L	新宿城南線1L	終端部シリコン油採取 作業場所:城南変電所		変更	
0342316	東京	2026/05/04 20:00	2026/05/04 23:00	単日	北多摩	新宿線1L	・CBO903取替後の試充電, 超音波測定 ・開閉位相制御御時間測定(CB入切試験有)		変更	
0342174	東京	2026/05/07 09:00	2026/05/07 17:00	単日	京浜(変)	南川崎線1LのCBO17	南川崎1L GIS(O17)6年停止試験	制約有	変更	
0342175	東京	2026/05/07 10:00	2026/05/07 16:00	単日	新座(変)	新座線2LのCBO2	1. GIS 6年停止試験(点検対象CBO2)		変更	
0342476	東京	2026/05/08 08:00	2026/05/31 17:00	連続	河北線4L	河北線4L	1.防錆塗装:《No.》13,《No.》15,《No.》22～ 《No.》28,《No.》30,《No.》35,《No.》38 計12基 2.停止がいにし検出:《No.》37～39 計4基		変更	
0344013	東京	2026/05/08 09:00	2026/05/08 17:00	単日	南新潟幹線1L	南新潟幹線1L	・がいにし洗浄(No.8 1基)		変更	
0351352	東京	2026/05/08 09:00	2026/05/08 17:00	単日	南狭山(変)	南狭山線2L	PD漏油修理		変更	
0351369	東京	2026/05/09 08:00	2026/05/10 17:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	・ジャンパ接続 花見川線No.11	制約有	変更	
0348227	東京	2026/05/10 08:00	2026/05/24 18:00	連続	西東京(変)	港北線2L	・保護制御モジュール更新 ・O-8普通点検 ・LS8普通点検 ・VT点検 ・垂直碍子連点検 ・LA点検	制約有	変更	
0342178	東京	2026/05/10 09:00	2026/05/11 17:00	連続	新所沢(変)	南狭山線2L/南狭山線2LのCBO46	1.LS46ELS46停止試験(36年)Mg交換 2.Ls146停止試験(36年)Mg交換 3.LS246停止試験(36年)Mg交換		変更	
0344002	東京	2026/05/10 17:00	2026/05/10 19:00	単日	花見川(変)	北千葉線2L	試充電	制約有	変更	
0344003	東京	2026/05/10 17:00	2026/05/10 19:00	単日	花見川(変)	北千葉線2LのCBO2	試充電	制約有	変更	
0342180	東京	2026/05/11 09:00	2026/06/05 17:00	連続	京浜線2L	京浜線2L	部材取替, 防雪塗装:No.1001～No.1008 アーム下面点検:No.1006,1026	制約有	変更	
0342191	東京	2026/05/11 09:00	2026/05/12 17:00	連続	港北	港北線2LのCBO2	港北2L O2 GCB 12年停止試験	制約有	変更	
0348129	東京	2026/05/11 09:00	2026/05/15 17:00	連続	新多摩線1L	新多摩線1L	【停止がいにし点検】 新多摩線《No.》7,《No.》14 【スベーサ取替】 新多摩線《No.》5-《No.》6,《No.》6-《No.》7,《No.》7-《No.》8, 《No.》8-《No.》9		変更	
0342182	東京	2026/05/11 10:00	2026/05/11 16:00	単日	新座(変)	北武蔵野線2LのCBO8	1. GIS 6年停止試験(点検対象:CBO8)		変更	
0342184	東京	2026/05/12 09:00	2026/05/12 17:00	単日	南狭山(変)	南狭山線2LのCBO6	1. CBO6 12年停止試験		変更	
0348126	東京	2026/05/12 09:00	2026/05/12 17:00	単日	新吾妻線2L	新吾妻線2L	【保守業務委託】 ▼がいにし取替 新吾妻線《No.》235 (2L 上相 若側 中連 18枚目) (2L 中相 若側 中連 13枚目)		変更	
0344009	東京	2026/05/13 08:00	2026/06/01 17:00	連続	福島中幹線1L	福島中幹線1L	《1》電線地線本体点検 ・福島幹線No.128～129, 158～159 計2径間 《2》防錆塗装工事 ・《No.》136,137,138,141,142(5基)		変更	
0342187	東京	2026/05/13 09:00	2026/05/13 17:00	単日	南狭山(変)	新座線2LのCBO4	1. CBO4 12年停止試験		変更	
0342189	東京	2026/05/13 09:00	2026/05/14 17:00	連続	京浜(変)	南川崎線2LのCBO18	南川崎2L(O18)油圧操作機構部ウレタンパッキン経年劣化修理(同型:3-1005)	制約有	変更	
0343620	東京	2026/05/13 09:00	2026/05/14 17:00	連続	豊岡(変)	豊岡線1LのCBO1	豊岡線1号GCB(O1)ウレタンパッキン修理		変更	
0351353	東京	2026/05/13 09:00	2026/05/13 17:00	単日	南川崎線2L	南川崎線2L	作業内容:接続部給油管の微小漏油箇所調査 作業場所:京浜洞道 鶴131D	制約有	変更	
0342192	東京	2026/05/14 09:00	2026/05/14 20:00	単日	城南	城南線3L	・275kV3号ブスセクション(O300・R300・S300・ER300・ES300) GIS(油圧・電動パネ)停止試験12年【GIS】 ・275kV3号ブスセクション(O300)計器用変成器 絶縁抵抗測定	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0342194	東京	2026/05/14 09:00	2026/06/10 16:00	連続	池上	池上線3LのCBO7	275kV3号母線VT ・AmpPD盤撤去 ・GISVT設置 ・制御ケーブル切り離し接続 ・諸試験		変更	
0342195	東京	2026/05/14 09:00	2026/05/14 15:00	単日	南川崎線2L	南川崎線2L	作業内容:油採取 作業場所:南川崎変電所	制約有	変更	
0348125	東京	2026/05/14 09:00	2026/05/15 17:00	毎日	新吾妻線1L	新吾妻線1L	【保守業務委託】 ▼がいし取替 新吾妻線《No.》235 (1L 上相 老側 中連 21枚目) (1L 中相 老側 外連 9枚目) (1L 下相 若側 中連 4枚目)		変更	
0342198	東京	2026/05/15 09:00	2026/05/15 15:00	単日	南川崎線3L	南川崎線3L	作業内容:油採取 作業場所:南川崎変電所	制約有	変更	
0342205	東京	2026/05/18 09:00	2026/05/18 17:00	単日	北相模(変)	佐久間東幹中線1LのCBO3	CBO3・6年点検		変更	
0342206	東京	2026/05/18 09:00	2026/05/20 17:00	連続	京浜(変)	京浜線2L/京浜線2LのCBO6	京浜線2L TC・KC・IF切替 【275kV2U関係切替】	制約有	変更	
0342208	東京	2026/05/18 09:00	2026/05/18 17:00	単日	新富士(変)	佐久間東幹中線1LのCBO33	【保守業務】 ・佐久間東幹中線1L LS333 LS停止試験(12年)		変更	
0343623	東京	2026/05/18 09:00	2026/05/19 17:00	連続	豊岡(変)	豊岡線2LのCBO2	豊岡線2号GCB(O2)ウレタンパッキン修理		変更	
0348130	東京	2026/05/18 09:00	2026/05/22 17:00	連続	新多摩線2L	新多摩線2L	【停止がいし点検】 新多摩線《No.》7,《No.》14 【スペーサ取替】 新多摩線《No.》5-《No.》6,《No.》6-《No.》7,《No.》7-《No.》8, 《No.》8-《No.》9		変更	
0342210	東京	2026/05/19 08:30	2026/05/21 17:30	毎日	佐久間東幹中線1L,2L	佐久間東幹中線1L,2L	《1》碍子点検(絶縁抵抗測定) 《No.》366〜373/8基		変更	
0342211	東京	2026/05/19 09:00	2026/05/19 17:00	単日	新富士(変)	佐久間東幹中線2LのCBO34	【保守業務】 ・佐久間東幹中線2L LS334 LS停止試験(12年)		変更	
0344098	東京	2026/05/19 09:30	2026/05/21 17:00	連続	新多摩(変)	新多摩線2L/新多摩線2LのCBO6	線路PD修理(採油)		変更	
0351371	東京	2026/05/19 09:30	2026/05/19 17:00	単日	新秦野(変)	新多摩線2LのCBO2	2025.9.4発見異常対応 ・新多摩線2L計測表示不具合調査 ・CB開放状態で20MWが表示される事象		変更	
0343973	東京	2026/05/20 09:00	2026/05/21 17:00	毎日	西群馬(開)	西上武幹線1L/西上武幹線1LのCBO35	ガス絶縁開閉装置(GIS)(油圧操作方式) 西上武幹線1号 停止試験(12年)		変更	
0344096	東京	2026/05/20 09:00	2026/05/20 17:00	単日	西上武幹線1L	西上武幹線1L	【保守業務委託】 ▼電線地線点検 西上武幹線《No.》82〜《No.》83,《No.》87〜 《No.》88 (2基)		変更	
0352302	東京	2026/05/20 09:00	2026/05/21 17:00	毎日	新所沢(変)	南狭山線2L/南狭山線2LのCBO46	1.中継盤(IF盤)改造 43LP制御回路追加 2.275kV1U簡易監視制御盤改造		変更	
0342221	東京	2026/05/25 09:00	2026/05/25 17:00	単日	荏田	港北線2LのCBO2	港北線2L GCB6年点検(GIS)		変更	
0342224	東京	2026/05/26 09:00	2026/05/30 17:00	連続	荏田	港北線2L/港北線2LのCBO2	港北線1L切替、ケーブル切離・接続・シーケンス試験	制約有	変更	
0343959	東京	2026/05/26 09:00	2026/06/26 17:00	連続	新所沢線2L	新所沢線2L	1.防錆塗装:《No.》59,66,67,68,69 5基「技術」		変更	
0345506	東京	2026/05/26 09:00	2026/06/12 17:00	連続	東京南線3L	東京南線3L	架空地線カウンターウェイト補修:No.46〜No.47ほか58箇所		変更	
0343962	東京	2026/05/26 09:30	2026/05/26 17:00	単日	新多摩(変)	新所沢線2LのCBO2	・CT137化に伴う旧BP用不使用CTケーブル切離し		変更	
0344091	東京	2026/05/26 09:30	2026/05/28 17:00	連続	新多摩(変)	新所沢線2L/新所沢線2LのCBO2	線路PD修理(採油)		変更	
0343980	東京	2026/05/30 09:00	2026/06/22 17:00	連続	新京葉(変)	房総線2L	・AMP-PD取替(巻線VT化)	制約有	変更	
0344088	東京	2026/05/30 09:00	2026/05/31 17:00	連続	房総(変)	君津線1L/君津線1LのCBO43	・LS-143停止試験(12年)5/30 ・LS-243停止試験(12年)5/31	制約有	変更	
0342230	東京	2026/05/31 09:00	2026/05/31 17:00	単日	北多摩	新宿線3LのCBO5	・新宿線3L 105 GIS(母線側断路器)6年停止試験		変更	
0342207	東京	2026/06/01 09:00	2026/06/03 17:00	毎日	北葛飾線1L	北葛飾線1L	1.停止がいし検出:《No.》17〜20 計4基		変更	
0342231	東京	2026/06/01 09:00	2026/06/03 17:00	連続	新野田(変)	北葛飾線1L/北葛飾線1LのCBO51	GCB鎖錠用ガス密度SW修理		変更	
0342232	東京	2026/06/01 09:00	2026/06/05 17:00	連続	西東京(変)	西南多摩線2L	《1》電線路細密点検(多摩ST〜《No.》520,544,545,547,548,571 /14基) 《2》鉄塔部材・ボルト取替(《No.》551,570/2基) 《3》電線補修(実施箇所検討中)	制約有	変更	
0342237	東京	2026/06/01 09:00	2026/06/02 17:00	連続	北葛飾(変)	北葛飾線1L/北葛飾線1LのCBO1	1.CBO1 6年点検 2.CBO1 X線撮影【東電修繕】		変更	
0342238	東京	2026/06/01 09:00	2026/06/03 17:00	連続	北葛飾線1L	北葛飾線1L	・停止不良がいし検出 No.2		変更	
0344053	東京	2026/06/01 09:00	2026/06/03 17:00	連続	新所沢(変)	新所沢線2LのCBO6	1.O6GCB停止試験(6年) 2.LS106停止試験(36年) 3.Mg交換		変更	
0347841	東京	2026/06/01 09:00	2026/06/01 17:00	単日	青梅・豊岡線2L	青梅・豊岡線2L	a.引下線撤去に伴う危険防止(接地なし) 豊岡線《No.》1(今井線)		変更	
0343625	東京	2026/06/02 09:00	2026/06/10 09:00	連続	豊岡(変)	豊岡線1LのCBO1	275kV甲母線接続・試験 275kVGIS甲母線既設〜新設 接続		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0343955	東京	2026/06/03 08:00	2026/06/22 17:00	連続	福島中幹線2L	福島中幹線2L	《1》電線地線本体点検 ・福島幹線No.128～129, 158～159 計2径間 《2》防錆塗装工事 ・《No.》136,137,138,141,142(5基)		変更	
0342301	東京	2026/06/03 09:00	2026/06/03 17:00	単日	上野線3L	上野線3L	探取場所:足22D		変更	
0342217	東京	2026/06/04 09:00	2026/06/06 17:00	毎日	北葛飾線2L	北葛飾線2L	1.停止がいし検出:《No.》17～20 計4基		変更	
0342244	東京	2026/06/04 09:00	2026/06/06 17:00	連続	北葛飾線2L	北葛飾線2L	・停止不良がいし検出 No.2		変更	
0342245	東京	2026/06/04 09:00	2026/06/04 17:00	単日	上野	上野線2L/上野線2LのCBO2	275kVGIS 2U線路側機器(上野2L O2)12年点検		変更	
0344056	東京	2026/06/04 09:00	2026/06/06 17:00	連続	新所沢(変)	新所沢線2LのCBO6	1.LS206停止試験(36年) 2.Mg交換		変更	
0344083	東京	2026/06/06 09:00	2026/06/07 17:00	連続	房総(変)	君津線2L/君津線2LのCBO44	・LS-144停止試験(12年)6/6 ・LS-244停止試験(12年)6/7	制約有	変更	
0342248	東京	2026/06/07 09:00	2026/06/07 20:00	単日	上野	上野線2LのCBO2/上野水道橋線2LのCBO6	275kVGIS 2U母線側機器12年点検		変更	
0341967	東京	2026/06/08 09:00	2026/06/09 17:00	毎日	西越谷線1L	西越谷線1L	1.がいし点検:《No.》7 計1基		変更	
0342250	東京	2026/06/08 09:00	2026/06/12 17:00	連続	練馬	北武蔵野線3LのCBO3/水道橋線3LのCBO7	275kV母線撤去に伴う着脱母線縁切り 275kV3号母線ガス処理		変更	
0342251	東京	2026/06/08 09:00	2026/06/10 17:00	連続	京浜(変)	東京南線3L/東京南線3LのCBO3	東京南線3L TC・KC・IF切替 【275kV2U関係切替】		変更	
0342252	東京	2026/06/08 09:00	2026/06/12 17:00	連続	荏田	世田谷線1L/世田谷線1LのCBO3	世田谷線1L切替, 制御ケーブル切離, 接続・シーケンス試験		変更	
0343979	東京	2026/06/08 09:00	2026/06/08 17:00	単日	新所沢(変)	西上武幹線1LのCBO7	1.07GIS停止試験(6年)		変更	
0347842	東京	2026/06/08 09:00	2026/06/12 17:00	毎日	青梅・豊岡線1L	青梅・豊岡線1L	a.引下線新設に伴う危険防止(接地なし) 豊岡線《No.》1(飯能線) b.電線・地線撤去に伴う危険防止(接地なし) 青梅《No.》85～飯能《No.》1		変更	
0344016	東京	2026/06/09 09:00	2026/06/09 17:00	単日	新所沢(変)	西上武幹線2LのCBO8	1.08GIS停止試験(6年)		変更	
0341968	東京	2026/06/10 09:00	2026/06/11 17:00	毎日	西越谷線2L	西越谷線2L	1.がいし点検:《No.》7 計1基		変更	
0342256	東京	2026/06/10 22:00	2026/06/10 23:00	単日	豊島	豊島線1L	・常規対地電圧印可試験	制約有	変更	
0342257	東京	2026/06/10 23:00	2026/06/10 23:59	単日	豊島	豊島線1L	VT突合せ	制約有	変更	
0342258	東京	2026/06/11 00:01	2026/06/11 01:00	単日	豊島	豊島線1L	コロナ超音波測定, VT突合せ	制約有	変更	
0342259	東京	2026/06/11 09:00	2026/06/17 17:00	連続	南池上線2L	南池上線2L	作業内容:湿式終端接続部防護対策工事 場所:池上(変)		変更	
0343628	東京	2026/06/11 09:00	2026/06/19 09:00	連続	豊岡(変)	豊岡線1LのCBO1	275kV乙母線接続・試験 275kVGIS乙母線既設～新設 接続		変更	
0342260	東京	2026/06/11 09:30	2026/06/11 17:00	単日	豊島線3L	豊島線3L	【絶縁油採取】 豊島変電所(VP)	制約有	変更	
0342253	東京	2026/06/13 09:00	2026/06/13 17:00	単日	水道橋	水道橋線3LのCBO3	3U275kV O3 GIS(油圧・電動バネ)停止試験(6年)		変更	
0342263	東京	2026/06/15 09:00	2026/06/18 17:00	連続	京浜(変)	東京南線4L/東京南線4LのCBO4	東京南線4L TC・KC・IF切替 【275kV2U関係切替】		変更	
0342264	東京	2026/06/15 09:00	2026/06/19 17:00	連続	荏田	世田谷線2L/世田谷線2LのCBO4	世田谷線2L切替, 制御ケーブル切離, 接続・シーケンス試験		変更	
0342265	東京	2026/06/15 09:00	2026/06/15 17:00	単日	水道橋線2L	水道橋線2L	絶縁油採取 場所:水道橋変電所		変更	
0347843	東京	2026/06/15 09:00	2026/06/19 17:00	毎日	青梅・豊岡線1L	青梅・豊岡線1L	a.引下線新設に伴う危険防止(接地なし) 豊岡線《No.》1(飯能線) b.電線・地線撤去に伴う危険防止(接地なし) 青梅《No.》85～飯能《No.》1		変更	
0348239	東京	2026/06/17 09:00	2026/06/17 17:00	単日	水道橋線1L	水道橋線1L	絶縁油採取 場所:水道橋変電所		変更	
0342240	東京	2026/06/18 09:00	2026/12/18 09:00	連続	北相模(変)	佐久間東幹中線1L	275kVGIS据付・切替・検査		変更	
0342243	東京	2026/06/18 09:00	2026/12/18 09:00	連続	北相模(変)	佐久間東幹中線1LのCBO3	275kVGIS据付・切替・検査		変更	
0342282	東京	2026/06/18 09:00	2026/12/18 09:00	連続	北相模(変)	佐久間東幹中線2L	275kVGIS据付・切替・検査		変更	
0342285	東京	2026/06/18 09:00	2026/12/18 09:00	連続	北相模(変)	佐久間東幹中線2LのCBO4	275kVGIS据付・切替・検査		変更	
0342268	東京	2026/06/19 09:00	2026/06/19 17:00	単日	荏田	世田谷線2LのCBO4	荏田変電所世田谷2LGIS(油圧・電動バネ)6年点検【GIS】		変更	
0348240	東京	2026/06/19 09:00	2026/06/19 17:00	単日	水道橋線3L	水道橋線3L	絶縁油採取 場所:水道橋変電所		変更	
0342269	東京	2026/06/22 09:00	2026/06/26 17:00	連続	荏田	世田谷線3L/世田谷線3LのCBO5	世田谷線3L切替, 制御ケーブル切離, 接続・シーケンス試験		変更	
0344071	東京	2026/06/22 09:00	2026/06/23 17:00	毎日	新富士(変)	新秦野線2LのCBO4	【新富士変電所7B増設他工事】 ・500kV母線鉄構補強部材調査		変更	
0348241	東京	2026/06/22 09:00	2026/06/23 17:00	連続	東京南線1L	東京南線1L	がいし点検:No.5,14,35,44,54		変更	
0351354	東京	2026/06/22 10:00	2026/06/22 12:00	単日	南横須賀(変)	東京南線1LのCBO1	東京南線1L GCB点検		変更	
0343987	東京	2026/06/22 17:00	2026/06/22 18:00	単日	房総線2L	房総線2L	・巻線VT化後の耐圧試験, 電圧突き合わせ	制約有	変更	
0342271	東京	2026/06/24 09:00	2026/06/30 17:00	連続	南池上線3L	南池上線3L	作業内容:湿式終端接続部防護対策工事 場所:池上(変)		変更	
0348242	東京	2026/06/24 09:00	2026/06/25 17:00	連続	東京南線2L	東京南線2L	がいし点検:No.5,14,35,44,54		変更	
0351355	東京	2026/06/24 10:00	2026/06/24 12:00	単日	南横須賀(変)	東京南線2LのCBO2	東京南線2L GCB点検		変更	
0342272	東京	2026/06/29 09:00	2026/07/31 17:00	連続	新富士(変)	佐久間東幹中線1L/佐久間東幹中線1LのCBO33/佐久間東幹中線2L/佐久間東幹中線2LのCBO34	【新富士(変)275kV母線鉄構塗装】 ・塗装箇所(佐久間東幹中線2L)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0348100	東京	2026/07/07 09:00	2026/07/07 17:00	単日	川内線1L	川内線1L	a. スペースサ取替 《No.》75～《No.》76		変更	
0342274	東京	2026/07/08 09:30	2026/07/08 17:00	単日	新富士(変)	佐久間東幹中線1LのCBO33	・佐久間東幹中線1L O33 GCB停止試験(6年)		変更	
0342275	東京	2026/07/09 09:30	2026/07/09 17:00	単日	新富士(変)	佐久間東幹中線2LのCBO34	・佐久間東幹中線1L O33 GCB停止試験(6年)		変更	
0344288	東京	2026/07/13 09:00	2026/07/24 13:00	連続	新岡部(変)	新岡部線1L/新岡部線1LのCBO3	1.新岡部線1号リレー取替		変更	
0348132	東京	2026/07/13 09:00	2026/07/24 13:00	連続	新秩父(開)	新岡部線1L/新岡部線1LのCBO5	1.新岡部線1号保護リレー取替		変更	
0344194	東京	2026/07/14 08:00	2026/08/07 17:00	連続	南新潟幹線1L	南新潟幹線1L	・南新潟幹線No.41～No.46OPGW張替工事 (No.41～No.46 5径間)		変更	
0345595	東京	2026/07/24 13:00	2026/07/24 17:00	単日	新岡部(変)	新岡部線1L	【新岡部線1号保護リレー取替の確認試験】 《1》電圧位相測定 《2》潮流チェック 試験No.～基送4		変更	
0348133	東京	2026/07/24 13:00	2026/07/24 17:00	単日	新秩父(開)	新岡部線1L	1.新岡部線1号保護リレー取替の確認試験 《1》電圧位相測定 《2》潮流チェック 試験No.～基送4		変更	
0344285	東京	2026/07/28 09:00	2026/08/07 13:00	連続	新岡部(変)	新岡部線2L/新岡部線2LのCBO4	1.新岡部線2号リレー取替		変更	
0348134	東京	2026/07/28 09:00	2026/08/07 13:00	連続	新秩父(開)	新岡部線2L/新岡部線2LのCBO6	1.新岡部線2号保護リレー取替		変更	
0345594	東京	2026/08/07 13:00	2026/08/07 17:00	単日	新岡部(変)	新岡部線2L	【新岡部線2号保護リレー取替の確認試験】 《1》電圧位相測定 《2》潮流チェック 試験No.～基送4		変更	
0348135	東京	2026/08/07 13:00	2026/08/07 17:00	単日	新秩父(開)	新岡部線2L	1.新岡部線2号保護リレー取替の確認試験 《1》電圧位相測定 《2》潮流チェック 試験No.～基送4		変更	
0344160	東京	2026/08/17 08:00	2026/09/11 17:00	連続	南新潟幹線2L	南新潟幹線2L	・南新潟幹線No.41～No.46OPGW張替工事 (No.41～No.46 5径間)		変更	
0344283	東京	2026/08/17 09:00	2026/08/21 17:00	連続	新秦野線1L	新秦野線1L	【電線・地線本体点検】 《No.》35～《No.》36,《No.》40～《No.》41,《No.》45～《No.》46,《No.》 50～《No.》51,《No.》55～《No.》56 【がいし点検】 《No.》10,《No.》35,《No.》50,《No.》55,《No.》57		変更	
0344282	東京	2026/08/24 09:00	2026/08/28 17:00	連続	新秦野線2L	新秦野線2L	【電線・地線本体点検】 《No.》35～《No.》36,《No.》40～《No.》41,《No.》45～《No.》46,《No.》 50～《No.》51,《No.》55～《No.》56 【がいし点検】 《No.》10,《No.》35,《No.》50,《No.》55,《No.》57		変更	
0344128	東京	2026/09/01 08:00	2026/09/21 17:00	連続	新しいわき線1L	新しいわき線1L	【総支社】○電線地線本体点検 ・No.219～220、224～225、234～235、239～240、244～245、 254～新今市(開) 計6径間 ○鉄塔防錆塗装工事 ・《No.》192、193、194、196、197、199 計6基		変更	
0344164	東京	2026/09/07 08:00	2026/09/21 17:00	連続	新しいわき線1L	新しいわき線1L	鉄塔防錆塗装工事 《No.》40,42,43,44,45,47,48,49,50,51(10基)		変更	
0352070	東京	2026/09/14 09:00	2026/09/16 17:00	連続	新筑波(変)	新筑波線1LのCBO3	CBO3アキュムレータ修理		変更	
0344132	東京	2026/09/16 09:00	2026/09/16 17:00	単日	西群馬(開)	東群馬幹線1LのCBO43	ガス絶縁開閉装置(GIS)(油圧操作方式) 東群馬幹線1号 停止試験(6年)		変更	
0344272	東京	2026/09/16 09:00	2026/09/16 17:00	単日	東群馬幹線1L	東群馬幹線1L	【保守業務委託】 ▼電線地線点検 東群馬幹線《No.》48～《No.》49 (1径間)		変更	
0344144	東京	2026/09/17 09:00	2026/09/18 17:00	連続	西群馬(開)	東群馬幹線2LのCBO44/東群馬幹線2L	ガス絶縁開閉装置(GIS)(油圧操作方式) 東群馬幹線2号 停止試験(6年)		変更	
0344271	東京	2026/09/17 09:00	2026/09/17 17:00	単日	東群馬幹線2L	東群馬幹線2L	【保守業務委託】 ▼電線地線点検 東群馬幹線《No.》48～《No.》49 (1径間)		変更	
0344139	東京	2026/09/22 08:00	2026/10/12 17:00	連続	新しいわき線2L	新しいわき線2L	【総支社】○電線地線本体点検 ・No.219～220、224～225、234～235、239～240、244～245、 254～新今市(開) 計6径間 ○鉄塔防錆塗装工事 ・《No.》192、193、194、196、197、199 計6基		変更	
0344140	東京	2026/09/22 08:00	2026/10/06 17:00	連続	新しいわき線2L	新しいわき線2L	鉄塔防錆塗装工事 《No.》40,42,43,44,45,47,48,49,50,51(10基)		変更	
0348157	東京	2026/09/23 10:00	2026/09/23 16:00	単日	新今市(開)	新しいわき線2LのCBO4	★R4・O4動作カウンター修理		変更	
0342202	東京	2026/10/01 08:00	2026/11/15 17:00	連続	新京葉(変)	江東線2L/江東線2LのCBO36	・架線撤去、架線取付 ・共接地EM改造 ・セミGIS取替	制約有	変更	
0342203	東京	2026/10/01 09:00	2026/10/01 17:00	単日	江東	城南線1LのCBO5	リード線外しに伴う危険防止	制約有	変更	
0342204	東京	2026/10/01 09:00	2026/10/01 17:00	単日	港(制)変保	城南線1L	リード線外しに伴う危険防止	制約有	変更	
0342297	東京	2026/10/01 09:00	2026/12/30 17:00	連続	江東	城南線1L/城南線1LのCBO5	275kV城南線1番 変流器取替	制約有	変更	
0342298	東京	2026/10/01 09:00	2026/12/30 17:00	連続	城南線1L	城南線1L	作業内容:ケーブル引入れ、ケーブル切断、接続部組立 作業場所:江東変電所～砂町洞道	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0342299	東京	2026/10/01 09:00	2026/11/06 17:00	連続	池上	南池上線3LのCBO17	275kV3号母線VT ・AmpPD盤撤去 ・GIS改造VT設置 ・制御ケーブル切り離し接続 ・諸試験		変更	
0342364	東京	2026/10/01 09:00	2026/12/30 17:00	連続	城南	城南線1L	・制御ケーブル切離し、接続 ・確認試験 ・主変1B保護リレー取替	制約有	変更	
0348248	東京	2026/10/01 09:00	2026/10/02 17:00	連続	江東線2L	江東線2L	作業内容:鋼管内部腐食点検 作業箇所:江東線《No.》89,90		変更	
0348249	東京	2026/10/01 09:00	2026/10/03 17:00	連続	東京南線3L	東京南線3L	ジャンパ開放:No.46(若)		変更	
0342453	東京	2026/10/02 10:00	2026/10/02 15:00	単日	北東京(変)	東京中線1LのCBO1	東京中線1L O1停止試験12年		変更	
0344254	東京	2026/10/03 09:00	2026/10/03 17:00	単日	新佐原線1L	新佐原線1L	【点検補修】 1.電線腐食点検 新佐原線No.99～100	制約有	変更	
0348151	東京	2026/10/03 09:00	2026/10/03 17:00	単日	新佐原(変)	新佐原線1L/新佐原線1LのCBO5	新佐原線1号O-5GCB12年停止試験、新佐原線1号GISブッシング12年停止試験	制約有	変更	
0348250	東京	2026/10/03 17:00	2029/03/26 09:00	連続	東京南線3L	東京南線3L	鉄塔建替:No.6ほか19基 鉄塔改造:No.4ほか19基 鉄塔補強:No.1 1基 防錆塗装:No.2～No.45		変更	
0344251	東京	2026/10/04 09:00	2026/10/04 17:00	単日	新佐原線2L	新佐原線2L	【点検補修】 1.電線腐食点検 新佐原線No.123～124	制約有	変更	
0348152	東京	2026/10/04 09:00	2026/10/04 17:00	単日	新佐原(変)	新佐原線2L/新佐原線2LのCBO6	新佐原線2号O-6GCB12年停止試験、新佐原線2号GISブッシング12年停止試験	制約有	変更	
0344297	東京	2026/10/05 08:00	2026/10/07 18:00	連続	南いわき(開)	相馬双葉幹線1L/相馬双葉幹線1LのCBO31	GIS 相馬双葉幹線1L GIS(油圧・電動バネ)12年停止試験A[GIS]		変更	
0342465	東京	2026/10/05 09:00	2026/10/05 17:00	単日	江東	江東線2L/江東線2LのCBO2	275kV江東線2L 2 102 202 LS停止試験【12年点検】O2GCB(油圧・電動バネ)普点A(6年)	制約有	変更	
0343634	東京	2026/10/05 09:00	2026/12/25 13:00	連続	新飯能(変)	青梅・豊岡線2L	・275kVGIS複母線化 ※2Bならびに青梅線2L乙母線断路器設置、社内試験		変更	
0348251	東京	2026/10/05 09:00	2026/10/07 17:00	連続	東京南線4L	東京南線4L	ジャンパ開放:No.46(若)		変更	
0352314	東京	2026/10/05 09:00	2026/10/05 17:00	単日	江東	江東線2LのCBO2	275kV江東線2L 2 LS停止試験【12年点検】O2GCB(油圧・電動バネ)普点A(6年)		変更	
0344214	東京	2026/10/06 08:00	2026/10/26 17:00	連続	新茂木線1L	新茂木線1L	【総支社】鉄塔防錆塗装工事 ・新茂木線《No.》452,452,453,454,455,456,457,458 計8基 ○電線地線本体点検 ・新茂木線No.423～424、436～437、438～439、441～442、443～444、446～447、448～449、451～452、456～457、458～459、466～新茂木(変) 計11区間		変更	
0344296	東京	2026/10/06 08:00	2026/10/06 18:00	単日	南いわき(開)	相馬双葉幹線1L/相馬双葉幹線1LのCBO31/500kV甲1母線	GIS 相馬双葉幹線1L GIS(油圧・電動バネ)12年停止試験A[GIS]		変更	
0344213	東京	2026/10/06 10:00	2026/10/06 17:00	単日	新秩父(開)	新岡部線1LのCBO5	1.CBO5停止試験【6年】		変更	
0344294	東京	2026/10/07 08:00	2026/10/07 18:00	単日	南いわき(開)	相馬双葉幹線1L/相馬双葉幹線1LのCBO31	GIS ガス遮断器 相馬双葉幹線1L O31 GCB(油圧・電動バネ)6年停止試験[GIS]		変更	
0344295	東京	2026/10/07 08:00	2026/10/07 18:00	単日	南いわき(開)	相馬双葉幹線1L/相馬双葉幹線1LのCBO31/500kV乙1母線	GIS 相馬双葉幹線1L GIS(油圧・電動バネ)12年停止試験A[GIS]		変更	
0342458	東京	2026/10/07 09:00	2026/11/20 17:00	連続	水道橋線1L	水道橋線1L	防食層保護装置補修工事		変更	
0346013	東京	2026/10/07 09:00	2026/11/20 17:00	連続	練馬	水道橋線1LのCBO5	275kV1号母線改造・ガス処理・引出口増設(ドッキング)		変更	
0344216	東京	2026/10/07 10:00	2026/10/07 17:00	単日	新岡部(変)	新岡部線1LのCBO3	・CBO3停止試験【6年】		変更	
0348253	東京	2026/10/07 17:00	2029/09/25 09:00	連続	東京南線4L	東京南線4L	鉄塔建替:No.6ほか19基 鉄塔改造:No.4ほか19基 鉄塔補強:No.1 1基 防錆塗装:No.2～No.45		変更	
0344292	東京	2026/10/08 08:00	2026/10/10 18:00	連続	南いわき(開)	相馬双葉幹線2L/相馬双葉幹線2LのCBO32	GIS 相馬双葉幹線2L GIS(油圧・電動バネ)12年停止試験A[GIS]		変更	
0344293	東京	2026/10/08 08:00	2026/10/08 17:00	単日	南いわき(開)	相馬双葉幹線2L/相馬双葉幹線2LのCBO32	GIS ガス遮断器 相馬双葉幹線2L O32 GCB(油圧・電動バネ)6年停止試験[GIS]		変更	
0342461	東京	2026/10/08 10:00	2026/10/08 15:00	単日	北東京(変)	東京中線2LのCBO2	東京中線2L O2停止試験12年		変更	
0342462	東京	2026/10/08 10:00	2026/10/08 15:00	単日	北東京(変)	東京中線2LのCBO2	東京中線2L CBO2 停止試験12年		変更	
0344291	東京	2026/10/09 08:00	2026/10/09 18:00	単日	南いわき(開)	相馬双葉幹線2L/相馬双葉幹線2LのCBO32/500kV甲1母線	GIS 相馬双葉幹線2L GIS(油圧・電動バネ)12年停止試験A[GIS]		変更	
0344290	東京	2026/10/10 08:00	2026/10/10 18:00	単日	南いわき(開)	相馬双葉幹線2L/相馬双葉幹線2LのCBO32/500kV乙1母線	GIS 相馬双葉幹線2L GIS(油圧・電動バネ)12年停止試験A[GIS]		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0344199	東京	2026/10/10 09:00	2026/11/03 17:00	連続	福島里幹線1L	福島里幹線1L	【福島幹線《No.》348他鉄塔防錆塗装工事】 1.鉄塔防錆塗装 福島幹線《No.》348, 349, 350, 352, 364, 366, 372, 420, 430, 431, 433		変更	
0343798	東京	2026/10/13 08:00	2026/10/15 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	(1)電線本体点検 《No.》37～38,《No.》50～51,《No.》110～111 計3径間 (2)地線本体点検 《No.》1-2～1,《No.》7～8 計3径間		変更	
0343833	東京	2026/10/13 09:00	2026/12/08 17:00	連続	印旛線1L	印旛線1L	印旛線No93～No.102 計17基		変更	
0341971	東京	2026/10/13 10:00	2026/10/16 17:00	連続	北与野線3L	北与野線3L	接続部放射線撮影に伴う危険防止停止		変更	
0343885	東京	2026/10/14 09:00	2026/10/14 17:00	単日	西上武幹線2L	西上武幹線2L	【保守業務委託】 ▼電線地線点検 西上武幹線《No.》82～《No.》83, 《No.》87～《No.》88 (2基)		変更	
0344632	東京	2026/10/14 09:00	2026/10/14 17:00	単日	新茂木(変)	新茂木線1LのCBO11	○新茂木線1L O11 GCB 6年停止試験(油圧・電動パネ)【GCB】		変更	
0346018	東京	2026/10/15 08:00	2026/10/16 20:00	連続	新座(変)	新座線2LのCBO2	<2U母線保護リレー取替> 1. 制御回路切替 2. 確認試験		変更	
0343797	東京	2026/10/16 09:00	2026/10/20 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	(1)電線本体点検 《No.》1-2～1,《No.》7～8 計2径間 (2)地線本体点検 《No.》1-2～1,《No.》7～8 計2径間		変更	
0343841	東京	2026/10/19 08:00	2026/10/25 18:00	連続	房総(変)	北千葉線2LのCBO54	275kV甲1母線63kA化	制約有	変更	
0346019	東京	2026/10/19 08:00	2026/10/20 20:00	連続	新座(変)	北武蔵野線3LのCBO9	<2U母線保護リレー取替> 1. 制御回路切替 2. 確認試験		変更	
0343800	東京	2026/10/21 08:00	2026/10/23 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	(1)電線本体点検 《No.》37～38,《No.》50～51,《No.》110～111 計3径間 (2)地線本体点検 《No.》1-2～1,《No.》7～8 計3径間		変更	
0343635	東京	2026/10/21 09:00	2026/11/10 17:00	連続	青梅・豊岡線2L	青梅・豊岡線2L	1.航空標識塗装:《No.》5.9.13.16.19 計5基 2.防錆塗装:《No.》10.12 計2基		変更	
0343876	東京	2026/10/21 09:00	2026/10/25 17:00	連続	新茂木(変)	新茂木線1LのCBO11	■E111S操作機構取替		変更	
0343799	東京	2026/10/26 09:00	2026/10/30 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	(1)電線本体点検 《No.》1-2～1,《No.》7～8 計2径間 (2)地線本体点検 《No.》1-2～1,《No.》7～8 計2径間		変更	
0344399	東京	2026/10/27 09:00	2026/10/31 17:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線1LのCBO5	■E105S操作機構取替		変更	
0346038	東京	2026/10/27 09:00	2026/10/27 17:00	単日	那珂(変)	那珂線1LのCBO3	CBO3操作機構部修理	制約有	変更	
0342308	東京	2026/10/28 09:00	2026/11/03 17:00	連続	佐久間東幹中線1L	佐久間東幹中線1L	(1)電線路細密点検 《No.》290～306／17基 (2)電線補修 実施箇所検討中 (3)鉄塔防錆塗装 実施箇所検討中 (4)鉄塔部材・ボルト取替 実施箇所検討中		変更	
0346037	東京	2026/10/28 09:00	2026/10/28 17:00	単日	那珂(変)	那珂線2LのCBO4	CBO4操作機構部修理 BO4Lインターロック用接地軸修理	制約有	変更	
0344365	東京	2026/10/30 08:00	2026/11/05 18:00	連続	房総(変)	北千葉線2LのCBO54	275kV甲1母線63kA化	制約有	変更	
0348166	東京	2026/10/30 09:00	2026/10/30 17:00	単日	新栃木(変)	中栃木線2L/中栃木線2LのCBO6	★E6モーター用電源ケーブル修理		変更	
0342307	東京	2026/10/31 09:00	2026/10/31 17:00	単日	東内幸町線3L	東内幸町線3L	絶縁油採取 場所:東内幸町変電所	制約有	変更	
0342309	東京	2026/10/31 09:30	2026/10/31 17:00	単日	東内幸町線3L	東内幸町線3L	【絶縁油採取】 豊島変電所(VP)	制約有	変更	
0344367	東京	2026/11/02 08:00	2026/11/22 17:00	連続	新茂木線2L	新茂木線2L	【総支社】鉄塔防錆塗装工事 ・新茂木線《No.》450,452,453,454,455,456,457,458 計8基 ○電線地線本体点検 ・新茂木線No.423～424, 436～437, 438～439, 441～442, 443～444, 446～447, 448～449, 451～452, 456～457, 458～459, 466～新茂木(変) 計11径間		変更	
0341955	東京	2026/11/02 09:00	2026/11/02 17:00	単日	新岡部(変)	北熊谷線1L/北熊谷線1LのCBO33	・北熊谷線1号 CBO33 GIS普点A		変更	
0342310	東京	2026/11/02 09:00	2026/12/17 17:00	連続	東内幸町線2L	東内幸町線2L	・中間接続部補修,7mmシート補修 ・場所:文6D(赤相)	制約有	変更	
0342318	東京	2026/11/04 09:00	2026/11/13 17:00	連続	佐久間東幹中線2L	佐久間東幹中線2L	(1)電線路細密点検 《No.》290～306／17基 (2)電線補修 実施箇所検討中 (3)鉄塔防錆塗装 実施箇所検討中 (4)鉄塔部材・ボルト取替 実施箇所検討中		変更	
0342421	東京	2026/11/06 09:00	2026/11/06 17:00	単日	永代橋	豊洲永代橋線1LのCBO5	豊洲永代橋線1LのCBO5 GIS6年停止試験		変更	
0342422	東京	2026/11/06 09:00	2026/11/06 17:00	単日	東内幸町線2L	東内幸町線2L	絶縁油採取 場所:東内幸町変電所	制約有	変更	
0344337	東京	2026/11/07 09:00	2026/11/08 17:00	連続	筑波南(変)	鹿島線1L/鹿島線1LのCBO1	鹿島線1L GIS(275kV油圧電動)停止試験(GCB含・12年)【GIS】	制約有	変更	
0344339	東京	2026/11/07 09:00	2026/11/08 17:00	連続	常総(変)	鹿島線1L鹿島側/鹿島線1LのCBO3	鹿島線1L(鹿島側) O3 GCB(油圧・電動パネ)停止試験(12年)【GCB】	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0344168	東京	2026/11/09 08:00	2026/11/13 17:00	連続	福島東幹線里線1L	福島東幹線里線1L	【総支社】○電線地線本体点検 ・福島東幹線No.246～247、251～252、258～259、261～262、263～263-1、265～266、267～268、270～271、272～273、277～278 計10径間		変更	
0344323	東京	2026/11/09 08:00	2026/11/09 17:00	単日	福島東幹線里線1L	福島東幹線里線1L	①電線地線本体点検 ・福島東幹線No.101～102、131～13 計2径間		変更	
0344325	東京	2026/11/09 09:00	2026/12/04 17:00	連続	新所沢線1L	新所沢線1L	1.防錆塗装:《No.》59.66.67.68.69 5基「技術」		変更	
0344348	東京	2026/11/09 09:00	2026/11/10 17:00	連続	筑波南(変)	鹿島線2L/鹿島線2LのCBO2	鹿島線2L GIS(275kV油圧電動)停止試験(GCB含・12年)【GIS】	制約有	変更	
0348174	東京	2026/11/09 09:00	2026/11/13 17:00	連続	福島東幹線里線1L	福島東幹線里線1L	1.電線地線本体点検 福島東幹線《No.》329～330,334～335,339～340,344～345,349～350,354～355.		変更	
0342393	東京	2026/11/10 09:00	2026/11/10 12:00	単日	東内幸町	東内幸町線2LのCBO5	ガス絶縁開閉装置 275kV油圧操作(線路側機器) 6年開閉時間測定 2U O5(東内幸町2L)	制約有	変更	
0344358	東京	2026/11/10 09:00	2026/11/10 17:00	単日	新所沢(変)	新所沢線1LのCBO5	1.Ls105停止試験(36年) 2.Mg交換 3.O5GCB停止試験(6年)		変更	
0344384	東京	2026/11/10 09:00	2026/11/12 17:00	連続	新多摩(変)	新所沢線1L/新所沢線1LのCBO1	線路PD修理(採油)		変更	
0344633	東京	2026/11/10 09:00	2026/11/10 17:00	単日	新茂木(変)	新茂木線2LのCBO12	○新茂木線2L O12 GCB 6年停止試験(油圧・電動パネ)【GCB】		変更	
0346022	東京	2026/11/11 08:00	2026/11/12 20:00	連続	新座(変)	新座線2LのCBO2	<2U母線保護リレー取替> 1.旧制御回路切離し 2.確認試験		変更	
0348261	東京	2026/11/11 08:00	2026/11/13 17:00	連続	江東線2L	江東線2L	・電線地線本体点検 No.60～76 計4径間 ・電線腐食点検 No.58～60 計2径間		変更	
0348178	東京	2026/11/11 09:00	2026/11/12 17:00	連続	新京葉(変)	東京東線2LのCBO38	・LS238導電部修理		変更	
0344338	東京	2026/11/14 09:00	2026/11/15 17:00	連続	鹿島(変)	鹿島線1L/鹿島線1LのCBO7	鹿島線1号 O7 GCB(油圧・電動パネ)停止試験(12年)【GCB】	制約有	変更	
0344355	東京	2026/11/14 09:00	2026/11/15 17:00	連続	鹿島(変)	鹿島線1L/鹿島線1LのCBO7	鹿島線1LWB プッシング停止試験A【壁貫】(12年)未分析	制約有	変更	
0344360	東京	2026/11/14 09:00	2026/11/15 17:00	連続	新所沢(変)	新所沢線1LのCBO5	1.Ls205停止試験(36年) 2.Mg交換 3.O5GCB停止試験(6年)		変更	
0344383	東京	2026/11/15 09:00	2026/11/15 17:00	単日	新所沢(変)	新所沢線1L	1.EL5 接地開閉器Mg修理		変更	
0342303	東京	2026/11/15 17:00	2026/11/15 19:00	単日	新京葉(変)	江東線2L/江東線2LのCBO36	・耐圧試験	制約有	変更	
0344208	東京	2026/11/16 08:00	2026/11/20 17:00	連続	福島東幹線里線2L	福島東幹線里線2L	【総支社】○電線地線本体点検 ・福島東幹線No.246～247、251～252、258～259、261～262、263～263-1、265～266、267～268、270～271、272～273、277～278 計10径間		変更	
0344324	東京	2026/11/16 08:00	2026/11/16 17:00	単日	福島東幹線里線2L	福島東幹線里線2L	①電線地線本体点検 ・福島東幹線No.101～102、131～132 計2径間		変更	
0348264	東京	2026/11/16 08:00	2026/11/18 17:00	連続	江東線1L	江東線1L	・電線地線本体点検 No.60～76 計4径間 ・電線腐食点検 No.58～60 計2径間		変更	
0344349	東京	2026/11/16 09:00	2026/11/17 17:00	連続	鹿島(変)	鹿島線2L/鹿島線2LのCBO8	鹿島線2号 O8 GCB(油圧・電動パネ)停止試験(12年)【GCB】	制約有	変更	
0344402	東京	2026/11/16 09:00	2026/11/20 17:00	連続	新筑波(変)	福島東幹線里線2L/福島東幹線里線2LのCBO2	福島東幹線里線2L 2 (E2 BO2L 含) LS(電動操作)停止試験(12年)【LS】		変更	
0347844	東京	2026/11/16 09:00	2026/11/20 17:00	毎日	青梅・豊岡線2L	青梅・豊岡線2L	a.引下線撤去に伴う危険防止(接地なし) 豊岡線《No.》1(今井線)		変更	
0348182	東京	2026/11/16 09:00	2026/11/20 17:00	連続	福島東幹線里線2L	福島東幹線里線2L	1.電線地線本体点検 福島東幹線《No.》329～330,334～335,339～340,344～345,349～350,354～355.		変更	
0348184	東京	2026/11/16 09:00	2026/11/17 17:00	連続	鹿島(変)	鹿島線2L/鹿島線2LのCBO8	鹿島線2LWB プッシング停止試験A【壁貫】(12年)未分析(コーキング)		変更	
0346023	東京	2026/11/17 08:00	2026/11/18 20:00	連続	新座(変)	北武蔵野線3LのCBO9	<2U母線保護リレー取替> 1.制御回路切替 2.確認試験		変更	
0342329	東京	2026/11/18 09:00	2026/11/18 17:00	単日	江東	江東線1L/江東線1LのCBO1	275kV江東線1L 1 101 201 LS停止試験【12年点検】O1GCB(油圧・電動パネ)普点A(6年)	制約有	変更	
0343695	東京	2026/11/24 09:00	2026/12/18 17:00	連続	福島里幹線2L	福島里幹線2L	【福島幹線《No.》348他鉄塔防錆塗装工事】 1.鉄塔防錆塗装 福島幹線《No.》348, 349, 350, 352, 364, 366, 372, 420, 430, 431, 433		変更	
0343740	東京	2026/11/24 09:00	2026/11/28 17:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線2LのCBO6	■E106S操作機構取替		変更	
0348191	東京	2026/11/25 08:00	2026/11/27 17:00	連続	新栃木線2L	新栃木線2L	【北部送電】○がいの取替 ・《No.》202,204,270 3基		変更	
0344631	東京	2026/11/25 09:00	2026/11/26 17:00	連続	新古河(変)	福島里幹線2LのCBO6	福島東幹線里線2L O6 GCB(油圧・電動パネ)停止試験(12年)【GCB】		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0348192	東京	2026/11/30 08:00	2026/11/30 17:00	単日	新栃木線1L	新栃木線1L	【北部送電】〇がいの取替 ・《No.》202 1基		変更	
0345510	東京	2026/11/30 09:00	2026/12/25 14:00	連続	東内幸町	豊洲内幸町線2L/豊洲内幸町線2LのCBO2	豊洲内幸町2L電流差動Ry取替 ・制御ケーブル切離、撤去、布設、接続 ・保護リレー盤撤去、据付 ・保護継電器試験(単体、対向) ・交流回路他確認試験 ・警報表示・実トリップ・操作試験		変更	
0345511	東京	2026/11/30 09:00	2026/12/21 17:00	連続	新豊洲	豊洲内幸町線2LのCBO65	275kV豊洲内幸町線2番送電線リレー改造		変更	
0345512	東京	2026/11/30 09:00	2026/12/21 17:00	連続	新豊洲	豊洲内幸町線2L/豊洲内幸町線2LのCBO65	275kV豊洲内幸町線2番送電線IF盤改造		変更	
0345516	東京	2026/11/30 09:00	2026/12/25 14:00	連続	東内幸町	豊洲内幸町線2L/豊洲内幸町線2LのCBO2	豊洲内幸町線2LRy取替 ・制御ケーブル切離、撤去、布設、接続 ・交流回路他確認試験 ・操作、警報表示、TM試験		変更	
0348195	東京	2026/12/01 09:00	2026/12/02 17:00	連続	新新田線1L	新新田線1L	1.電線腐食点検 2.スベーサ取替 《No.》73～《No.》74		変更	
0344423	東京	2026/12/03 09:00	2026/12/04 17:00	連続	城南	城南線1L	・城南線1番(R1・ELR1)断路器275kV逆さ吊り(電動)停止試験 ・主変1号2次(O11)開閉時間測定 ・1号分路リアクトル(O91)開閉時間測定	制約有	変更	
0343671	東京	2026/12/06 09:00	2026/12/24 17:00	連続	房総(変)	房総線1L	・房総線1L(BO1)撤去、碍子型CT撤去 ・旧2U母線連絡鉄構撤去	制約有	変更	
0342362	東京	2026/12/08 09:00	2026/12/08 17:00	単日	江東	城南線1LのCBO5	275kV城南線1L O5 GCB(油圧・電動バネ)普点B(12年)	制約有	変更	
0342365	東京	2026/12/08 09:00	2026/12/08 17:00	単日	江東	城南線1L/城南線1LのCBO5	城南線1L 5 LS停止試験【重要回線線路用12年点検】	制約有	変更	
0343672	東京	2026/12/08 10:00	2026/12/08 15:00	単日	新京葉(変)	房総線1LのCBO3	・O-3 6年停止試験	制約有	変更	
0343720	東京	2026/12/15 09:00	2026/12/15 17:00	単日	新様名(変)	新様名線2LのCBO4	LS204ベアリング修理		変更	
0341969	東京	2026/12/15 10:00	2026/12/18 17:00	連続	北与野線2L	北与野線2L	接続部放射線撮影に伴う危険防止停止		変更	
0342434	東京	2026/12/17 17:00	2026/12/17 17:30	単日	東内幸町線2L	東内幸町線2L	常規対地電圧印加試験	制約有	変更	
0342277	東京	2026/12/18 09:00	2026/12/18 12:00	単日	北相模(変)	佐久間東幹中線1L	275kV1U→2Uへ切替・試充電試験		変更	
0342278	東京	2026/12/18 09:00	2026/12/18 12:00	単日	北相模(変)	佐久間東幹中線1LのCBO3	275kV1U→2Uへ切替・試充電試験		変更	
0343713	東京	2026/12/18 09:00	2026/12/24 17:00	連続	房総(変)	房総線1LのCBO1	・制御ケーブル切離し、接続 ・シーケンス試験	制約有	変更	
0343714	東京	2026/12/18 09:00	2026/12/24 17:00	連続	房総(変)	房総線1LのOLR	・制御ケーブル切離し、接続 ・シーケンス試験		変更	
0342367	東京	2026/12/18 13:00	2026/12/18 17:00	単日	北相模(変)	佐久間東幹中線2L	275kV1U→2Uへ切替・試充電試験		変更	
0342368	東京	2026/12/18 13:00	2026/12/18 17:00	単日	北相模(変)	佐久間東幹中線2LのCBO4	275kV1U→2Uへ切替・試充電試験		変更	
0342370	東京	2026/12/19 09:00	2026/12/25 17:00	連続	佐久間東幹里線1L	佐久間東幹里線1L/佐久間東幹里線2L	《1》落雪装置の取り付け《No.》429～431/2径間 《2》電線補修 実施箇所検討中 《3》鉄塔防錆塗装 実施箇所検討中		変更	
0342371	東京	2026/12/19 09:00	2026/12/20 17:00	連続	北相模(変)	佐久間東幹里線1L	GIS12年点検		変更	
0343710	東京	2026/12/22 09:00	2026/12/22 17:00	単日	房総(変)	房総線1L	・制御ケーブル切離し、接続 ・シーケンス試験	制約有	変更	
0343709	東京	2026/12/24 17:00	2026/12/24 18:00	単日	房総(変)	房総線1L	・電圧、電流測定	制約有	変更	
0343637	東京	2026/12/25 13:00	2026/12/25 17:00	単日	新館能(変)	青梅・豊岡線2L	・275kVGIS複母線化に伴う諸試験		変更	
0345513	東京	2026/12/25 14:00	2026/12/25 16:00	単日	東内幸町	豊洲内幸町線2L/豊洲内幸町線2LのCBO2	豊洲内幸町2L電流差動Ry取替に伴うVT突合せ、電流位相測定		変更	
0345514	東京	2026/12/25 14:00	2026/12/25 16:00	単日	東内幸町	豊洲内幸町線2L/豊洲内幸町線2LのCBO2	充電後電流位相測定		変更	
0342447	東京	2026/12/30 09:00	2026/12/30 17:00	単日	港(制)変保	城南線1L	リード線接続に伴う危険防止	制約有	変更	
0342448	東京	2026/12/30 09:00	2026/12/30 17:00	単日	江東	城南線1LのCBO5	リード線接続に伴う危険防止	制約有	変更	
0342374	東京	2026/12/30 17:00	2026/12/30 17:30	単日	城南線1L	城南線1L	作業内容:絶縁耐力試験(使用前自主検査) 作業場所:江東変電所	制約有	変更	
0342375	東京	2026/12/30 17:00	2026/12/30 18:00	単日	江東	城南線1L	275kV城南線1番 変流器回路チェック	制約有	変更	
0342376	東京	2027/01/04 09:00	2027/03/31 17:00	連続	城南線2L	城南線2L	作業内容:ケーブル引入れ、ケーブル切断、接続部組立 作業場所:江東変電所～砂町洞道	制約有	変更	
0342449	東京	2027/01/04 09:00	2027/01/04 17:00	単日	江東	城南線2LのCBO6	リード線外しに伴う危険防止	制約有	変更	
0342450	東京	2027/01/04 09:00	2027/01/04 17:00	単日	城南	城南線2L	リード線外しに伴う危険防止	制約有	変更	
0343707	東京	2027/01/06 08:30	2027/01/08 17:00	連続	新富士(変)	新秦野線2LのCBO4	【新富士変電所7B増設他工事】 ・500kV母線鉄構補強		変更	
0342380	東京	2027/01/12 09:00	2027/03/31 17:00	連続	江東	城南線2L/城南線2LのCBO6	275kV城南線2番 変流器取替	制約有	変更	
0342404	東京	2027/01/12 09:00	2027/03/31 17:00	連続	城南	城南線2L	・制御ケーブル切離し、接続 ・確認試験 ・主変2B保護リレー取替	制約有	変更	
0341963	東京	2027/01/13 09:00	2027/02/08 17:00	連続	北熊谷線2L	北熊谷線2L	1.防錆塗装工事 《No.》18他 計5基		変更	
0343638	東京	2027/01/13 09:00	2027/02/17 13:00	連続	新館能(変)	青梅・豊岡線2L	275kV青梅線2L接続変更		変更	
0352311	東京	2027/01/14 09:00	2027/01/14 17:00	単日	城南	新宿城南線2L	・主変6号1次構連OFケーブル点検、絶縁油採取、分析		変更	
0343706	東京	2027/01/18 08:30	2027/01/22 17:00	連続	新富士(変)	新秦野線2LのCBO4	【新富士変電所7B増設他工事】 ・500kV母線鉄構補強		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0342383	東京	2027/01/20 09:00	2027/01/20 17:00	単日	永代橋	墨東線2LのCBO2	275kV2U O2 GIS(油圧・電動パネ)停止試験(6年)		変更	
0343566	東京	2027/01/25 09:00	2027/01/27 17:00	連続	新赤城線1L	新赤城線1L	電線路細密点検		変更	
0344630	東京	2027/01/26 09:00	2027/01/27 17:00	連続	新古河(変)	福島東幹線1LのCBO5	福島東幹線1L O5 GCB(油圧・電動パネ)停止試験(12年)【GCB】		変更	
0343573	東京	2027/01/28 09:00	2027/01/30 17:00	連続	新赤城線2L	新赤城線2L	電線路細密点検		変更	
0348098	東京	2027/02/01 08:00	2027/02/01 17:00	単日	千葉印西(変)	275kV甲1母線	・1B運転開始 ・使用前自主主検査 ・コナ測定、超音波測定		変更	
0346025	東京	2027/02/01 09:00	2027/03/11 17:00	連続	東内幸町線1L	東内幸町線1L	・中間接続部補修,アラミシート補修 ・場所:文6D(赤相)	制約有	変更	
0342212	東京	2027/02/02 09:00	2027/02/02 17:00	単日	東内幸町線1L	東内幸町線1L	絶縁油採取 場所:東内幸町変電所	制約有	変更	
0342385	東京	2027/02/16 09:00	2027/02/16 17:00	単日	江東	城南線2L/城南線2LのCBO6	城南線2L 6 LS停止試験【重要回線線路用12年点検】	制約有	変更	
0341962	東京	2027/02/17 09:00	2027/03/15 17:00	連続	北熊谷線1L	北熊谷線1L	1.防錆塗装工事《No.》18他 計5基		変更	
0343639	東京	2027/02/17 13:00	2027/02/17 17:00	単日	新飯能(変)	青梅・豊岡線2L	275kV青梅線2L接続変更 に伴う諸試験		変更	
0342386	東京	2027/02/18 09:00	2027/02/18 17:00	単日	池上	南池上線2L/南池上線2LのCBO16	南池上線2L O16 GIS(油圧操作)12年点検(線路側) 計器用変成器絶縁抵抗測定		変更	
0342387	東京	2027/02/18 10:00	2027/02/18 16:00	単日	南池上線2L	南池上線2L	作業内容:シリコン油採取・分析 場所:南池上(変)		変更	
0342388	東京	2027/02/19 10:00	2027/02/19 16:00	単日	南池上線3L	南池上線3L	作業内容:シリコン油採取・分析 場所:南池上(変)		変更	
0343213	東京	2027/02/20 08:00	2027/02/20 13:00	単日	275kV千葉印西線3L	275kV千葉印西線3L	作業内容:常規対地電圧印加試験		変更	
0345430	東京	2027/02/20 08:00	2027/02/20 13:00	単日	275kV千葉印西線3L	275kV千葉印西線3L	・千葉印西線3L初加圧(10分) ・コナ測定、超音波測定 ・千葉印西線3L電圧・電流・位相測定 試験No:個別調整		更新	
0343640	東京	2027/02/22 09:00	2027/02/26 13:00	連続	新飯能(変)	青梅・豊岡線1L	275GIS複母線化(乙母線)		変更	
0343613	東京	2027/02/26 13:00	2027/02/26 17:00	単日	新飯能(変)	青梅・豊岡線1L	275GIS複母線化(乙母線) に伴う諸試験		変更	
0342396	東京	2027/03/04 09:00	2027/03/29 14:00	連続	東内幸町	高輪線2L/高輪線2LのCBO8	【TC切替】制御ケーブル切替、確認試験 【Ry取替】制御ケーブル切替、確認試験	制約有	変更	
0342397	東京	2027/03/04 09:00	2027/03/29 14:00	連続	高輪	高輪線2L/高輪線2LのCBO2	保護リレー取替 ・制御ケーブル切離、撤去、布設、接続 ・保護リレー盤撤去、据付 ・保護継電器試験(単体、対向) ・交流回路他確認試験 ・警報表示・実トリップ・操作試験 ・他	制約有	変更	
0345515	東京	2027/03/04 09:00	2027/03/29 14:00	連続	東内幸町	高輪線2L/高輪線2LのCBO8	高輪線2L電流差動リレー取替 ・制御ケーブル切離、撤去、布設、接続 ・保護リレー盤撤去、据付 ・保護継電器試験(単体、対向) ・交流回路他確認試験 ・警報表示・実トリップ・操作試験	制約有	変更	
0342398	東京	2027/03/06 08:00	2027/03/10 18:00	連続	南川越(変)	坂戸川越線1L	・屋外機器普通点検 (LS-5,E-5,線路側・母線側CVT,線路側避雷器, LS-105,205) ・O-5定期補修(12年目) ・TRD試験	制約有	変更	
0342400	東京	2027/03/06 09:00	2027/03/10 17:00	連続	坂戸川越線1L	坂戸川越線1L	電線路細密点検《No.》444～南川越ST/13基	制約有	変更	
0342401	東京	2027/03/08 08:00	2027/03/08 18:00	単日	南川越(変)	坂戸川越線1LのCBO5	屋外機器普通点検(LS-105)	制約有	変更	
0342406	東京	2027/03/08 10:00	2027/03/08 17:00	単日	新坂戸(変)	坂戸川越線1LのCBO33	1.CBO33停止試験	制約有	変更	
0342407	東京	2027/03/09 08:00	2027/03/09 18:00	単日	南川越(変)	坂戸川越線1LのCBO5	屋外機器普通点検(LS-205)	制約有	変更	
0342409	東京	2027/03/09 09:00	2027/03/09 17:00	単日	東内幸町	高輪線2LのCBO8	ガス絶縁開閉装置 275kV油圧操作(線路側機器) 6年開閉 時間測定 2U O8(高輪2L)	制約有	変更	
0342411	東京	2027/03/11 08:00	2027/03/15 18:00	連続	南川越(変)	坂戸川越線2L	・屋外機器普通点検 (LS-6,E-6,線路側・母線側CVT,線路側避雷器, LS-106,206) ・O-6定期補修(12年目) ・TRD試験	制約有	変更	
0342413	東京	2027/03/11 09:00	2027/03/11 17:00	単日	高輪線2L	高輪線2L	絶縁油採取 場所:東内幸町変電所,高輪変電所	制約有	変更	
0342414	東京	2027/03/11 09:00	2027/03/15 17:00	連続	坂戸川越線2L	坂戸川越線2L	電線路細密点検《No.》444～南川越ST/13基)	制約有	変更	
0346029	東京	2027/03/11 17:00	2027/03/11 17:30	単日	東内幸町線1L	東内幸町線1L	常規対地電圧印加試験	制約有	変更	
0342416	東京	2027/03/12 08:00	2027/03/12 18:00	単日	南川越(変)	坂戸川越線2LのCBO6	屋外機器普通点検(LS-106)	制約有	変更	
0342419	東京	2027/03/13 08:00	2027/03/13 18:00	単日	南川越(変)	坂戸川越線2LのCBO6	屋外機器普通点検(LS-206)	制約有	変更	
0346034	東京	2027/03/13 09:00	2027/03/14 17:00	連続	房総(変)	北千葉線1LのCBO53	北千葉線1号SPがしい装置取替	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0342423	東京	2027/03/22 09:00	2027/03/26 17:00	連続	西南川越線1L	西南川越線1L	(1)電線路細密点検(南川越ST～《No.》461／7基) (2)電線補修(実施箇所検討中)	制約有	変更	
0342424	東京	2027/03/22 09:00	2027/03/26 17:00	毎日	西南川越線2L	西南川越線2L	(1)洞道内点検 南狭山変電所(引留鉄構 CH1・CH2) (2)ケーブル終端部点検 南狭山変電所(引留鉄構 CH1・CH2)		変更	
0342425	東京	2027/03/22 09:00	2027/03/26 17:00	連続	西南川越線1L	西南川越線1L	(1)絶縁油特性試験 (2)ケーブルヘッド点検清掃 (3)避雷器点検	制約有	変更	
0342426	東京	2027/03/24 08:00	2027/03/26 18:00	連続	南川越(変)	西南川越線1L	屋外機器普通点検 (線路側・母線側CVT,LS-1,E-1,線路側避雷器, O-1,LS-101,201)	制約有	変更	
0342427	東京	2027/03/25 08:00	2027/03/25 18:00	単日	南川越(変)	西南川越線1LのCBO1	屋外機器普通点検(LS-101)	制約有	変更	
0342429	東京	2027/03/26 08:00	2027/03/26 18:00	単日	南川越(変)	西南川越線1LのCBO1	屋外機器普通点検(LS-201)	制約有	変更	
0342431	東京	2027/03/27 09:00	2027/03/31 17:00	毎日	西南川越線1L	西南川越線1L	(1)洞道内点検 南狭山変電所(引留鉄構 CH1・CH2) (2)ケーブル終端部点検 南狭山変電所(引留鉄構 CH1・CH2)		変更	
0342432	東京	2027/03/27 09:00	2027/03/31 17:00	連続	西南川越線2L	西南川越線2L	(1)電線路細密点検(南川越ST～《No.》461／7基) (2)電線補修(実施箇所検討中)	制約有	変更	
0342433	東京	2027/03/27 09:00	2027/03/31 17:00	連続	西南川越線2L	西南川越線2L	(1)絶縁油特性試験 (2)ケーブルヘッド点検清掃 (3)避雷器点検	制約有	変更	
0342437	東京	2027/03/29 08:00	2027/03/31 18:00	連続	南川越(変)	西南川越線2L	屋外機器普通点検 (線路側・母線側CVT,LS-2,E-2,線路側避雷器, O-2,LS-102,202)	制約有	変更	
0342439	東京	2027/03/29 14:00	2027/03/29 16:00	単日	東内幸町	高輪線2L/高輪線2LのCBO8	電圧突合せ、電流位相測定	制約有	変更	
0345509	東京	2027/03/29 14:00	2027/03/29 16:00	単日	東内幸町	高輪線2L/高輪線2LのCBO8	高輪線2L電流差動Ry取替に伴うVT突合せ、電流位相測定	制約有	変更	
0342441	東京	2027/03/30 08:00	2027/03/30 18:00	単日	南川越(変)	西南川越線2LのCBO2	屋外機器普通点検(LS-102)	制約有	変更	
0342443	東京	2027/03/30 09:00	2027/03/30 20:00	単日	高輪	高輪線2L/高輪線2LのCBO2	・275kV高輪線2番 O2 GIS(油圧・電動パネ)停止試験 12年【GIS】 ・275kV高輪線2番 Ry盤 O2 計器用変成器点検	制約有	変更	
0342444	東京	2027/03/31 08:00	2027/03/31 18:00	単日	南川越(変)	西南川越線2LのCBO2	屋外機器普通点検(LS-202)	制約有	変更	
0342451	東京	2027/03/31 09:00	2027/03/31 17:00	単日	城南	城南線2L	リード線接続に伴う危険防止	制約有	変更	
0342452	東京	2027/03/31 09:00	2027/03/31 17:00	単日	江東	城南線2LのCBO6	リード線接続に伴う危険防止	制約有	変更	
0342445	東京	2027/03/31 17:00	2027/03/31 17:30	単日	城南線2L	城南線2L	作業内容:絶縁耐力試験(使用前自主検査) 作業場所:江東変電所	制約有	変更	
0342446	東京	2027/03/31 17:00	2027/03/31 18:00	単日	江東	城南線2L	275kV城南線2番 変流器回路チェック	制約有	変更	
0348326	東京	2027/04/01 09:00	2027/06/30 17:00	連続	城南線3L	城南線3L	作業内容:ケーブル引入れ、ケーブル切断、接続部組立 作業場所:江東変電所～砂町洞道	制約有	変更	
0348327	東京	2027/04/01 09:00	2027/04/01 17:00	単日	城南	城南線3L	リード線外しに伴う危険防止	制約有	変更	
0348328	東京	2027/04/01 09:00	2027/04/01 17:00	単日	江東	城南線3LのCBO7	リード線外しに伴う危険防止	制約有	変更	
0348372	東京	2027/04/01 09:00	2027/05/25 17:00	連続	京浜線3L	京浜線3L	【建設C】 JP開放《No.》1022		変更	
0348701	東京	2027/04/01 09:00	2027/05/15 17:00	連続	東京東線1L	東京東線1L	・電線張替 No.4006～4023		変更	
0348059	東京	2027/04/05 09:00	2027/04/29 17:00	連続	北熊谷線2L	北熊谷線2L	1.長幹支持がいし耐震対策工事 北熊谷線《No.》1他 計14基		新規	
0348333	東京	2027/04/05 09:00	2027/06/30 17:00	連続	江東	城南線3L/城南線3LのCBO7	275kV城南線3番変流器取替	制約有	変更	
0348384	東京	2027/04/05 09:00	2027/06/30 17:00	連続	城南	城南線3L	・制御ケーブル切離し、接続 ・確認試験	制約有	変更	
0348716	東京	2027/04/05 09:00	2027/04/06 17:00	毎日	新秩父(開)	新岡部線1LのCBO5	・LS105停止試験(接地装置ED-5)含む		変更	
0348717	東京	2027/04/05 09:00	2027/04/05 17:00	単日	新栃木線1L	新栃木線1L	●特定点検 電線・地線本体点検 新栃木線《No.》123～《No.》124		変更	
0348718	東京	2027/04/05 09:00	2027/04/05 17:00	単日	新佐原(変)	印旛線1L/印旛線1LのCBO3	印旛線1LO-3GCB(油圧・電動パネ)停止試験(12年) 印旛線1LGCBプッシング12年停止試験 印旛線1L3LS(電動操作)12年停止試験 印旛線1L103LS(電動操作)12年停止試験 印旛線1L203LS(電動操作)12年停止試験		変更	
0348721	東京	2027/04/05 09:00	2027/04/05 17:00	単日	新栃木線1L	新栃木線1L	【北部送電】保守業務委託 ○停止不良がいし検出 ・《No.》274		変更	
0352293	東京	2027/04/05 09:00	2027/04/06 17:00	毎日	新岡部(変)	新岡部線1L/新岡部線1LのCBO3	(1)引留鉄構強度不足に対する補強修理		変更	
0348336	東京	2027/04/06 08:00	2027/04/08 18:00	連続	西東京(変)	佐久間東幹線1L	GIS普通点検、垂直碍子連点検		変更	
0348043	東京	2027/04/06 09:00	2027/04/09 17:00	毎日	西越谷線1L	西越谷線1L	1.停止がいし点検 計10基		変更	
0348306	東京	2027/04/06 09:00	2027/04/08 17:00	連続	西南川越線1L	西南川越線1L	(1)電線路細密点検 《No.》462～469／8基 (2)電線補修 (実施箇所検討中)	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0348722	東京	2027/04/06 09:00	2027/04/06 17:00	単日	新佐原(変)	印旛線2L/印旛線2LのCBO4	印旛線2LO-4GCB(油圧・電動パネ)停止試験(12年) 印旛線2LGCBBプッシング12年停止試験 印旛線2L4LS(電動操作)12年停止試験 印旛線2L104LS(電動操作)12年停止試験 印旛線2L204LS(電動操作)12年停止試験		変更	
0348723	東京	2027/04/06 09:00	2027/04/06 17:00	単日	新栃木線2L	新栃木線2L	●特定点検 電線・地線本体点検 新栃木線《No.》123～《No.》124		変更	
0348725	東京	2027/04/06 09:00	2027/04/06 17:00	単日	東京東線1L	東京東線1L	・停止不良がいし検出 No.4069		変更	
0348726	東京	2027/04/06 09:00	2027/04/06 17:00	単日	新栃木線2L	新栃木線2L	【北部送電】保守業務委託 ○停止不良がいし検出 ・《No.》274		変更	
0348741	東京	2027/04/07 08:00	2027/05/10 17:00	連続	那珂線1L	那珂線1L	【北部送電】○鉄塔防錆塗装工事 ・《No.》65,69 計2基	制約有	変更	
0348728	東京	2027/04/07 09:00	2027/04/07 17:00	単日	新秩父(開)	新岡部線1LのCBO5	・LS205停止試験		変更	
0348737	東京	2027/04/08 09:00	2027/04/08 17:00	単日	新佐原(変)	印旛線1L/印旛線1LのCBO3	印旛線1LO-3GCB(油圧・電動パネ)停止試験(12年) 印旛線1LGCBBプッシング12年停止試験 印旛線1L3LS(電動操作)12年停止試験 印旛線1L103LS(電動操作)12年停止試験 印旛線1L203LS(電動操作)12年停止試験		変更	
0348340	東京	2027/04/09 09:00	2027/04/09 12:00	単日	北相模(変)	佐久間東幹里線1LのCBO1	・電源移設他		変更	
0348739	東京	2027/04/09 09:00	2027/04/09 17:00	単日	新佐原(変)	印旛線2L/印旛線2LのCBO4	印旛線2LO-4GCB(油圧・電動パネ)停止試験(12年) 印旛線2LGCBBプッシング12年停止試験 印旛線2L4LS(電動操作)12年停止試験 印旛線2L104LS(電動操作)12年停止試験 印旛線2L204LS(電動操作)12年停止試験		変更	
0348341	東京	2027/04/09 13:00	2027/04/09 16:00	単日	北相模(変)	佐久間東幹里線2LのCBO2	・電源移設他		変更	
0348705	東京	2027/04/10 09:00	2027/04/12 17:00	連続	新坂戸(変)	新古河線2LのCBO4	1.GIS停止試験6年 2.EL2 Mg取替	制約有	変更	
0348742	東京	2027/04/10 09:00	2027/04/24 17:00	連続	那珂線1L	那珂線1L	1.鉄塔防錆塗装 No.46,47,49～53 2.電線腐食点検 那珂線10～11,21～22	制約有	変更	
0348862	東京	2027/04/10 09:00	2027/04/14 17:00	連続	新古河線2L	新古河線2L	1.圧縮接続管補修 《No.》46他	制約有	変更	
0351548	東京	2027/04/10 09:00	2027/04/13 17:00	連続	新古河線2L	新古河線2L	1.ジャンパー開放:新鶴ヶ島《No.》11-1 2.航空標識塗装:新鶴ヶ島《No.》2,3,4,7,9,11 計6基 3.防錆塗装:新鶴ヶ島《No.》5,6,8,10,13,14 計6基	制約有	変更	
0348044	東京	2027/04/12 09:00	2027/04/14 17:00	毎日	西越谷線2L	西越谷線2L	1.停止がいし点検 計10基		変更	
0348565	東京	2027/04/12 09:00	2027/04/16 17:00	連続	西南多摩線1L	西南多摩線1L	《1》電線路細密点検 《No.》521～528/8基 《2》鉄塔部材・ボルト取替 《No.》555,556/2基 《3》電線補修 実施箇所検討中	制約有	変更	
0348710	東京	2027/04/12 09:00	2027/04/14 17:00	連続	新所沢(変)	新古河線2LのCBO2	1.EL2接地開閉器M ₂ 修理	制約有	変更	
0348712	東京	2027/04/12 09:00	2027/04/14 17:00	連続	新古河(変)	新古河線2L/新古河線2LのCBO8	パレット引出改造 制御ケーブル接続 シーケンス試験	制約有	変更	
0348344	東京	2027/04/13 08:00	2027/04/15 18:00	連続	西東京(変)	佐久間東幹里線2L	GIS普通点検、垂直碍子連点検		変更	
0348473	東京	2027/04/13 09:00	2027/04/13 17:00	単日	京浜線1L	京浜線1L	アーム下面点検:京浜線1.2号線《No.》 1009,1010,1011,1017,1034	制約有	変更	
0348713	東京	2027/04/13 17:00	2027/05/06 09:00	連続	新古河線2L	新古河線2L	1.航空標識塗装:新鶴ヶ島《No.》2,3,4,7,9,11 計6基「技術」 2.防錆塗装:新鶴ヶ島《No.》5,6,8,10,13,14 計6基「技術」	制約有	変更	
0348516	東京	2027/04/14 09:00	2027/04/14 17:00	単日	西南川越線1L	西南川越線1L	【東京電力作業】 《1》絶縁油特性試験	制約有	変更	
0348714	東京	2027/04/14 17:00	2027/04/14 18:00	単日	新古河(変)	新古河線2L	電圧電流位相測定	制約有	変更	
0348517	東京	2027/04/15 09:00	2027/04/15 17:00	単日	西南川越線2L	西南川越線2L	【東京電力作業】 《1》絶縁油特性試験	制約有	変更	
0348578	東京	2027/04/19 09:00	2027/04/23 17:00	連続	西南多摩線2L	西南多摩線2L	《1》電線路細密点検 《No.》521～528/8基 《2》鉄塔部材・ボルト取替 《No.》555,556/2基 《3》電線補修 実施箇所検討中	制約有	変更	
0348477	東京	2027/04/20 09:00	2027/04/20 17:00	単日	京浜線2L	京浜線2L	アーム下面点検:京浜線1.2号線《No.》 1009,1010,1011,1017,1034	制約有	変更	
0348964	東京	2027/04/21 09:00	2027/04/21 17:00	単日	川内線1L	川内線1L	《1》電線本体点検 《No.》85～86 1径間 《2》地線本体点検 《No.》85～86 1径間		変更	
0348965	東京	2027/04/22 09:00	2027/04/22 17:00	単日	川内線1L	川内線1L	《1》電線・地線点検 《No.》115～116 1径間		変更	
0348847	東京	2027/04/25 08:00	2027/04/29 17:00	連続	新京葉線1L	新京葉線1L	・電線地線本体点検 No.51～126,新野田線No.3～4-1 計25径間 ・電線腐食点検 No.49～73 計2径間	制約有	変更	
0348845	東京	2027/04/25 09:00	2027/04/29 17:00	連続	新京葉(変)	新京葉線1LのCBO1	・GIS制御盤パレット引出改造 ・ケーブル接続 ・交流回路、シーケンス試験	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0348848	東京	2027/04/26 07:00	2027/04/28 17:00	連続	新古河(変)	新京葉線1L/新京葉線1LのCBO1	1 LS停止試験 BO1L Vバックイン取替	制約有	変更	
0348314	東京	2027/04/26 09:00	2027/04/28 17:00	連続	西南川越線2L	西南川越線2L	《1》電線路細密点検 《No.》462～469/8基 《2》電線補修 (実施箇所検討中)	制約有	変更	
0348764	東京	2027/04/26 09:00	2027/04/28 17:00	連続	新古河(変)	新京葉線1LのCBO1	バレット引出改造 制御ケーブル接続 シーケンス試験	制約有	変更	
0348846	東京	2027/04/26 09:00	2027/04/26 17:00	単日	新京葉線1L	新京葉線1L	【点検補修】 1.不良がいし検出 新京葉線No.1	制約有	変更	
0348966	東京	2027/04/26 09:00	2027/04/26 17:00	単日	川内線2L	川内線2L	《1》電線本体点検 《No.》85～86 1径間 《2》地線本体点検 《No.》85～86 1径間		変更	
0348971	東京	2027/04/27 09:00	2027/04/27 17:00	単日	川内線2L	川内線2L	《1》電線・地線点検 《No.》115～116 1径間		変更	
0348419	東京	2027/04/29 08:00	2027/04/29 18:00	単日	西東京(変)	港北線1L	・275kVNo.1BP CT回路切替	制約有	変更	
0348852	東京	2027/04/30 07:00	2027/05/02 17:00	連続	新古河(変)	新京葉線2L/新京葉線2LのCBO2	2 LS停止試験 BO2L Vバックイン取替	制約有	変更	
0348420	東京	2027/04/30 08:00	2027/04/30 18:00	単日	西東京(変)	港北線2L	・275kVNo.1BP CT回路切替	制約有	変更	
0348851	東京	2027/04/30 08:00	2027/05/04 17:00	連続	新京葉線2L	新京葉線2L	・電線地線本体点検 No.51～126,新野田線No.3～4-1 計25径間 ・電線腐食点検 No.49～73 計2径間	制約有	変更	
0348766	東京	2027/04/30 09:00	2027/05/02 17:00	連続	新古河(変)	新京葉線2LのCBO2	バレット引出改造 制御ケーブル接続 シーケンス試験	制約有	変更	
0348849	東京	2027/04/30 09:00	2027/05/04 17:00	連続	新京葉(変)	新京葉線2LのCBO2	・GIS制御盤バレット引出改造 ・ケーブル接続 ・交流回路、シーケンス試験	制約有	変更	
0348850	東京	2027/04/30 09:00	2027/04/30 17:00	単日	新京葉線2L	新京葉線2L	【点検補修】 1.不良がいし検出 新京葉線No.1	制約有	変更	
0348853	東京	2027/05/03 08:00	2027/05/03 18:00	単日	新古河(変)	新京葉線2LのCBO2	LS202 駆動ベアリング修理	制約有	変更	
0351541	東京	2027/05/06 09:00	2027/05/09 17:00	連続	新古河線2L	新古河線2L	1.ジャンパー接続:新鶴ヶ島《No.》1-1 2.航空標識塗装:新鶴ヶ島《No.》2,3,4,7,9,11 計6基 3.防錆塗装:新鶴ヶ島《No.》5,6,8,10,13,14 計6基	制約有	変更	
0348359	東京	2027/05/08 09:00	2027/05/09 17:00	連続	新所沢(変)	南狭山線2L/南狭山線2LのCBO46	1.LPT黒赤 計器用変圧器停止試験12年 2.146LS停止試験(36年)		変更	
0348368	東京	2027/05/08 09:00	2027/05/08 17:00	単日	南狭山(変)	南狭山線2L/南狭山線2LのCBO6	1. LS6,EL6 24年停止試験		変更	
0348771	東京	2027/05/10 08:00	2027/05/10 18:00	単日	新しいわき(開)	福島中幹線1L/福島中幹線1LのCBO5	・福島中幹線1L O5 6年停止試験(油圧・電動バネ)【GIS】		変更	
0348772	東京	2027/05/10 08:00	2027/05/10 18:00	単日	新しいわき(開)	福島中幹線1L/福島中幹線1LのCBO5	・福島中幹線1L 105 LS(電動操作)停止試験A【12年】		変更	
0348425	東京	2027/05/11 08:00	2027/05/12 18:00	連続	西東京(変)	佐久間東幹線1L	・275kVNo.1BP CT回路切替		変更	
0348777	東京	2027/05/11 08:00	2027/05/11 18:00	単日	新しいわき(開)	福島中幹線1L/福島中幹線1LのCBO5	・福島中幹線1L 205 LS(電動操作)停止試験A【12年】		変更	
0348428	東京	2027/05/13 08:00	2027/05/14 18:00	連続	西東京(変)	佐久間東幹線2L	・275kVNo.1BP CT回路切替		変更	
0348792	東京	2027/05/14 08:00	2027/06/16 17:00	連続	那珂線2L	那珂線2L	【北部送電】○鉄塔防錆塗装工事 ・《No.》65,69 計2基	制約有	変更	
0348797	東京	2027/05/14 09:00	2027/05/28 17:00	連続	那珂線2L	那珂線2L	1.鉄塔防錆塗装 No.46,47,49～53 2.電線腐食点検 那珂線10～11,21～22	制約有	変更	
0348799	東京	2027/05/14 09:00	2027/05/17 17:00	連続	新古河線1L	新古河線1L	1.ジャンパー開放:新鶴ヶ島《No.》1-1「技術」 2.航空標識塗装:新鶴ヶ島《No.》2,3,4,7,9,11 計6基「技術」 3.防錆塗装:新鶴ヶ島《No.》5,6,8,10,13,14 計6基「技術」	制約有	変更	
0348803	東京	2027/05/14 09:00	2027/05/14 17:00	単日	南新潟幹線1L	南新潟幹線1L	がいし洗浄《No.8 1基》		変更	
0348861	東京	2027/05/14 09:00	2027/05/18 17:00	連続	新古河線1L	新古河線1L	1.圧縮接続管補修 《No.》46他	制約有	変更	
0351595	東京	2027/05/15 09:00	2027/05/16 17:00	連続	新所沢(変)	南狭山線2LのCBO46	1.246停止試験 2.246Mg取替		変更	
0348709	東京	2027/05/17 09:00	2027/05/31 17:00	連続	新しいわき線1L	新しいわき線1L	《1》新しいわき線《No.》28他鉄塔防錆塗装工事 《No.》28,29,30,31,32,33 計6基		変更	
0348793	東京	2027/05/17 09:00	2027/05/19 17:00	連続	新坂戸(変)	新古河線1LのCBO3	1.GIS停止試験6年 2.EL1 Mg取替	制約有	変更	
0348813	東京	2027/05/17 09:00	2027/06/30 17:00	連続	東京東線2L	東京東線2L	・電線張替 No.4006～4023		変更	
0348816	東京	2027/05/17 09:00	2027/05/20 17:00	毎日	東群馬幹線1L	東群馬幹線1L	【保守業務委託】 ▼電線・地線点検 ・《No.》45～《No.》46、《No.》46～《No.》47、《No.》47～《No.》48、 《No.》53～《No.》54 (4径間)		変更	
0348854	東京	2027/05/17 09:00	2027/05/17 17:00	単日	新京葉(変)	東京東線2LのCBO38	・CBO38 12年停止試験		変更	
0348805	東京	2027/05/17 17:00	2027/06/17 09:00	連続	新古河線1L	新古河線1L	1.航空標識塗装:新鶴ヶ島《No.》2,3,4,7,9,11 計6基「技術」 2.防錆塗装:新鶴ヶ島《No.》5,6,8,10,13,14 計6基「技術」	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0348335	東京	2027/05/18 08:00	2027/05/19 18:00	毎日	佐久間東幹中線1L,2L	佐久間東幹中線1L,2L	不良碼子検出 分6～10(10基cct)		変更	
0348436	東京	2027/05/18 08:00	2027/05/19 18:00	連続	西東京(変)	京浜線3L	・275kVNo.1BP CT回路切替		変更	
0348337	東京	2027/05/18 09:00	2027/05/20 17:00	毎日	佐久間東幹中線1L,2L	佐久間東幹中線1L,2L	不良碼子検出《No.》388～《No.》396／9基		変更	
0348370	東京	2027/05/18 09:00	2027/05/18 17:00	単日	江東	城南線3L/城南線3LのCBO7	城南線3L 7 LS停止試験【重要回線線路用12年点検】	制約有	変更	
0348437	東京	2027/05/18 09:00	2027/05/18 17:00	単日	高輪線3L	高輪線3L	絶縁油採取 場所: 東内幸町変電所、高輪変電所	制約有	変更	
0348820	東京	2027/05/18 09:00	2027/05/18 17:00	単日	東京東線2L	東京東線2L	・停止不良がいし検出 No.4069		変更	
0348821	東京	2027/05/18 09:00	2027/05/18 17:00	単日	新秩父(開)	新岡部線2LのCBO6	・CBO5停止試験		変更	
0352294	東京	2027/05/18 09:00	2027/05/19 17:00	毎日	新岡部(変)	新岡部線2L/新岡部線2LのCBO4	《1》引留鉄構強度不足に対する補強修理		変更	
0348825	東京	2027/05/19 09:00	2027/05/20 17:00	連続	新岡部(変)	新岡部線2LのCBO4	・O4GIS停止試験A		変更	
0348827	東京	2027/05/19 09:00	2027/05/28 17:00	連続	新しいわき線1L	新しいわき線1L	1.鉄塔防錆塗装 No.115～119		変更	
0347838	東京	2027/05/20 09:00	2027/05/20 17:00	単日	新飯能(変)	青梅・豊岡線2L	・GIS停止試験		変更	
0347839	東京	2027/05/20 09:00	2027/05/20 17:00	単日	豊岡(変)	青梅・豊岡線2L	・GIS停止試験		変更	
0347840	東京	2027/05/20 09:00	2027/05/20 17:00	単日	豊岡(変)	豊岡線2LのCBO2	・GIS停止試験		変更	
0347873	東京	2027/05/20 09:00	2027/05/20 17:00	単日	新飯能(変)	青梅線2LのCBO34	・GIS停止試験		変更	
0348828	東京	2027/05/20 09:00	2027/05/20 17:00	単日	新しいわき線1L	新しいわき線1L	【北部送電】保守業務委託 ○停止不良がいし検出 ・新今市開閉所		変更	
0348969	東京	2027/05/24 08:00	2027/05/29 18:00	連続	南いわき(開)	相馬双葉幹線1L/相馬双葉幹線1LのCBO31	500kVVCB投入抵抗接点脱落対策		変更	
0348447	東京	2027/05/24 09:00	2027/05/24 17:00	単日	南川崎線3L	南川崎線3L	作業内容: 油採取 作業場所: 南川崎変電所	制約有	変更	
0348471	東京	2027/05/24 09:00	2027/05/24 17:00	単日	京浜線3L	京浜線3L	がいし点検: 京浜線3.4号線《No.》1021-1 アーム下面点検: 京浜線3.4号線《No.》1009,1011		変更	
0348835	東京	2027/05/24 09:00	2027/05/27 17:00	毎日	東群馬幹線2L	東群馬幹線2L	【保守業務委託】 ▼電線・地線点検 ・《No.》45～《No.》46、《No.》46～《No.》47、《No.》47～《No.》48、 《No.》53～《No.》54 (4径間)		変更	
0347875	東京	2027/05/25 09:00	2027/05/25 17:00	単日	新飯能(変)	青梅・豊岡線1L	・GIS停止試験		変更	
0347876	東京	2027/05/25 09:00	2027/05/25 17:00	単日	豊岡(変)	青梅・豊岡線1L	・GIS停止試験		変更	
0347877	東京	2027/05/25 09:00	2027/05/25 17:00	単日	豊岡(変)	豊岡線1LのCBO1	・GIS停止試験		変更	
0347878	東京	2027/05/25 09:00	2027/05/25 17:00	単日	新飯能(変)	青梅線1LのCBO33	・GIS停止試験		変更	
0348598	東京	2027/05/25 09:00	2027/05/25 17:00	単日	世田谷	世田谷線1L/世田谷線1LのCBO1	O1GIS点検(12年)計器用変成器点検(VT)		変更	
0348600	東京	2027/05/26 09:00	2027/05/26 17:00	単日	世田谷	世田谷線2L/世田谷線2LのCBO2	O2GIS点検(6年)		変更	
0348612	東京	2027/05/26 09:00	2027/05/26 17:00	単日	南池上線1L	南池上線1L	作業内容: X線撮影 作業場所: 川242D		変更	
0349046	東京	2027/05/26 09:00	2027/05/26 17:00	単日	東群馬(変)	東群馬幹線2LのCBO38	ガス絶縁開閉装置(GIS)(油圧電動バネ操作) 東群馬幹線2L O38 停止試験(6年)		変更	
0349051	東京	2027/05/29 08:00	2027/05/29 17:00	単日	新木更津(変)	君津線1L	【君津線1L】 ・新BP乙LS条件確認 ・新BP2系乙LSトリップシーケンス確認 ・新BP2系HBR起動確認 ・既設BP・HBRトリップシーケンス ・既設HBR起動確認	制約有	変更	
0349054	東京	2027/05/29 17:00	2027/05/29 19:00	単日	新木更津(変)	君津線1L	【君津線1L】 ・新BP1、2系電圧電流位相測定 ・試験No「基送3その2」	制約有	変更	
0348972	東京	2027/05/29 18:00	2027/05/29 20:00	単日	南いわき(開)	相馬双葉幹線1L/相馬双葉幹線1LのCBO31	500kVVCB投入抵抗接点脱落対策終了後の試充電・コロナ 超音波測定他		変更	
0341988	東京	2027/05/31 09:00	2027/05/31 17:00	単日	中東京(変)	中沢線2LのCBO2	1.架空地線撤去		変更	
0348369	東京	2027/05/31 09:00	2027/06/02 17:00	連続	京浜線4L	京浜線4L	【建設C】 JP開放《No.》1021-1 jp作成・接続《No.》1021-1		変更	
0348375	東京	2027/05/31 09:00	2027/06/08 17:00	連続	佐久間東幹里線1L	佐久間東幹里線1L	《1》落雪装置の取外 《No.》429～431／2径間 《2》落雪装置用ロッド巻替 《No.》430～431／1径間		変更	
0348286	東京	2027/05/31 16:30	2027/05/31 17:00	単日	北武蔵野線1L	北武蔵野線1L	【275kV北武蔵野線1番新設工事】 作業内容: 系統課電10分間 試験No. 一地送1		変更	
0348374	東京	2027/05/31 16:30	2027/05/31 17:00	単日	北武蔵野線1L	北武蔵野線1L	【275kV北武蔵野線1番新設工事】 作業内容: 系統課電10分間 試験No. 一地送1		変更	
0348472	東京	2027/06/01 09:00	2027/06/01 19:00	単日	京浜線4L	京浜線4L	がいし点検: 京浜線3.4号線《No.》1021-1 アーム下面点検: 京浜線3.4号線《No.》1009,1011		変更	
0348988	東京	2027/06/02 08:00	2027/06/02 18:00	単日	新しいわき(開)	福島中幹線2L/福島中幹線2LのCBO6	・福島中幹線2L O6 LS(電動操作)停止試験A【12年】		変更	
0348989	東京	2027/06/02 08:00	2027/06/02 18:00	単日	新しいわき(開)	福島中幹線2L/福島中幹線2LのCBO6	・福島中幹線2L O6 6年停止試験(油圧・電動バネ)【GIS】		変更	
0341947	東京	2027/06/02 09:00	2027/06/02 17:00	単日	新所沢(変)	中沢線1LのCBO41	1.LS141停止試験(24年)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0348371	東京	2027/06/02 17:00	2027/09/21 21:00	連続	京浜線4L	京浜線4L	【建設C】 電線張替《No.》1022～《No.》1038		変更	
0348991	東京	2027/06/03 08:00	2027/06/03 18:00	単日	新しいわき(開)	福島中幹線2L/福島中幹線2LのCBO6	・福島中幹線2L 206 LS(電動操作)停止試験A【12年】		変更	
0341945	東京	2027/06/03 09:00	2027/06/03 17:00	単日	新所沢(変)	中沢線1LのCBO41	1.LS241停止試験(24年)		変更	
0352326	東京	2027/06/03 09:00	2027/06/04 17:00	連続	京浜(変)	南川崎線1LのCBO17	南川崎1L(〇17)油圧操作機構部ウレタンパッキン経年劣化修理(同型:3-1005)	制約有	変更	
0348376	東京	2027/06/04 09:00	2027/06/04 17:00	単日	練馬	水道橋線3LのCBO7	〇7 GIS点検GCB開閉時間測定(パレット)		変更	
0348994	東京	2027/06/04 09:00	2027/06/04 17:00	単日	新しいわき線2L	新しいわき線2L	【北部送電】保守業務委託 ○停止不良がいし検出 ・新今市開閉所		変更	
0349039	東京	2027/06/04 09:00	2027/06/18 17:00	連続	新しいわき線2L	新しいわき線2L	《1》新しいわき線《No.》28他鉄塔防錆塗装工事 《No.》28,29,30,31,32,33 計6基		変更	
0348990	東京	2027/06/07 09:00	2027/06/16 17:00	連続	新しいわき線2L	新しいわき線2L	1.鉄塔防錆塗装 No.115～119		変更	
0341948	東京	2027/06/08 09:00	2027/06/08 17:00	単日	新所沢(変)	中沢線2LのCBO42	1.LS142停止試験(24年)		変更	
0341946	東京	2027/06/09 09:00	2027/06/09 17:00	単日	新所沢(変)	中沢線2LのCBO42	1.LS242停止試験(24年)		変更	
0348407	東京	2027/06/09 10:00	2027/06/09 16:00	単日	南川崎(変)	南池上線2LのCBO8	南池上2L O8 GIS6年点検		変更	
0348381	東京	2027/06/10 09:00	2027/06/18 17:00	連続	佐久間東幹線2L	佐久間東幹線2L	《1》落雪装置の取外 《No.》429～431/2径間 《2》落雪装置用ロッド巻替 《No.》430～431/1径間		変更	
0348408	東京	2027/06/11 10:00	2027/06/11 16:00	単日	南川崎(変)	南池上線3LのCBO9	南池上3L O9 GIS6年点検		変更	
0349008	東京	2027/06/17 09:00	2027/06/20 17:00	連続	新古河線1L	新古河線1L	1.ジャンパー接続:新鶴ヶ島《No.》1-1「技術」 2.航空標識塗装:新鶴ヶ島《No.》2,3,4,7,9,11 計6基「技術」 3.防錆塗装:新鶴ヶ島《No.》5,6,8,10,13,14 計6基「技術」	制約有	変更	
0349007	東京	2027/06/18 09:00	2027/06/20 17:00	連続	新古河(変)	新古河線1L/新古河線1LのCBO7	パレット引出改造 制御ケーブル接続 シーケンス試験	制約有	変更	
0349041	東京	2027/06/18 09:00	2027/06/20 17:00	連続	新所沢(変)	新古河線1LのCBO1	1.101 LS停止試験36年 Mg交換 2.〇1 GCB 停止試験 6年	制約有	変更	
0349059	東京	2027/06/19 08:30	2027/06/20 17:00	連続	新富士(変)	新秦野線1LのCBO3	【保守業務】 ・新秦野線1L 203・EB203 LS停止試験(12年)		変更	
0349010	東京	2027/06/20 17:00	2027/06/20 18:00	単日	新古河(変)	新古河線1L	電圧電流位相測定	制約有	変更	
0348975	東京	2027/06/21 09:00	2027/06/24 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	《1》電線本体点検 《No.》10～《No.》11 1径間 《2》地線本体点検 《No.》10～《No.》11 1径間 《3》ジャンパースベアサ臨時点検 《No.》9,16,30 計3基		変更	
0352285	東京	2027/06/21 09:00	2027/06/23 17:00	連続	南いわき(開)	南いわき幹線1L/南いわき幹線1LのCBO35	ELSパレット他修理		変更	
0349012	東京	2027/06/22 08:00	2027/06/24 17:00	連続	新所沢線2L	新所沢線2L	電線地線点検 新多摩(変)～《No.》3、《No.》15～《No.》18、《No.》30～《No.》33		変更	
0349015	東京	2027/06/22 09:00	2027/06/25 17:00	連続	新飯能(変)	新飯能線2L	・500kVGIS複母線化 ※乙1エンド母線交換		変更	
0348976	東京	2027/06/22 10:00	2027/06/22 16:00	単日	東群馬(変)	南いわき幹線1LのCBO35	ガス絶縁開閉装置(GIS)(油圧電動バネ操作) 南いわき幹線1L O35 停止試験(6年)		変更	
0349017	東京	2027/06/25 17:00	2027/06/25 18:00	単日	新飯能(変)	新飯能線2L	・500kVGIS複母線化に伴う諸試験		変更	
0348977	東京	2027/06/27 09:00	2027/06/30 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	《1》電線本体点検 《No.》10～《No.》11 1径間 《2》地線本体点検 《No.》10～《No.》11 1径間 《3》ジャンパースベアサ臨時点検 《No.》9,16,30 計3基		変更	
0349060	東京	2027/06/29 09:00	2027/07/05 17:00	連続	新秦野線1L	新秦野線1L	【停止がいし点検】 新秦野線《No.》10、《No.》13、《No.》15、《No.》17、《No.》19、《No.》20、《No.》25、《No.》30、《No.》35、《No.》40、《No.》45、《No.》50、《No.》55、《No.》57		変更	
0348978	東京	2027/06/29 10:00	2027/06/29 16:00	単日	東群馬(変)	南いわき幹線2LのCBO36	ガス絶縁開閉装置(GIS)(油圧電動バネ操作) 南いわき幹線2L O36 停止試験(6年)		変更	
0348390	東京	2027/06/30 09:00	2027/06/30 17:00	単日	城南	城南線3L	リード線接続に伴う危険防止	制約有	変更	
0348391	東京	2027/06/30 09:00	2027/06/30 17:00	単日	江東	城南線3LのCBO7	リード線接続に伴う危険防止	制約有	変更	
0348392	東京	2027/06/30 17:00	2027/06/30 18:00	単日	江東	城南線3L	275kV城南線3番変流器回路チェック	制約有	変更	
0348393	東京	2027/06/30 17:00	2027/06/30 17:30	単日	城南線3L	城南線3L	作業内容:絶縁耐力試験(使用前自主検査) 作業場所:江東変電所	制約有	変更	
0348824	東京	2027/07/01 09:00	2027/07/09 17:00	毎日	新坂戸線1L	新坂戸線1L/新坂戸線2L	不良碍子検出 《No.》368～384/17基		変更	
0349023	東京	2027/07/06 09:00	2027/07/07 17:00	連続	新富士(変)	新秦野線1L/新秦野線1LのCBO3	【修繕】 ・新秦野線1L GIS修理		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0349061	東京	2027/07/08 09:00	2027/07/14 17:00	連続	新秦野線2L	新秦野線2L	【停止がいし点検】 新秦野線《No.》10,《No.》13,《No.》15,《No.》17,《No.》19,《No.》20, 《No.》25,《No.》30,《No.》35,《No.》40,《No.》45,《No.》50,《No.》55, 《No.》57		変更	
0349024	東京	2027/07/15 09:00	2027/07/16 17:00	連続	新富士(変)	新秦野線2L/新秦野線2LのCBO4	【修繕】 ・新秦野線2L GIS修理		変更	
0349025	東京	2027/07/20 08:00	2027/07/29 17:00	連続	南新潟幹線1L	南新潟幹線1L	保守監視装置撤去(《No.》28,87,115,145,171 計5基)		変更	
0348748	東京	2027/07/21 09:00	2027/07/29 17:00	毎日	新赤城線1L	新赤城線1L/新赤城線2L	不良碍子検出 《No.》247～264/18基		変更	
0349027	東京	2027/07/21 09:00	2027/07/30 17:00	連続	新多摩線1L	新多摩線1L	【電線・地線本体点検】 《No.》1～《No.》2,《No.》6～《No.》7,《No.》11～《No.》12,《No.》16～ 《No.》17,《No.》21～《No.》22		変更	
0349028	東京	2027/07/26 09:00	2027/07/27 17:00	連続	新多摩(変)	新多摩線1L	5.E5.ES5点検		変更	
0349029	東京	2027/07/26 09:00	2027/07/27 17:00	連続	新多摩(変)	新多摩線1LのCBO5	CBO5点検 105.ER5点検 205点検		変更	
0349035	東京	2027/08/02 08:00	2027/08/15 17:00	連続	福島中幹線1L	福島中幹線1L	【北部送電】○鉄塔防錆塗装工事 ・《No.》278,281 計2基		変更	
0349036	東京	2027/08/02 09:00	2027/08/03 17:00	連続	新多摩(変)	新多摩線2LのCBO6	CBO6点検 106.ER6点検 206点検		変更	
0349038	東京	2027/08/02 09:00	2027/08/16 17:00	連続	福島中幹線1L	福島中幹線1L	《1》福島中幹線《No.》92他鉄塔防錆塗装工事 No.92,95 計2基 《2》福島中幹線《No.》100他鉄塔防錆塗装工事 《No.》100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 計8基 《3》福島中幹線《No.》175他鉄塔防錆塗装工事 《No.》175, 176, 177, 178 計4基 《4》電線・地線点検 《No.》103～104 計1径間		変更	
0349088	東京	2027/08/02 09:00	2027/08/03 17:00	連続	新多摩(変)	新多摩線2L	6.E6.ES6点検		変更	
0349089	東京	2027/08/02 09:00	2027/08/11 17:00	連続	新多摩線2L	新多摩線2L	【電線・地線本体点検】 《No.》1～《No.》2,《No.》6～《No.》7,《No.》11～《No.》12,《No.》16～ 《No.》17,《No.》21～《No.》22		変更	
0349090	東京	2027/08/03 08:00	2027/08/12 17:00	連続	南新潟幹線2L	南新潟幹線2L	保守監視装置撤去(《No.》28,87,115,145,171 計5基)		変更	
0349093	東京	2027/08/16 09:00	2027/08/18 17:00	連続	新多摩(変)	新秩父線1L	3.E3.ES3点検 PD点検		変更	
0349097	東京	2027/08/16 09:00	2027/08/18 17:00	連続	新多摩(変)	新秩父線1LのCBO3	CBO3点検 103.ER3点検 203点検		変更	
0349094	東京	2027/08/17 08:00	2027/08/30 17:00	連続	福島中幹線2L	福島中幹線2L	【北部送電】○鉄塔防錆塗装工事 ・《No.》278,281 計2基		変更	
0349095	東京	2027/08/17 09:00	2027/08/31 17:00	連続	福島中幹線2L	福島中幹線2L	《1》福島中幹線《No.》92他鉄塔防錆塗装工事 No.92,95 計2基 《2》福島中幹線《No.》100他鉄塔防錆塗装工事 《No.》100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 計8基 《3》福島中幹線《No.》175他鉄塔防錆塗装工事 《No.》175, 176, 177, 178 計4基 《4》電線・地線点検 《No.》103～104 計1径間		変更	
0349106	東京	2027/09/01 08:00	2027/09/03 17:00	連続	鹿島線2L	鹿島線2L	【鹿島線No.55鉄塔移設工事】 1.ジャンパー開放 鹿島線No.52, 79	制約有	変更	
0351597	東京	2027/09/01 09:00	2027/10/08 17:00	連続	城南	新宿城南線1L	・制御ケーブル切離し、接続 ・確認試験		変更	
0351604	東京	2027/09/02 09:00	2027/09/02 17:00	単日	城南	新宿城南線1L	主変5号1次構連 受電側、Tr側CH OFケーブル点検(採油あり)		変更	
0349110	東京	2027/09/03 17:00	2028/04/30 14:00	連続	鹿島線2L	鹿島線2L	【鹿島線No.55鉄塔移設工事】 1.鉄塔移設 鹿島線No.55	制約有	変更	
0349111	東京	2027/09/04 08:00	2027/09/06 17:00	連続	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	【鹿島線No.55鉄塔移設工事】 1.ジャンパー開放 鹿島線No.52, 79, 【点検補修】 1.電線本体点検 鹿島線No.50～51, 103～104, 113～114, 118～119, 123～ 124	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0349113	東京	2027/09/06 17:00	2027/09/30 17:00	連続	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	【鹿島線No.55鉄塔移設工事】 1.ジャンパー開放 鹿島線No.49, 2.回線間ジャンパー設置 鹿島線No.49, 52	制約有	変更	
0349114	東京	2027/09/06 17:00	2028/04/26 14:00	連続	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	【鹿島線No.55鉄塔移設工事】 1.鉄塔移設 鹿島線No.55	制約有	変更	
0349115	東京	2027/09/07 08:00	2027/09/30 17:00	連続	鹿島線2L	鹿島線2L	【鹿島線No.55鉄塔移設工事】 1.ジャンパー開放 鹿島線No.49, 2.回線間ジャンパー設置 鹿島線No.49, 52, 【点検補修】 1.電線腐食点検 鹿島線No.47～乙47-1, 2.電線本体点検 鹿島線No.11～12, 26～27, 31～32, 36～37, 50～51, 103～104, 118～119	制約有	変更	
0348602	東京	2027/09/07 09:00	2027/09/08 17:00	連続	城南	新宿城南線1L	・城南線3番(R3・ELR3)断路器275kV逆さ吊り(電動)停止試験 ・3B2次中性点OFケーブル絶縁油入替(下期)11/10		変更	
0352332	東京	2027/09/13 09:00	2027/09/17 17:00	連続	北葛飾(変)	墨東線1L/墨東線1LのCBO7	1.GISガス配管改造		変更	
0348440	東京	2027/09/16 08:00	2027/09/17 18:00	連続	西東京(変)	京浜線4L	・275kVNo.1BP CT回路切替		変更	
0349130	東京	2027/09/19 09:00	2027/09/20 17:00	連続	花見川(変)	北千葉線1L/北千葉線1LのCBO1	北千葉1LGIS 6年停止試験	制約有	変更	
0348568	東京	2027/09/21 21:00	2027/09/22 06:00	連続	京浜線4L	京浜線4L	【建設C】 JP接続《No.》1021-1		変更	
0348603	東京	2027/09/29 21:00	2027/09/30 06:00	連続	京浜線3L	京浜線3L	【建設C】 電線張替《No.》1022～《No.》1038		変更	
0348575	東京	2027/09/30 06:00	2028/01/24 21:00	連続	京浜線3L	京浜線3L	【建設C】 電線張替《No.》1022～《No.》1038 JP接続《No.》1022		変更	
0349179	東京	2027/10/01 09:00	2027/10/10 17:00	連続	新佐原線1L	新佐原線1L	1.鉄塔防錆塗装 No.19～21,23～25	制約有	変更	
0348377	東京	2027/10/02 09:00	2027/10/02 17:00	単日	練馬	北武蔵野線3LのCBO3	07 GIS点検GCB開閉時間測定(パレット)		変更	
0348412	東京	2027/10/02 09:00	2027/10/02 17:00	単日	南狭山(変)	南狭山線2LのCBO6	1. LS106 24年停止試験		変更	
0348413	東京	2027/10/03 09:00	2027/10/03 17:00	単日	南狭山(変)	南狭山線2LのCBO6	1. LS206 24年停止試験		変更	
0349189	東京	2027/10/04 08:00	2027/10/31 17:00	連続	中栃木線1L	中栃木線1L	【北部送電】○鉄塔防錆塗装工事 《No.》23,25,26,28 4基		変更	
0349191	東京	2027/10/04 08:00	2027/10/06 17:00	連続	新秩父線1L	新秩父線1L	電線地線点検 新多摩(変)～《No.》3、《No.》15～《No.》17、《No.》30～《No.》33、《No.》45～《No.》48 がしし取替 《No.》10、11、12		変更	
0352286	東京	2027/10/04 08:00	2027/10/06 17:00	連続	新多摩(変)	新秩父線1L	3.E3.E53 LS点検(24年)		変更	
0348308	東京	2027/10/04 09:00	2027/10/29 14:00	連続	豊島	東内幸町線3L/東内幸町線3LのCBO9 東内幸町線3L/東内幸町線3LのCBO6	東内幸町線3LRy取替 東内幸町線3LRy取替, 電流差動Ry取替 ・制御ケーブル切離・撤去・布設・接続 ・交流回路他確認試験 ・操作・警報表示・TM試験	制約有	変更	
0348313	東京	2027/10/04 09:00	2027/10/29 14:00	連続	東内幸町			制約有	変更	
0348411	東京	2027/10/04 09:00	2027/10/22 17:00	連続	南川崎線2L	南川崎線2L	作業内容: 鶴見川専用橋耐震対策補強工事 作業場所: 鶴見川専用橋	制約有	変更	
0348522	東京	2027/10/04 09:00	2027/10/04 17:00	単日	北多摩	新宿線1L	北多摩変電所 新宿線1L OF電力ケーブル(OFケーブル停止試験) ・北多摩変電所 新宿線1LShR O903 空気CB 主回路接触抵抗測定		変更	
0349164	東京	2027/10/04 09:00	2027/10/04 17:00	単日	新秩父(開)	新秩父線1LのCBO7	・CBO7点検(6年)		変更	
0351327	東京	2027/10/04 09:00	2027/10/08 17:00	連続	永代橋	墨東線2L/墨東線2LのCBO2	275kV墨東線2番関係切替・確認試験		変更	
0348525	東京	2027/10/04 22:00	2027/10/07 05:00	毎日	新宿線1L	新宿線1L	新宿線1番POF鋼管塗膜層調査 区間: 三鷹大沢洞道～三鷹久我山洞道杉1D		変更	
0348656	東京	2027/10/05 09:00	2027/10/05 18:00	単日	北多摩	新宿線1L	■北多摩変電所 新宿線1LShR O903 空気CB 主回路接触抵抗測定 北多摩変電所 新宿線1LShR O903 空気CB 3年停止試験		変更	
0349199	東京	2027/10/05 09:00	2028/02/25 13:00	連続	新飯能(変)	新飯能線1L	・500kVGIS複母線化 ※乙母線,母線連絡,2B1次遮断器設置・新飯能線1L接続変更		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0349202	東京	2027/10/05 09:00	2027/10/06 17:00	連続	新栃木(変)	新栃木線1LのCBO3	○新栃木線1L O3 GCB(空気操作)6年停止試験【GCB】		変更	
0349203	東京	2027/10/06 08:00	2027/10/08 17:00	連続	新所沢線1L	新所沢線1L	電線地線点検 新多摩(変)～《No.》3、《No.》15～《No.》18、《No.》30～《No.》33		変更	
0347889	東京	2027/10/06 09:00	2027/10/06 17:00	単日	東毛(変)	東毛線1L/東毛線1LのCBO1	・気中断路器 東毛線1号 1(E10含む) 停止試験(12年) 【直営】 ・気中断路器 東毛線1号 101 停止試験(12年)(母線用) 【直営】 ・気中断路器 東毛線1号 201 停止試験(12年)(母線用) 【直営】		変更	
0348479	東京	2027/10/06 09:00	2027/10/06 17:00	単日	東内幸町線3L	東内幸町線3L	絶縁油採取 場所:東内幸町変電所	制約有	変更	
0348480	東京	2027/10/06 09:00	2027/10/06 17:00	単日	高輪線2L	高輪線2L	絶縁油採取 場所:東内幸町変電所、高輪変電所	制約有	変更	
0349249	東京	2027/10/06 09:00	2027/10/06 17:00	単日	新筑波(変)	新佐原線1LのCBO5	O5 GCB停止試験	制約有	変更	
0347892	東京	2027/10/07 09:00	2027/10/07 17:00	単日	東毛(変)	東毛線2L/東毛線2LのCBO2	・気中断路器 東毛線2号 2(E20含む) 停止試験(12年) 【直営】 ・気中断路器 東毛線2号 102 停止試験(12年)(母線用) 【直営】 ・気中断路器 東毛線2号 202 停止試験(12年)(母線用) 【直営】		変更	
0349207	東京	2027/10/07 09:00	2027/10/08 17:00	連続	新栃木(変)	新栃木線2LのCBO4	○新栃木線2L O4 GCB(空気操作)6年停止試験【GCB】		変更	
0348482	東京	2027/10/09 09:00	2027/10/09 17:00	単日	北多摩	西北線2L/西北線2LのCBO2	・西北線2L O2 GCB(電動バネ操作)12年停止試験 ・壁抜Bg点検		変更	
0349206	東京	2027/10/09 09:00	2027/10/09 17:00	単日	新茂木(変)	新茂木線1L	○新茂木線1L 計器用変圧器 停止試験A【計器用変圧器】 ○新茂木線1L 計器用変圧器用回路絶縁抵抗測定【計器用変圧器】		変更	
0349269	東京	2027/10/09 10:00	2027/10/09 17:00	単日	新栃木(変)	新茂木線1LのCBO1	■制御ケーブル切離、接続 ■電流取り込み、LS条件取り込み ■トリップ回路接続		変更	
0348645	東京	2027/10/10 09:00	2027/10/10 17:00	単日	北多摩	西北線2L/西北線2LのCBO2	・西北線2L 2 E2 LS(電動操作)12年停止試験 ・西北線2L 102 GIS(母線側機器)12年停止試験 ・西北線2L 線路CT 計器用変成器 12年停止試験 ・西北線2L 線路VT 計器用変成器 12年停止試験 ・275kV母線保護Ry切替試験		変更	
0349209	東京	2027/10/10 09:00	2027/10/10 17:00	単日	新茂木(変)	新茂木線2L	○新茂木線2L 計器用変圧器 停止試験A【計器用変圧器】 ○新茂木線2L 計器用変圧器用回路絶縁抵抗測定【計器用変圧器】		変更	
0349270	東京	2027/10/10 10:00	2027/10/10 17:00	単日	新栃木(変)	新茂木線2LのCBO2	■制御ケーブル切離、接続 ■電流取り込み、LS条件取り込み ■トリップ回路接続 ■シーケンス試験		変更	
0348646	東京	2027/10/11 09:00	2027/10/11 17:00	単日	北多摩	西北線2LのCBO2	・西北線2L 202 LS(電動操作)24年停止試験 ・275kV母線保護Ry切替試験		変更	
0349216	東京	2027/10/11 09:00	2027/10/20 17:00	連続	新佐原線2L	新佐原線2L	1.鉄塔防錆塗装 No.19～21,23～25	制約有	変更	
0348648	東京	2027/10/12 09:00	2027/10/12 17:00	単日	江東	江東線1LのCBO1	275kV江東線1L 101 LS停止試験【12年点検】	制約有	変更	
0349083	東京	2027/10/12 09:00	2027/11/18 14:00	連続	南いわき(開)	相馬双葉幹線1L/相馬双葉幹線1LのCBO31	・制御ケーブル切り離し・接続 ・各種試験 交流回路試験 対向試験 警報、トリップ、操作試験		変更	
0348649	東京	2027/10/13 09:00	2027/10/13 17:00	単日	江東	江東線1LのCBO1	275kV江東線1L 201 LS停止試験【12年点検】	制約有	変更	
0348650	東京	2027/10/14 09:00	2027/10/14 17:00	単日	江東	江東線2LのCBO2	275kV江東線2L 102 LS停止試験【12年点検】	制約有	変更	
0349230	東京	2027/10/14 09:00	2027/10/14 17:00	単日	新飯能(変)	新飯能線1LのCBO1	・GIS停止試験		変更	
0349231	東京	2027/10/14 09:00	2027/10/14 17:00	単日	新飯能(変)	新飯能線1L	・GIS停止試験		変更	
0351456	東京	2027/10/14 09:00	2027/10/14 17:00	単日	東毛(変)	東毛線1LのCBO1	・気中断路器 東毛線1号 201 停止試験(12年)(母線用) 【直営】		変更	
0348651	東京	2027/10/15 09:00	2027/10/15 17:00	単日	江戸川(制)変保	江東線2LのCBO2	275kV江東線2L 202 LS停止試験【12年点検】	制約有	変更	
0351457	東京	2027/10/15 09:00	2027/10/15 17:00	単日	東毛(変)	東毛線2LのCBO2	・気中断路器 東毛線2号 202 停止試験(12年)(母線用) 【直営】		変更	
0352334	東京	2027/10/17 22:00	2027/10/18 01:00	連続	世田谷	世田谷線1LのCBO1	世田谷線1番りー(2系) レトロフィット更新に伴う仮設回路作成		変更	
0351328	東京	2027/10/18 09:00	2027/10/22 17:00	連続	永代橋	豊洲永代橋線2L/豊洲永代橋線2LのCBO6	275kV豊洲永代橋線2番関係切替・確認試験		変更	
0348654	東京	2027/10/19 09:00	2027/10/21 17:00	毎日	新豊洲線1L	新豊洲線1L	・EMJX線撮影 船57A、船25D、	制約有	変更	
0348652	東京	2027/10/20 09:00	2027/10/20 16:00	単日	新京葉(変)	新豊洲線1LのCBO7	・O7 6年停止試験	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0349439	東京	2027/10/21 09:00	2027/10/21 13:00	単日	新栃木(変)	新茂木線1LのCBO1	■制御ケーブル切離、接続 ■電流回路変更、LS条件切り離し ■交流回路試験		変更	
0349440	東京	2027/10/21 13:00	2027/10/21 18:00	単日	新栃木(変)	新茂木線2LのCBO2	■制御ケーブル切離、接続 ■電流回路変更、LS条件切り離し ■交流回路試験		変更	
0348529	東京	2027/10/22 08:00	2027/10/24 18:00	連続	佐久間東幹中線1L	佐久間東幹中線1L	《1》電線圧縮接続部抵抗測定(クランプ)分7,9,11,12,13,15(6基)		変更	
0349443	東京	2027/10/22 08:00	2027/11/02 17:00	連続	福島東幹線里線1L	福島東幹線里線1L	【北部送電】○鉄塔防錆塗装工事 ・《No.》258,273 計2基		変更	
0348531	東京	2027/10/22 09:00	2027/10/28 17:00	連続	佐久間東幹中線1L	佐久間東幹中線1L	《1》電線路細密点検 《No.》307～323／17基 《2》電線補修 実施箇所検討中 《3》鉄塔防錆塗装 実施箇所検討中 《4》鉄塔部材・ボルト取替 実施箇所検討中		変更	
0349334	東京	2027/10/22 09:00	2027/11/05 17:00	連続	福島東幹線里線1L	福島東幹線里線1L	1.鉄塔防錆塗装 No.195,205,210,213 No.380～392 2.電線本体点検 福島東幹線《No.》369～370		変更	
0349338	東京	2027/10/25 09:00	2027/10/26 17:00	連続	福島東幹線里線1L	福島東幹線里線1L	《1》電線・地線点検 《No.》106～107 計1径間 《2》電線腐食点検 《No.》88～89 計1径間		変更	
0348364	東京	2027/10/25 10:00	2027/10/25 15:00	単日	北多摩	新宿線2L	北多摩変電所 新宿線2L SHR OFケーブル 絶縁油性能試験(ICP課電劣化診断 無し 作業)		変更	
0348361	東京	2027/10/26 09:00	2027/10/26 17:00	単日	永代橋	豊洲永代橋線2LのCBO6	275kV2U O6 GIS(油圧・電動バネ)停止試験(6年)		変更	
0348621	東京	2027/10/26 10:00	2027/10/26 15:00	単日	北多摩	新宿線2LのCBO4	新宿線2L O4 GCB(油圧操作)6年停止試験		変更	
0348567	東京	2027/10/27 09:00	2027/10/28 17:00	連続	城南	城南線3L	・城南線3番(R3・ELR3)断路器275kV逆さ吊り(電動)停止試験 ・3B2次中性点OFケーブル絶縁油入替(下期)11/10	制約有	変更	
0349408	東京	2027/10/28 10:00	2027/10/28 17:00	単日	新栃木(変)	中栃木線1LのCBO5	■制御ケーブル切離、接続 ■電流取り込み、LS条件取り込み ■トリップ回路接続		変更	
0352335	東京	2027/10/28 22:00	2027/10/29 01:00	連続	世田谷	世田谷線1LのCBO1	世田谷線1番リレー(2系) レトロフィット更新に伴う仮設回路戻し		変更	
0348542	東京	2027/10/29 08:00	2027/10/29 18:00	単日	佐久間東幹中線2L	佐久間東幹中線2L	《1》電線圧縮接続部抵抗測定(スリーブ)分2～3～分6(1径間)		変更	
0348543	東京	2027/10/29 09:00	2027/11/04 17:00	連続	佐久間東幹中線2L	佐久間東幹中線2L	《1》電線路細密点検 《No.》307～323／17基 《2》電線補修 実施箇所検討中 《3》鉄塔防錆塗装 実施箇所検討中 《4》鉄塔部材・ボルト取替 実施箇所検討中		変更	
0352336	東京	2027/11/01 00:00	2027/11/01 03:00	単日	世田谷	世田谷線2LのCBO2	世田谷線1番リレー(2系) レトロフィット更新に伴う仮設回路作成		変更	
0349353	東京	2027/11/01 08:00	2027/11/28 17:00	連続	中栃木線2L	中栃木線2L	【北部送電】○鉄塔防錆塗装工事 《No.》23,25,26,28 4基		変更	
0348547	東京	2027/11/01 09:00	2027/11/30 14:00	連続	東内幸町	高輪線1L/高輪線1LのCBO7	・制御ケーブル切離、撤去、布設、接続・保護リレー盤撤去、据付・保護継電器試験(単体、対向)・交流回路他確認試験・警報表示・実トリップ・操作試験	制約有	変更	
0348549	東京	2027/11/01 09:00	2027/11/30 17:00	連続	東内幸町線2L	東内幸町線2L	・中間接続部補修、アラストシート補修 ・場所:豊3D(黒相)	制約有	変更	
0348552	東京	2027/11/01 09:00	2027/11/30 14:00	連続	高輪	高輪線1L/高輪線1LのCBO1	保護リレー取替 ・制御ケーブル切離、撤去、布設、接続 ・保護リレー盤撤去、据付 ・保護継電器試験(単体、対向) ・交流回路他確認試験 ・警報表示・実トリップ・操作試験 ・他	制約有	変更	
0348553	東京	2027/11/01 09:00	2027/11/30 17:00	連続	東内幸町	東内幸町線2L/東内幸町線2LのCBO5	東内幸町線2LRy取替、電流差動Ry取替 ・制御ケーブル切離・撤去・布設・接続 ・交流回路他確認試験 ・操作・警報表示・TM試験	制約有	変更	
0348554	東京	2027/11/01 09:00	2027/11/30 17:00	連続	豊島	東内幸町線2L/東内幸町線2LのCBO8	東内幸町線2LRy取替	制約有	変更	
0348608	東京	2027/11/01 09:00	2027/11/19 17:00	連続	南川崎線3L	南川崎線3L	作業内容:鶴見川専用橋耐震対策補強工事 作業場所:鶴見川専用橋	制約有	変更	
0348343	東京	2027/11/01 09:30	2027/11/01 17:00	単日	東内幸町線2L	東内幸町線2L	【絶縁油採取】 豊2D(W)(傾向監視対象) 豊3D(B)(Aランク) 文6D(R)(Aランク改修対象)	制約有	変更	
0348658	東京	2027/11/02 09:00	2027/11/02 16:00	単日	新京葉(変)	新豊洲線3LのCBO9	・O9 6年停止試験 ・3号ShR 停止試験	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0349461	東京	2027/11/02 09:00	2027/11/25 14:00	連続	南いわき(開)	相馬双葉幹線2L/相馬双葉幹線2LのCBO32	・制御ケーブル切り離し・接続 ・各種試験 交流回路試験 対向試験 警報、トリップ、操作試験		変更	
0348491	東京	2027/11/04 09:00	2027/11/04 17:00	単日	永代橋	豊洲永代橋線3LのCBO7	275kV3U O7 GIS(油圧・電動パネ)停止試験(6年)		変更	
0349412	東京	2027/11/04 10:00	2027/11/04 17:00	単日	新栃木(変)	新栃木線1LのCBO3	■制御ケーブル切離、接続 ■電流取り込み、LS条件取り込み ■トリップ回路接続		変更	
0349414	東京	2027/11/05 10:00	2027/11/05 17:00	単日	新栃木(変)	新栃木線2LのCBO4	■制御ケーブル切離、接続 ■電流取り込み、LS条件取り込み ■トリップ回路接続		変更	
0349444	東京	2027/11/08 08:00	2027/11/19 17:00	連続	福島東幹線里線2L	福島東幹線里線2L	【北都送電】○鉄塔防錆塗装工事 ・《No.》258.273 計2基		変更	
0348660	東京	2027/11/08 09:00	2027/11/08 17:00	単日	高輪線1L	高輪線1L	絶縁油採取 場所: 東内幸町変電所、高輪変電所	制約有	変更	
0349196	東京	2027/11/08 09:00	2027/11/09 17:00	連続	新野田(変)	鹿島線1L<シンノダ>/鹿島線1L<シンノダ>のCBO55	・O-55 GCB(油圧・電動パネ)停止試験B ・計器用変成器2次・3次回路絶縁抵抗測定 ・計器用変圧器停止試験A【PD】 ・55 LS(電動操作)停止試験 ・155、255 LS(電動操作)停止試験	制約有	変更	
0349285	東京	2027/11/08 09:00	2027/11/09 17:00	連続	常総(変)	鹿島線1L新野田側/鹿島線1LのCBO1	鹿島線1L(鹿島側) O1 GCB(油圧・電動パネ)停止試験(12年)【GCB】	制約有	変更	
0349287	東京	2027/11/08 09:00	2027/11/10 17:00	連続	鹿島線1L新野田側	鹿島線1L新野田側	【点検補修】 1.電線腐食点検 鹿島線No.甲47-7～甲47-8、 2.電線本体点検 鹿島線No.11～12、16～17、26～27、31～32、36～37	制約有	変更	
0349337	東京	2027/11/08 09:00	2027/11/08 17:00	単日	福島東幹線里線2L	福島東幹線里線2L	電線・地線点検 《No.》106～107 計1径間		変更	
0349371	東京	2027/11/08 09:00	2027/11/22 17:00	連続	福島東幹線里線2L	福島東幹線里線2L	1.鉄塔防錆塗装 No.195,205,210,213 No.380～392 2.電線本体点検 福島東幹線《No.》369～370		変更	
0351602	東京	2027/11/08 09:00	2027/12/24 17:00	連続	城南	新宿城南線2L	・制御ケーブル切離し、接続 ・確認試験		変更	
0348625	東京	2027/11/09 09:00	2027/11/09 17:00	単日	東内幸町	高輪線1LのCBO7	ガス絶縁開閉装置 275kV油圧操作(線路側機器) 6年開閉時間測定 1U O7(高輪1L)	制約有	変更	
0351599	東京	2027/11/09 09:00	2027/11/09 17:00	単日	城南	新宿城南線2L	・主変6号1次構連 受電側、Tr側CH OFケーブル点検(採油あり) ・主変6号1次構連 Tr側CH OFケーブルICP課電劣化診断		変更	
0349410	東京	2027/11/09 10:00	2027/11/09 17:00	単日	新栃木(変)	中栃木線2LのCBO6	■制御ケーブル切離、接続 ■電流取り込み、LS条件取り込み ■トリップ回路接続		変更	
0348604	東京	2027/11/10 22:00	2027/11/11 08:00	連続	豊島	東内幸町線2L/東内幸町線2LのCBO8	GIS点検(8.O8.E8)	制約有	変更	
0348488	東京	2027/11/11 09:00	2027/11/12 17:00	毎日	北葛飾線2L	北葛飾線2L	1.停止がいし点検:《No.》15.《No.》18～《No.》20 計4基		変更	
0348489	東京	2027/11/11 09:00	2027/11/12 17:00	連続	北葛飾(変)	北葛飾線2L/北葛飾線2LのCBO2	1.275kVGIS 12年点検		変更	
0348504	東京	2027/11/11 09:00	2027/11/11 17:00	単日	北葛飾(変)	上野線1LのCBO3	1.GIS 6年点検【東電直営】		変更	
0348551	東京	2027/11/11 09:00	2027/11/11 12:00	単日	上野	上野線1LのCBO1	上野線1L O1 6年点検		変更	
0348662	東京	2027/11/11 09:00	2027/11/11 17:00	単日	東内幸町線2L	東内幸町線2L	絶縁油採取 場所: 東内幸町変電所	制約有	変更	
0349205	東京	2027/11/11 09:00	2027/11/12 17:00	連続	新野田(変)	鹿島線2L/鹿島線2LのCBO56	・O-56 GCB(油圧・電動パネ)停止試験B ・計器用変成器2次・3次回路絶縁抵抗測定 ・計器用変圧器停止試験A【PD】 ・56 LS(電動操作)停止試験 ・156、256 LS(電動操作)停止試験	制約有	変更	
0349375	東京	2027/11/11 09:00	2027/11/11 17:00	単日	新筑波(変)	福島東幹線里線2LのCBO2	福島東幹線里線2L O2 GCB停止試験(6年)		変更	
0352337	東京	2027/11/12 00:00	2027/11/12 03:00	単日	世田谷	世田谷線2LのCBO2	世田谷線1番リレ(2系) レトロフィット更新に伴う仮設回路戻し		変更	
0348505	東京	2027/11/12 09:00	2027/11/12 17:00	単日	北葛飾(変)	上野線2LのCBO4	1.GIS 6年点検【東電直営】		変更	
0348486	東京	2027/11/13 09:00	2027/11/14 17:00	毎日	北葛飾線1L	北葛飾線1L	1.停止がいし点検:《No.》15.《No.》18～《No.》20 計4基		変更	
0348512	東京	2027/11/13 09:00	2027/11/13 17:00	単日	上野線3L	上野線3L	上野線3番赤相 絶縁油採取【足22D】		変更	
0348644	東京	2027/11/15 09:00	2027/12/03 17:00	連続	京北(変)	豊島線2L/豊島線2LのCBO4	1.制御ケーブル切り離し、接続 2.各種試験	制約有	変更	
0348665	東京	2027/11/15 09:00	2027/12/17 17:00	連続	水道橋線2L	水道橋線2L	防食層保護装置補修		変更	
0348686	東京	2027/11/15 09:00	2027/12/03 17:00	連続	豊島	豊島線2L/豊島線2LのCBO2	豊島線2LPCM取替(レトロフィット)	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0349413	東京	2027/11/16 09:00	2027/11/16 13:00	単日	新栃木(変)	新栃木線1LのCBO3	■制御ケーブル切離、接続 ■電流回路変更、LS条件切り離し ■交流回路試験		変更	
0349426	東京	2027/11/16 09:00	2027/11/16 17:00	単日	常総(変)	鹿島線1L新野田側/鹿島線1LのCBO1	鹿島線1L(鹿島側) O1 GCB(油圧・電動パネ)停止試験(12年)【GCB】	制約有	変更	
0349415	東京	2027/11/16 13:00	2027/11/16 18:00	単日	新栃木(変)	新栃木線2LのCBO4	■制御ケーブル切離、接続 ■電流回路変更、LS条件切り離し ■交流回路試験		変更	
0349411	東京	2027/11/17 13:00	2027/11/17 18:00	単日	新栃木(変)	中栃木線2LのCBO6	■制御ケーブル切離、接続 ■電流回路変更、LS条件切り離し ■交流回路試験		変更	
0349454	東京	2027/11/18 14:00	2027/11/18 15:00	単日	南いわき(開)	相馬双葉幹線1L/相馬双葉幹線1LのCBO31	・実系統による電圧電流位相測定試験		変更	
0349390	東京	2027/11/23 08:00	2027/11/24 17:00	連続	新秩父線2L	新秩父線2L	電線地線点検 新多摩(変)～《No.》3、《No.》15～《No.》17、《No.》30～《No.》33、《No.》45～《No.》48 がいし取替 《No.》12、14		変更	
0349385	東京	2027/11/24 09:00	2027/11/24 17:00	単日	新秩父(開)	新秩父線2LのCBO8	・CBO8点検(6年)		変更	
0349394	東京	2027/11/24 09:00	2027/12/03 17:00	連続	福島里幹線1L	福島里幹線1L	1.航空標識塗装 No.369,377,394,395,404,426 2.がいし取替 福島幹線《No.》388,425,430,433		変更	
0349395	東京	2027/11/24 09:00	2027/11/24 17:00	単日	西群馬(開)	新吾妻線1LのCBO33	・ガス絶縁開閉装置(GIS)(油圧操作方式) 新吾妻線1号 停止試験(6年)		変更	
0348593	東京	2027/11/25 09:00	2027/12/01 17:00	連続	佐久間東幹線1L	佐久間東幹線1L	《1》落雪装置の取り付け 《No.》429～《No.》431/2径間 《2》鉄塔防錆塗装 実施箇所検討中		変更	
0349399	東京	2027/11/25 09:00	2027/11/25 17:00	単日	西群馬(開)	新吾妻線2LのCBO34	・ガス絶縁開閉装置(GIS)(油圧操作方式) 新吾妻線2号 停止試験(6年)		変更	
0349526	東京	2027/11/25 14:00	2027/11/25 15:00	単日	南いわき(開)	相馬双葉幹線2L/相馬双葉幹線2LのCBO32	・実系統による電圧電流位相測定試験		変更	
0349409	東京	2027/11/30 10:00	2027/11/30 15:00	単日	新栃木(変)	中栃木線1LのCBO5	■制御ケーブル切離、接続 ■電流回路変更、LS条件切り離し ■交流回路試験		変更	
0348483	東京	2027/11/30 17:00	2027/11/30 17:30	単日	東内幸町線2L	東内幸町線2L	常規対地電圧印加試験	制約有	変更	
0348501	東京	2027/12/02 09:00	2027/12/08 17:00	連続	佐久間東幹線2L	佐久間東幹線2L	《1》落雪装置の取り付け 《No.》429～《No.》431/2径間 《2》鉄塔防錆塗装 実施箇所検討中		変更	
0348643	東京	2027/12/06 09:00	2027/12/24 17:00	連続	京北(変)	豊島線3L/豊島線3LのCBO5	1.制御ケーブル切り離し、接続 2.各種試験	制約有	変更	
0348691	東京	2027/12/06 09:00	2027/12/24 17:00	連続	豊島	豊島線3L/豊島線3LのCBO3	豊島線3LPCM取替(レトロフィット)	制約有	変更	
0349282	東京	2027/12/06 09:00	2027/12/15 17:00	連続	福島里幹線2L	福島里幹線2L	1.航空標識塗装 No.369,377,394,395,404,426		変更	
0349284	東京	2027/12/08 09:00	2027/12/09 17:00	連続	新秩父(開)	新榛名線1LのCBO1	・CBO2点検(12年)		変更	
0347902	東京	2027/12/14 09:00	2027/12/16 17:00	連続	東毛線1L	東毛線1L	電線路細密点検		変更	
0348661	東京	2027/12/14 09:00	2027/12/14 16:00	単日	葛南世田谷線1L	葛南世田谷線1L	ケーブルヘッドシリコン油採取		変更	
0348666	東京	2027/12/15 09:00	2027/12/15 16:00	単日	葛南世田谷線2L	葛南世田谷線2L	ケーブルヘッドシリコン油採取		変更	
0347885	東京	2027/12/17 09:00	2027/12/19 17:00	連続	東毛線2L	東毛線2L	電線路細密点検		変更	
0348509	東京	2027/12/18 09:00	2027/12/19 18:00	連続	新多摩(変)	東京西線1L/東京西線1LのCBO33	【定期点検】 ・東京西線1LGIS 12年停止試験 ・東京西線1LBg 12年停止試験 ・東京西線1LVT 12年停止試験 【GCB油圧操作機構修理】 ・O33ウレタンパッキン交換修理 【不具合修理】 ・東京西線1LGISのE33区画ガス漏れ修理	制約有	変更	
0349433	東京	2027/12/20 08:30	2027/12/21 17:00	連続	新富士(変)	新秦野線1LのCBO3	【保守業務】 ・新秦野線1L 103・E103・EB103 LS停止試験(12年)		変更	
0348507	東京	2027/12/20 09:00	2027/12/21 17:00	毎日	東京西線1L	東京西線1L	a.ジャンパーソケットボルト補修 《No.》76	制約有	変更	
0351334	東京	2027/12/20 09:00	2027/12/25 18:00	連続	新多摩(変)	東京西線1L/東京西線1LのCBO33	【定期点検】 ・東京西線1LBg 12年停止試験 ・東京西線1LVT 12年停止試験 【GCB油圧操作機構修理】 ・O33ウレタンパッキン交換修理 【不具合修理】 ・東京西線1LGISのE33区画ガス漏れ修理	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0348506	東京	2027/12/23 09:00	2027/12/24 18:00	連続	南多摩	東京西線1L/東京西線1LのCBO1	【定期点検】 ・東京西線1LGIS 6年停止試験 ・東京西線1LBg 12年停止試験 【GCB油圧操作機構修理】 ・O1ウレタンハッペン交換修理	制約有	変更	
0348497	東京	2028/01/03 09:00	2028/06/30 16:30	連続	東新宿線3L	東新宿線3L	洪5K Y分岐接続 新宿変電所 新宿線3L終端接続部組立 POFケーブル部撤去		変更	
0352324	東京	2028/01/03 09:00	2028/06/30 16:30	連続	北多摩	東新宿線3L 新宿線3L	新新宿線3番GIS～東新宿線3番Shr間ケーブル張替		変更	
0348498	東京	2028/01/04 09:00	2028/06/30 16:30	連続	新宿線3L	新宿線3L	洪5K Y分岐接続 新宿変電所 新宿線3L終端接続部組立 POFケーブル部撤去		変更	
0348613	東京	2028/01/04 09:00	2028/04/28 17:00	連続	城南	新宿城南線3L 新宿城南線3L	・7B一次ケーブル張替		変更	
0348614	東京	2028/01/04 09:00	2028/04/28 17:00	連続	城南	新宿城南線3L	・制御ケーブル切離し、接続 ・確認試験 ・所変線3号GIS接地に伴う制御ケーブル移設		変更	
0348681	東京	2028/01/04 09:00	2028/01/06 17:00	連続	新宿	新宿線3L/新宿線3LのCBO3	CH部解体、ガス処理		変更	
0352339	東京	2028/01/04 09:00	2028/06/30 16:30	連続	北多摩	新宿線3L	新新宿線3番GIS～東新宿線3番Shr間ケーブル張替		変更	
0348055	東京	2028/01/11 09:00	2028/01/27 17:00	連続	北東京(変)	西越谷線1L/西越谷線1LのCBO13	西越谷線1号TC取替		新規	
0349310	東京	2028/01/12 09:00	2028/01/12 17:00	単日	新坂戸(変)	新坂戸線1LのCBO1	1.GIS停止試験6年		変更	
0349311	東京	2028/01/12 09:00	2028/01/17 17:00	連続	新坂戸線1L	新坂戸線1L	電線路細密点検 《No.》405～420ノ16基		変更	
0349312	東京	2028/01/18 09:00	2028/01/23 17:00	連続	新坂戸線2L	新坂戸線2L	電線路細密点検 《No.》405～420ノ16基		変更	
0349313	東京	2028/01/18 09:00	2028/01/18 17:00	単日	新坂戸(変)	新坂戸線2LのCBO2	1.GIS停止試験6年		変更	
0348535	東京	2028/01/19 09:00	2028/01/19 17:00	単日	北多摩	新宿線3L	北多摩変電所 新宿線3L SHR OF電力ケーブル(OFケーブル)停止試験		変更	
0349431	東京	2028/01/21 09:00	2028/01/26 17:00	連続	新新田(変)	新赤城線1LのCBO7	500kVGIS用GCB投入抵抗接点脱落による内部事故対策		変更	
0348558	東京	2028/01/24 09:00	2028/01/25 17:00	連続	城南	新宿城南線3L	・新宿城南線3番(S3・ELSS)断路器275kV逆さ吊り(電動)停止試験		変更	
0348685	東京	2028/01/24 21:00	2028/01/25 06:00	連続	京浜線3L	京浜線3L	【建設C】京浜線3・4号線《No.》1022～《No.》1038電線張替工事 JP接続《No.》1022		変更	
0349315	東京	2028/01/25 09:00	2028/01/26 17:00	連続	新赤城線1L	新赤城線1L	電線路細密点検 東群馬ST～《No.》229-3ノ4基		変更	
0341981	東京	2028/01/26 09:00	2028/01/27 17:00	連続	西越谷線1L	西越谷線1L	1.CT撤去 2.検出装置据付		変更	
0349316	東京	2028/01/27 09:00	2028/01/28 17:00	連続	新赤城線2L	新赤城線2L	電線路細密点検 東群馬ST～《No.》229-3ノ4基		変更	
0347867	東京	2028/01/31 09:00	2028/02/07 17:00	連続	豊岡(変)	青梅・豊岡線1L/豊岡線1LのCBO1	1.制御ケーブル切り離し		変更	
0348056	東京	2028/02/01 09:00	2028/02/17 17:00	連続	北東京(変)	西越谷線2L/西越谷線2LのCBO14	西越谷線2号TC取替		新規	
0348687	東京	2028/02/01 21:00	2028/02/02 06:00	連続	京浜線4L	京浜線4L	【建設C】京浜線3・4号線《No.》1022～《No.》1038電線張替工事 JP開放《No.》1022		変更	
0348688	東京	2028/02/02 06:00	2028/03/27 21:00	連続	京浜線4L	京浜線4L	【建設C】京浜線3・4号線《No.》1022～《No.》1038電線張替工事 電線張替《No.》1027～《No.》1034		変更	
0349317	東京	2028/02/02 09:00	2028/02/10 17:00	連続	新所沢線1L	新所沢線1L	1.電線地線点検:《No.》47～48,51～52,54～55,61～62,66～67,68～69,76～77,81～82,86～87 計9区間		変更	
0341982	東京	2028/02/16 09:00	2028/02/17 17:00	連続	西越谷線2L	西越谷線2L	1.CT撤去 2.検出装置据付		変更	
0347870	東京	2028/02/16 09:00	2028/02/23 17:00	連続	豊岡(変)	青梅・豊岡線2L/豊岡線2LのCBO2	1.制御ケーブル切り離し		変更	
0348623	東京	2028/02/16 10:00	2028/02/16 17:00	単日	北多摩	新宿線3LのCBO5	新宿線3L O5 GCB(油圧操作)6年停止試験		変更	
0349590	東京	2028/02/25 13:00	2028/02/25 17:00	単日	新飯能(変)	新飯能線1L	・500kVGIS複母線化に伴う諸試験		変更	
0348626	東京	2028/03/06 09:00	2028/06/19 17:00	連続	豊島	東内幸町線1L/東内幸町線1LのCBO7	O7GIS封じ切り化、AMP-PD取替	制約有	変更	
0349553	東京	2028/03/07 09:00	2028/03/15 17:00	連続	新所沢線2L	新所沢線2L	1.電線地線点検:《No.》47～48,51～52,54～55,61～62,66～67,68～69,76～77,81～82,86～87 計9区間		変更	
0349554	東京	2028/03/07 09:00	2028/06/23 13:00	連続	新飯能(変)	新飯能線2L	・500kVGIS複母線化 ※1U甲母線,1B1次遮断器設置		変更	
0348605	東京	2028/03/08 09:00	2028/03/08 16:00	単日	東内幸町	東内幸町線1LのCBO4	ガス絶縁開閉装置 275kV油圧操作(線路側機器) 6年開閉時間測定 1U O4(東内幸町1L)	制約有	変更	
0348519	東京	2028/03/20 09:00	2028/04/07 17:00	連続	京北(変)	豊島線1L/豊島線1LのCBO3	1.制御ケーブル切り離し、接続 2.各種試験	制約有	変更	
0348682	東京	2028/03/20 09:00	2028/04/07 17:00	連続	豊島	豊島線1L/豊島線1LのCBO1	豊島線1LPCM取替(レトロフィット)	制約有	変更	
0349574	東京	2028/03/20 09:00	2028/03/24 17:00	連続	新栃木(変)	新栃木線1LのCBO3	■E103操作機構取替		変更	
0348048	東京	2028/03/21 09:00	2028/03/29 17:00	連続	西越谷(変)	西越谷線2L/西越谷線2LのCBO2	1.制御回路切替		新規	
0348358	東京	2028/03/22 08:00	2028/03/22 18:00	単日	西東京(変)	佐久間東幹里線1LのCBO3	・LS203細密点検		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0348355	東京	2028/03/23 08:00	2028/03/23 18:00	単日	西東京(変)	佐久間東幹里線2LのCBO4	・LS204細密点検 ・E-230普通点検 ・VT点検		変更	
0348692	東京	2028/03/24 09:00	2028/03/30 17:00	連続	南多摩	東京西線2L	・主変2BTr取替 ・2B1次ケーブル張替に伴う危険防止(CH解体)	制約有	変更	
0348066	東京	2028/03/27 09:00	2028/03/31 17:00	連続	西越谷(変)	西越谷線1L/西越谷線1LのCBO1 東京西線2L/東京西線2LのCBO34	1.制御回路切替 【定期点検】 ・東京西線2LGIS 6年停止試験 ・東京西線2LBg 12年停止試験 ・東京西線2LVT 12年停止試験 【不具合修理】 ・東京西線2LGISのE34区画ガス漏れ修理		変更	
0348588	東京	2028/03/27 09:00	2028/03/28 18:00	連続	新多摩(変)	東京西線2L	・停止がいし点検 《No.》67	制約有	変更	
0348693	東京	2028/03/27 09:00	2028/03/28 17:00	毎日	東京西線2L	東京西線2L	【建設C】京浜線3・4号線《No.》1022～《No.》1038電線張替工事 JP接続《No.》1022	制約有	変更	
0348696	東京	2028/03/27 21:00	2028/03/28 06:00	連続	京浜線4L	東京西線2L/東京西線2LのCBO2	【定期点検】 ・東京西線2LGIS 6年停止試験 ・東京西線2LBg 12年停止試験 【GCB油圧操作機構修理】 ・O2ウレタンハッキン交換修理 【不具合修理】 ・LS2黒相回転シール部交換 ・LS2黒、赤相入切インジケータ部ガスリーク修理 ・E2黒相操作機構部モーター修理	制約有	変更	
0352325	東京	2028/03/31 09:00	2028/03/31 17:00	単日	北葛飾(変)	墨東線1L/墨東線1LのCBO7	1.7号ShR試験		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0471817	中部	2026/04/01 09:00	2026/04/01 09:30	単日	南福光変	77kV 1 BTB	開閉試験		変更	
0472557	中部	2026/04/01 09:00	2026/04/01 09:30	単日	南福光変	77kV 7 BANK	開閉試験		変更	
0471233	中部	2026/04/03 08:30	2026/04/03 09:00	単日	飛騨変換所	500kV AB BUS SECT	開閉試験		更新	
0471064	中部	2026/04/03 09:00	2026/04/03 09:30	単日	東部変	500kV 新三河幹 2L 構内	開閉試験	制約有	変更	
0471115	中部	2026/04/03 09:00	2026/04/03 09:30	単日	新三河変	500kV 新三河幹 2L 構内	開閉試験	制約有	変更	
0475855	中部	2026/04/03 09:00	2026/04/03 17:00	単日	新三河幹 2L	500kV 新三河幹 2L 全線	新三河幹線2Lがいし取替	制約有	新規	
0470723	中部	2026/04/04 09:00	2026/04/04 16:00	単日	東部額田 2L	275kV 東部額田 2L 全線	東部額田線・20 2Lジャンパオフ		変更	
0471107	中部	2026/04/04 09:00	2026/04/04 09:30	単日	東部変	275kV 東部額田 2L 構内	開閉試験		変更	
0471195	中部	2026/04/04 09:00	2026/04/04 09:30	単日	額田開	275kV 東部額田 2L 構内	開閉試験		変更	
0471591	中部	2026/04/04 09:00	2026/04/04 09:30	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB038)		変更	
0472902	中部	2026/04/04 09:00	2026/04/04 16:00	単日	東部額田 2L	275kV 東部額田 2L 全線	防錆塗装		変更	
0470722	中部	2026/04/04 16:00	2026/05/31 09:00	連続	東部額田 2L	275kV 東部額田 2L 区間停止	東部額田線・6～・11間電線張替		変更	
0470599	中部	2026/04/06 08:00	2026/04/09 18:00	連続	金山変	275kV 金山松ケ枝 2L 線路	275kV松ケ枝2L関係機器点検(LE電装品、CB電装品・点検A(ほか))		更新	
0470486	中部	2026/04/06 09:00	2026/04/07 17:00	連続	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 1L 構内	(瀬戸1L)甲016 FB撤去	制約有	更新	
0470498	中部	2026/04/06 09:00	2026/04/11 17:00	連続	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 1L 線路	北豊田変制御盤取替／瀬戸1L取込	制約有	更新	
0470572	中部	2026/04/06 09:00	2026/04/06 17:00	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 1L 構内	CB026作動油交換、A点検	制約有	更新	
0470886	中部	2026/04/06 09:00	2026/04/08 17:00	毎日	瀬戸北豊田 1L	275kV 瀬戸北豊田 1L 全線	瀬戸北豊田線鉄塔防錆塗装	制約有	更新	
0471123	中部	2026/04/06 09:00	2026/04/06 09:30	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 1L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471129	中部	2026/04/06 09:00	2026/04/06 09:30	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 1L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0470834	中部	2026/04/07 08:00	2026/04/08 17:00	毎日	犬山電名 1L	275kV 犬山電名 1L	【KCB-26-001】不良碍子検出(活線)		変更	
0470488	中部	2026/04/08 09:00	2026/04/09 17:00	連続	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 1L 構内	(瀬戸1L)乙016 FB撤去	制約有	更新	
0471036	中部	2026/04/08 15:00	2026/04/08 15:30	単日	犬山変	275kV 犬山電名 2L 構内	開閉試験		更新	
0471037	中部	2026/04/08 15:00	2026/04/08 15:30	単日	中名古屋開	275kV 犬山電名 2L 構内	開閉試験		更新	
0471035	中部	2026/04/08 15:30	2026/04/08 16:00	単日	犬山変	275kV 犬山電名 1L 構内	開閉試験		更新	
0470835	中部	2026/04/09 08:00	2026/04/10 17:00	毎日	犬山電名 2L	275kV 犬山電名 2L	【KCB-26-002】不良碍子検出(活線)		変更	
0472637	中部	2026/04/10 16:00	2026/04/10 16:10	単日	南福光変	77kV 1 BTB	南福光連系所BTB廃止／77kV側試加圧		変更	
0479117	中部	2026/04/18 09:00	2026/04/19 17:00	毎日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装		新規	
0470499	中部	2026/04/18 09:00	2026/04/22 17:00	連続	愛知変	275kV 愛知瀬戸 1L 線路	制御盤・保護盤取替／愛知瀬戸1・2L切替		変更	
0471449	中部	2026/04/18 09:00	2026/04/18 09:30	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 1L 構内	開閉試験		変更	
0471450	中部	2026/04/18 09:00	2026/04/18 09:30	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 2L 構内	開閉試験		変更	
0471541	中部	2026/04/18 09:00	2026/04/18 09:30	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 1L 構内	開閉試験		変更	
0471542	中部	2026/04/18 09:00	2026/04/18 09:30	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 2L 構内	開閉試験		変更	
0475796	中部	2026/04/18 09:00	2026/04/22 17:00	連続	愛知変	275kV 愛知瀬戸 2L 線路	制御盤・保護盤取替／愛知瀬戸1・2L切替		新規	
0470810	中部	2026/04/20 15:00	2026/04/20 15:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 2L 線路	伊勢中勢線屋外機器取替／伊勢中勢線2L課電試験		更新	
0471371	中部	2026/04/20 15:30	2026/04/20 16:00	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 2L 線路	伊勢中勢線屋外機器取替／伊勢中勢線2L実負荷試験(中勢側)		更新	
0471378	中部	2026/04/20 15:30	2026/04/20 16:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 2L 線路	伊勢中勢線屋外機器取替／伊勢中勢線2L実負荷試験		更新	
0471379	中部	2026/04/20 15:30	2026/04/20 16:00	単日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 2L 線路	伊勢中勢線屋外機器取替／伊勢中勢線2L実負荷試験		更新	
0471380	中部	2026/04/20 15:30	2026/04/20 16:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 2L 線路	伊勢中勢線屋外機器取替／伊勢中勢線2L実負荷試験		更新	
0471347	中部	2026/04/20 16:00	2026/04/20 16:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 1L 構内	開閉試験		更新	
0471358	中部	2026/04/20 16:00	2026/04/20 16:30	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 1L 構内	開閉試験		更新	
0471348	中部	2026/04/20 16:30	2026/04/20 17:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 2L 構内	開閉試験		更新	
0471359	中部	2026/04/20 16:30	2026/04/20 17:00	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 2L 構内	開閉試験		更新	
0471351	中部	2026/04/20 17:00	2026/04/20 17:30	単日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 1L 構内	開閉試験		更新	
0471367	中部	2026/04/20 17:00	2026/04/20 17:30	単日	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 1L 構内	開閉試験		更新	
0471352	中部	2026/04/20 17:30	2026/04/20 18:00	単日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 2L 構内	開閉試験		更新	
0471368	中部	2026/04/20 17:30	2026/04/20 18:00	単日	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 2L 構内	開閉試験		更新	
0471046	中部	2026/04/21 07:30	2026/04/21 08:00	単日	東信変	275kV 東信新北信 1L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471054	中部	2026/04/21 07:30	2026/04/21 08:00	単日	新北信変	275kV 東信新北信 1L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0470836	中部	2026/04/21 08:00	2026/04/22 17:00	毎日	佐久間西幹里 1L	275kV 佐久間西幹里 1L	【KCB-26-003】不良碍子検出(活線)		変更	
0471344	中部	2026/04/21 08:00	2026/04/21 08:30	単日	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 1L 構内	開閉試験		更新	
0471353	中部	2026/04/21 08:00	2026/04/21 08:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 1L 構内	開閉試験		更新	
0471345	中部	2026/04/21 08:30	2026/04/21 09:00	単日	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 2L 構内	開閉試験		更新	
0471354	中部	2026/04/21 08:30	2026/04/21 09:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 2L 構内	開閉試験		更新	
0471105	中部	2026/04/21 09:00	2026/04/22 17:00	連続	西部変	275kV 鈴鹿幹 1L 線路	鈴鹿幹1L関係機器点検		更新	
0471245	中部	2026/04/21 09:00	2026/04/21 09:30	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 1L 構内	開閉試験		更新	
0471272	中部	2026/04/21 09:00	2026/04/21 09:30	単日	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 1L 構内	開閉試験		更新	
0470837	中部	2026/04/23 08:00	2026/04/24 17:00	毎日	佐久間西幹里 2L	275kV 佐久間西幹里 2L	【KCB-26-004】不良碍子検出(活線)		変更	
0471106	中部	2026/04/23 09:00	2026/04/24 17:00	連続	西部変	275kV 鈴鹿幹 2L 線路	鈴鹿幹2L関係機器点検		更新	
0471246	中部	2026/04/23 09:00	2026/04/23 09:30	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 2L 構内	開閉試験		更新	
0471273	中部	2026/04/23 09:00	2026/04/23 09:30	単日	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 2L 構内	開閉試験		更新	
0471268	中部	2026/04/24 09:00	2026/04/24 09:30	単日	信濃変	275kV 佐久幹 2L 構内	開閉試験		変更	
0471581	中部	2026/04/24 09:00	2026/04/24 15:00	単日	佐久変	275kV 佐久幹 2L 構内	開閉試験(佐久幹2L)		変更	
0475863	中部	2026/04/24 09:00	2026/04/24 15:00	単日	佐久幹 2L	275kV 佐久幹 2L 全線	架線金具補修		新規	
0471267	中部	2026/04/24 15:00	2026/04/24 15:30	単日	信濃変	275kV 佐久幹 1L 構内	開閉試験		変更	
0471580	中部	2026/04/24 15:00	2026/04/24 15:20	単日	佐久変	275kV 佐久幹 1L 構内	開閉試験(佐久幹1L)		変更	
0470932	中部	2026/04/25 08:00	2026/04/30 17:00	毎日	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	制約有	更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0471172	中部	2026/04/25 08:00	2026/04/25 08:30	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471180	中部	2026/04/25 08:00	2026/04/25 08:30	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 1L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0473153	中部	2026/04/25 08:00	2026/04/30 17:00	毎日	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	制約有	更新	
0475885	中部	2026/04/25 08:00	2026/04/30 17:00	毎日	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	制約有	新規	
0470481	中部	2026/04/27 09:00	2026/04/29 17:00	連続	北豊田変	275kV 東浦北豊田 1L 構内	(東浦1・2L)甲012・014 FB撤去	制約有	更新	
0470482	中部	2026/04/27 09:00	2026/04/29 17:00	連続	北豊田変	275kV 東浦北豊田 2L 構内	(東浦1・2L)甲012・014 FB撤去	制約有	更新	
0470571	中部	2026/04/27 09:00	2026/05/02 17:00	連続	北豊田変	275kV 東浦北豊田 1L 線路	北豊田変275・154kV制御盤取替／275東浦1L取込	制約有	更新	
0470812	中部	2026/04/27 09:00	2026/05/02 17:00	連続	東浦開	275kV 東浦北豊田 1L 線路	東浦開275kV制御盤取替／北豊田・知多火力1L	制約有	更新	
0470813	中部	2026/04/27 09:00	2026/05/02 17:00	連続	東浦開	275kV 知多火力東浦 1L 線路	東浦開275kV制御盤取替／北豊田・知多火力1L	制約有	更新	
0471127	中部	2026/04/27 09:00	2026/04/27 09:30	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 1L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471128	中部	2026/04/27 09:00	2026/04/27 09:30	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 2L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471182	中部	2026/04/27 09:00	2026/04/27 09:30	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 1L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471192	中部	2026/04/27 09:00	2026/04/27 09:30	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 1L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471168	中部	2026/04/27 10:30	2026/04/27 11:00	単日	知多火力変	275kV B BUS TIE	開閉試験		更新	
0479113	中部	2026/04/28 11:00	2026/04/28 12:00	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 1L 構内	知多火力1L、北豊田1L切替 バレット取込、制御試験	制約有	新規	
0479114	中部	2026/04/28 11:00	2026/04/28 12:00	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 1L 構内	知多火力1L、北豊田1L切替 バレット取込、制御試験	制約有	新規	
0479115	中部	2026/04/28 15:00	2026/04/28 16:00	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 1L 構内	知多火力1L、北豊田1L切替 バレット取込、制御試験	制約有	新規	
0479116	中部	2026/04/28 15:00	2026/04/28 16:00	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 1L 構内	知多火力1L、北豊田1L切替 バレット取込、制御試験	制約有	新規	
0479100	中部	2026/04/30 08:00	2026/05/02 18:00	連続	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 1L 構内	275kV東名古屋分岐1LGISガス漏れ修理	制約有	新規	
0470484	中部	2026/04/30 09:00	2026/05/01 17:00	連続	北豊田変	275kV 東浦北豊田 1L 構内	(東浦1L)乙012 FB撤去	制約有	更新	
0479111	中部	2026/04/30 09:30	2026/04/30 10:30	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 1L 構内	知多火力1L、北豊田1L切替 制御試験	制約有	新規	
0479112	中部	2026/04/30 09:30	2026/04/30 10:30	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 1L 構内	知多火力1L、北豊田1L切替 制御試験	制約有	新規	
0471199	中部	2026/05/02 08:00	2026/05/02 08:30	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 1L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471207	中部	2026/05/02 08:00	2026/05/02 08:30	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 1L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471391	中部	2026/05/02 08:00	2026/05/04 18:00	連続	碧南変	275kV 幸田碧南 1L 線路	碧南変 幸田碧南1L機器関係機器電装品取替	制約有	更新	
0472583	中部	2026/05/02 08:00	2026/05/04 18:00	連続	碧南変	275kV 幸田碧南 1L 線路	碧南変 幸田碧南1L LS操作箱かさ歯車修理	制約有	更新	
0471002	中部	2026/05/02 09:00	2026/05/02 09:30	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 1L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471018	中部	2026/05/02 09:00	2026/05/02 09:30	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 1L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471619	中部	2026/05/02 09:00	2026/05/03 17:00	毎日	西名古屋西尾張 1L	275kV 西名古屋西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	更新	
0471183	中部	2026/05/02 17:00	2026/05/02 17:30	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 2L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471193	中部	2026/05/02 17:00	2026/05/02 17:30	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 2L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0470933	中部	2026/05/03 08:00	2026/05/08 17:00	毎日	知多火力東浦 2L	275kV 知多火力東浦 2L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	制約有	更新	
0471173	中部	2026/05/03 08:00	2026/05/03 08:30	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471181	中部	2026/05/03 08:00	2026/05/03 08:30	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 2L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471393	中部	2026/05/03 08:00	2026/05/03 18:00	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 1L 構内	碧南変 幸田碧南1L機器関係機器電装品取替(乙LS)ほか	制約有	更新	
0472585	中部	2026/05/03 08:00	2026/05/03 18:00	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 1L 構内	碧南変 幸田碧南1L LS操作箱かさ歯車修理	制約有	更新	
0473154	中部	2026/05/03 08:00	2026/05/08 17:00	毎日	知多火力東浦 2L	275kV 知多火力東浦 2L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	制約有	更新	
0475886	中部	2026/05/03 08:00	2026/05/08 17:00	毎日	知多火力東浦 2L	275kV 知多火力東浦 2L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	制約有	新規	
0471003	中部	2026/05/04 09:00	2026/05/04 09:30	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 2L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471019	中部	2026/05/04 09:00	2026/05/04 09:30	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 2L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471620	中部	2026/05/04 09:00	2026/05/05 17:00	毎日	西名古屋西尾張 2L	275kV 西名古屋西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	更新	
0478570	中部	2026/05/05 08:00	2026/05/06 18:00	連続	田原変	275kV 田原湖西 1L 線路	CB032電装品取替ほか	制約有	新規	
0470590	中部	2026/05/07 08:00	2026/05/10 17:00	連続	駿遠河変	275kV 駿遠駿河 1L 構内	駿遠1L切替		更新	
0470615	中部	2026/05/07 08:00	2026/05/10 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河No40他鉄塔防錆塗装		更新	
0470964	中部	2026/05/07 10:00	2026/05/08 16:00	毎日	豊根連絡 1L	500kV 豊根連絡 1L 全線	不良がいろいろ検出(メガー測定)No1、30、豊根開トラス 計3基		更新	
0478073	中部	2026/05/07 10:00	2026/05/07 14:00	単日	東米変	500kV 豊根連絡 1L 構内	豊根連絡1L CB欠相表示接点変更		新規	
0471070	中部	2026/05/08 08:00	2026/05/10 17:00	連続	駿遠変	275kV 駿遠駿河 1L 全線	LS・EO42取替		更新	
0470574	中部	2026/05/09 08:00	2026/05/09 17:00	単日	駿河変	275kV 駿遠駿河 1L 線路	東清水FC増設／駿遠駿河1L 幹線遮断装置取込		更新	
0470591	中部	2026/05/09 08:00	2026/05/10 17:00	連続	駿河変	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠1L切替		更新	
0471000	中部	2026/05/09 08:00	2026/05/09 08:30	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 1L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471007	中部	2026/05/09 08:00	2026/05/09 08:30	単日	川越変	275kV 川越火力 1L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471617	中部	2026/05/09 08:00	2026/05/10 17:00	毎日	川越火力 1L	275kV 川越火力 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	更新	
0471047	中部	2026/05/11 08:00	2026/05/11 08:30	単日	東信変	275kV 東信新北信 2L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471055	中部	2026/05/11 08:00	2026/05/11 08:30	単日	新北信変	275kV 東信新北信 2L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0470494	中部	2026/05/11 09:00	2026/05/12 17:00	連続	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 2L 全線	(瀬戸2L)PD取替	制約有	更新	
0470495	中部	2026/05/11 09:00	2026/05/16 17:00	連続	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 2L 線路	北豊田変制御盤取替／瀬戸2L取込	制約有	更新	
0470573	中部	2026/05/11 09:00	2026/05/11 17:00	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 2L 構内	CB028作動油交換、A点検	制約有	更新	
0470887	中部	2026/05/11 09:00	2026/05/13 17:00	毎日	瀬戸北豊田 2L	275kV 瀬戸北豊田 2L 全線	瀬戸北豊田線鉄塔防錆塗装	制約有	更新	
0471124	中部	2026/05/11 09:00	2026/05/11 09:30	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 2L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471130	中部	2026/05/11 09:00	2026/05/11 09:30	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 2L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0470653	中部	2026/05/13 08:00	2026/05/14 17:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	ジャンパ補強線取替	制約有	更新	
0470994	中部	2026/05/13 08:00	2026/05/13 08:30	単日	信濃変	275kV 信濃東信 1L 構内	開閉試験	制約有	変更	
0471044	中部	2026/05/13 08:00	2026/05/13 08:30	単日	東信変	275kV 信濃東信 1L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471583	中部	2026/05/13 08:00	2026/05/13 17:00	単日	北松本変	275kV 北松本分岐 1L 構内	開閉試験(O62)	制約有	更新	
0475837	中部	2026/05/13 08:00	2026/05/13 17:00	単日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	電力線補修	制約有	新規	
0470492	中部	2026/05/13 09:00	2026/05/14 17:00	連続	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 2L 構内	(瀬戸2L)甲018 FB撤去	制約有	更新	
0470592	中部	2026/05/14 08:00	2026/05/17 17:00	連続	駿河変	275kV 駿遠駿河 2L 構内	駿遠2L切替		更新	
0470616	中部	2026/05/14 08:00	2026/05/17 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河No40他鉄塔防錆塗装		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0470654	中部	2026/05/15 08:00	2026/05/16 17:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	ジャンパ補強線取替	制約有	更新	
0470995	中部	2026/05/15 08:00	2026/05/15 08:30	単日	信濃変	275kV 信濃東信 2L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471045	中部	2026/05/15 08:00	2026/05/15 08:30	単日	東信変	275kV 信濃東信 2L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471071	中部	2026/05/15 08:00	2026/05/17 17:00	連続	駿遠変	275kV 駿遠駿河 2L 全線	L・E044取替		更新	
0471584	中部	2026/05/15 08:00	2026/05/15 17:00	単日	北松本変	275kV 北松本分岐 2L 構内	開閉試験(O64)	制約有	更新	
0475838	中部	2026/05/15 08:00	2026/05/15 17:00	単日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	電力線補修他	制約有	新規	
0470490	中部	2026/05/15 09:00	2026/05/16 17:00	連続	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 2L 構内	(瀬戸2L)乙O18 FB撤去	制約有	更新	
0470575	中部	2026/05/16 08:00	2026/05/16 17:00	単日	駿河変	275kV 駿遠駿河 2L 線路	東清水FC増設／駿遠駿河2L 幹線遮断装置取込		更新	
0470593	中部	2026/05/16 08:00	2026/05/17 17:00	連続	駿河変	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠2L切替		更新	
0471001	中部	2026/05/16 08:00	2026/05/16 08:30	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 2L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471008	中部	2026/05/16 08:00	2026/05/16 08:30	単日	川越変	275kV 川越火力 2L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471618	中部	2026/05/16 08:00	2026/05/17 17:00	毎日	川越火力 2L	275kV 川越火力 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	更新	
0470558	中部	2026/05/16 09:00	2026/05/19 17:00	連続	北部変	275kV 北部中濃 2L 全線	044関係機器点検(CB044A点・電装、L・E044箱普・		更新	
0471260	中部	2026/05/16 09:00	2026/05/16 09:30	単日	北部変	275kV 北部中濃 2L 構内	開閉試験		更新	
0471419	中部	2026/05/16 09:00	2026/05/16 09:30	単日	中濃変	275kV 北部中濃 2L 構内	開閉試験		更新	
0470647	中部	2026/05/18 08:00	2026/05/23 17:00	連続	駿遠変	500kV 静岡連絡 1L 線路	駿遠変500・275kV LS操作箱取替(静岡連絡1L)		更新	
0470567	中部	2026/05/18 09:00	2026/05/21 17:00	連続	静岡変	500kV 静岡連絡 1L 線路	CB5022電装品取替、作動油交換、LE5022電装品取替		更新	
0470559	中部	2026/05/21 09:00	2026/05/24 17:00	連続	北部変	275kV 北部中濃 1L 全線	042関係機器点検(CB042A点・電装、L・E042箱普		更新	
0471259	中部	2026/05/21 09:00	2026/05/21 09:30	単日	北部変	275kV 北部中濃 1L 構内	開閉試験		更新	
0471418	中部	2026/05/21 09:00	2026/05/21 09:30	単日	中濃変	275kV 北部中濃 1L 構内	開閉試験		更新	
0471851	中部	2026/05/23 08:00	2026/05/23 08:30	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 1L 構内	開閉試験		変更	
0477563	中部	2026/05/23 08:00	2026/05/23 17:00	単日	湖西三河 1L	275kV 湖西三河 1L 全線	湖西三河線架空地線補修工事	制約有	新規	
0472599	中部	2026/05/23 09:00	2026/05/23 09:30	単日	三河変	275kV 湖西三河 1L 構内	開閉試験	制約有	変更	
0472604	中部	2026/05/23 09:00	2026/05/23 09:30	単日	湖西変	275kV 湖西三河 1L 構内	開閉試験	制約有	変更	
0475835	中部	2026/05/23 09:00	2026/05/23 14:00	単日	湖西三河 1L	275kV 湖西三河 1L 全線	不良がしい補修	制約有	新規	
0470650	中部	2026/05/24 08:00	2026/05/29 17:00	連続	駿遠変	500kV 静岡連絡 2L 線路	駿遠変500・275kV LS操作箱取替(静岡連絡2L)		更新	
0472600	中部	2026/05/24 08:00	2026/05/24 08:30	単日	三河変	275kV 湖西三河 2L 構内	開閉試験	制約有	変更	
0472605	中部	2026/05/24 08:00	2026/05/24 08:30	単日	湖西変	275kV 湖西三河 2L 構内	開閉試験	制約有	変更	
0475836	中部	2026/05/24 08:00	2026/05/24 17:00	単日	湖西三河 2L	275kV 湖西三河 2L 全線	不良がしい他補修	制約有	新規	
0471852	中部	2026/05/25 08:00	2026/05/25 08:30	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 2L 構内	開閉試験		変更	
0470568	中部	2026/05/25 09:00	2026/05/28 17:00	連続	静岡変	500kV 静岡連絡 2L 線路	CB5024電装品取替、作動油交換、LE5024電装品取替		更新	
0470862	中部	2026/05/26 08:00	2026/05/31 17:00	毎日	中濃大山 1L	275kV 中濃大山 1L	【TCB-26-001】電線路細密点検、クランプ抵抗測定、電線点検		変更	
0471416	中部	2026/05/26 08:00	2026/05/26 08:30	単日	中濃変	275kV 中濃大山 1L 構内	開閉試験		更新	
0471425	中部	2026/05/26 08:00	2026/05/26 08:30	単日	犬山変	275kV 中濃大山 1L 構内	開閉試験		更新	
0470724	中部	2026/05/31 09:00	2026/05/31 16:00	単日	東部額田 2L	275kV 東部額田 2L 全線	東部額田線・20 2Lジャンパイン		変更	
0472903	中部	2026/05/31 09:00	2026/05/31 16:00	単日	東部額田 2L	275kV 東部額田 2L 全線	防錆塗装		変更	
0470725	中部	2026/05/31 16:00	2026/05/31 16:10	単日	東部額田 2L	275kV 東部額田 2L 全線	東部額田線・6～・11間電線張替 2L試加圧試験		変更	
0471417	中部	2026/05/31 17:00	2026/05/31 17:30	単日	中濃変	275kV 中濃犬山 2L 構内	開閉試験		更新	
0471426	中部	2026/05/31 17:00	2026/05/31 17:30	単日	犬山変	275kV 中濃犬山 2L 構内	開閉試験		更新	
0471429	中部	2026/06/03 08:00	2026/06/03 08:30	単日	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 1L 構内	開閉試験		更新	
0470694	中部	2026/06/08 08:00	2026/06/10 18:00	連続	額田開	275kV 額田三河 1L 線路	額田三河1L関係機器電装品取替	制約有	更新	
0472592	中部	2026/06/08 08:00	2026/06/08 08:30	単日	額田開	275kV 額田三河 1L 構内	開閉試験	制約有	変更	
0472601	中部	2026/06/08 08:00	2026/06/08 08:30	単日	三河変	275kV 額田三河 1L 構内	開閉試験	制約有	変更	
0470535	中部	2026/06/09 08:00	2026/06/12 18:00	連続	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 2L 線路	CB024電装品取替、LE024電装品取替		更新	
0471430	中部	2026/06/09 08:00	2026/06/09 08:30	単日	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 2L 構内	開閉試験		更新	
0471540	中部	2026/06/09 08:00	2026/06/09 08:30	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 2L 構内	開閉試験		更新	
0471063	中部	2026/06/13 08:00	2026/06/13 08:30	単日	東部変	500kV 新三河幹 1L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471083	中部	2026/06/13 08:00	2026/06/16 18:00	連続	東部変	500kV 新三河幹 1L 全線	500kV新三河幹1L関係機器点検	制約有	変更	
0471114	中部	2026/06/13 08:00	2026/06/13 08:30	単日	新三河変	500kV 新三河幹 1L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0470695	中部	2026/06/15 08:00	2026/06/17 18:00	連続	額田開	275kV 額田三河 2L 線路	額田三河2L関係機器電装品取替	制約有	更新	
0472593	中部	2026/06/15 08:00	2026/06/15 08:30	単日	額田開	275kV 額田三河 2L 構内	開閉試験	制約有	変更	
0472602	中部	2026/06/15 08:00	2026/06/15 08:30	単日	三河変	275kV 額田三河 2L 構内	開閉試験	制約有	変更	
0475831	中部	2026/06/16 15:00	2026/06/16 15:30	単日	松ヶ枝変	275kV 金山松ヶ枝 2L 線路	金山松ヶ枝線2LOFケーブル改修	制約有	新規	
0471144	中部	2026/06/16 15:30	2026/06/16 16:00	単日	金山変	275kV 金山松ヶ枝 2L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471151	中部	2026/06/16 15:30	2026/06/16 16:00	単日	松ヶ枝変	275kV 金山松ヶ枝 2L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471112	中部	2026/06/16 16:00	2026/06/16 16:15	単日	東部変	275kV 東部北豊田 1L 構内	開閉試験		更新	
0471131	中部	2026/06/16 16:00	2026/06/16 16:15	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 1L 構内	開閉試験		更新	
0471113	中部	2026/06/16 16:15	2026/06/16 16:30	単日	東部変	275kV 東部北豊田 2L 構内	開閉試験		更新	
0471132	中部	2026/06/16 16:15	2026/06/16 16:30	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 2L 構内	開閉試験		更新	
0471133	中部	2026/06/16 16:30	2026/06/16 16:45	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471137	中部	2026/06/16 16:30	2026/06/16 16:45	単日	梅森開	275kV 北豊田梅森 1L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471139	中部	2026/06/16 16:30	2026/06/16 16:45	単日	梅森開	275kV 梅森金山 1L 構内	開閉試験		更新	
0471141	中部	2026/06/16 16:30	2026/06/16 16:45	単日	金山変	275kV 梅森金山 1L 構内	開閉試験		更新	
0471134	中部	2026/06/16 16:45	2026/06/16 17:00	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471138	中部	2026/06/16 16:45	2026/06/16 17:00	単日	梅森開	275kV 北豊田梅森 2L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471140	中部	2026/06/16 16:45	2026/06/16 17:00	単日	梅森開	275kV 梅森金山 2L 構内	開閉試験		更新	
0471142	中部	2026/06/16 16:45	2026/06/16 17:00	単日	金山変	275kV 梅森金山 2L 構内	開閉試験		更新	
0471147	中部	2026/06/17 08:00	2026/06/17 08:30	単日	松ヶ枝変	275kV 南武平町松ヶ枝 1L 構内	開閉試験		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0471152	中部	2026/06/17 08:00	2026/06/17 08:30	単日	南武平町変	275kV 下広井南武平町 1L 構内	開閉試験		更新	
0471154	中部	2026/06/17 08:00	2026/06/17 08:30	単日	南武平町変	275kV 南武平町松ケ枝 1L 構内	開閉試験		更新	
0471631	中部	2026/06/17 08:00	2026/06/21 18:00	連続	南武平町変	275kV 下広井南武平町 1L 線路	275kV下広井1Lほか機器点検(CB・L092電装品、L・E072ほか同形)		変更	
0471632	中部	2026/06/17 08:00	2026/06/21 18:00	連続	南武平町変	275kV 南武平町松ケ枝 1L 構内	275kV下広井1Lほか機器点検(CB・L092電装品、L・E072ほか同形)		更新	
0471027	中部	2026/06/17 09:00	2026/06/17 09:30	単日	牛島町変	275kV 牛島町名城 1L 構内	開閉試験		更新	
0471031	中部	2026/06/17 09:00	2026/06/17 09:30	単日	名城変	275kV 牛島町名城 1L 構内	開閉試験		更新	
0470538	中部	2026/06/17 09:30	2026/06/17 16:00	単日	南武平町松ケ枝 1L	275kV 南武平町松ケ枝 1L 全線	特別点検(OFケーブル採油)		更新	
0471028	中部	2026/06/17 09:30	2026/06/17 10:00	単日	牛島町変	275kV 牛島町名城 2L 構内	開閉試験		更新	
0471032	中部	2026/06/17 09:30	2026/06/17 10:00	単日	名城変	275kV 牛島町名城 2L 構内	開閉試験		更新	
0471148	中部	2026/06/21 18:00	2026/06/21 18:30	単日	松ケ枝変	275kV 南武平町松ケ枝 2L 構内	開閉試験		更新	
0471153	中部	2026/06/21 18:00	2026/06/21 18:30	単日	南武平町変	275kV 下広井南武平町 2L 構内	開閉試験		更新	
0471155	中部	2026/06/21 18:00	2026/06/21 18:30	単日	南武平町変	275kV 南武平町松ケ枝 2L 構内	開閉試験		更新	
0471513	中部	2026/06/23 07:30	2026/06/23 08:00	単日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 1L 構内	開閉試験		変更	
0472617	中部	2026/06/23 07:30	2026/06/23 08:00	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 1L 構内	開閉試験		変更	
0479099	中部	2026/06/23 09:00	2026/06/23 13:00	単日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	不良がいし補修他		新規	
0470944	中部	2026/06/24 08:00	2026/06/26 17:00	連続	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	気田笹岡線No66鉄塔撤去に伴う保安停止		更新	
0470967	中部	2026/06/24 08:00	2026/06/25 18:00	連続	下広井変	275kV 下広井南武平町 1L 線路	275kV下広井南武平町1L関係機器点検(CB電装品ほか)		更新	
0471160	中部	2026/06/24 08:00	2026/06/24 08:30	単日	下広井変	275kV 下広井南武平町 1L 構内	開閉試験		更新	
0471514	中部	2026/06/24 08:00	2026/06/24 08:30	単日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 2L 構内	開閉試験		変更	
0472618	中部	2026/06/24 08:00	2026/06/24 08:30	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 2L 構内	開閉試験		変更	
0479098	中部	2026/06/24 08:00	2026/06/26 17:00	連続	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	不良がいし補修、架線金具補修他		新規	
0471161	中部	2026/06/25 18:00	2026/06/25 18:30	単日	下広井変	275kV 下広井南武平町 2L 構内	開閉試験		更新	
0470532	中部	2026/06/27 08:00	2026/06/30 18:00	連続	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 1L 線路	CB022電装品取替、LE022電装品取替		変更	
0471539	中部	2026/06/27 08:00	2026/06/27 08:30	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 1L 構内	開閉試験		変更	
0472634	中部	2026/07/30 09:00	2026/07/31 17:00	連続	南福光変	77kV 7 BANK	南福光連系所BTB廃止／77kV側CTPT回路切離し		変更	
0472635	中部	2026/07/30 09:00	2026/07/31 17:00	連続	南福光変	77kV BUS	南福光連系所BTB廃止／77kV側CTPT回路切離し		変更	
0472636	中部	2026/07/30 09:00	2026/07/31 17:00	連続	南福光変	77kV 1 BTB	南福光連系所BTB廃止／77kV側CTPT回路切離し		変更	
0471365	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	尾鷲変	275kV BUS TIE	開閉試験		更新	
0471397	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	牛島町変	275kV B 連絡母線	開閉試験		更新	
0471455	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	豊根開	500kV 豊根幹 1L 構内	開閉試験		更新	
0471456	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	豊根開	500kV 豊根幹 2L 構内	開閉試験		更新	
0471457	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 1L 構内	開閉試験		更新	
0471458	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 2L 構内	開閉試験		更新	
0471459	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	豊根開	500kV 静岡幹 1L 構内	開閉試験		更新	
0471460	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	豊根開	500kV 静岡幹 2L 構内	開閉試験		更新	
0471477	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	東部変	500kV 東栄幹 1L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471478	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	東部変	500kV 東栄幹 2L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471487	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 1L 構内	開閉試験		更新	
0471488	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 2L 構内	開閉試験		更新	
0471489	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	東栄変	500kV 東栄幹 1L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471490	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	東栄変	500kV 東栄幹 2L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471516	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 2L 構内	開閉試験		更新	
0471525	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	静岡変	500kV 静岡幹 1L 構内	開閉試験		更新	
0471526	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	静岡変	500kV 静岡幹 2L 構内	開閉試験		更新	
0471527	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	静岡変	500kV 静岡連絡 1L 構内	開閉試験		更新	
0471528	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	静岡変	500kV 静岡連絡 2L 構内	開閉試験		更新	
0471531	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	静岡変	275kV 静岡西分岐 1L 構内	開閉試験		更新	
0471532	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	静岡変	275kV 静岡西分岐 2L 構内	開閉試験		更新	
0471533	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	静岡変	275kV 静岡東分岐 1L 構内	開閉試験		更新	
0471534	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	静岡変	275kV 静岡東分岐 2L 構内	開閉試験		更新	
0472609	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	田原変	275kV 田原湖西 1L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0472610	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	田原変	275kV 田原湖西 2L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0472626	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 1L 構内	開閉試験		更新	
0472627	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 2L 構内	開閉試験		更新	
0471029	中部	2026/09/11 07:00	2026/09/11 07:30	単日	名城変	275kV 名城松ケ枝 1L 構内	開閉試験		更新	
0471145	中部	2026/09/11 07:00	2026/09/11 07:30	単日	松ケ枝変	275kV 名城松ケ枝 1L 構内	開閉試験		更新	
0471030	中部	2026/09/11 07:30	2026/09/11 08:00	単日	名城変	275kV 名城松ケ枝 2L 構内	開閉試験		更新	
0471146	中部	2026/09/11 07:30	2026/09/11 08:00	単日	松ケ枝変	275kV 名城松ケ枝 2L 構内	開閉試験		更新	
0471350	中部	2026/09/11 08:00	2026/09/11 08:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 2L 構内	開閉試験		変更	
0471465	中部	2026/09/11 08:00	2026/09/13 18:00	毎日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 2L 線路	伊勢開 伊勢南勢2L関係機器点検		更新	
0471575	中部	2026/09/11 08:00	2026/09/14 16:00	毎日	伊勢南勢 2L	275kV 伊勢南勢 2L 全線	鉄塔防錆塗装工事		更新	
0471576	中部	2026/09/11 08:00	2026/09/12 18:00	毎日	南勢変	275kV 伊勢南勢 2L 線路	伊勢南勢2L関係機器点検		更新	
0470626	中部	2026/09/11 09:00	2026/12/25 15:00	連続	金山松ケ枝 1L	275kV 金山松ケ枝 1L 全線	金山松ケ枝線1LOFケーブル改修	制約有	更新	
0470965	中部	2026/09/11 09:00	2026/12/25 15:00	連続	松ケ枝変	275kV 金山松ケ枝 1L 全線	275kV電力ケーブル(金山松ケ枝線1L)修理に伴うGIS修理	制約有	更新	
0471010	中部	2026/09/11 09:00	2026/12/25 15:00	連続	金山変	275kV 金山松ケ枝 1L 全線	275kV電力ケーブル(金山松ケ枝線1L)修理に伴うGIS修理	制約有	更新	
0471143	中部	2026/09/11 09:00	2026/09/11 09:30	単日	金山変	275kV 金山松ケ枝 1L 構内	開閉試験	制約有	更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0471150	中部	2026/09/11 09:00	2026/09/11 09:30	単日	松ヶ枝変	275kV 金山松ヶ枝 1L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471467	中部	2026/09/13 08:00	2026/09/13 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 2L 構内	伊勢開 伊勢南勢2L関係機器点検(乙LS)		更新	
0470770	中部	2026/09/14 09:00	2026/09/14 17:00	単日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	電名瀬戸線鉄塔防錆塗装		更新	
0471093	中部	2026/09/14 09:00	2026/09/15 16:00	毎日	幸田新三河 1L	275kV 幸田新三河 1L 全線	幸田新三河線No. 27 1・2L不良がいし検出(メガー測定)		変更	
0471117	中部	2026/09/14 09:00	2026/09/14 09:30	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 1L 構内	開閉試験		更新	
0471203	中部	2026/09/14 09:00	2026/09/14 09:30	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 1L 構内	開閉試験		更新	
0475798	中部	2026/09/14 09:00	2026/09/15 16:00	毎日	幸田新三河 2L	275kV 幸田新三河 2L 全線	幸田新三河線No. 27 1・2L不良がいし検出(メガー測定)		新規	
0475799	中部	2026/09/14 09:00	2026/09/14 17:00	単日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	電名瀬戸線1Lがいし補修		新規	
0471573	中部	2026/09/15 08:00	2026/09/18 16:00	毎日	伊勢南勢 1L	275kV 伊勢南勢 1L 全線	鉄塔防錆塗装工事		更新	
0470769	中部	2026/09/15 09:00	2026/09/15 17:00	単日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	電名瀬戸線鉄塔防錆塗装		更新	
0472628	中部	2026/09/15 09:00	2026/09/16 17:00	連続	金山変	275kV 金山松ヶ枝 1L 構内	275kV1B関係機器点検(故障表示器取替ほか)	制約有	更新	
0472629	中部	2026/09/15 09:00	2026/09/16 17:00	連続	金山変	275kV 梅森金山 1L 構内	275kV1B関係機器点検(故障表示器取替ほか)		更新	
0470768	中部	2026/09/16 09:00	2026/09/16 17:00	単日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	電名瀬戸線鉄塔防錆塗装		更新	
0471118	中部	2026/09/16 09:00	2026/09/16 09:30	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 2L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471204	中部	2026/09/16 09:00	2026/09/16 09:30	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 2L 構内	開閉試験		更新	
0471349	中部	2026/09/17 08:00	2026/09/17 08:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 1L 構内	開閉試験		変更	
0471468	中部	2026/09/17 08:00	2026/09/19 18:00	毎日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 1L 線路	伊勢開 伊勢南勢1L関係機器点検		更新	
0471577	中部	2026/09/17 08:00	2026/09/18 18:00	毎日	南勢変	275kV 伊勢南勢 1L 線路	伊勢南勢1L関係機器点検		更新	
0470767	中部	2026/09/17 09:00	2026/09/17 17:00	単日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	電名瀬戸線鉄塔防錆塗装		更新	
0470766	中部	2026/09/18 09:00	2026/09/18 17:00	単日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	電名瀬戸線鉄塔防錆塗装		更新	
0471119	中部	2026/09/18 11:30	2026/09/18 11:45	単日	新三河変	275kV 三河 1L 構内	開閉試験		更新	
0471212	中部	2026/09/18 11:30	2026/09/18 11:45	単日	三河変	275kV 三河 1L 構内	開閉試験		更新	
0471120	中部	2026/09/18 11:45	2026/09/18 12:00	単日	新三河変	275kV 三河 2L 構内	開閉試験		更新	
0471213	中部	2026/09/18 11:45	2026/09/18 12:00	単日	三河変	275kV 三河 2L 構内	開閉試験		更新	
0471197	中部	2026/09/19 08:00	2026/09/19 08:30	単日	額田開	275kV 額田幸田 2L 構内	開閉試験		更新	
0471202	中部	2026/09/19 08:00	2026/09/19 08:30	単日	幸田変	275kV 額田幸田 2L 構内	開閉試験		更新	
0471470	中部	2026/09/19 08:00	2026/09/19 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 1L 構内	伊勢開 伊勢南勢1L関係機器点検(乙LS)		更新	
0471651	中部	2026/09/19 08:00	2026/09/20 18:00	連続	額田幸田 2L	275kV 額田幸田 2L 全線	額田幸田線No29～No30架空地線補修		更新	
0472633	中部	2026/09/19 08:00	2026/09/20 18:00	毎日	額田幸田 1L	275kV 額田幸田 1L 全線	額田幸田線No29～No30架空地線補修に伴う待避設定		更新	
0471196	中部	2026/09/20 18:00	2026/09/20 18:30	単日	額田開	275kV 額田幸田 1L 構内	開閉試験		更新	
0471201	中部	2026/09/20 18:00	2026/09/20 18:30	単日	幸田変	275kV 額田幸田 1L 構内	開閉試験		更新	
0472624	中部	2026/09/21 08:00	2026/09/23 18:00	連続	額田開	275kV 額田幸田 1L 線路	額田幸田1L関係機器電装品取替		更新	
0471574	中部	2026/09/24 08:00	2026/09/25 16:00	毎日	伊勢南勢 2L	275kV 伊勢南勢 2L 全線	鉄塔防錆塗装工事		更新	
0470775	中部	2026/09/24 09:00	2026/09/24 17:00	単日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	電名瀬戸線鉄塔防錆塗装		更新	
0470774	中部	2026/09/25 09:00	2026/09/25 17:00	単日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	電名瀬戸線鉄塔防錆塗装		更新	
0470727	中部	2026/09/26 09:00	2026/09/26 16:00	単日	東部額田 1L	275kV 東部額田 1L 全線	東部額田線・20 1Lジャンパオフ		変更	
0471590	中部	2026/09/26 09:00	2026/09/26 09:30	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB036)		変更	
0470726	中部	2026/09/26 16:00	2026/11/22 09:00	連続	東部額田 1L	275kV 東部額田 1L 区間停止	東部額田線・6～11間電線張替		変更	
0471104	中部	2026/09/27 09:00	2026/09/27 09:30	単日	東部変	275kV 東部額田 1L 構内	開閉試験		変更	
0471194	中部	2026/09/27 09:00	2026/09/27 09:30	単日	額田開	275kV 東部額田 1L 構内	開閉試験		変更	
0470773	中部	2026/09/28 09:00	2026/09/28 17:00	単日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	電名瀬戸線鉄塔防錆塗装		更新	
0470772	中部	2026/09/29 09:00	2026/09/29 17:00	単日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	電名瀬戸線鉄塔防錆塗装		更新	
0470771	中部	2026/09/30 09:00	2026/09/30 17:00	単日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	電名瀬戸線鉄塔防錆塗装		更新	
0470889	中部	2026/10/02 09:00	2026/10/02 17:00	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 2L 線路	LSZ5058断路器普点		更新	
0471554	中部	2026/10/02 09:00	2026/10/02 17:00	単日	浜岡原発	275kV 浜岡駿遠 1L 線路	浜岡駿遠用1L用避雷器点検		変更	
0471299	中部	2026/10/03 09:00	2026/10/05 17:00	連続	三重開	500kV 三重連絡 1L 線路	三重連絡1L切替		変更	
0471356	中部	2026/10/03 09:00	2026/10/03 09:30	単日	中勢変	275kV 中勢亀山 1L 構内	開閉試験		更新	
0471361	中部	2026/10/03 09:00	2026/10/03 09:30	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L 構内	開閉試験		更新	
0471621	中部	2026/10/03 09:00	2026/10/04 17:00	毎日	新鈴鹿分岐 1L	275kV 新鈴鹿分岐 1L 全線	鉄塔防錆塗装		更新	
0471870	中部	2026/10/03 09:00	2026/10/04 17:00	毎日	三重連絡 1L	500kV 三重連絡 1L 全線	鉄塔防錆塗装		変更	
0471872	中部	2026/10/03 09:00	2026/10/03 17:00	単日	三重開	500kV 三重連絡 1L 線路	三重連絡1L機器バレット条件切離		変更	
0471926	中部	2026/10/03 09:00	2026/10/03 09:30	単日	三重開	500kV 三重連絡 1L 構内	開閉試験		変更	
0471937	中部	2026/10/03 09:00	2026/10/03 09:30	単日	西部変	500kV 三重連絡 1L 構内	開閉試験		変更	
0471300	中部	2026/10/07 09:00	2026/10/09 17:00	連続	三重開	500kV 三重連絡 2L 線路	三重連絡2L切替		変更	
0471871	中部	2026/10/07 09:00	2026/10/08 17:00	毎日	三重連絡 2L	500kV 三重連絡 2L 全線	鉄塔防錆塗装		変更	
0471873	中部	2026/10/07 09:00	2026/10/07 17:00	単日	三重開	500kV 三重連絡 2L 線路	三重連絡2L機器バレット条件切離		変更	
0471927	中部	2026/10/07 09:00	2026/10/07 09:30	単日	三重開	500kV 三重連絡 2L 構内	開閉試験		変更	
0471938	中部	2026/10/07 09:00	2026/10/07 09:30	単日	西部変	500kV 三重連絡 2L 構内	開閉試験		変更	
0471555	中部	2026/10/09 09:00	2026/10/09 17:00	単日	浜岡原発	275kV 浜岡駿遠 2L 線路	浜岡駿遠用2L用避雷器点検		変更	
0470720	中部	2026/10/10 08:00	2026/10/13 17:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	鉄塔防錆塗装		更新	
0471210	中部	2026/10/10 08:00	2026/10/10 08:30	単日	三河変	275kV 三河遠江 1L 構内	開閉試験		更新	
0471214	中部	2026/10/10 08:00	2026/10/10 08:30	単日	遠江変	275kV 三河遠江 1L 構内	開閉試験		更新	
0471420	中部	2026/10/10 08:00	2026/10/12 17:00	毎日	中勢亀山 2L	275kV 中勢亀山 2L 全線	バッテリーステーション亀山線新設(保安停止)		更新	
0472556	中部	2026/10/10 08:00	2026/10/13 17:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	鉄塔防錆塗装		更新	
0475839	中部	2026/10/10 08:00	2026/10/13 17:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	ダンパー補修		新規	
0475840	中部	2026/10/10 08:00	2026/10/13 17:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	ダンパー補修		新規	
0471357	中部	2026/10/10 09:00	2026/10/10 09:30	単日	中勢変	275kV 中勢亀山 2L 構内	開閉試験		更新	
0471362	中部	2026/10/10 09:00	2026/10/10 09:30	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 2L 構内	開閉試験		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0471622	中部	2026/10/10 09:00	2026/10/11 17:00	毎日	新鈴鹿分岐 2L	275kV 新鈴鹿分岐 2L 全線	鉄塔防錆塗装		更新	
0471211	中部	2026/10/15 08:00	2026/10/15 08:30	単日	三河変	275kV 三河遠江 2L 構内	開閉試験		更新	
0471215	中部	2026/10/15 08:00	2026/10/15 08:30	単日	遠江変	275kV 三河遠江 2L 構内	開閉試験		更新	
0479102	中部	2026/10/15 08:00	2026/10/18 17:00	連続	西名古屋西尾張 2L	275kV 西名古屋西尾張 2L 全線	No5～No6間OPGW張替	制約有	新規	
0472607	中部	2026/10/21 07:30	2026/10/21 08:00	単日	湖西変	275kV 田原湖西 2L 構内	開閉試験	制約有	変更	
0470552	中部	2026/10/21 08:00	2027/03/19 13:00	連続	田原湖西 1L	275kV 田原湖西 1L 全線	田原湖西線・42～・46間電線張替	制約有	更新	
0472606	中部	2026/10/21 08:00	2026/10/21 08:30	単日	湖西変	275kV 田原湖西 1L 構内	開閉試験	制約有	変更	
0470992	中部	2026/10/24 08:00	2026/10/24 08:30	単日	西部変	275kV 西濃西部 1L 構内	開閉試験		更新	
0471033	中部	2026/10/24 08:00	2026/10/24 08:30	単日	西濃変	275kV 西濃西部 1L 構内	開閉試験		更新	
0470993	中部	2026/10/24 08:30	2026/10/24 09:00	単日	西部変	275kV 西濃西部 2L 構内	開閉試験		更新	
0471034	中部	2026/10/24 08:30	2026/10/24 09:00	単日	西濃変	275kV 西濃西部 2L 構内	開閉試験		更新	
0470618	中部	2026/10/24 09:00	2026/10/24 17:00	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 1L 構内	西部西名古屋線1L BP(A)切替	制約有	更新	
0470985	中部	2026/10/24 09:00	2026/10/24 09:30	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 1L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0470998	中部	2026/10/24 09:00	2026/10/24 09:30	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 1L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0470619	中部	2026/10/25 09:00	2026/10/25 17:00	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 2L 構内	西部西名古屋線2L BP(A)切替	制約有	更新	
0470986	中部	2026/10/25 09:00	2026/10/25 09:30	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 2L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0470999	中部	2026/10/25 09:00	2026/10/25 09:30	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 2L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0470946	中部	2026/10/26 09:00	2026/10/28 17:00	毎日	駿遠幹 2L	500kV 駿遠幹 2L 全線	不良がよい検出(点検)絶縁抵抗測定		更新	
0470974	中部	2026/10/26 09:00	2026/10/27 17:00	毎日	駿遠幹 2L	500kV 駿遠幹 2L 全線	不良がよい検出(メガー)		更新	
0471492	中部	2026/10/26 09:00	2026/10/26 09:30	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 2L 構内	開閉試験		変更	
0471502	中部	2026/10/26 09:00	2026/10/26 09:30	単日	駿遠変	500kV 駿遠幹 2L 構内	開閉試験		変更	
0472577	中部	2026/10/26 09:00	2026/10/26 17:00	単日	駿遠幹 2L	500kV 駿遠幹 2L 全線	架線金具他補修		更新	
0475805	中部	2026/10/26 09:00	2026/10/27 17:00	毎日	駿遠幹 2L	500kV 駿遠幹 2L 全線	不良がよい検出(メガー測定) No105		新規	
0476635	中部	2026/10/26 09:00	2026/10/28 17:00	毎日	駿遠幹 2L	500kV 駿遠幹 2L 全線	不良がよい取り替え		新規	
0470584	中部	2026/11/02 09:00	2026/11/02 10:00	単日	小坂川発	275kV 小坂川分岐線 構内	開閉操作		更新	
0470863	中部	2026/11/03 08:00	2026/11/16 17:00	連続	佐久間西幹里 1L	275kV 佐久間西幹里 1L	【TCB-26-006】電線路細密点検, ボルトナット取替, 部材取替		変更	
0471447	中部	2026/11/03 08:00	2026/11/03 08:30	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 1L 構内	開閉試験		更新	
0471483	中部	2026/11/03 08:00	2026/11/03 08:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹里 1L 構内	開閉試験		更新	
0470620	中部	2026/11/05 09:00	2026/11/05 17:00	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	亀山西名古屋線1L BP(A)切替		更新	
0470899	中部	2026/11/05 09:00	2026/11/08 17:00	連続	静岡変	500kV 静岡連絡1L 線路	静岡連絡1L PCMC取替		変更	
0470919	中部	2026/11/05 09:00	2026/11/08 17:00	連続	駿遠変	500kV 静岡連絡1L 線路	静岡連絡1L PCMC取替		変更	
0471363	中部	2026/11/05 09:00	2026/11/05 09:30	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	開閉試験		更新	
0471375	中部	2026/11/05 09:00	2026/11/05 09:30	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	開閉試験		更新	
0477566	中部	2026/11/05 09:00	2026/11/05 17:00	単日	亀山西名古屋 1L	275kV 亀山西名古屋 1L 全線	架空地線懸垂装置取替		新規	
0470621	中部	2026/11/06 09:00	2026/11/06 17:00	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	亀山西名古屋線2L BP(A)切替		更新	
0471364	中部	2026/11/06 09:00	2026/11/06 09:30	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	開閉試験		更新	
0471376	中部	2026/11/06 09:00	2026/11/06 09:30	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	開閉試験		更新	
0477567	中部	2026/11/06 09:00	2026/11/06 17:00	単日	亀山西名古屋 2L	275kV 亀山西名古屋 2L 全線	架空地線懸垂装置取替		新規	
0475844	中部	2026/11/06 11:00	2026/11/06 15:00	単日	飛騨変換所	500kV AB BUS SECT	CPU基板修理(双極・500kV-A)		新規	
0475845	中部	2026/11/06 15:00	2026/11/06 17:00	単日	飛騨変換所	500kV 飛騨分岐 1L 構内	CPU基板修理(双極・500kV-A)		新規	
0470670	中部	2026/11/07 09:00	2026/11/08 17:00	毎日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	更新	
0470990	中部	2026/11/07 09:00	2026/11/07 09:30	単日	西部変	275kV 西部西尾張 1L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471016	中部	2026/11/07 09:00	2026/11/07 09:30	単日	西尾張変	275kV 西部西尾張 1L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0472900	中部	2026/11/07 09:00	2026/11/08 17:00	毎日	東部額田 1L	275kV 東部額田 1L 全線	防錆塗装		変更	
0475846	中部	2026/11/07 09:00	2026/11/07 11:00	単日	飛騨変換所	500kV 飛騨分岐 2L 構内	CPU基板修理(500kV-B, 共通)		新規	
0477564	中部	2026/11/07 09:00	2026/11/08 17:00	毎日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	架空地線懸垂装置取替	制約有	新規	
0471312	中部	2026/11/08 09:00	2026/11/27 17:00	連続	南福光変	77kV 7 BANK	制御・保護盤取替/7Tr, 77GTr, 77調相関係切替		変更	
0471318	中部	2026/11/08 09:00	2026/12/03 13:00	連続	南福光変	77kV 7 BANK	7Tr二次フッシング修理		変更	
0470843	中部	2026/11/09 08:00	2026/11/13 18:00	連続	電源名古屋変	275kV 佐久間西幹里 1L	【TCA-26-003】O-3細密点検, LS3点検ほか		変更	
0470845	中部	2026/11/10 08:00	2026/11/10 13:00	単日	電源名古屋変	275kV 佐久間西幹里 1L 構内	【TCA-26-004】LS103点検		変更	
0470847	中部	2026/11/10 13:00	2026/11/10 18:00	単日	電源名古屋変	275kV 佐久間西幹里 1L 構内	【TCA-26-005】LS203点検		変更	
0470671	中部	2026/11/14 09:00	2026/11/15 17:00	毎日	西部西尾張 2L	275kV 西部西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	更新	
0470934	中部	2026/11/14 09:00	2026/11/15 17:00	毎日	東部額田 1L	275kV 東部額田 1L 全線	鉄塔改造に伴う鉄塔スケッチ		更新	
0470991	中部	2026/11/14 09:00	2026/11/14 09:30	単日	西部変	275kV 西部西尾張 2L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471017	中部	2026/11/14 09:00	2026/11/14 09:30	単日	西尾張変	275kV 西部西尾張 2L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0472901	中部	2026/11/14 09:00	2026/11/14 16:00	単日	東部額田 1L	275kV 東部額田 1L 全線	防錆塗装		変更	
0477565	中部	2026/11/14 09:00	2026/11/15 17:00	毎日	西部西尾張 2L	275kV 西部西尾張 2L 全線	架空地線懸垂装置取替	制約有	新規	
0470864	中部	2026/11/19 08:00	2026/11/30 17:00	連続	佐久間西幹里 2L	275kV 佐久間西幹里 2L	【TCB-26-007】電線路細密点検, ボルトナット取替, 部材取替ほか		変更	
0471448	中部	2026/11/19 08:00	2026/11/19 08:30	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 2L 構内	開閉試験		更新	
0471484	中部	2026/11/19 08:00	2026/11/19 08:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹里 2L 構内	開閉試験		更新	
0470728	中部	2026/11/22 09:00	2026/11/22 16:00	単日	東部額田 1L	275kV 東部額田 1L 全線	東部額田線・20 1Lジャンパイン		変更	
0472899	中部	2026/11/22 09:00	2026/11/22 16:00	単日	東部額田 1L	275kV 東部額田 1L 全線	防錆塗装		変更	
0470729	中部	2026/11/22 16:00	2026/11/22 16:10	単日	東部額田 1L	275kV 東部額田 1L 全線	東部額田線・6～・11間電線張替 1L試加圧試験		変更	
0471270	中部	2026/11/23 08:00	2026/11/24 16:00	連続	額田三河 1L	275kV 額田三河 1L 全線	架空地線補修	制約有	更新	
0470947	中部	2026/11/30 08:30	2026/11/30 17:00	単日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装		更新	
0471257	中部	2026/11/30 08:30	2026/11/30 09:00	単日	北部変	275kV 北部西濃 1L 構内	開閉試験		更新	
0471407	中部	2026/11/30 08:30	2026/11/30 09:00	単日	西濃変	275kV 北部西濃 1L 構内	開閉試験		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0472558	中部	2026/11/30 09:00	2026/12/01 17:00	連続	額田三河 1L	275kV 額田三河 1L 全線	架空地線補修	制約有	変更	
0472559	中部	2026/11/30 09:00	2026/12/01 17:00	毎日	額田三河 2L	275kV 額田三河 2L 全線	架空地線補修	制約有	変更	
0470948	中部	2026/12/01 08:30	2026/12/01 17:00	単日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装		更新	
0471258	中部	2026/12/01 08:30	2026/12/01 09:00	単日	北部変	275kV 北部西濃 2L 構内	開閉試験		更新	
0471408	中部	2026/12/01 08:30	2026/12/01 09:00	単日	西濃変	275kV 北部西濃 2L 構内	開閉試験		変更	
0470900	中部	2026/12/01 09:00	2026/12/04 17:00	連続	静岡変	500kV 静岡連絡 2L 線路	静岡連絡2L PCM取替		変更	
0470920	中部	2026/12/01 09:00	2026/12/04 17:00	連続	駿遠変	500kV 静岡連絡 2L 線路	静岡連絡2L PCM取替		変更	
0471627	中部	2026/12/01 09:00	2026/12/01 17:00	単日	瀬戸北豊田 1L	275kV 瀬戸北豊田 1L 全線	ダンバー取替	制約有	更新	
0471628	中部	2026/12/02 09:00	2026/12/02 17:00	単日	瀬戸北豊田 2L	275kV 瀬戸北豊田 2L 全線	ダンバー取替	制約有	更新	
0470645	中部	2026/12/03 09:00	2026/12/05 17:00	連続	愛知瀬戸 1L	275kV 愛知瀬戸 1L 全線	愛知瀬戸線No13～No15間OPGW張替		更新	
0472554	中部	2026/12/03 09:00	2026/12/05 17:00	連続	愛知瀬戸 2L	275kV 愛知瀬戸 2L 全線	愛知瀬戸線No13～No15間OPGW張替		更新	
0470928	中部	2026/12/05 09:00	2026/12/13 17:00	連続	駿遠幹 1L	500kV 駿遠幹 1L 全線	気田笹岡線新No37組立工事に伴う保安停止		更新	
0471491	中部	2026/12/05 09:00	2026/12/05 09:30	単日	東米変	500kV 駿遠幹 1L 構内	開閉試験		変更	
0471501	中部	2026/12/05 09:00	2026/12/05 09:30	単日	駿遠変	500kV 駿遠幹 1L 構内	開閉試験		変更	
0476634	中部	2026/12/05 09:00	2026/12/11 17:00	毎日	駿遠幹 1L	500kV 駿遠幹 1L 全線	不良がしい取り替え		新規	
0470646	中部	2026/12/07 09:00	2026/12/09 17:00	連続	愛知瀬戸 1L	275kV 愛知瀬戸 1L 全線	愛知瀬戸線No13～No15間OPGW張替		更新	
0470945	中部	2026/12/07 09:00	2026/12/09 17:00	毎日	駿遠幹 1L	500kV 駿遠幹 1L 全線	不良がしい検出(点検)絶縁抵抗測定		更新	
0470973	中部	2026/12/07 09:00	2026/12/08 17:00	毎日	駿遠幹 1L	500kV 駿遠幹 1L 全線	不良がしい検出(メガー)		更新	
0472555	中部	2026/12/07 09:00	2026/12/09 17:00	連続	愛知瀬戸 2L	275kV 愛知瀬戸 2L 全線	愛知瀬戸線No13～No15間OPGW張替		更新	
0472576	中部	2026/12/07 09:00	2026/12/09 17:00	連続	駿遠幹 1L	500kV 駿遠幹 1L 全線	航空障害標識補修		更新	
0475804	中部	2026/12/07 09:00	2026/12/08 17:00	毎日	駿遠幹 1L	500kV 駿遠幹 1L 全線	不良がしい検出(メガー測定) No105		新規	
0475816	中部	2026/12/07 09:00	2026/12/09 17:00	毎日	駿遠幹 2L	500kV 駿遠幹 2L 全線	航空障害標識補修に伴う待避設定		新規	
0470569	中部	2026/12/14 09:00	2026/12/18 17:00	連続	駿遠変	500kV 静岡連絡 1L 線路	CB5056遮断器点検A、電装品取替、LE電装品取替		更新	
0470570	中部	2026/12/21 09:00	2026/12/25 17:00	連続	駿遠変	500kV 静岡連絡 2L 線路	CB5058遮断器点検A、電装品取替、LE電装品取替		更新	
0471304	中部	2026/12/21 09:00	2026/12/21 17:00	単日	三重開	500kV 三重連絡 1L 構内	BP仮工事戻し		変更	
0471305	中部	2026/12/22 09:00	2026/12/22 17:00	単日	三重開	500kV 三重連絡 2L 構内	BP仮工事戻し		変更	
0475833	中部	2026/12/25 15:00	2026/12/25 15:30	単日	松ヶ枝変	275kV 金山松ヶ枝 1L 線路	金山松ヶ枝線1LOFケーブル改修	制約有	新規	
0470594	中部	2026/12/26 08:00	2026/12/29 17:00	連続	駿河変	275kV 駿河東清水 1L 全線	東清水1L切替		更新	
0471014	中部	2026/12/26 08:00	2026/12/26 08:30	単日	西尾張変	275kV 西尾張海部 1L 構内	開閉試験		更新	
0471023	中部	2026/12/26 08:00	2026/12/26 08:30	単日	海部開	275kV 西尾張海部 1L 構内	開閉試験		更新	
0471015	中部	2026/12/26 08:30	2026/12/26 09:00	単日	西尾張変	275kV 西尾張海部 2L 構内	開閉試験		更新	
0471024	中部	2026/12/26 08:30	2026/12/26 09:00	単日	海部開	275kV 西尾張海部 2L 構内	開閉試験		更新	
0470956	中部	2026/12/26 09:00	2026/12/26 17:00	単日	海部開	275kV 海部牛島町 1L 構内	機器点検 海部開 海部牛島町1L GCB作動油交換		更新	
0471021	中部	2026/12/26 09:00	2026/12/26 09:30	単日	海部開	275kV 海部牛島町 1L 構内	開閉試験		更新	
0471025	中部	2026/12/26 09:00	2026/12/26 09:30	単日	牛島町変	275kV 海部牛島町 1L 構内	開閉試験		更新	
0471588	中部	2026/12/26 09:00	2026/12/28 17:00	連続	三好変	275kV 三好分岐 1L 構内	三好分岐1L DAC他取込	制約有	更新	
0471593	中部	2026/12/26 09:00	2026/12/26 09:30	単日	三好変	275kV 三好分岐 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB052)	制約有	更新	
0470576	中部	2026/12/27 08:00	2026/12/27 17:00	単日	駿河変	275kV 駿河東清水 1L 線路	東清水FC増設/駿河東清水1L 幹線遮断装置取込		更新	
0470579	中部	2026/12/27 08:00	2026/12/27 17:00	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 1L 線路	東清水FC増設/駿河東清水1L 幹線遮断装置取込		更新	
0470957	中部	2026/12/27 09:00	2026/12/27 17:00	単日	海部開	275kV 海部牛島町 2L 構内	機器点検 海部開 海部牛島町2L GCB作動油交換		更新	
0471022	中部	2026/12/27 09:00	2026/12/27 09:30	単日	海部開	275kV 海部牛島町 2L 構内	開閉試験		更新	
0471026	中部	2026/12/27 09:00	2026/12/27 09:30	単日	牛島町変	275kV 海部牛島町 2L 構内	開閉試験		更新	
0471108	中部	2026/12/27 09:00	2026/12/27 09:30	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 1L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471187	中部	2026/12/27 09:00	2026/12/27 09:30	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 1L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471596	中部	2026/12/27 09:00	2026/12/27 18:00	単日	三好変	275kV 三好分岐 1L 線路	三好分岐1L DAC他取込(線路)	制約有	更新	
0471170	中部	2026/12/27 10:00	2026/12/27 10:30	単日	知多火力変	275kV 知多火力 1L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471185	中部	2026/12/27 10:00	2026/12/27 10:30	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 1L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471171	中部	2026/12/27 10:30	2026/12/27 11:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 2L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471186	中部	2026/12/27 10:30	2026/12/27 11:00	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 2L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471167	中部	2026/12/27 11:00	2026/12/27 11:30	単日	知多火力変	275kV A BUS TIE	開閉試験		更新	
0470702	中部	2026/12/29 08:00	2027/01/02 18:00	連続	碧南変	275kV 幸田碧南 2L 線路	幸田碧南2L関係機器点検	制約有	変更	
0470703	中部	2026/12/29 08:00	2026/12/29 18:00	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 2L 構内	乙018電装品取替・自動BOX普点ほか	制約有	更新	
0471200	中部	2026/12/29 08:00	2026/12/29 08:30	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 2L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471208	中部	2026/12/29 08:00	2026/12/29 08:30	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 2L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0470719	中部	2026/12/29 09:00	2026/12/29 15:00	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 2L 構内	GCB028カウンタ取替	制約有	更新	
0470539	中部	2026/12/29 09:30	2026/12/29 16:00	単日	南武平町松ヶ枝 2L	275kV 南武平町松ヶ枝 2L 全線	特別点検(OFケーブル採油)		更新	
0470707	中部	2026/12/30 08:00	2026/12/30 18:00	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 2L 構内	甲018電装品取替・自動BOX普点ほか	制約有	更新	
0471158	中部	2026/12/30 08:00	2026/12/30 08:30	単日	下広井変	275kV 東海下広井 1L 構内	開閉試験		更新	
0470935	中部	2026/12/30 09:00	2026/12/30 18:00	単日	東海下広井 1L	275kV 東海下広井 1L 線路	CH絶縁油分析		更新	
0471164	中部	2026/12/30 09:00	2026/12/30 09:30	単日	東海変	275kV 東海下広井 1L 構内	開閉試験		更新	
0470595	中部	2026/12/31 08:00	2027/01/03 17:00	連続	駿河変	275kV 駿河東清水 2L 全線	東清水2L切替		更新	
0471264	中部	2026/12/31 08:00	2026/12/31 18:00	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 2L 構内	GCB連結ロット同形対策		更新	
0470936	中部	2026/12/31 09:00	2026/12/31 18:00	単日	東海下広井 2L	275kV 東海下広井 2L 線路	CH絶縁油分析		更新	
0471159	中部	2026/12/31 09:00	2026/12/31 09:30	単日	下広井変	275kV 東海下広井 2L 構内	開閉試験		更新	
0471165	中部	2026/12/31 09:00	2026/12/31 09:30	単日	東海変	275kV 東海下広井 2L 構内	開閉試験		更新	
0470577	中部	2027/01/01 08:00	2027/01/01 17:00	単日	駿河変	275kV 駿河東清水 2L 線路	東清水FC増設/駿河東清水2L 幹線遮断装置取込		更新	
0470578	中部	2027/01/01 08:00	2027/01/01 17:00	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 2L 線路	東清水FC増設/駿河東清水2L 幹線遮断装置取込		更新	
0471589	中部	2027/01/03 09:00	2027/01/05 17:00	連続	三好変	275kV 三好分岐 2L 構内	三好分岐2L DAC他取込	制約有	更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0471594	中部	2027/01/03 09:00	2027/01/03 09:30	単日	三好変	275kV 三好分岐 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB054)	制約有	更新	
0471109	中部	2027/01/04 09:00	2027/01/04 09:30	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 2L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471188	中部	2027/01/04 09:00	2027/01/04 09:30	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 2L 構内	開閉試験	制約有	更新	
0471597	中部	2027/01/04 09:00	2027/01/04 18:00	単日	三好変	275kV 三好分岐 2L 線路	三好分岐2L DAC他取込(線路)	制約有	更新	
0471517	中部	2027/01/05 09:00	2027/01/05 09:30	単日	駿遠変	275kV 浜岡駿遠 1L 構内	開閉試験		変更	
0475860	中部	2027/01/05 09:00	2027/01/08 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠線No7部材取替		新規	
0475861	中部	2027/01/12 09:00	2027/01/22 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠線No7部材取替		新規	
0470689	中部	2027/01/13 09:00	2027/01/13 17:00	単日	知多第二火発	275kV 知多第二東海 1L 線路	機器点検/275kV知多第二火力東海1L関係		変更	
0471552	中部	2027/01/13 09:00	2027/01/22 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠No8他鉄塔防錆塗装		更新	
0471571	中部	2027/01/13 09:00	2027/01/22 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠線No48他がいし取替		更新	
0472572	中部	2027/01/13 09:00	2027/01/13 09:30	単日	東海変	275kV 知多第二東海 1L 構内	開閉試験		変更	
0472574	中部	2027/01/13 09:00	2027/01/13 09:30	単日	知多第二火発	275kV 知多第二東海 1L 構内	開閉試験		変更	
0470690	中部	2027/01/14 09:00	2027/01/14 17:00	単日	知多第二火発	275kV 知多第二東海 2L 線路	機器点検/275kV知多第二火力東海2L関係		変更	
0472573	中部	2027/01/14 09:00	2027/01/14 09:30	単日	東海変	275kV 知多第二東海 2L 構内	開閉試験		変更	
0472575	中部	2027/01/14 09:00	2027/01/14 09:30	単日	知多第二火発	275kV 知多第二東海 2L 構内	開閉試験		変更	
0471560	中部	2027/01/18 09:00	2027/02/01 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡新佐倉 1L 線路	浜岡新佐倉1L遮断器接地装置、母線接地装置、線路接地装置点検		変更	
0471561	中部	2027/01/25 09:00	2027/01/27 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡新佐倉 1L 構内	浜岡新佐倉1L断路器甲052点検		更新	
0471518	中部	2027/01/26 09:00	2027/01/26 09:30	単日	駿遠変	275kV 浜岡駿遠 2L 構内	開閉試験		変更	
0471553	中部	2027/01/26 09:00	2027/02/04 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠No8他鉄塔防錆塗装		更新	
0471572	中部	2027/01/26 09:00	2027/02/04 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠線No48他がいし取替		更新	
0475859	中部	2027/01/26 09:00	2027/02/17 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠線No7部材取替		新規	
0471563	中部	2027/01/28 09:00	2027/02/01 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡新佐倉 1L 構内	浜岡新佐倉1L断路器乙052点検		変更	
0471545	中部	2027/02/01 09:00	2027/02/03 17:00	連続	電発佐久間発	275kV 佐久間川根 2L 全線	GIS化工事に伴う母線側断路器切離し		更新	
0471546	中部	2027/02/01 09:00	2027/02/03 17:00	連続	電発佐久間発	275kV 佐久間川根 1L 構内	GIS化工事に伴う母線側断路器切離し		更新	
0471547	中部	2027/02/01 09:00	2027/02/03 17:00	連続	電発佐久間発	275kV 佐久間川根 2L 構内	GIS化工事に伴う母線側断路器切離し		更新	
0471914	中部	2027/02/01 09:00	2027/02/02 17:00	毎日	電発佐久間発	275kV 佐久間川根 1L 構内	【TNA-26-091】佐久間川根1・2LGIS化工事に伴う母線側断路器切離		変更	
0471915	中部	2027/02/01 09:00	2027/02/02 17:00	毎日	電発佐久間発	275kV 佐久間川根 2L 構内	【TNA-26-091】佐久間川根1・2LGIS化工事に伴う母線側断路器切離		変更	
0475851	中部	2027/02/01 09:00	2027/09/21 09:00	連続	電発佐久間発	275kV 佐久間川根 2L 線路	【TNA-26-093】275kV佐久間川根2L GIS化工事		新規	
0475852	中部	2027/02/01 09:00	2027/09/27 09:00	連続	電発佐久間発	275kV 佐久間川根 1L 線路	【TNA-26-089】275kV佐久間川根1L GIS化工事		新規	
0471565	中部	2027/02/02 09:00	2027/02/16 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡新佐倉 2L 線路	浜岡新佐倉2L遮断器接地装置、母線接地装置、線路接地装置点検		変更	
0470787	中部	2027/02/04 09:00	2027/02/08 17:00	連続	東清水変	275kV 駿河東清水 1L 構内	60Hz 275kV甲主母線接続		更新	
0471265	中部	2027/02/05 08:00	2027/02/05 18:00	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 1L 構内	GCB連結ロット同形対策		更新	
0471566	中部	2027/02/08 09:00	2027/02/10 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡新佐倉 2L 全線	浜岡新佐倉2L断路器甲054点検		更新	
0471568	中部	2027/02/11 09:00	2027/02/13 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡新佐倉 2L 全線	浜岡新佐倉2L断路器乙054点検		更新	
0470789	中部	2027/02/15 09:00	2027/02/19 17:00	連続	東清水変	275kV 駿河東清水 1L 構内	60Hz 275kV乙主母線接続		更新	
0471333	中部	2027/02/19 18:00	2027/02/20 17:00	連続	東清水変	275kV BUS TIE	GIS課電試験(60Hz 275kV乙母線、1、3FC)		更新	
0470540	中部	2027/02/28 09:30	2027/02/28 16:00	単日	梅森金山 1L	275kV 梅森金山 1L 全線	特別点検(OFケーブル採油)		更新	
0471635	中部	2027/03/01 08:00	2027/03/01 16:00	単日	北豊田梅森 2L	275kV 北豊田梅森 2L 全線	北豊田梅森線鉄塔防錆塗装	制約有	更新	
0470627	中部	2027/03/01 09:00	2027/06/15 15:00	連続	梅森金山 2L	275kV 梅森金山 2L 全線	梅森金山線2L OFケーブル改修		更新	
0470888	中部	2027/03/01 09:00	2027/06/15 15:00	連続	梅森開	275kV 梅森金山 2L 線路	梅森金山2L OFケーブル改修に伴う梅森開側GIS分解組立		更新	
0471012	中部	2027/03/01 09:00	2027/06/15 15:00	連続	金山変	275kV 梅森金山 2L 全線	275kV電力ケーブル(梅森金山線2L)修理に伴うGIS修理		更新	
0471441	中部	2027/03/01 09:00	2027/03/01 09:30	単日	愛知変	500kV 豊根幹 1L 構内	開閉試験		変更	
0471442	中部	2027/03/01 09:00	2027/03/01 09:30	単日	愛知変	500kV 豊根幹 2L 構内	開閉試験		変更	
0470966	中部	2027/03/04 10:00	2027/03/05 16:00	毎日	豊根連絡 2L	500kV 豊根連絡 2L 全線	不良がいし検出(メガー測定)No1、30、豊根開トラス、計3基		更新	
0470604	中部	2027/03/06 08:00	2027/03/09 18:00	連続	金山変	275kV 梅森金山 2L 線路	275kV梅森2L関係機器点検(LE電装品、CB電装品・点検Aほか)		更新	
0471645	中部	2027/03/08 08:00	2027/03/08 16:00	単日	北豊田梅森 2L	275kV 北豊田梅森 2L 全線	北豊田梅森線鉄塔防錆塗装	制約有	更新	
0475862	中部	2027/03/10 09:00	2027/03/14 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠線No7部材取替		変更	
0471499	中部	2027/03/11 09:00	2027/03/11 09:30	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 1L 構内	開閉試験		変更	
0471500	中部	2027/03/11 09:00	2027/03/11 09:30	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 2L 構内	開閉試験		変更	
0470743	中部	2027/03/13 10:00	2027/03/13 11:00	単日	静岡変	275kV 3 BANK	試加圧試験(3B一次ZLS)		更新	
0470731	中部	2027/03/13 11:00	2027/03/13 16:00	単日	静岡変	275kV 3 BANK	試加圧試験(3B、3B三次)		更新	
0470746	中部	2027/03/13 13:00	2027/03/13 15:00	単日	静岡変	275kV 3 BANK	実負荷試験(3B、3B三次)		更新	
0470714	中部	2027/03/13 15:00	2027/03/13 17:00	単日	静岡変	275kV 3 BANK	仮リレ切離し(500Bブスタイ、275ブス・ブスタイ)		更新	
0470736	中部	2027/03/13 16:00	2027/03/14 13:00	連続	静岡変	500kV 甲B BUS	課電試験(3B、3B三次)		更新	
0470737	中部	2027/03/13 16:00	2027/03/14 13:00	連続	静岡変	275kV 3 BANK	課電試験(3B、3B三次)		更新	
0470740	中部	2027/03/16 09:00	2027/04/07 15:00	連続	静岡変	275kV 3 BANK	所内切替(3B三次)		更新	
0471515	中部	2027/03/17 09:00	2027/03/17 09:30	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 1L 構内	開閉試験		変更	
0472620	中部	2027/03/17 09:00	2027/03/17 09:30	単日	駿河変	275kV 駿遠駿河 1L 構内	開閉試験		変更	
0472621	中部	2027/03/17 09:00	2027/03/17 09:30	単日	駿河変	275kV 駿遠駿河 2L 構内	開閉試験		変更	
0472622	中部	2027/03/17 09:00	2027/03/17 09:30	単日	駿河変	275kV 駿河東清水 1L 構内	開閉試験		変更	
0472623	中部	2027/03/17 09:00	2027/03/17 09:30	単日	駿河変	275kV 駿河東清水 2L 構内	開閉試験		変更	
0471081	中部	2027/03/18 08:00	2027/03/21 17:00	毎日	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L 全線	懸垂クランプ取替(電線・地線)、地線ダンパ補修	制約有	変更	
0470553	中部	2027/03/19 13:00	2027/03/19 13:10	単日	田原湖西 1L	275kV 田原湖西 1L 全線	田原湖西線・42～46間1L試加圧	制約有	更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0470870	中部	2027/03/23 09:00	2027/03/24 17:00	毎日	亀山西名古屋 1L	275kV 亀山西名古屋 1L 全線	鉄塔防錆塗装		更新	
0477568	中部	2027/03/23 09:00	2027/03/24 17:00	毎日	亀山西名古屋 1L	275kV 亀山西名古屋 1L 全線	架空地線懸垂装置取替		新規	
0475853	中部	2027/03/24 09:00	2027/03/24 17:00	毎日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	旧BPP切離し		新規	
0475854	中部	2027/03/24 17:00	2027/03/24 20:00	毎日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	旧BPP切離し		新規	
0471082	中部	2027/03/25 08:00	2027/03/28 17:00	毎日	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	懸垂クランプ取替(電線・地線)、地線ダンパ補修、J線補修	制約有	変更	
0470873	中部	2027/03/25 09:00	2027/03/26 17:00	毎日	亀山西名古屋 2L	275kV 亀山西名古屋 2L 全線	鉄塔防錆塗装		更新	
0477569	中部	2027/03/25 09:00	2027/03/26 17:00	毎日	亀山西名古屋 2L	275kV 亀山西名古屋 2L 全線	架空地線懸垂装置取替		新規	
0470871	中部	2027/03/29 09:00	2027/03/29 17:00	毎日	亀山西名古屋 1L	275kV 亀山西名古屋 1L 全線	鉄塔防錆塗装		更新	
0477570	中部	2027/03/29 09:00	2027/03/29 17:00	毎日	亀山西名古屋 1L	275kV 亀山西名古屋 1L 全線	架空地線懸垂装置取替		新規	
0470872	中部	2027/03/30 09:00	2027/03/30 17:00	毎日	亀山西名古屋 2L	275kV 亀山西名古屋 2L 全線	鉄塔防錆塗装		更新	
0477571	中部	2027/03/30 09:00	2027/03/30 17:00	毎日	亀山西名古屋 2L	275kV 亀山西名古屋 2L 全線	架空地線懸垂装置取替		新規	
0476061	中部	2027/04/01 09:00	2027/07/30 17:00	連続	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No49～No54間電線張替 1. 2L本体工事		新規	
0476062	中部	2027/04/01 09:00	2027/07/30 17:00	連続	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線No49～No54間電線張替 1. 2L本体工事		新規	
0476391	中部	2027/04/01 09:00	2027/04/04 17:00	毎日	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	制約有	新規	
0476392	中部	2027/04/01 09:00	2027/04/04 17:00	毎日	知多火力東浦 2L	275kV 知多火力東浦 2L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	制約有	新規	
0476441	中部	2027/04/01 09:00	2027/04/01 17:00	毎日	東栄変	500kV 東栄幹 1L 線路	屋外鉄構現場スケッチ(B13)	制約有	新規	
0479666	中部	2027/04/02 08:30	2027/04/02 09:00	毎日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479719	中部	2027/04/02 08:30	2027/04/02 09:00	毎日	東浦開	275kV 東浦北豊田 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479725	中部	2027/04/02 08:30	2027/04/02 09:00	毎日	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0476443	中部	2027/04/02 09:00	2027/04/02 17:00	毎日	東栄変	500kV 東栄幹 2L 線路	屋外鉄構現場スケッチ(23)	制約有	新規	
0476460	中部	2027/04/02 09:00	2027/04/02 17:00	毎日	東栄幹 2L	500kV 東栄幹 2L 全線	東栄幹線2L架線金具補修	制約有	新規	
0479665	中部	2027/04/02 09:00	2027/04/02 09:30	毎日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479718	中部	2027/04/02 09:00	2027/04/02 09:30	毎日	東浦開	275kV 東浦北豊田 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479724	中部	2027/04/02 09:00	2027/04/02 09:30	毎日	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479840	中部	2027/04/02 09:00	2027/04/02 17:00	毎日	東浦北豊田 1L	275kV 東浦北豊田 1L 全線	がいし取替	制約有	新規	
0476135	中部	2027/04/03 09:00	2027/04/03 14:00	毎日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 1L 構内	275kV PT、旧BPP切離し	制約有	新規	
0476366	中部	2027/04/03 09:00	2027/04/03 09:30	毎日	西部変	275kV 西部西名古屋 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0476472	中部	2027/04/03 09:00	2027/04/03 09:30	毎日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0476137	中部	2027/04/03 14:00	2027/04/03 18:00	毎日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 2L 構内	275kV PT、旧BPP切離し	制約有	新規	
0476367	中部	2027/04/03 14:00	2027/04/03 14:30	毎日	西部変	275kV 西部西名古屋 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0476473	中部	2027/04/03 14:00	2027/04/03 14:30	毎日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0476197	中部	2027/04/05 08:00	2027/06/30 13:00	連続	川越火力 2L	275kV 川越火力 2L 全線	川越火力線No25～No28建替・電線張替	制約有	新規	
0476475	中部	2027/04/05 08:00	2027/04/05 08:30	毎日	西名古屋変	275kV 川越火力 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0476490	中部	2027/04/05 08:00	2027/04/05 08:30	毎日	川越変	275kV 川越火力 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0476297	中部	2027/04/05 09:00	2027/04/12 17:00	連続	知多火力変	275kV 甲A BUS	(8G)ユニット 甲ブス接続		新規	
0479705	中部	2027/04/05 09:00	2027/04/05 09:30	毎日	知多火力変	275kV A BUS TIE	開閉試験		新規	
0476324	中部	2027/04/06 08:00	2027/04/07 17:00	毎日	犬山電名 1L	275kV 犬山電名 1L 全線	【KCB-27-001】活線碍子点検		新規	
0476159	中部	2027/04/06 09:00	2027/04/07 17:00	毎日	鈴鹿幹 1L	275kV 鈴鹿幹 1L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0476453	中部	2027/04/06 09:00	2027/04/07 17:00	毎日	鈴鹿幹 1L	275kV 鈴鹿幹 1L 全線	架線金具補修工事		新規	
0476325	中部	2027/04/08 08:00	2027/04/09 17:00	毎日	犬山電名 2L	275kV 犬山電名 2L 全線	【KCB-27-002】活線碍子点検		新規	
0476405	中部	2027/04/08 09:00	2027/04/09 17:00	毎日	鈴鹿幹 2L	275kV 鈴鹿幹 2L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0476454	中部	2027/04/08 09:00	2027/04/08 17:00	毎日	鈴鹿幹 2L	275kV 鈴鹿幹 2L 全線	架線金具補修工事		新規	
0476442	中部	2027/04/12 09:00	2027/04/12 17:00	毎日	東栄変	500kV 駿遠幹 1L 線路	屋外鉄構現場スケッチ(B7)	制約有	新規	
0476299	中部	2027/04/12 17:00	2027/04/12 17:10	毎日	知多火力変	275kV 甲A BUS	(8G)ユニット 試加圧試験		新規	
0476300	中部	2027/04/12 17:00	2027/04/12 17:10	毎日	知多火力変	275kV A BUS TIE	(8G)ユニット 試加圧試験		新規	
0476141	中部	2027/04/13 08:00	2027/04/15 17:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	ジャンパ補強線取替	制約有	新規	
0476326	中部	2027/04/13 08:00	2027/04/14 17:00	毎日	佐久間西幹里 1L	275kV 佐久間西幹里 1L 全線	【KCB-27-003】活線碍子点検		新規	
0476374	中部	2027/04/13 08:00	2027/04/13 08:30	毎日	信濃変	275kV 信濃東信 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0476544	中部	2027/04/13 08:00	2027/04/13 17:00	毎日	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L 全線	がいし取替	制約有	新規	
0479607	中部	2027/04/13 08:00	2027/04/13 17:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	ルーズスペーサ点検	制約有	新規	
0479716	中部	2027/04/13 08:00	2027/04/13 08:30	毎日	東浦開	275kV 知多火力東浦 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0476440	中部	2027/04/13 09:00	2027/04/13 17:00	毎日	東栄変	500kV 駿遠幹 2L 線路	屋外鉄構現場スケッチ(B3)		新規	
0479710	中部	2027/04/13 09:00	2027/04/13 09:30	毎日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479824	中部	2027/04/13 09:00	2027/04/14 17:00	毎日	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	制約有	新規	
0476327	中部	2027/04/15 08:00	2027/04/16 17:00	毎日	佐久間西幹里 2L	275kV 佐久間西幹里 2L 全線	【KCB-27-004】活線碍子点検		新規	
0479717	中部	2027/04/15 08:00	2027/04/15 08:30	毎日	東浦開	275kV 知多火力東浦 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479839	中部	2027/04/15 08:00	2027/04/15 17:00	毎日	知多火力東浦 2L	275kV 知多火力東浦 2L 全線	がいし取替	制約有	新規	
0479711	中部	2027/04/15 09:00	2027/04/15 09:30	毎日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479825	中部	2027/04/15 09:00	2027/04/16 17:00	毎日	知多火力東浦 2L	275kV 知多火力東浦 2L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	制約有	新規	
0476358	中部	2027/04/16 08:00	2027/04/21 18:00	連続	豊根開	500kV 豊根連絡 1L 線路	甲5062・LE5062電装品取替		新規	
0476359	中部	2027/04/17 08:00	2027/04/17 18:00	毎日	豊根開	500kV 豊根連絡 1L 線路	乙5062電装品取替		新規	
0476301	中部	2027/04/19 09:00	2027/04/27 17:00	連続	知多火力変	275kV 乙A BUS	(8G)ユニット 乙ブス接続		新規	
0479777	中部	2027/04/19 10:00	2027/04/19 10:30	毎日	佐久変	275kV 佐久幹 1L 構内	開閉試験(佐久幹・ブスタイ)		新規	
0479778	中部	2027/04/19 10:00	2027/04/19 10:30	毎日	佐久変	275kV 佐久幹 2L 構内	開閉試験(佐久幹・ブスタイ)		新規	
0476103	中部	2027/04/23 08:00	2027/04/25 18:00	連続	中濃変	275kV 北部中濃 2L 全線	058関係機器点検(GCB・GCS・ES・LS電装品取替、波形、GCB作動油交換)		新規	
0476129	中部	2027/04/24 08:00	2027/04/28 18:00	連続	豊根開	500kV 豊根連絡 2L 線路	甲・L・E5064電装品取替、CB5064電装品取替		新規	
0476130	中部	2027/04/25 08:00	2027/04/25 18:00	毎日	豊根開	500kV 豊根連絡 2L 線路	乙5064電装品取替		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0476303	中部	2027/04/27 17:00	2027/04/27 17:10	単日	知多火力変	275kV Z A BUS	(8G)ユニット 試加圧試験		新規	
0476304	中部	2027/04/27 17:00	2027/04/27 17:10	単日	知多火力変	275kV A BUS TIE	(8G)ユニット 試加圧試験		新規	
0479729	中部	2027/05/01 07:30	2027/05/01 08:00	単日	額田開	275kV 額田幸田 2L 構内	開閉試験		新規	
0476209	中部	2027/05/01 08:00	2027/05/03 18:00	連続	幸田変	275kV 額田幸田 2L 線路	幸田変 額田幸田2L関係機器点検		新規	
0476211	中部	2027/05/01 08:00	2027/05/01 18:00	単日	幸田変	275kV 額田幸田 2L 線路	幸田変 額田幸田2L関係機器点検(甲ブス)		新規	
0479728	中部	2027/05/01 08:00	2027/05/01 08:30	単日	額田開	275kV 額田幸田 1L 構内	開閉試験		新規	
0476370	中部	2027/05/01 09:00	2027/05/01 09:30	単日	西部変	275kV 西濃西部 1L 構内	開閉試験		新規	
0476371	中部	2027/05/01 09:00	2027/05/01 09:30	単日	西部変	275kV 西濃西部 2L 構内	開閉試験		新規	
0479601	中部	2027/05/01 09:00	2027/05/01 09:30	単日	西濃変	275kV 西濃西部 1L 構内	開閉試験		新規	
0479602	中部	2027/05/01 09:00	2027/05/01 09:30	単日	西濃変	275kV 西濃西部 2L 構内	開閉試験		新規	
0479733	中部	2027/05/01 09:00	2027/05/01 09:30	単日	幸田変	275kV 額田幸田 1L 構内	開閉試験		新規	
0479734	中部	2027/05/01 09:00	2027/05/01 09:30	単日	幸田変	275kV 額田幸田 2L 構内	開閉試験		新規	
0476213	中部	2027/05/02 08:00	2027/05/02 18:00	単日	幸田変	275kV 額田幸田 2L 線路	幸田変 額田幸田2L関係機器点検(乙ブス)		新規	
0476204	中部	2027/05/06 09:00	2027/05/07 17:00	毎日	東部額田 2L	275kV 東部額田 2L 全線	防錆塗装		新規	
0476060	中部	2027/05/08 09:00	2027/05/09 17:00	毎日	東部額田 2L	275kV 東部額田 2L 全線	鉄塔改造に伴う鉄塔スケッチ		新規	
0476388	中部	2027/05/10 09:00	2027/05/14 17:00	毎日	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	変更	
0476389	中部	2027/05/10 09:00	2027/05/14 17:00	毎日	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	変更	
0476408	中部	2027/05/10 09:00	2027/05/10 17:00	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 1L 構内	機器点検/GCB036 A・作動油交換	制約有	新規	
0479643	中部	2027/05/10 09:00	2027/05/10 09:30	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479706	中部	2027/05/10 09:00	2027/05/10 09:30	単日	知多火力変	275kV B BUS TIE	開閉試験		新規	
0479708	中部	2027/05/10 09:00	2027/05/10 09:30	単日	知多火力変	275kV 知多火力 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479709	中部	2027/05/10 09:00	2027/05/10 09:30	単日	知多火力変	275kV 知多火力 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479720	中部	2027/05/10 09:00	2027/05/10 09:30	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479721	中部	2027/05/10 09:00	2027/05/10 09:30	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479722	中部	2027/05/10 09:00	2027/05/10 09:30	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479644	中部	2027/05/10 09:30	2027/05/10 10:00	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479723	中部	2027/05/10 09:30	2027/05/10 10:00	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0476142	中部	2027/05/11 08:00	2027/05/13 17:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	ジャンパ補強線取替	制約有	新規	
0476145	中部	2027/05/11 09:00	2027/05/14 17:00	連続	静岡変	500kV 静岡幹 1L 線路	静岡幹1L DAC取込		新規	
0476409	中部	2027/05/11 09:00	2027/05/11 17:00	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 2L 構内	機器点検/GCB038 A・作動油交換	制約有	新規	
0476262	中部	2027/05/13 08:00	2027/05/13 17:00	単日	東信変	275kV 信濃東信 2L 全線	東信変275・77kV保護盤取替/275BP盤取替(信濃2L取込)	制約有	新規	
0476375	中部	2027/05/13 08:00	2027/05/13 08:30	単日	信濃変	275kV 信濃東信 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479609	中部	2027/05/13 08:00	2027/05/13 08:30	単日	東信変	275kV 信濃東信 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0476462	中部	2027/05/13 17:00	2027/05/13 18:00	単日	東信変	275kV 信濃東信 2L 構内	東信変275・77kV保護盤取替/275BP盤取替(信濃2L取込)	制約有	新規	
0476261	中部	2027/05/14 08:00	2027/05/14 17:00	単日	東信変	275kV 信濃東信 1L 全線	東信変275・77kV保護盤取替/275BP盤取替(信濃1L取込)	制約有	新規	
0479608	中部	2027/05/14 08:00	2027/05/14 08:30	単日	東信変	275kV 信濃東信 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0476461	中部	2027/05/14 17:00	2027/05/14 18:00	単日	東信変	275kV 信濃東信 1L 構内	東信変275・77kV保護盤取替/275BP盤取替(信濃1L取込)	制約有	新規	
0477717	中部	2027/05/16 09:00	2027/05/19 17:00	毎日	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0477718	中部	2027/05/16 09:00	2027/05/19 17:00	毎日	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0476105	中部	2027/05/17 08:00	2027/05/19 18:00	連続	中濃変	275kV 中濃犬山 2L 全線	018関係機器点検(GCB・GCS・ES・LS電装品取替,波形,GCB作動油交換)		新規	
0476263	中部	2027/05/17 08:00	2027/05/17 17:00	単日	東信変	275kV 東信新北信 1L 全線	東信変275・77kV保護盤取替/275BP盤取替(新北信1L取込)	制約有	新規	
0479610	中部	2027/05/17 08:00	2027/05/17 08:30	単日	東信変	275kV 東信新北信 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479618	中部	2027/05/17 08:00	2027/05/17 08:30	単日	新北信変	275kV 東信新北信 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479783	中部	2027/05/17 09:00	2027/05/18 17:00	毎日	川越火力 2L	275kV 川越火力 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0476463	中部	2027/05/17 17:00	2027/05/17 18:00	単日	東信変	275kV 東信新北信 1L 構内	東信変275・77kV保護盤取替/275BP盤取替(新北信1L取込)	制約有	新規	
0476264	中部	2027/05/18 08:00	2027/05/18 17:00	単日	東信変	275kV 東信新北信 2L 全線	東信変275・77kV保護盤取替/275BP盤取替(新北信2L取込)	制約有	新規	
0479611	中部	2027/05/18 08:00	2027/05/18 08:30	単日	東信変	275kV 東信新北信 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479619	中部	2027/05/18 08:00	2027/05/18 08:30	単日	新北信変	275kV 東信新北信 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0476146	中部	2027/05/18 09:00	2027/05/21 17:00	連続	静岡変	500kV 静岡幹 2L 線路	静岡幹2L DAC取込		新規	
0476548	中部	2027/05/18 09:00	2027/05/18 17:00	単日	東信新北信 2L	275kV 東信新北信 2L 全線	がいにし補修	制約有	新規	
0476464	中部	2027/05/18 17:00	2027/05/18 18:00	単日	東信変	275kV 東信新北信 2L 構内	東信変275・77kV保護盤取替/275BP盤取替(新北信2L取込)	制約有	新規	
0479847	中部	2027/05/19 09:00	2027/05/21 17:00	毎日	川越火力 2L	275kV 川越火力 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0476147	中部	2027/06/01 09:00	2027/06/04 17:00	連続	静岡変	500kV 静岡連絡 1L 線路	静岡連絡1L DAC・PCM取込		新規	
0476539	中部	2027/06/05 09:30	2027/06/05 16:00	単日	南武平町松ケ枝 1L	275kV 南武平町松ケ枝 1L 全線	特別点検(OFケーブル採油)		新規	
0479685	中部	2027/06/05 09:30	2027/06/05 10:00	単日	松ケ枝変	275kV 南武平町松ケ枝 1L 構内	開閉試験		新規	
0479692	中部	2027/06/05 09:30	2027/06/05 10:00	単日	南武平町変	275kV 南武平町松ケ枝 1L 構内	開閉試験		新規	
0476338	中部	2027/06/09 08:00	2027/06/18 17:00	毎日	中濃犬山 1L	275kV 中濃犬山 1L 線路	【TCB-27-003】電線路細密点検ほか		新規	
0476104	中部	2027/06/15 08:00	2027/06/17 18:00	連続	中濃変	275kV 中濃犬山 1L 全線	016関係機器点検(GCB・GCS・ES・LS電装品取替,波形,GCB作動油交換)		新規	
0476148	中部	2027/06/15 09:00	2027/06/18 17:00	連続	静岡変	500kV 静岡連絡 2L 線路	静岡連絡2L DAC・PCM取込		新規	
0476458	中部	2027/06/15 09:00	2027/06/15 17:00	単日	新三河幹 1L	500kV 新三河幹 1L 全線	新三河幹線1Lがいにし取替	制約有	新規	
0479635	中部	2027/06/15 09:00	2027/06/15 09:30	単日	東部変	500kV 新三河幹 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479649	中部	2027/06/15 09:00	2027/06/15 09:30	単日	新三河変	500kV 新三河幹 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479678	中部	2027/06/15 09:00	2027/06/15 09:30	単日	梅森開	275kV 梅森金山 2L 構内	開閉試験		新規	
0479680	中部	2027/06/15 09:00	2027/06/15 09:30	単日	金山変	275kV 梅森金山 2L 構内	開閉試験		新規	
0476533	中部	2027/06/15 15:00	2027/06/15 15:30	単日	金山変	275kV 梅森金山 2L 線路	梅森金山線2L OFケーブル改修		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0477710	中部	2027/06/15 15:00	2027/06/15 16:00	単日	梅森開	275kV 梅森金山 2L 線路	梅森金山2L OFケーブル改修に伴うGIS組立後の試加圧試験		新規	
0479814	中部	2027/06/16 08:00	2027/06/20 18:00	連続	南武平町変	275kV 下広井南武平町 2L 線路	275kV下広井2Lほか機器点検(CB・L094電装品、CB020同形ほか)		新規	
0479815	中部	2027/06/16 08:00	2027/06/20 18:00	連続	南武平町変	275kV 南武平町松ヶ枝 2L 構内	275kV下広井2Lほか機器点検(CB・L094電装品、CB020同形ほか)		新規	
0479691	中部	2027/06/16 09:00	2027/06/16 09:30	単日	南武平町変	275kV 下広井南武平町 2L 構内	開閉試験		新規	
0479693	中部	2027/06/16 09:00	2027/06/16 09:30	単日	南武平町変	275kV 南武平町松ヶ枝 2L 構内	開閉試験		新規	
0479699	中部	2027/06/16 09:00	2027/06/16 09:30	単日	下広井変	275kV 下広井南武平町 2L 構内	開閉試験		新規	
0479769	中部	2027/06/16 09:00	2027/06/18 17:00	連続	新佐倉変	275kV 浜岡新佐倉 2L 線路	2B LR細点, LR, GIS, CB720電装品		新規	
0476160	中部	2027/06/19 09:00	2027/06/21 17:00	毎日	西濃西部 1L	275kV 西濃西部 1L 全線	鉄塔防錆塗装		変更	
0476161	中部	2027/06/19 09:00	2027/06/21 17:00	毎日	西濃西部 2L	275kV 西濃西部 2L 全線	鉄塔防錆塗装		変更	
0476644	中部	2027/06/19 09:00	2027/06/19 09:30	単日	飛騨変換所	500kV AB BUS SECT	開閉試験		変更	
0479681	中部	2027/06/21 09:00	2027/06/21 09:30	単日	金山変	275kV 金山松ヶ枝 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479682	中部	2027/06/21 09:00	2027/06/21 09:30	単日	金山変	275kV 金山松ヶ枝 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479688	中部	2027/06/21 09:00	2027/06/21 09:30	単日	松ヶ枝変	275kV 金山松ヶ枝 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479689	中部	2027/06/21 09:00	2027/06/21 09:30	単日	松ヶ枝変	275kV 金山松ヶ枝 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479770	中部	2027/06/21 09:00	2027/06/26 17:00	連続	新佐倉変	275kV 浜岡新佐倉 2L 線路	2B 変圧器電装品		新規	
0476459	中部	2027/06/22 09:00	2027/06/22 17:00	単日	新三河幹 2L	500kV 新三河幹 2L 全線	新三河幹線2Lがいし取替	制約有	新規	
0479636	中部	2027/06/22 09:00	2027/06/22 09:30	単日	東部変	500kV 新三河幹 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479650	中部	2027/06/22 09:00	2027/06/22 09:30	単日	新三河変	500kV 新三河幹 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0476520	中部	2027/06/24 09:00	2027/06/24 09:30	単日	牛島町変	275kV 海部牛島町 1L 構内	開閉試験		新規	
0476540	中部	2027/06/24 09:00	2027/06/24 12:00	単日	海部牛島町 1L	275kV 海部牛島町 1L 全線	CH絶縁油分析		新規	
0476521	中部	2027/06/24 13:00	2027/06/24 13:30	単日	牛島町変	275kV 海部牛島町 2L 構内	開閉試験		新規	
0476541	中部	2027/06/24 13:00	2027/06/24 16:00	単日	海部牛島町 2L	275kV 海部牛島町 2L 全線	CH絶縁油分析		新規	
0476522	中部	2027/06/25 09:00	2027/06/25 09:30	単日	牛島町変	275kV 牛島町名城 1L 構内	開閉試験		新規	
0476542	中部	2027/06/25 09:00	2027/06/25 12:00	単日	牛島町名城 1L	275kV 牛島町名城 1L 全線	CH絶縁油分析		新規	
0479599	中部	2027/06/25 09:00	2027/06/25 09:30	単日	名城変	275kV 牛島町名城 1L 構内	開閉試験		新規	
0476523	中部	2027/06/25 13:00	2027/06/25 13:30	単日	牛島町変	275kV 牛島町名城 2L 構内	開閉試験		新規	
0476543	中部	2027/06/25 13:00	2027/06/25 16:00	単日	牛島町名城 2L	275kV 牛島町名城 2L 全線	CH絶縁油分析		新規	
0479600	中部	2027/06/25 13:00	2027/06/25 13:30	単日	名城変	275kV 牛島町名城 2L 構内	開閉試験		新規	
0476198	中部	2027/06/30 13:00	2027/06/30 13:10	単日	川越火力 2L	275kV 川越火力 2L 全線	川越火力線No25～No28建替・電線張替 2L試加圧試験	制約有	新規	
0479771	中部	2027/07/05 09:00	2027/07/05 17:00	単日	南勢変	275kV 伊勢南勢 1L 線路	南勢変 275kVヤード鳥害防止器修理		新規	
0479774	中部	2027/07/07 09:00	2027/07/07 17:00	単日	南勢変	275kV 伊勢南勢 2L 線路	南勢変 275kVヤード鳥害防止器修理		新規	
0479370	中部	2027/07/20 08:00	2027/07/23 17:00	連続	川根変	275kV 佐久間川根 1L 構内	川根変275kV LS操作箱取替(佐久間川根1L)		新規	
0476362	中部	2027/08/01 09:00	2027/08/01 09:30	単日	南福光変	77kV 7 BANK	開閉試験		変更	
0476476	中部	2027/08/01 09:00	2027/08/01 09:30	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0476477	中部	2027/08/01 09:00	2027/08/01 09:30	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0476496	中部	2027/08/01 09:00	2027/08/01 09:30	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0476497	中部	2027/08/01 09:00	2027/08/01 09:30	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479597	中部	2027/08/01 09:00	2027/08/01 09:30	単日	名城変	275kV 名城松ヶ枝 1L 構内	開閉試験		新規	
0479598	中部	2027/08/01 09:00	2027/08/01 09:30	単日	名城変	275kV 名城松ヶ枝 2L 構内	開閉試験		新規	
0479764	中部	2027/08/03 08:00	2027/09/21 17:00	連続	川根変	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根2L PD取替		新規	
0476624	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	三重開	500kV 三重連絡 1L 構内	開閉試験		新規	
0476625	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	三重開	500kV 三重連絡 2L 構内	開閉試験		新規	
0477534	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	西部変	500kV 三重連絡 1L 構内	開閉試験		新規	
0477535	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	西部変	500kV 三重連絡 2L 構内	開閉試験		新規	
0477540	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0477541	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0477557	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	北部変	275kV 北部西濃 1L 構内	開閉試験		新規	
0477558	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	北部変	275kV 北部西濃 2L 構内	開閉試験		新規	
0477559	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	北部変	275kV 北部中濃 1L 構内	開閉試験		新規	
0477560	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	北部変	275kV 北部中濃 2L 構内	開閉試験		新規	
0477802	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	信濃変	275kV 佐久幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0477803	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	信濃変	275kV 佐久幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0477805	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0477806	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0477807	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0477808	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0477810	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 1L 構内	開閉試験		新規	
0477811	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 2L 構内	開閉試験		新規	
0477812	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 1L 構内	開閉試験		新規	
0477813	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 2L 構内	開閉試験		新規	
0477814	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 1L 構内	開閉試験		新規	
0477815	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 2L 構内	開閉試験		新規	
0477816	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0477817	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0479121	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	中勢変	275kV 中勢亀山 1L 構内	開閉試験		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0479122	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	中勢変	275kV 中勢龜山 2L 構内	開閉試験		新規	
0479123	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 1L 構内	開閉試験		新規	
0479124	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 2L 構内	開閉試験		新規	
0479126	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L 構内	開閉試験		新規	
0479127	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 2L 構内	開閉試験		新規	
0479128	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	開閉試験		新規	
0479129	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	開閉試験		新規	
0479130	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	尾鷲変	275kV BUS TIE	開閉試験		新規	
0479132	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 1L 構内	開閉試験		新規	
0479133	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 2L 構内	開閉試験		新規	
0479137	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	開閉試験		新規	
0479138	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	開閉試験		新規	
0479145	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	牛島町変	275kV B 連絡母線	開閉試験		新規	
0479153	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	西濃変	275kV 北部西濃 1L 構内	開閉試験		新規	
0479154	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	西濃変	275kV 西濃西部 2L 構内	開閉試験		新規	
0479156	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	中濃変	275kV 中濃大山 1L 構内	開閉試験		新規	
0479157	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	中濃変	275kV 中濃大山 2L 構内	開閉試験		新規	
0479158	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	中濃変	275kV 北部中濃 1L 構内	開閉試験		新規	
0479159	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	中濃変	275kV 北部中濃 2L 構内	開閉試験		新規	
0479164	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	犬山変	275kV 中濃大山 1L 構内	開閉試験		新規	
0479165	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	犬山変	275kV 中濃大山 2L 構内	開閉試験		新規	
0479168	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 1L 構内	開閉試験		新規	
0479169	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 2L 構内	開閉試験		新規	
0479182	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	愛知変	500kV 豊根幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0479183	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	愛知変	500kV 豊根幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0479188	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 1L 構内	開閉試験		新規	
0479189	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 2L 構内	開閉試験		新規	
0479190	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 1L 構内	開閉試験		新規	
0479191	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 2L 構内	開閉試験		新規	
0479196	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	豊根開	500kV 豊根幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0479197	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	豊根開	500kV 豊根幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0479198	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 1L 構内	開閉試験		新規	
0479199	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 2L 構内	開閉試験		新規	
0479200	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	豊根開	500kV 静岡幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0479201	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	豊根開	500kV 静岡幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0479206	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	東部変	500kV 東栄幹 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479207	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	東部変	500kV 東栄幹 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479212	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹里 1L 構内	開閉試験		新規	
0479213	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹里 2L 構内	開閉試験		新規	
0479216	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 1L 構内	開閉試験		新規	
0479217	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 2L 構内	開閉試験		新規	
0479218	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	東栄変	500kV 東栄幹 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479219	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	東栄変	500kV 東栄幹 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479220	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0479221	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0479228	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 1L 構内	開閉試験		新規	
0479229	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 2L 構内	開閉試験		新規	
0479230	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	駿遠変	500kV 駿遠幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0479231	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	駿遠変	500kV 駿遠幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0479242	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 1L 構内	開閉試験		新規	
0479243	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 2L 構内	開閉試験		新規	
0479244	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 1L 構内	開閉試験		新規	
0479245	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 2L 構内	開閉試験		新規	
0479246	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	駿遠変	275kV 浜岡駿遠 1L 構内	開閉試験		新規	
0479247	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	駿遠変	275kV 浜岡駿遠 2L 構内	開閉試験		新規	
0479254	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	静岡変	500kV 静岡幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0479255	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	静岡変	500kV 静岡幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0479256	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	静岡変	500kV 静岡連絡 1L 構内	開閉試験		新規	
0479257	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	静岡変	500kV 静岡連絡 2L 構内	開閉試験		新規	
0479260	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	静岡変	275kV 静岡西分岐 1L 構内	開閉試験		新規	
0479261	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	静岡変	275kV 静岡西分岐 2L 構内	開閉試験		新規	
0479262	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	静岡変	275kV 静岡東分岐 1L 構内	開閉試験		新規	
0479263	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	静岡変	275kV 静岡東分岐 2L 構内	開閉試験		新規	
0479268	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 1L 構内	開閉試験		新規	
0479269	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 2L 構内	開閉試験		新規	
0479270	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 1L 構内	開閉試験		新規	
0479271	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 2L 構内	開閉試験		新規	
0479286	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	東海変	275kV 知多第二東海 1L 構内	開閉試験		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0479287	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	東海変	275kV 知多第二東海 2L 構内	開閉試験		新規	
0479288	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	知多第二火発	275kV 知多第二東海 1L 構内	開閉試験		新規	
0479289	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	知多第二火発	275kV 知多第二東海 2L 構内	開閉試験		新規	
0479297	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	額田開	275kV 額田三河 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479298	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	額田開	275kV 額田三河 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479304	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	三河変	275kV 湖西三河 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479305	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	三河変	275kV 湖西三河 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479306	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	三河変	275kV 額田三河 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479307	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	三河変	275kV 額田三河 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479309	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	湖西変	275kV 湖西三河 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479310	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	湖西変	275kV 湖西三河 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479311	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	湖西変	275kV 田原湖西 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479312	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	湖西変	275kV 田原湖西 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479314	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	田原変	275kV 田原湖西 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479315	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	田原変	275kV 田原湖西 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479322	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 1L 構内	開閉試験		新規	
0479323	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 2L 構内	開閉試験		新規	
0479325	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	駿河変	275kV 駿遠駿河 1L 構内	開閉試験		新規	
0479326	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	駿河変	275kV 駿遠駿河 2L 構内	開閉試験		新規	
0479327	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	駿河変	275kV 駿河東清水 1L 構内	開閉試験		新規	
0479328	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	駿河変	275kV 駿河東清水 2L 構内	開閉試験		新規	
0479330	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 1L 構内	開閉試験		新規	
0479331	中部	2027/08/08 09:00	2027/08/08 09:30	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 2L 構内	開閉試験		新規	
0479763	中部	2027/08/10 08:00	2027/09/27 17:00	連続	川根変	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根 1L PD取替		新規	
0476537	中部	2027/09/07 09:00	2027/09/08 17:00	毎日	額田三河 1L	275kV 額田三河 1L 全線	防錆塗装	制約有	新規	
0476538	中部	2027/09/09 09:00	2027/09/10 17:00	毎日	額田三河 2L	275kV 額田三河 2L 全線	防錆塗装	制約有	新規	
0476199	中部	2027/09/13 08:00	2027/12/10 13:00	連続	川越火力 1L	275kV 川越火力 1L 全線	川越火力線No25～No28建替・電線張替	制約有	新規	
0476474	中部	2027/09/13 08:00	2027/09/13 08:30	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0476489	中部	2027/09/13 08:00	2027/09/13 08:30	単日	川越変	275kV 川越火力 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479844	中部	2027/09/13 08:30	2027/09/13 17:00	単日	北豊田梅森 1L	275kV 北豊田梅森 1L 全線	北豊田梅森線鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0476106	中部	2027/09/13 09:00	2027/09/15 17:00	毎日	愛知瀬戸 1L	275kV 愛知瀬戸 1L 全線	愛知瀬戸線鉄塔防錆塗装		新規	
0476114	中部	2027/09/13 09:00	2027/12/27 15:00	連続	梅森開	275kV 梅森金山 1L 線路	梅森金山1L OFケーブル改修に伴う梅森開側GIS分解組立		新規	
0476195	中部	2027/09/13 09:00	2027/12/27 15:00	連続	梅森金山 1L	275kV 梅森金山 1L 全線	梅森金山線1L OFケーブル改修		新規	
0476310	中部	2027/09/13 09:00	2027/12/27 15:00	連続	金山変	275kV 梅森金山 1L 全線	275kV電力ケーブル(梅森金山線1L)修理に伴うGIS修理		新規	
0479119	中部	2027/09/13 09:00	2027/09/13 15:00	単日	湖西三河 2L	275kV 湖西三河 2L 全線	鉄塔部材補修	制約有	新規	
0479647	中部	2027/09/13 09:00	2027/09/13 09:30	単日	東部変	275kV 東部北豊田 1L 構内	開閉試験		新規	
0479648	中部	2027/09/13 09:00	2027/09/13 09:30	単日	東部変	275kV 東部北豊田 2L 構内	開閉試験		新規	
0479669	中部	2027/09/13 09:00	2027/09/13 09:30	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 1L 構内	開閉試験		新規	
0479670	中部	2027/09/13 09:00	2027/09/13 09:30	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 2L 構内	開閉試験		新規	
0479671	中部	2027/09/13 09:00	2027/09/13 09:30	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479672	中部	2027/09/13 09:00	2027/09/13 09:30	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479675	中部	2027/09/13 09:00	2027/09/13 09:30	単日	梅森開	275kV 北豊田梅森 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479676	中部	2027/09/13 09:00	2027/09/13 09:30	単日	梅森開	275kV 北豊田梅森 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479677	中部	2027/09/13 09:00	2027/09/13 09:30	単日	梅森開	275kV 梅森金山 1L 構内	開閉試験		新規	
0479679	中部	2027/09/13 09:00	2027/09/13 09:30	単日	金山変	275kV 梅森金山 1L 構内	開閉試験		新規	
0477715	中部	2027/09/17 08:00	2027/12/28 22:00	連続	東清水変	275kV 駿河東清水 1L 線路	1FC系統連系試験		変更	
0479853	中部	2027/09/19 18:00	2027/09/20 08:00	連続	佐久間東変 1L	275kV 佐久間東変 1L 全線	【TZA-27-004】所内監視不可に伴う保安停止		新規	
0479854	中部	2027/09/19 18:00	2027/09/20 08:00	連続	佐久間東変 2L	275kV 佐久間東変 2L 全線	【TZA-27-004】所内監視不可に伴う保安停止		新規	
0479849	中部	2027/09/20 08:00	2027/09/20 20:00	単日	佐久間東変 1L	275kV 佐久間東変 1L 線路	【TZA-27-005】新佐久間FC 60Hz母線ほか加圧試験		新規	
0479850	中部	2027/09/20 08:00	2027/09/20 20:00	単日	佐久間東変 2L	275kV 佐久間東変 2L 線路	【TZA-27-005】新佐久間FC 60Hz母線ほか加圧試験		新規	
0479845	中部	2027/09/20 08:30	2027/09/20 17:00	単日	北豊田梅森 1L	275kV 北豊田梅森 1L 全線	北豊田梅森線鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0476107	中部	2027/09/20 09:00	2027/09/23 17:00	毎日	愛知瀬戸 2L	275kV 愛知瀬戸 2L 全線	愛知瀬戸線鉄塔防錆塗装		新規	
0479759	中部	2027/09/20 17:00	2027/09/20 17:10	単日	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線No49～No54間電線張替に伴う試加圧試験		新規	
0478571	中部	2027/09/21 09:00	2027/09/21 17:00	単日	電発佐久間発	275kV 佐久間川根 2L 線路	【TNA-27-021】佐久間川根線2L GIS化工事に伴う確認試験		新規	
0479848	中部	2027/09/21 09:00	2027/09/21 12:00	単日	東変変	275kV 佐久間東変 2L 線路	実負荷試験(275kV佐久間東変2L)		新規	
0479767	中部	2027/09/21 17:00	2027/09/21 17:10	単日	川根変	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根2L PD取替／加圧確認		新規	
0479813	中部	2027/09/27 08:30	2027/09/27 17:00	単日	北豊田梅森 1L	275kV 北豊田梅森 1L 全線	北豊田梅森線鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0476108	中部	2027/09/27 09:00	2027/10/02 17:00	毎日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	電名瀬戸線鉄塔防錆塗装		新規	
0478572	中部	2027/09/27 09:00	2027/09/27 17:00	単日	電発佐久間発	275kV 佐久間川根 1L 線路	【TNA-27-021】佐久間川根線1L GIS化工事に伴う確認試験		新規	
0479758	中部	2027/09/27 17:00	2027/09/27 17:10	単日	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No49～No54間電線張替に伴う試加圧試験		新規	
0479768	中部	2027/09/27 17:00	2027/09/27 17:10	単日	川根変	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根1L PD取替／加圧確認		新規	
0476109	中部	2027/10/04 09:00	2027/10/09 17:00	毎日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	電名瀬戸線鉄塔防錆塗装		新規	
0476157	中部	2027/10/05 09:00	2027/10/06 17:00	毎日	亀山西名古屋 1L	275kV 亀山西名古屋 1L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0477547	中部	2027/10/05 09:00	2027/10/06 17:00	毎日	亀山西名古屋 1L	275kV 亀山西名古屋 1L 全線	架空地線懸垂装置取替		新規	
0476158	中部	2027/10/07 09:00	2027/10/08 17:00	毎日	亀山西名古屋 2L	275kV 亀山西名古屋 2L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0477548	中部	2027/10/07 09:00	2027/10/08 17:00	毎日	亀山西名古屋 2L	275kV 亀山西名古屋 2L 全線	架空地線懸垂装置取替		新規	
0479788	中部	2027/10/08 14:10	2027/10/08 14:30	単日	尾鷲変	275kV 乙 BUS	CB710実負荷試験		新規	
0476208	中部	2027/10/09 08:00	2027/10/11 18:00	連続	額田開	275kV 東部額田 1L 線路	額田開 東部額田1L関係機器点検		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0476164	中部	2027/10/09 09:00	2027/10/11 17:00	毎日	西部西尾張 2L	275kV 西部西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0476194	中部	2027/10/09 09:00	2027/10/15 16:00	連続	西尾張海部 1L	275kV 西尾張海部 1L 全線	西尾張分岐トラス～No2 撤去・新設		新規	
0476203	中部	2027/10/09 09:00	2027/10/11 17:00	毎日	東部額田 1L	275kV 東部額田 1L 全線	防錆塗装		新規	
0476369	中部	2027/10/09 09:00	2027/10/09 09:30	単日	西部変	275kV 西部西尾張 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0476492	中部	2027/10/09 09:00	2027/10/09 09:30	単日	西尾張変	275kV 西尾張海部 1L 構内	開閉試験		新規	
0476494	中部	2027/10/09 09:00	2027/10/09 09:30	単日	西尾張変	275kV 西部西尾張 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0476499	中部	2027/10/09 09:00	2027/10/09 09:30	単日	海部開	275kV 海部牛島町 1L 構内	開閉試験		新規	
0476500	中部	2027/10/09 09:00	2027/10/09 09:30	単日	海部開	275kV 海部牛島町 2L 構内	開閉試験		新規	
0476501	中部	2027/10/09 09:00	2027/10/09 09:30	単日	海部開	275kV 西尾張海部 1L 構内	開閉試験		新規	
0476528	中部	2027/10/09 09:00	2027/10/10 17:00	連続	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 1L 構内	尾鷲伊勢 1L 甲062操作箱取替		新規	
0477546	中部	2027/10/09 09:00	2027/10/10 17:00	毎日	西部西尾張 2L	275kV 西部西尾張 2L 全線	架空地線懸垂装置取替	制約有	新規	
0478622	中部	2027/10/09 09:00	2027/10/09 17:00	単日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 1L 線路	GCB062 A点検・作動油交換		変更	
0475954	中部	2027/10/12 09:00	2027/10/13 17:00	毎日	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 全線	鉄塔防錆塗装		変更	
0476645	中部	2027/10/12 09:00	2027/10/12 09:30	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 1L 構内	開閉試験		新規	
0476650	中部	2027/10/12 09:00	2027/10/12 09:30	単日	西部変	500kV 西部幹 1L 構内	開閉試験		変更	
0476652	中部	2027/10/12 09:00	2027/10/12 09:30	単日	北部変	500kV 西部幹 1L 構内	開閉試験		変更	
0476532	中部	2027/10/13 09:00	2027/10/14 17:00	毎日	伊勢幹 1L	275kV 伊勢幹 1L 全線	伊勢幹線No7ジャンパー線補修		新規	
0475955	中部	2027/10/14 09:00	2027/10/15 17:00	毎日	西部幹 2L	500kV 西部幹 2L 全線	鉄塔防錆塗装		変更	
0476646	中部	2027/10/14 09:00	2027/10/14 09:30	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 2L 構内	開閉試験		新規	
0476651	中部	2027/10/14 09:00	2027/10/14 09:30	単日	西部変	500kV 西部幹 2L 構内	開閉試験		変更	
0476653	中部	2027/10/14 09:00	2027/10/14 09:30	単日	北部変	500kV 西部幹 2L 構内	開閉試験		変更	
0478184	中部	2027/10/14 09:00	2027/10/14 18:00	単日	電源名古屋変	275kV 佐久間西幹里 1L 構内	[TCA-27-030]オシロ更新に伴う条件取り込み		新規	
0478185	中部	2027/10/14 09:00	2027/10/14 18:00	単日	電源名古屋変	275kV 佐久間西幹里 1L 線路	[TCA-27-030]オシロ更新に伴う条件取り込み		新規	
0478186	中部	2027/10/15 09:00	2027/10/15 18:00	単日	電源名古屋変	275kV 佐久間西幹里 2L 構内	[TCA-27-031]オシロ更新に伴う条件取り込み		新規	
0478187	中部	2027/10/15 09:00	2027/10/15 18:00	単日	電源名古屋変	275kV 佐久間西幹里 2L 線路	[TCA-27-031]オシロ更新に伴う条件取り込み		新規	
0476493	中部	2027/10/15 16:00	2027/10/15 16:30	単日	西尾張変	275kV 西尾張海部 2L 構内	開閉試験		新規	
0476502	中部	2027/10/15 16:00	2027/10/15 16:30	単日	海部開	275kV 西尾張海部 2L 構内	開閉試験		新規	
0479731	中部	2027/10/17 09:00	2027/10/17 09:30	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479732	中部	2027/10/17 09:00	2027/10/17 09:30	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479739	中部	2027/10/17 10:00	2027/10/17 10:30	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479740	中部	2027/10/17 10:30	2027/10/17 11:00	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0476339	中部	2027/10/18 08:00	2027/10/22 18:00	連続	電源名古屋変	275kV 犬山電名 1L 線路	[TCA-27-001]O-1, LS1細密点検ほか		新規	
0476340	中部	2027/10/18 08:00	2027/10/19 18:00	連続	電源名古屋変	275kV 犬山電名 1L 構内	[TCA-27-002]LS101操作BOX取替 他		変更	
0479603	中部	2027/10/18 08:00	2027/10/18 08:30	単日	犬山変	275kV 犬山電名 1L 構内	開閉試験		新規	
0476524	中部	2027/10/18 09:00	2027/10/19 17:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢南勢 1L 構内	伊勢南勢 1L 甲056操作箱取替		新規	
0479782	中部	2027/10/19 09:00	2027/10/20 17:00	毎日	川越火力 1L	275kV 川越火力 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0476342	中部	2027/10/20 08:00	2027/10/21 18:00	連続	電源名古屋変	275kV 犬山電名 1L 構内	[TCA-27-003]LS201操作BOX取替 他		変更	
0476526	中部	2027/10/20 09:00	2027/10/21 17:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢南勢 2L 構内	伊勢南勢 2L 甲058操作箱取替		新規	
0476167	中部	2027/10/21 08:00	2028/03/23 13:00	連続	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線・42～・46間電線張替	制約有	新規	
0479846	中部	2027/10/21 09:00	2027/10/22 17:00	毎日	川越火力 1L	275kV 川越火力 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0476075	中部	2027/10/23 09:00	2027/10/23 17:00	単日	中名古屋開	275kV 犬山電名 2L 線路	CB02 A点検		新規	
0476162	中部	2027/10/23 09:00	2027/10/24 17:00	毎日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0476368	中部	2027/10/23 09:00	2027/10/23 09:30	単日	西部変	275kV 西部西尾張 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0476495	中部	2027/10/23 09:00	2027/10/23 09:30	単日	西尾張変	275kV 西部西尾張 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0477545	中部	2027/10/23 09:00	2027/10/24 17:00	毎日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	架空地線懸垂装置取替	制約有	新規	
0479604	中部	2027/10/23 09:00	2027/10/23 09:30	単日	犬山変	275kV 犬山電名 2L 構内	開閉試験		新規	
0479605	中部	2027/10/23 09:00	2027/10/23 09:30	単日	中名古屋開	275kV 犬山電名 2L 構内	開閉試験		新規	
0476069	中部	2027/10/26 09:00	2027/10/29 16:00	毎日	中勢亀山 1L	275kV 中勢亀山 1L 全線	鉄塔防錆塗装工事		新規	
0476444	中部	2027/10/26 09:00	2027/10/26 17:00	単日	東栄変	500kV 東栄幹 1L 線路	屋外鉄構現場スケッチ(B10・15・20)	制約有	新規	
0476562	中部	2027/10/28 09:00	2027/10/29 17:00	毎日	三岐幹 2L	500kV 三岐幹 2L 全線	三岐幹線 架線金具補修		変更	
0476564	中部	2027/10/28 09:00	2027/10/28 09:30	単日	岐阜開	500kV 三岐幹 2L 構内	開閉試験		変更	
0476566	中部	2027/10/28 09:00	2027/10/28 09:30	単日	三重開	500kV 三岐幹 2L 構内	開閉試験		変更	
0476163	中部	2027/10/30 09:00	2027/10/30 17:00	毎日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0476530	中部	2027/10/30 09:00	2027/10/31 17:00	連続	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 2L 構内	尾鷲伊勢 2L 甲064操作箱取替		新規	
0478623	中部	2027/10/30 09:00	2027/10/30 17:00	単日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 2L 線路	GCB064 A点検・作動油交換		変更	
0476432	中部	2027/11/03 08:00	2027/11/08 17:00	連続	駿遠変	500kV 駿遠幹 1L 線路	駿遠変電所 LS操作箱取替(駿遠幹1L)		変更	
0476350	中部	2027/11/06 08:00	2027/11/06 18:00	単日	三河変	275kV 三河遠江 1L 構内	三河遠江 1L甲026操作箱取替		新規	
0476435	中部	2027/11/06 08:00	2027/11/08 17:00	連続	駿遠変	500kV 駿遠幹 1L 線路	駿遠変電所 LS操作箱取替(駿遠幹1L)		新規	
0479742	中部	2027/11/06 09:00	2027/11/06 09:30	単日	三河変	275kV 三河遠江 1L 構内	開閉試験		新規	
0479746	中部	2027/11/06 09:00	2027/11/06 09:30	単日	遠江変	275kV 三河遠江 1L 構内	開閉試験		新規	
0476352	中部	2027/11/07 08:00	2027/11/07 18:00	毎日	三河変	275kV 三河遠江 1L 構内	三河遠江 1L乙026操作箱取替		新規	
0475956	中部	2027/11/08 08:00	2027/11/12 17:00	連続	三岐幹 1L	500kV 三岐幹 1L 全線	三岐幹線OPGW改修		変更	
0476563	中部	2027/11/08 08:00	2027/11/08 08:30	単日	岐阜開	500kV 三岐幹 1L 構内	開閉試験		変更	
0476565	中部	2027/11/08 08:00	2027/11/08 08:30	単日	三重開	500kV 三岐幹 1L 構内	開閉試験		変更	
0476555	中部	2027/11/08 09:00	2027/11/08 17:00	毎日	三岐幹 1L	500kV 三岐幹 1L 全線	架線金具補修工事		変更	
0476561	中部	2027/11/08 09:00	2027/11/09 17:00	毎日	三岐幹 1L	500kV 三岐幹 1L 全線	三岐幹線 架線金具補修		変更	
0479654	中部	2027/11/08 09:00	2027/11/08 09:30	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 1L 構内	開閉試験		新規	
0479655	中部	2027/11/08 09:00	2027/11/08 09:30	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 2L 構内	開閉試験		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0479735	中部	2027/11/08 09:00	2027/11/08 09:30	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 1L 構内	開閉試験		新規	
0479736	中部	2027/11/08 09:00	2027/11/08 09:30	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 2L 構内	開閉試験		新規	
0476070	中部	2027/11/09 09:00	2027/11/12 16:00	毎日	中勢亀山 2L	275kV 中勢亀山 2L 全線	鉄塔防錆塗装工事		新規	
0476095	中部	2027/11/09 09:00	2027/11/10 17:00	連続	駿遠変	275kV 浜岡駿遠 1L 線路	CB046遮断器点検A、作動油交換		新規	
0478573	中部	2027/11/09 09:00	2027/11/13 17:00	連続	静岡連絡 1L	500kV 静岡連絡 1L 全線	静岡連絡線鉄塔防錆塗装		新規	
0478574	中部	2027/11/09 09:00	2027/11/13 17:00	連続	静岡連絡 2L	500kV 静岡連絡 2L 全線	静岡連絡線鉄塔防錆塗装		新規	
0476214	中部	2027/11/10 08:00	2027/11/13 16:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0476215	中部	2027/11/10 08:00	2027/11/13 16:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0479656	中部	2027/11/10 09:00	2027/11/10 09:30	単日	新三河変	275kV 三河 1L 構内	開閉試験		新規	
0479657	中部	2027/11/10 09:00	2027/11/10 09:30	単日	新三河変	275kV 三河 2L 構内	開閉試験		新規	
0479744	中部	2027/11/10 09:00	2027/11/10 09:30	単日	三河変	275kV 三河 1L 構内	開閉試験		新規	
0479745	中部	2027/11/10 09:00	2027/11/10 09:30	単日	三河変	275kV 三河 2L 構内	開閉試験		新規	
0476096	中部	2027/11/11 09:00	2027/11/12 17:00	連続	駿遠変	275kV 浜岡駿遠 2L 線路	CB048遮断器点検A、作動油交換		新規	
0475957	中部	2027/11/15 08:00	2027/11/19 17:00	連続	三岐幹 1L	500kV 三岐幹 1L 全線	三岐幹線OPGW改修		変更	
0476436	中部	2027/11/17 08:00	2027/11/22 17:00	連続	駿遠変	500kV 駿遠幹 2L 線路	駿遠変電所 LS操作箱取替(駿遠幹2L)		変更	
0476642	中部	2027/11/17 09:00	2027/11/19 17:00	毎日	駿遠幹 2L	500kV 駿遠幹 2L 全線	不良がいし取り替え		新規	
0476354	中部	2027/11/20 08:00	2027/11/20 18:00	単日	三河変	275kV 三河遠江 2L 構内	三河遠江2L甲028操作箱取替		新規	
0476439	中部	2027/11/20 08:00	2027/11/22 17:00	連続	駿遠変	500kV 駿遠幹 2L 線路	駿遠変電所 LS操作箱取替(駿遠幹2L)		新規	
0479743	中部	2027/11/20 09:00	2027/11/20 09:30	単日	三河変	275kV 三河遠江 2L 構内	開閉試験		新規	
0479747	中部	2027/11/20 09:00	2027/11/20 09:30	単日	遠江変	275kV 三河遠江 2L 構内	開閉試験		新規	
0476356	中部	2027/11/21 08:00	2027/11/21 18:00	単日	三河変	275kV 三河遠江 2L 構内	三河遠江2L乙028操作箱取替		新規	
0479748	中部	2027/11/22 08:00	2027/11/26 17:00	連続	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江駿遠線OPGW張替工事		新規	
0479749	中部	2027/11/22 08:00	2027/11/26 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	遠江駿遠線OPGW張替工事		新規	
0479661	中部	2027/11/27 09:00	2027/11/27 09:30	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479667	中部	2027/11/27 09:00	2027/11/27 09:30	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479812	中部	2027/11/27 09:00	2027/11/27 17:00	単日	瀬戸北豊田 1L	275kV 瀬戸北豊田 1L 全線	ダンパー取替	制約有	新規	
0479662	中部	2027/11/28 09:00	2027/11/28 09:30	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479668	中部	2027/11/28 09:00	2027/11/28 09:30	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0479811	中部	2027/11/28 09:00	2027/11/28 17:00	単日	瀬戸北豊田 2L	275kV 瀬戸北豊田 2L 全線	ダンパー取替	制約有	新規	
0479626	中部	2027/11/29 09:00	2027/12/27 15:00	連続	南武平町松ケ枝 2L	275kV 南武平町松ケ枝 2L 全線	南武平町松ケ枝線2LOFケーブル改修		新規	
0479686	中部	2027/11/29 09:00	2027/11/29 09:30	単日	松ケ枝変	275kV 南武平町松ケ枝 2L 構内	開閉試験		新規	
0476124	中部	2027/11/30 08:00	2027/12/03 17:00	連続	駿遠変	500kV 浜岡幹 1L 線路	CB5052BOX細点		新規	
0476344	中部	2027/11/30 08:00	2027/12/09 17:00	連続	佐久間西幹里 2L	275kV 佐久間西幹里 2L 全線	【TCB-27-010】電線路細密点検ほか		新規	
0478575	中部	2027/11/30 09:00	2027/12/03 17:00	毎日	南勢変	275kV 伊勢南勢 2L 構内	275kVBCセクGCS(106)関係機器点検他		新規	
0478181	中部	2027/12/06 08:00	2027/12/10 17:00	連続	西濃変	275kV 北部西濃 2L 線路	044関係機器点検(GCB・GCS・ES・LS電装品取替、波形ES・LSBOX普		新規	
0476065	中部	2027/12/06 09:00	2027/12/13 17:00	毎日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	防錆塗装		変更	
0476066	中部	2027/12/06 09:00	2027/12/13 17:00	毎日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	防錆塗装		変更	
0476200	中部	2027/12/10 13:00	2027/12/10 13:10	単日	川越火力 1L	275kV 川越火力 1L 全線	川越火力線No25～No28建替・電線張替 1L試加圧試験	制約有	新規	
0479332	中部	2027/12/11 08:00	2027/12/12 17:00	毎日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装		新規	
0476345	中部	2027/12/14 08:00	2027/12/23 17:00	連続	佐久間西幹里 1L	275kV 佐久間西幹里 1L 全線	【TCB-27-009】電線路細密点検ほか		新規	
0479333	中部	2027/12/18 08:00	2027/12/19 17:00	毎日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装		新規	
0476535	中部	2027/12/27 15:00	2027/12/27 15:30	単日	金山変	275kV 梅森金山 1L 線路	梅森金山線1LOFケーブル改修		新規	
0477709	中部	2027/12/27 15:00	2027/12/27 16:00	単日	梅森開	275kV 梅森金山 1L 線路	梅森金山1L OFケーブル改修に伴うGIS組立後の試加圧試験		新規	
0479697	中部	2027/12/30 07:30	2027/12/30 08:00	単日	下広井変	275kV 東海下広井 2L 構内	開閉試験		新規	
0479703	中部	2027/12/30 07:30	2027/12/30 08:00	単日	東海変	275kV 東海下広井 2L 構内	開閉試験		新規	
0476317	中部	2027/12/30 08:00	2027/12/31 18:00	連続	下広井変	275kV 東海下広井 1L 線路	275kV東海下広井1L関係機器点検(CB電装品ほか)		新規	
0479690	中部	2027/12/30 08:00	2027/12/30 08:30	単日	南武平町変	275kV 下広井南武平町 1L 構内	開閉試験		新規	
0479696	中部	2027/12/30 08:00	2027/12/30 08:30	単日	下広井変	275kV 東海下広井 1L 構内	開閉試験		新規	
0479698	中部	2027/12/30 08:00	2027/12/30 08:30	単日	下広井変	275kV 下広井南武平町 1L 構内	開閉試験		新規	
0479702	中部	2027/12/30 08:00	2027/12/30 08:30	単日	東海変	275kV 東海下広井 1L 構内	開閉試験		新規	
0478080	中部	2028/01/04 08:00	2028/01/06 22:00	連続	東清水変	275kV 駿河東清水 1L 線路	1FC系統連系試験		新規	
0478078	中部	2028/01/07 08:00	2028/02/04 22:00	連続	東清水変	275kV 駿河東清水 1L 線路	3FC系統連系試験		新規	
0478605	中部	2028/01/11 09:00	2028/01/14 17:00	連続	静岡変	500kV 静岡幹 1L 線路	CB5016電装品取替、作動油交換、LE5016電装品取替		新規	
0479683	中部	2028/01/11 09:00	2028/01/11 09:30	単日	松ケ枝変	275kV 名城松ケ枝 1L 構内	開閉試験		新規	
0479684	中部	2028/01/11 09:00	2028/01/11 09:30	単日	松ケ枝変	275kV 名城松ケ枝 2L 構内	開閉試験		新規	
0476411	中部	2028/01/13 08:00	2028/01/17 18:00	連続	知多第二火発	275kV 知多第二東海 1L 線路	三菱電機製GCB内ガイド不具合合同対策		新規	
0478606	中部	2028/01/13 09:00	2028/01/13 17:00	単日	静岡変	500kV 静岡幹 1L 構内	甲5016電装品取替		新規	
0478608	中部	2028/01/14 09:00	2028/01/14 17:00	単日	静岡変	500kV 静岡幹 1L 構内	Z5016電装品取替		新規	
0478610	中部	2028/01/18 09:00	2028/01/21 17:00	連続	静岡変	500kV 静岡幹 2L 線路	CB5018電装品取替、作動油交換、LE5018電装品取替		新規	
0479625	中部	2028/01/18 09:00	2028/03/01 09:00	連続	南武平町松ケ枝 2L	275kV 南武平町松ケ枝 2L 全線	南武平町松ケ枝線2LOFケーブル改修		新規	
0478611	中部	2028/01/20 09:00	2028/01/20 17:00	単日	静岡変	500kV 静岡幹 2L 構内	甲5018電装品取替		新規	
0478613	中部	2028/01/21 09:00	2028/01/21 17:00	単日	静岡変	500kV 静岡幹 2L 構内	Z5018電装品取替		新規	
0478632	中部	2028/02/15 10:00	2028/02/15 14:00	単日	新佐倉変	275kV 浜岡新佐倉 2L 線路	浜岡新佐倉2L保護 転送しや断送信回路点検		新規	
0478631	中部	2028/02/15 14:00	2028/02/15 17:00	単日	新佐倉変	275kV 浜岡新佐倉 2L 全線	浜岡新佐倉1L保護 転送しや断送信回路点検		新規	
0479851	中部	2028/02/16 08:00	2028/02/16 18:00	単日	佐久間東変 1L	275kV 佐久間東変 1L 線路	【TZA-27-006】新佐久間FC 60Hz変換用変圧器ほか加圧試験		新規	
0479852	中部	2028/02/16 08:00	2028/02/16 18:00	単日	佐久間東変 2L	275kV 佐久間東変 2L 線路	【TZA-27-006】新佐久間FC 60Hz変換用変圧器ほか加圧試験		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0478633	中部	2028/02/16 10:00	2028/02/16 14:00	単日	新佐倉変	275kV 浜岡新佐倉 3L 全線	浜岡新佐倉3L保護 転送しや断送信回路点検		新規	
0478196	中部	2028/03/01 08:00	2028/03/04 22:00	毎日	駿河変	275kV 駿河東清水 1L 線路	1. 3FC系統連系試験(東清水変～駿河変ブラックスタート)		新規	
0478198	中部	2028/03/01 08:00	2028/03/04 22:00	毎日	東清水変	275kV 駿河東清水 1L 線路	1. 3FC系統連系試験(東清水変～駿河変ブラックスタート)		新規	
0476196	中部	2028/03/01 09:00	2028/06/15 15:00	連続	南武平町松ヶ枝 2L	275kV 南武平町松ヶ枝 2L 全線	南武平町松ヶ枝線2LOFケーブル改修		新規	
0476311	中部	2028/03/01 09:00	2028/06/15 15:00	連続	松ヶ枝変	275kV 南武平町松ヶ枝 2L 全線	275kV電力ケーブル(南武平町松ヶ枝線2L)修理に伴うGIS修理		新規	
0476312	中部	2028/03/01 09:00	2028/06/15 15:00	連続	南武平町変	275kV 南武平町松ヶ枝 2L 全線	275kV電力ケーブル(南武平町松ヶ枝線2L)修理に伴うGIS修理		新規	
0478182	中部	2028/03/06 08:00	2028/03/10 17:00	連続	西濃変	275kV 北部西濃 1L 線路	042関係機器点検(GCB・GCS・ES・LS電装品取替;波形ES・LSBOX普		変更	
0476067	中部	2028/03/06 09:00	2028/03/12 17:00	毎日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	防錆塗装		変更	
0476068	中部	2028/03/06 09:00	2028/03/12 17:00	毎日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	防錆塗装		変更	
0476127	中部	2028/03/11 09:00	2028/03/11 16:00	単日	東部額田 1L	275kV 東部額田 1L 全線	東部額田線No20ジャンパーオフ		新規	
0479641	中部	2028/03/11 09:00	2028/03/11 09:30	単日	東部変	275kV 東部額田 1L 構内	開閉試験		新規	
0479726	中部	2028/03/11 09:00	2028/03/11 09:30	単日	額田開	275kV 東部額田 1L 構内	開閉試験		新規	
0476128	中部	2028/03/11 16:00	2028/06/17 09:00	連続	東部額田 1L	275kV 東部額田 1L 区間停止	東部額田線No3～No6間電線張替		新規	
0476372	中部	2028/03/12 09:00	2028/03/12 16:00	単日	東部額田 2L	275kV 東部額田 2L 全線	東部額田線No20ジャンパーオフ		新規	
0479642	中部	2028/03/12 09:00	2028/03/12 09:30	単日	東部変	275kV 東部額田 2L 構内	開閉試験		新規	
0479727	中部	2028/03/12 09:00	2028/03/12 09:30	単日	額田開	275kV 東部額田 2L 構内	開閉試験		新規	
0476373	中部	2028/03/12 16:00	2028/06/18 09:00	連続	東部額田 2L	275kV 東部額田 2L 区間停止	東部額田線No3～No6間電線張替		新規	
0476168	中部	2028/03/23 13:00	2028/03/23 13:10	単日	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線・42～・46間2L試加圧	制約有	新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0516125	北陸	2026/04/01 08:30	2026/04/24 15:30	連続	送電線	七尾大田火力線1L	弛度調整		更新	
0513898	北陸	2026/04/09 08:30	2026/04/09 13:30	単日	加賀変電所	加賀275母連/加賀275丙母線	電圧共通BCU丙アス6年点検		更新	
0513899	北陸	2026/04/09 12:30	2026/04/09 17:30	単日	加賀変電所	加賀275母連/加賀275丁母線	電圧共通BCU丁アス6年点検		更新	
0514059	北陸	2026/04/13 08:30	2026/04/14 17:30	連続	敦賀火力変電所	敦賀火力変連1Tr/敦賀火力変275甲母線	連1Tr1次GISユニット開閉6年・点検6年・手入れ6年(甲母線側)		更新	
0514077	北陸	2026/04/15 08:30	2026/04/16 17:30	連続	敦賀火力変電所	敦賀火力変連1Tr/敦賀火力変275乙母線	連1Tr1次GISユニット開閉6年・点検6年・手入れ6年(乙母線側)		更新	
0516122	北陸	2026/04/21 09:30	2026/04/21 15:30	単日	七尾大田火力	七尾大田火力線1L/大田火力線1L構内(七)	碇子洗浄用ノズル点検(1L MOF用)他		更新	
0516448	北陸	2026/04/22 09:30	2026/04/22 12:00	単日	加賀変電所	加賀275丙母線/加賀275母連	5`7Tr2次BCU、5・6Tr盤取替に伴う丙母線電圧接続		更新	
0516447	北陸	2026/04/22 11:00	2026/04/22 12:30	単日	加賀変電所	加賀275丙母線	5・6Tr盤、5`7Tr2次BCU取替に伴う丙母線無負荷充電		更新	
0516449	北陸	2026/04/22 11:30	2026/04/22 16:00	単日	加賀変電所	加賀275母連/加賀275丁母線	5`7Tr2次BCU、5・6Tr盤取替に伴う丁母線電圧接続		更新	
0516450	北陸	2026/04/22 15:00	2026/04/22 16:30	単日	加賀変電所	加賀275丁母線	5・6Tr盤、5`7Tr2次BCU取替に伴う丁母線無負荷充電		更新	
0514000	北陸	2026/04/24 08:30	2026/04/24 16:00	単日	中能登変電所	七尾大田火力線1L/大田火力線1L構内(中)	七尾大田火力線1LCB 使用前社内検査(外観検査、保護装置試験他)		更新	
0514001	北陸	2026/04/24 15:00	2026/04/24 16:30	単日	中能登変電所	中能登275母連/大田火力線1L構内(中)/中能登275丙母線	七尾大田火力線1LCB 使用前社内検査(常規対地電圧試験)、講評		更新	
0514002	北陸	2026/04/24 15:00	2026/04/24 16:30	単日	中能登変電所	七尾大田火力線1L	七尾大田火力線1LCB使用前社内検査未完了に伴う線路停止		更新	
0514003	北陸	2026/04/24 15:30	2026/04/24 17:30	単日	中能登変電所	七尾大田火力線1L/大田火力線1L構内(中)	七尾大田火力線1LCB取替後のCT位相測定(モニター確認)		更新	
0514262	北陸	2026/04/25 07:30	2026/04/26 17:30	毎日	敦賀火力変電所	敦賀火力線1L/敦賀火力1L構内(敦火)	碇子清掃・碇子洗浄ノズル点検・手入れ		更新	
0513990	北陸	2026/04/25 08:30	2026/04/26 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線1L	鉄塔防錆塗装		更新	
0513992	北陸	2026/04/25 08:30	2026/04/26 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線1L	ボルト取替		更新	
0513994	北陸	2026/04/25 08:30	2026/04/25 17:30	単日	送電線	敦賀火力線1L	東浦線作業に伴う停止		更新	
0516147	北陸	2026/04/25 08:30	2026/04/26 17:30	連続	南条変電所	敦賀火力線1L/敦賀火力1L構内(南条)/南条275乙母線	敦賀火力線1LGIS LS087甲E、LS18操作機構電装品修理		更新	
0513925	北陸	2026/05/12 08:30	2026/05/12 17:30	単日	城端開閉所	城端連系乙側(構内)/関西城端連系母線/関西城端乙母線	LS102操作箱取替(電動→電動)		更新	
0514269	北陸	2026/05/13 07:30	2026/05/21 17:30	連続	中能登変電所	中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-1ShR/※2024→2026年度 変更	1Tr 1次GIS 電装品修理(6年点検含む)		更新	
0514270	北陸	2026/05/13 07:30	2026/05/26 17:30	連続	中能登変電所	中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-1ShR	1Tr、1Tr2次LA、CB091 機器塗装		更新	
0513926	北陸	2026/05/13 08:30	2026/05/13 17:30	単日	城端開閉所	城端連系乙側(構内)/城端開275乙母線	LS104操作箱取替(電動→電動)		更新	
0516120	北陸	2026/05/13 08:30	2026/05/14 17:30	連続	中能登変電所	中能登2Tr	2Tr地震対策改修		更新	
0513929	北陸	2026/05/14 08:30	2026/05/14 17:30	単日	城端開閉所	城端開275母連/城端開275甲母線/関西LS103	LS113操作箱取替(電動→電動)		更新	
0513930	北陸	2026/05/15 08:30	2026/05/15 17:30	単日	城端開閉所	城端開275母連/城端開275乙母線	LS114操作箱取替(電動→電動)		更新	
0514266	北陸	2026/05/18 08:30	2026/05/18 17:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-1ShR/中能登500甲母線/中能登500母連/※2024→2026年度 変更	LS221(GIS) 電装品修理(6年点検含む)		更新	
0514267	北陸	2026/05/19 08:30	2026/05/19 17:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-1ShR/中能登500乙母線/中能登500母連/※2024→2026年度 変更	LS222(GIS) 電装品修理(6年点検含む)		更新	
0516467	北陸	2026/06/01 08:30	2026/06/03 17:30	連続	南条変電所	南条275母連	275kV母連GIS CB操作機構油圧ユニット修理		更新	
0513916	北陸	2026/06/02 07:30	2026/06/02 17:30	単日	越前変電所	越前275丙母線/越前5Tr	5Tr1次GIS(LS55) 開閉・点検6年・操作機構分点12年、5Tr1次GIS現場盤 点検6年		更新	
0514033	北陸	2026/06/02 07:30	2026/06/10 17:30	連続	中能登変電所	中能登2Tr/中能登66-2Tr3次母線/中能登2-1ShR	2Tr 1次GIS 電装品修理、2次CB 092 6年点検・コネクティング処理、3次GIS 6年点検		更新	
0516107	北陸	2026/06/02 07:30	2026/06/02 17:30	単日	越前変電所	越前5Tr/越前275丙母線	5Tr1次GIS(LS55) 開閉・点検・各種手入6年、5Tr1次GIS現場盤 点検6年		更新	
0514056	北陸	2026/06/02 09:00	2026/06/02 17:30	単日	東金津変電所	東金津275母連	CB300開閉・点検6年・各種手入れ		更新	
0516135	北陸	2026/06/02 09:00	2026/06/02 17:30	単日	東金津変電所	東金津275母連	CB300 開閉・点検・各種手入・コネクティング再処理6年		更新	
0513917	北陸	2026/06/03 07:30	2026/06/03 17:30	単日	越前変電所	越前275丁母線/越前5Tr	5Tr1次GIS(LS56) 開閉・点検6年・操作機構分点12年、5Tr1次GIS現場盤 点検6年		更新	
0516108	北陸	2026/06/03 07:30	2026/06/03 17:30	単日	越前変電所	越前5Tr/越前275丁母線	5Tr1次GIS(LS56) 開閉・点検・各種手入6年、5Tr1次GIS現場盤 点検6年		更新	
0516123	北陸	2026/06/03 07:30	2026/06/03 17:30	単日	送電線	七尾大田火力線1L	がいし連スベーサ取付、がいし掃除		更新	
0514057	北陸	2026/06/03 09:00	2026/06/03 13:30	単日	東金津変電所	東金津275母連/東金津275丙母線	275kVDP自動切替盤(1)(2) 点検6年		更新	
0516136	北陸	2026/06/03 09:00	2026/06/03 13:30	単日	東金津変電所	東金津275母連/東金津275丙母線	275kVDP自動切替盤(1)(2) 点検6年		更新	
0514058	北陸	2026/06/03 12:30	2026/06/03 17:30	単日	東金津変電所	東金津275母連/東金津275丁母線	275kVDP自動切替盤(1)(2) 点検6年		更新	
0516137	北陸	2026/06/03 12:30	2026/06/03 17:30	単日	東金津変電所	東金津275母連/東金津275丁母線	275kVDP自動切替盤(1)(2) 点検6年		更新	
0513884	北陸	2026/06/03 13:30	2026/06/03 15:00	単日	加賀変電所	加賀275母連/加賀275丁母線/加賀154B母線/加賀5Tr	5Trおよび1次・2次・3次電力ケーブル試充電、PD2次検相		更新	
0513901	北陸	2026/06/03 14:00	2026/06/03 17:00	単日	加賀変電所	加賀275母連/加賀154B母線/加賀5Tr/加賀77-5Tr3次母線/加賀5-1ShR	5Tr盤方向試験(1-3次)		更新	
0513902	北陸	2026/06/03 16:00	2026/06/03 18:00	単日	加賀変電所	加賀275母連/加賀154B母線/加賀5Tr/加賀77-5Tr3次母線/加賀5-1ShR	5Tr盤方向試験(2-3次)		更新	
0516557	北陸	2026/06/04 16:30	2026/06/04 18:00	単日	加賀変電所	加賀275丁母線/加賀275母連/加賀8Tr/[充電]LSKO-8甲 仮ケーブル 6Tr3次BPD[停止]ShR SC STr	[6Tr取替]8Tr3次`6Tr3次仮ケーブル試充電・三次BPD二次検相		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0516558	北陸	2026/06/04 17:00	2026/06/04 19:00	単日	加賀変電所	加賀275丁母線/加賀275母連/加賀8Tr/ 加賀6-1ShR/[停止]6-2ShR、6-1SC、6STr	[6Tr取替]8Tr盤87方向試験(1-3次)		新規	
0513991	北陸	2026/06/06 08:30	2026/06/07 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線2L	鉄塔防錆塗装		更新	
0513993	北陸	2026/06/06 08:30	2026/06/07 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線2L	ボルト取替		更新	
0513995	北陸	2026/06/06 08:30	2026/06/06 17:30	単日	送電線	敦賀火力線2L	東浦線作業に伴う停止		更新	
0514261	北陸	2026/06/06 08:30	2026/06/07 17:30	毎日	敦賀火力変電所	敦賀火力線2L/敦賀火力2L構内(敦火) 敦賀火力線2L/敦賀火力2L構内(南条)/南 条275乙母線	罎子清掃・罎子洗浄ノズル点検・手入れ 敦賀火力線2LGIS LS088甲E、LS24操作機構電装品修理		更新	
0516148	北陸	2026/06/06 08:30	2026/06/07 17:30	連続	南条変電所	越前275丙母線/越前6Tr	6Tr1次GIS(LS57) 開閉・点検6年・操作機構分点12年、6Tr1 次GIS現場盤 点検6年		更新	
0513918	北陸	2026/06/08 07:30	2026/06/08 17:30	単日	越前変電所	越前275丙母線/越前6Tr	6Tr1次GIS(LS57) 開閉・点検・各種手入6年、6Tr1次GIS現 場盤 点検6年		更新	
0516109	北陸	2026/06/08 07:30	2026/06/08 17:30	単日	越前変電所	越前275丙母線/越前6Tr	2Tr1次GIS(LS225) 6年点検・電装品修理		更新	
0514034	北陸	2026/06/08 08:30	2026/06/08 17:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr/中能登66-2Tr3次母線/中能 登500甲母線/中能登500母連/中能登2- 1ShR	6Tr1次GIS(LS58) 開閉・点検6年・操作機構分点12年、6Tr1 次GIS現場盤 点検6年		更新	
0513919	北陸	2026/06/09 07:30	2026/06/09 17:30	単日	越前変電所	越前275丁母線/越前6Tr	6Tr1次GIS(LS58) 開閉・点検・各種手入6年、6Tr1次GIS現 場盤 点検6年		更新	
0516110	北陸	2026/06/09 07:30	2026/06/09 17:30	単日	越前変電所	越前275丁母線/越前6Tr	2Tr1次GIS(LS226) 6年点検・電装品修理		更新	
0514035	北陸	2026/06/09 08:30	2026/06/09 17:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr/中能登66-2Tr3次母線/中能 登500乙母線/中能登500母連/中能登2- 1ShR			更新	
0516144	北陸	2026/06/09 12:30	2026/06/09 17:30	単日	東金津変電所	東金津275丁母線/[保安停止]	CB025点検に伴う保安停止		更新	
0514268	北陸	2026/06/12 07:30	2026/06/20 17:30	連続	中能登変電所	中能登3Tr/中能登66-3Tr3次母線/中能 登3-1ShR	3Tr 1次GIS 電装品修理(6年点検含む)		更新	
0514020	北陸	2026/06/15 08:30	2026/07/10 09:30	連続	中能登変電所	七尾大田火力線2L/大田火力線2L構内 (中)/43D56.43C(A.B).43RCA(B).0.43RCA(B)モック	七尾大田火力線2LCB、甲ELS取替		更新	
0514021	北陸	2026/06/15 08:30	2026/07/03 09:30	毎日	中能登変電所	中能登275母連/中能登275丙母線	七尾太田火力線2LCB取替に伴う丙母線停止		更新	
0516124	北陸	2026/06/15 08:30	2026/07/10 15:30	連続	送電線	七尾大田火力線2L	地度調整、がいし掃除		更新	
0513885	北陸	2026/06/16 08:30	2026/06/16 15:30	単日	加賀変電所	加賀500甲母線/加賀500母連/500kV43- 87HA(加賀)/500kV43CBZHA(加賀)/500タ イ43-87THA(加賀)	500kV母線分離Ry取替に伴う甲母線電圧取込、BP(A)・母連 Ry(A)切替試験		更新	
0513863	北陸	2026/06/16 14:30	2026/06/16 16:30	単日	加賀変電所	加賀500甲母線	500kV母線分離Ry取替に伴う甲母線電圧検相		更新	
0513864	北陸	2026/06/17 08:30	2026/06/17 15:30	単日	加賀変電所	加賀500乙母線/加賀500母連/500kV43- 87HB(加賀)/500kV43CBZHB(加賀)/500タ イ43-87THB(加賀)	500kV母線分離Ry取替に伴う乙母線電圧取込、BP(B)・母連 Ry(B)切替試験		更新	
0514263	北陸	2026/06/17 08:30	2026/06/17 17:30	単日	中能登変電所	中能登3Tr/中能登66-3Tr3次母線/中能 登3-1ShR/中能登500甲母線/中能登500 母連	LS231(GIS) 電装品修理(6年点検含む)		更新	
0513865	北陸	2026/06/17 14:30	2026/06/17 16:30	単日	加賀変電所	加賀500乙母線	500kV母線分離Ry取替に伴う乙母線電圧検相		更新	
0513866	北陸	2026/06/17 15:30	2026/06/17 17:00	単日	加賀変電所	加賀500母連	500kV母線分離Ry取替に伴う位相測定		更新	
0514264	北陸	2026/06/18 08:30	2026/06/18 17:30	単日	中能登変電所	中能登3Tr/中能登66-3Tr3次母線/中能 登3-1ShR/中能登500乙母線/中能登500 母連	LS232(GIS) 電装品修理(6年点検含む)		更新	
0513966	北陸	2026/06/20 07:30	2026/06/20 17:30	単日	送電線	中央幹線1L	がいし連スベーサ修理		更新	
0513886	北陸	2026/06/20 08:30	2026/06/20 11:30	単日	加賀変電所	加賀275丙母線/加賀275母連	中央幹線N-1電制設置に伴う275kV丙母線電圧取込み		更新	
0513887	北陸	2026/06/20 08:30	2026/06/20 16:30	単日	加賀変電所	中央幹線1L構内(加賀)/中幹1L43CA(加 賀)/中幹1L43CB(加賀)/中幹 1L43RCA0(加賀)/中幹1L43RCAM(加賀)/ 中幹1L43RCB0(加賀)/中幹1L43RCBM(加 賀)	中央幹線N-1電制設置に伴う切替		更新	
0513922	北陸	2026/06/20 08:30	2026/06/20 17:30	単日	新富山変電所	新富山幹線1L構内	ケーブル切替・試験		更新	
0513932	北陸	2026/06/20 08:30	2026/06/20 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線1L/中央幹線1L構内(加賀)/加賀 275丙母線/加賀275母連	鳥害対策修理		更新	
0513888	北陸	2026/06/20 10:30	2026/06/20 12:30	単日	加賀変電所	加賀275丙母線	中央幹線N-1電制設置に伴う275kV丙母線検相		更新	
0513890	北陸	2026/06/20 12:30	2026/06/20 15:30	単日	加賀変電所	加賀275丁母線/加賀275母連	中央幹線N-1電制設置に伴う275kV丁母線電圧取込み		更新	
0513892	北陸	2026/06/20 14:30	2026/06/20 16:30	単日	加賀変電所	加賀275丁母線	中央幹線N-1電制設置に伴う275kV丁母線検相		更新	
0513889	北陸	2026/06/20 15:30	2026/06/20 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線1L構内(加賀)	中央幹線N-1電制設置に伴う中央幹線1L位相測定		更新	
0513942	北陸	2026/06/20 16:30	2026/06/20 18:00	単日	新富山変電所	新富山幹線1L構内	ケーブル接続後の潮流確認試験		更新	
0513967	北陸	2026/06/21 07:30	2026/06/21 17:30	単日	送電線	中央幹線2L	がいし連スベーサ修理		更新	
0513874	北陸	2026/06/21 08:30	2026/06/21 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線2L/中央幹線2L構内(加賀)/加賀 275丁母線/加賀275母連	鳥害対策修理		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0513891	北陸	2026/06/21 08:30	2026/06/21 16:30	単日	加賀変電所	中央幹線2L構内(加賀)/中幹2L43CA(加賀)/中幹2L43CB(加賀)/中幹2L43RCA0(加賀)/中幹2L43RCAM(加賀)/中幹2L43RCB0(加賀)/中幹2L43RCBM(加賀)	中央幹線N-1電制設置に伴う切替		更新	
0513938	北陸	2026/06/21 08:30	2026/06/21 17:30	単日	新富山変電所	新富山幹線2L構内	ケーブル切替・試験		更新	
0516559	北陸	2026/06/21 08:30	2026/06/21 17:30	単日	送電線	新富山幹線2L	がいし修理		新規	
0513893	北陸	2026/06/21 15:30	2026/06/21 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線2L構内(加賀)	中央幹線N-1電制設置に伴う中央幹線2L位相測定		更新	
0513941	北陸	2026/06/21 16:30	2026/06/21 18:00	単日	新富山変電所	新富山幹線2L構内	ケーブル接続後の潮流確認試験		更新	
0513935	北陸	2026/06/29 09:30	2026/06/29 15:30	単日	七尾大田火力	七尾大田火力線2L/大田火力線2L構内(七)	碍子洗浄用ノズル点検(2L MOF用)他		更新	
0513974	北陸	2026/07/01 07:30	2026/07/01 17:30	単日	送電線	七尾大田火力線2L	がいし連スペース取付		更新	
0514036	北陸	2026/07/06 07:30	2026/07/07 17:30	連続	中能登変電所	中能登500甲母線/中能登500母連/※追加件名	500kV 甲母線 延長母線GIS 電装品修理		更新	
0514037	北陸	2026/07/08 07:30	2026/07/09 17:30	連続	中能登変電所	中能登500乙母線/中能登500母連/※追加件名	500kV 乙母線 延長母線GIS 電装品修理、PT分配1-2盤6年点検		更新	
0514022	北陸	2026/07/10 08:30	2026/07/10 16:00	単日	中能登変電所	七尾大田火力線2L/大田火力線2L構内(中)	七尾大田火力線2LCB 使用前社内検査(外観検査、保護装置試験他)		更新	
0514023	北陸	2026/07/10 15:00	2026/07/10 16:30	単日	中能登変電所	中能登275母連/大田火力線2L構内(中)/中能登275丙母線	七尾大田火力線2LCB 使用前社内検査(常規対地電圧試験)、講評		更新	
0514024	北陸	2026/07/10 15:00	2026/07/10 16:30	単日	中能登変電所	七尾大田火力線2L	七尾大田火力線2LCB使用前社内検査未完に伴う停止		更新	
0514025	北陸	2026/07/10 15:30	2026/07/10 17:30	単日	中能登変電所	七尾大田火力線2L/大田火力線2L構内(中)	七尾大田火力線2LCB取替後のCT位相測定(モニター確認)		更新	
0514038	北陸	2026/07/14 08:30	2026/07/14 13:30	単日	中能登変電所	中能登275丙母線/中能登275母連	275kV 母連・電圧共通 BCU盤 6年点検		更新	
0514039	北陸	2026/07/14 12:30	2026/07/14 17:30	単日	中能登変電所	中能登275丁母線/中能登275母連	275kV 母連・電圧共通 BCU盤 6年点検		更新	
0516560	北陸	2026/07/28 08:30	2026/07/29 17:30	連続	中能登変電所	中能登2Tr	2号変圧器地震対策改修のうちBCU改修		新規	
0516561	北陸	2026/08/05 08:30	2026/08/06 17:30	連続	中能登変電所	中能登2Tr	2号変圧器地震対策改修のうち2号変圧器-B盤改修		新規	
0516562	北陸	2026/08/07 08:30	2026/08/07 17:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr	2号変圧器地震対策改修のうち切替・結合試験		新規	
0516114	北陸	2026/08/25 08:30	2026/08/25 17:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr/中能登2-1ShR/中能登66-2Tr3次母線	2TrS相取替使用前自主検査リハーサル		更新	
0516115	北陸	2026/08/25 08:30	2026/08/25 17:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr/中能登2-1ShR/中能登66-2Tr3次母線	2TrS相取替使用前自主検査(外観検査、接地抵抗、保護装置試験、制御試験)		更新	
0516116	北陸	2026/08/26 08:30	2026/08/26 14:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr/中能登2-1ShR/中能登66-2Tr3次母線	2TrS相取替使用前自主検査(絶縁抵抗測定)、Tr二次リード接続		更新	
0516117	北陸	2026/08/26 13:30	2026/08/26 16:00	単日	中能登変電所	中能登2Tr/中能登275丙母線/[停止]2Tr3次母線 2-1ShR.275母連.CB092「切」LS302甲「切」	2TrS相取替後の試充電・講評、Tr二次・三次配電盤検相		更新	
0514060	北陸	2026/08/31 08:30	2026/08/31 11:30	単日	南条変電所	南条275甲母線	[オシロ取替工事]新オシロ 甲母線電圧2次電圧ケーブル接続		更新	
0514061	北陸	2026/08/31 10:30	2026/08/31 12:30	単日	南条変電所	南条275甲母線[試験使用]	[オシロ取替工事]新オシロ 甲母線電圧2次電圧検相		更新	
0514062	北陸	2026/08/31 12:30	2026/08/31 15:30	単日	南条変電所	南条275乙母線	[オシロ取替工事]新オシロ 乙母線電圧2次電圧ケーブル接続		更新	
0514063	北陸	2026/08/31 14:30	2026/08/31 16:30	単日	南条変電所	南条275乙母線[試験使用]	[オシロ取替工事]新オシロ 乙母線電圧2次電圧検相		更新	
0513860	北陸	2026/09/04 13:30	2026/09/04 15:00	単日	加賀変電所	加賀275母連/加賀275丁母線/加賀154B母線/加賀6Tr	6Trおよび1次・2次・3次電力ケーブル試充電、PD2次検相		更新	
0513861	北陸	2026/09/04 14:00	2026/09/04 17:00	単日	加賀変電所	加賀275母連/加賀275丁母線/加賀6Tr/加賀77-6Tr3次母線/加賀6-1ShR	6Tr盤方向試験(1-3次)		更新	
0513862	北陸	2026/09/04 16:00	2026/09/04 18:00	単日	加賀変電所	加賀275母連/加賀154B母線/加賀6Tr/加賀77-5Tr3次母線/加賀5-1ShR	6Tr盤方向試験(2-3次)		更新	
0516465	北陸	2026/09/07 08:30	2026/09/12 17:30	毎日	送電線	新富山幹線1L	鉄塔防錆塗装 定期点検		更新	
0516453	北陸	2026/09/09 07:30	2026/09/09 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線2L(構内)/城端開275甲母線/関西LS103	LS107・108操作箱取替(電動→電動)		更新	
0516454	北陸	2026/09/09 16:30	2026/09/09 19:30	単日	城端開閉所	新富山幹線2L(構内)/城端開275乙母線	LS107・108操作箱取替(電動→電動)		更新	
0516455	北陸	2026/09/10 07:30	2026/09/10 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線1L(構内)/城端開275甲母線/関西LS103	LS109・110操作箱取替(電動→電動)		更新	
0513981	北陸	2026/09/10 08:30	2026/09/10 13:30	単日	新福井変電所	新福井275甲母線/新福井275母連	275kVVD自切盤・275kVVD自切盤ii 点検6年、275kV電圧共通BCU盤 点検6年		更新	
0514073	北陸	2026/09/10 08:30	2026/09/10 16:30	単日	南条変電所	南条275母連/275kV43BUH(南条)	[オシロ取替工事]275kV母連 切替・試験		更新	
0516143	北陸	2026/09/10 08:30	2026/09/10 13:30	単日	新福井変電所	新福井275甲母線/新福井275母連	275kVVD自切盤・275kVVD自切盤ii 点検6年、275kV電圧共通BCU盤 点検6年		更新	
0513982	北陸	2026/09/10 12:30	2026/09/10 17:30	単日	新福井変電所	新福井275乙母線/新福井275母連	275kVVD自切盤・275kVVD自切盤ii 点検6年、275kV電圧共通BCU盤 点検6年		更新	
0516142	北陸	2026/09/10 12:30	2026/09/10 17:30	単日	新福井変電所	新福井275乙母線/新福井275母連	275kVVD自切盤・275kVVD自切盤ii 点検6年、275kV電圧共通BCU盤 点検6年		更新	
0516456	北陸	2026/09/10 16:30	2026/09/10 19:30	単日	城端開閉所	中央幹線1L(構内)/城端開275乙母線	LS109・110操作箱取替(電動→電動)		更新	
0516457	北陸	2026/09/11 07:30	2026/09/11 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線2L(構内)/城端開275甲母線/関西LS103	LS111・112操作箱取替(電動→電動)		更新	
0516461	北陸	2026/09/11 08:30	2026/09/11 18:30	単日	城端開閉所	新富山幹線1L/新富山幹線1L(構内)/城端開275甲母線/関西LS103	新富山線1L Yブス碍子修理		更新	
0516458	北陸	2026/09/11 16:30	2026/09/11 19:30	単日	城端開閉所	中央幹線2L(構内)/城端開275乙母線	LS111・112操作箱取替(電動→電動)		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0516464	北陸	2026/09/14 08:30	2026/09/16 18:30	連続	城端開閉所	新富山幹線2L/新富山幹線2L(構内)	新富山幹線2L 送電線引込鉄構碍子金物修理		更新	
0516466	北陸	2026/09/14 08:30	2026/09/19 17:30	毎日	送電線	新富山幹線2L	鉄塔防錆塗装 定期点検		更新	
0513977	北陸	2026/09/15 08:30	2026/09/15 17:30	単日	新福井変電所	新福井275甲母線/新福井1Tr/新福井33母線1B/新福井1-1ShR/新福井1-2ShR	LS53 開閉・点検・精密点検・各種手入12年		更新	
0516138	北陸	2026/09/15 08:30	2026/09/15 17:30	単日	新福井変電所	新福井275甲母線/新福井1Tr/新福井33母線1B/新福井1-1ShR/新福井1-2ShR	LS53 開閉・点検・精密点検・各種手入12年		更新	
0513978	北陸	2026/09/16 08:30	2026/09/16 17:30	単日	新福井変電所	新福井275乙母線/新福井1Tr/新福井33母線1B/新福井1-1ShR/新福井1-2ShR	LS54 開閉・点検・精密点検・各種手入12年		更新	
0516139	北陸	2026/09/16 08:30	2026/09/16 17:30	単日	新福井変電所	新福井275乙母線/新福井1Tr/新福井33母線1B/新福井1-1ShR/新福井1-2ShR	LS54 開閉・点検・精密点検・各種手入12年		更新	
0516463	北陸	2026/09/16 08:30	2026/09/16 18:30	単日	城端開閉所	新富山幹線2L/新富山幹線2L(構内)/城端開275甲母線/関西LS103	新富山線2L Yブス碍子修理		更新	
0513979	北陸	2026/09/17 08:30	2026/09/17 17:30	単日	新福井変電所	新福井275甲母線/新福井2Tr/新福井2ShR	LS57 開閉・点検・精密点検・各種手入12年		更新	
0516140	北陸	2026/09/17 08:30	2026/09/17 17:30	単日	新福井変電所	新福井275甲母線/新福井2Tr/新福井2ShR	LS57 開閉・点検・精密点検・各種手入12年		更新	
0513980	北陸	2026/09/18 08:30	2026/09/18 17:30	単日	新福井変電所	新福井275乙母線/新福井2Tr/新福井2ShR	LS58 開閉・点検・精密点検・各種手入12年		更新	
0516141	北陸	2026/09/18 08:30	2026/09/18 17:30	単日	新福井変電所	新福井275乙母線/新福井2Tr/新福井2ShR	LS58 開閉・点検・精密点検・各種手入12年		更新	
0513976	北陸	2026/09/24 08:30	2026/09/24 17:30	単日	新福井変電所	新福井275乙母線/新福井1Tr	[各変圧器後備盤取替]1Tr1次後備保護盤切替(電圧取込含む)		更新	
0516119	北陸	2026/09/24 08:30	2026/09/24 18:30	単日	城端開閉所	城端開275乙母線/城端連系乙側(構内)/城端開LS102	鉄構碍子金物修理(連系乙ブスLS104側)		更新	
0516127	北陸	2026/09/24 16:30	2026/09/24 18:30	単日	新福井変電所	新福井275乙母線/新福井1Tr/[試験使用]	[各変圧器後備盤取替]1Tr 位相測定		更新	
0516118	北陸	2026/09/25 08:30	2026/09/25 18:30	単日	城端開閉所	城端開275乙母線/城端連系乙側(構内)/城端開LS102/関西城端開275乙母線	鉄構碍子金物修理(連系乙ブスLS102側)		更新	
0516128	北陸	2026/09/25 08:30	2026/09/25 17:30	単日	新福井変電所	新福井275乙母線/新福井2Tr	[各変圧器後備盤取替]2Tr1次後備保護盤切替(電圧取込含む)		更新	
0516129	北陸	2026/09/25 16:30	2026/09/25 18:30	単日	新福井変電所	新福井275乙母線/新福井2Tr/[試験使用]	[各変圧器後備盤取替]2Tr 位相測定		更新	
0513882	北陸	2026/09/28 08:30	2026/09/29 17:30	連続	加賀変電所	加賀500母連/加賀500甲母線	GIS 500kV母連ユニット(LS329) 6年点検・電装品修理他		更新	
0516154	北陸	2026/09/28 08:30	2026/09/28 17:30	単日	新福井変電所	新福井275乙母線/新福井3Tr	[各変圧器後備盤取替]3Tr1次後備保護盤切替(電圧取込含む)		更新	
0516130	北陸	2026/09/28 16:30	2026/09/28 18:30	単日	新福井変電所	新福井275乙母線/新福井3Tr/[試験使用]	[各変圧器後備盤取替]3Tr 位相測定		更新	
0516131	北陸	2026/09/29 08:30	2026/09/29 17:30	単日	新福井変電所	新福井275乙母線/新福井4Tr	[各変圧器後備盤取替]4Tr1次後備保護盤切替(電圧取込含む)		更新	
0516132	北陸	2026/09/29 16:30	2026/09/29 18:30	単日	新福井変電所	新福井275乙母線/新福井4Tr/[試験使用]	[各変圧器後備盤取替]4Tr 位相測定		更新	
0513881	北陸	2026/09/30 08:30	2026/10/06 17:30	連続	加賀変電所	加賀500母連/500タイ43-87THA(加賀/500タイ43-87THB(加賀/500kVタイ43BUH(加賀)	GIS 500kV母連ユニット(CB5300-2) 12年点検他		更新	
0513883	北陸	2026/09/30 08:30	2026/10/01 17:30	連続	加賀変電所	加賀500母連/加賀500乙母線	GIS 500kV母連ユニット(LS330) 6年点検・電装品修理		更新	
0516111	北陸	2026/10/05 07:30	2026/10/07 18:30	連続	越前変電所	南条越前線1L/南条越前1L構内(越前)	南条越前線1LGIS(CB075) 開閉・点検・各種手入6年・操作機構分点12年		更新	
0514014	北陸	2026/10/05 08:30	2026/10/07 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	防錆塗装(No.65)		更新	
0516149	北陸	2026/10/05 08:30	2026/10/07 17:30	連続	南条変電所	南条越前1L構内(南条)/南条275甲母線	南条越前線1LGIS LS15操作機構・現地盤電装品修理		更新	
0516563	北陸	2026/10/05 08:30	2026/10/07 17:30	毎日	南条変電所	南条越前1L構内(南条)/南条275甲母線	南条越前線1LGIS LS15操作機構・現地盤電装品修理		新規	
0516565	北陸	2026/10/05 08:30	2026/10/07 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	鉄塔防錆塗装		新規	
0516566	北陸	2026/10/05 08:30	2026/10/07 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	ボルト取替・電線サンプル調査		新規	
0516112	北陸	2026/10/06 07:30	2026/10/06 18:30	単日	越前変電所	南条越前1L構内(越前)/越前275丙母線	南条越前線1LGIS(LS45) 開閉・点検・各種手入6年		更新	
0513868	北陸	2026/10/06 16:30	2026/10/06 18:00	単日	加賀変電所	加賀500母連/加賀500乙母線	母連ユニット6年点検に伴う母線LSインターロック確認試験		更新	
0516113	北陸	2026/10/07 07:30	2026/10/07 18:30	単日	越前変電所	南条越前1L構内(越前)/越前275丁母線	南条越前線1LGIS(LS46) 開閉・点検・各種手入6年		更新	
0513871	北陸	2026/10/07 08:30	2026/10/07 17:30	単日	加賀変電所	加賀500母連/加賀500甲母線	GIS 500kV母線PTユニット(甲) 6年点検他		更新	
0513872	北陸	2026/10/08 08:30	2026/10/08 17:30	単日	加賀変電所	加賀500母連/加賀500乙母線	GIS 500kV母線PTユニット(乙) 6年点検他		更新	
0514068	北陸	2026/10/17 08:30	2026/10/17 16:30	単日	南条変電所	敦賀火力1L構内(南条)/南条275乙母線	[オシロ取替工事]敦賀火力線1L 切替・試験		更新	
0514070	北陸	2026/10/18 08:30	2026/10/18 16:30	単日	南条変電所	敦賀火力2L構内(南条)/南条275乙母線	[オシロ取替工事]敦賀火力線2L 切替・試験		更新	
0514015	北陸	2026/10/19 08:30	2026/10/21 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	防錆塗装(No.65)		更新	
0516150	北陸	2026/10/19 08:30	2026/10/21 17:30	連続	南条変電所	南条越前2L構内(南条)	南条越前線2LGIS 現地盤電装品修理		更新	
0516567	北陸	2026/10/19 08:30	2026/10/21 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	鉄塔防錆塗装		新規	
0516568	北陸	2026/10/19 08:30	2026/10/21 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	ボルト取替		新規	
0514050	北陸	2026/10/26 07:30	2026/10/27 17:30	連続	中能登変電所	中能登3Tr/中能登66-3Tr3次母線/中能登3-1ShR	3Tr (R相) LTC操作機構修理(電装品取替修理)・SEリレー修理		更新	
0516151	北陸	2026/10/26 08:30	2026/10/28 17:30	連続	南条変電所	南条275乙母線/南条275乙母線	275kV乙母線BE操作機構・現地盤電装品修理		更新	
0516152	北陸	2026/10/26 08:30	2026/10/28 17:30	連続	南条変電所	南条275乙母線/南条275母連/南条275乙母線	母線連絡LS20 操作機構・現地盤電装品修理		更新	
0514051	北陸	2026/10/28 07:30	2026/10/29 17:30	連続	中能登変電所	中能登3Tr/中能登66-3Tr3次母線/中能登3-1ShR	3Tr (S相) LTC操作機構修理(電装品取替修理)・SEリレー修理		更新	
0514052	北陸	2026/10/30 07:30	2026/10/31 17:30	連続	中能登変電所	中能登3Tr/中能登66-3Tr3次母線/中能登3-1ShR	3Tr (T相) LTC操作機構修理(電装品取替修理)・SEリレー修理		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0514090	北陸	2026/11/05 08:00	2026/11/05 12:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/甲BUSPT	[越前嶺南線PSC装置撤去]甲母線BPD制御ケーブル撤去		更新	
0514091	北陸	2026/11/05 12:00	2026/11/05 18:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/乙BUSPT	[越前嶺南線PSC装置撤去]乙母線BPD制御ケーブル撤去		更新	
0513970	北陸	2026/11/09 07:30	2026/11/13 17:30	毎日	送電線	志賀原子力線1L	ジャンパ補強装置修理、がいし連スベサ取付		更新	
0514047	北陸	2026/11/09 07:30	2026/11/13 17:30	連続	中能登変電所	志賀原線1L構内(中能)	CB077 12年点検・コキング処理、志賀原線1L BCU盤 6年点検		更新	
0516460	北陸	2026/11/09 07:30	2026/11/11 18:30	連続	城端閉閉所	新富山幹線1L/新富山幹線1L(構内)	新富山幹線1L 送電線引込鉄構碍子金物修理		更新	
0514016	北陸	2026/11/10 08:30	2026/11/11 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	鉄塔防錆塗装		更新	
0514018	北陸	2026/11/10 08:30	2026/11/11 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	ボルト取替、電線サンプル調査		更新	
0514064	北陸	2026/11/11 08:30	2026/11/11 16:30	単日	南条変電所	南条越前1L構内(南条)/南条275乙母線	[オシロ取替工事]南条越前線1L 切替・試験		更新	
0516451	北陸	2026/11/11 09:30	2026/11/11 12:30	単日	加賀変電所	加賀275丙母線/加賀275母連	5"7Tr2次BCU、5・6Tr盤取替に伴う丙母線電圧切り離し		更新	
0516452	北陸	2026/11/11 11:30	2026/11/11 15:30	単日	加賀変電所	加賀275母連/加賀275丁母線	5"7Tr2次BCU、5・6Tr盤取替に伴う丁母線電圧切り離し		更新	
0514017	北陸	2026/11/12 08:30	2026/11/13 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	鉄塔防錆塗装		更新	
0514019	北陸	2026/11/12 08:30	2026/11/13 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	ボルト取替		更新	
0514066	北陸	2026/11/12 08:30	2026/11/12 16:30	単日	南条変電所	南条越前2L構内(南条)/南条275乙母線	[オシロ取替工事]南条越前線2L 切替・試験		更新	
0513920	北陸	2026/11/13 14:30	2026/11/13 16:00	単日	加賀変電所	加賀275母連/加賀275丁母線/加賀154B母線/加賀7Tr	7Tr2次電力ケーブル試充電、PD2次検相		更新	
0513921	北陸	2026/11/13 15:00	2026/11/13 17:30	単日	加賀変電所	加賀275母連/加賀275丁母線/加賀154B母線/加賀7Tr	7Tr盤方向試験、位相測定他		更新	
0514048	北陸	2026/11/16 07:30	2026/11/20 17:30	連続	中能登変電所	志賀原線2L構内(中能)	CB078 12年点検・コキング処理		更新	
0514049	北陸	2026/11/16 07:30	2026/11/16 17:30	単日	中能登変電所	志賀原線2L構内(中能)/志賀原子力線2L	志賀原線2L BCU盤 6年点検、2L LA 12年点検		更新	
0516126	北陸	2026/11/16 07:30	2026/11/17 17:30	毎日	送電線	志賀原子力線2L	がいし連スベサ取付		更新	
0514075	北陸	2026/11/16 08:30	2026/11/16 11:30	単日	南条変電所	南条275甲母線	[オシロ取替工事]旧オシロ 甲母線電圧2次電圧ケーブル切離し		更新	
0516133	北陸	2026/11/16 10:30	2026/11/16 12:30	単日	南条変電所	南条275甲母線/[試験使用]	[オシロ取替工事]新オシロ 甲母線電圧2次電圧検相		更新	
0514076	北陸	2026/11/16 12:30	2026/11/16 15:30	単日	南条変電所	南条275乙母線	[オシロ取替工事]旧オシロ 乙母線電圧2次電圧ケーブル切離し		更新	
0516134	北陸	2026/11/16 14:30	2026/11/16 16:30	単日	南条変電所	南条275乙母線/[試験使用]	[オシロ取替工事]新オシロ 乙母線電圧2次電圧検相		更新	
0516564	北陸	2026/12/02 08:30	2026/12/04 17:30	毎日	南条変電所	南条1Tr/南条275甲母線/南条1ShR/南条154-INGR/南条1STr/南条275甲母線	1Tr1次GIS LS13操作機構、現地盤電装品修理		新規	
0514078	北陸	2026/12/07 08:30	2026/12/07 13:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力変275甲母線	275kVPT自動切替盤点検6年(甲母線側)		更新	
0514079	北陸	2026/12/07 12:30	2026/12/07 17:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力変275乙母線	275kVPT自動切替盤点検6年(乙母線側)		更新	
0514030	北陸	2027/03/01 08:30	2027/03/01 15:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr	500Tr(1.3Tr)N-1電制設置に伴う1Tr切替		更新	
0514031	北陸	2027/03/01 14:30	2027/03/01 17:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr/[試験使用]	500Tr(1.3Tr)N-1電制設置による1Tr潮流試験(位相測定)		更新	
0514032	北陸	2027/03/02 08:30	2027/03/02 15:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr	500Tr(2Tr)N-1電制設置に伴う2Tr切替		更新	
0514044	北陸	2027/03/02 14:30	2027/03/02 17:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr/[試験使用]	500Tr(2Tr)N-1電制設置による2Tr潮流試験(位相測定)		更新	
0514045	北陸	2027/03/03 08:30	2027/03/03 15:30	単日	中能登変電所	中能登3Tr	500Tr(1.3Tr)N-1電制設置に伴う3Tr切替		更新	
0514046	北陸	2027/03/03 14:30	2027/03/03 17:30	単日	中能登変電所	中能登3Tr/[試験使用]	500Tr(1.3Tr)N-1電制設置による3Tr潮流試験(位相測定)		更新	
0514026	北陸	2027/03/15 08:30	2027/03/15 11:30	単日	中能登変電所	中能登275丙母線	500TrN-1電制設置に伴う275kV母線電圧取込		更新	
0514027	北陸	2027/03/15 10:30	2027/03/15 13:30	単日	中能登変電所	中能登275丙母線/[試験使用]	500TrN-1電制設置に伴う275kV母線電圧検相		更新	
0514028	北陸	2027/03/15 12:30	2027/03/15 15:30	単日	中能登変電所	中能登275丁母線	500TrN-1電制設置に伴う275kV母線電圧取込		更新	
0514029	北陸	2027/03/15 14:30	2027/03/15 17:30	単日	中能登変電所	中能登275丁母線/[試験使用]	500TrN-1電制設置に伴う275kV母線電圧検相		更新	
0514053	北陸	2027/03/16 07:30	2027/03/17 17:30	毎日	中能登変電所	七尾大田火力線1L/大田火力線1L構内(中)	LS083甲・083甲E 操作機構修理		更新	
0514054	北陸	2027/03/18 07:30	2027/03/19 17:30	毎日	中能登変電所	七尾大田火力線2L/大田火力線2L構内(中)	LS084甲・043甲E 操作機構修理		更新	
0516327	北陸	2027/04/02 08:30	2027/04/02 16:30	単日	東金津変電所	東金津275丁母線	[275kVPT自動切替盤取替]東金津新福井線2L切替に伴う275kV丁母線停止		更新	
0516328	北陸	2027/04/02 15:30	2027/04/02 17:30	単日	東金津変電所	東金津275丁母線/[試験使用]	[275kVPT自動切替盤取替]東金津新福井線2L切替後のBPD検相		更新	
0516231	北陸	2027/04/05 07:30	2027/04/07 17:30	毎日	送電線	七尾大田火力線1L	定期点検(測定)		更新	
0516213	北陸	2027/04/06 07:30	2027/04/06 17:30	単日	中能登変電所	七尾大田火力線1L/大田火力線1L構内(中)/中能登275丙母線/中能登275母連	LS083甲/甲E、LS61 12年点検、275kV 丙母線 6年点検		更新	
0516214	北陸	2027/04/07 09:00	2027/04/07 16:30	単日	中能登変電所	大田火力線1L構内(中)/中能登275丁母線/中能登275母連	LS62 12年点検、275kV 丁母線 6年点検		更新	
0516215	北陸	2027/04/08 07:30	2027/04/08 17:30	単日	中能登変電所	七尾大田火力線2L/大田火力線2L構内(中)/中能登275丙母線/中能登275母連	LS084甲/甲E、LS63 12年点検		更新	
0516232	北陸	2027/04/08 07:30	2027/04/10 17:30	毎日	送電線	七尾大田火力線2L	定期点検(測定)		更新	
0516216	北陸	2027/04/09 09:00	2027/04/09 16:30	単日	中能登変電所	大田火力線2L構内(中)/中能登275丁母線/中能登275母連	LS64 12年点検		更新	
0516233	北陸	2027/04/19 07:30	2027/04/22 17:30	毎日	送電線	志賀原子力線1L	定期点検(測定)		更新	
0516504	北陸	2027/04/19 08:30	2027/04/19 17:30	単日	新富山変電所	新港幹線2L/新港幹線2L構内	CB010 6年、BCU 6年		更新	
0516505	北陸	2027/04/20 08:30	2027/04/20 17:30	単日	新富山変電所	新港幹線2L/新港幹線2L構内	LS010甲・甲E 12年、LA-010 12年、LPD 12年		更新	
0516501	北陸	2027/04/21 08:30	2027/04/21 18:30	単日	新富山変電所	新港幹線1L/新港幹線1L構内	CB009 6年、BCU 6年、LPD 12年、LA-009 12年		更新	
0516502	北陸	2027/04/22 08:30	2027/04/22 17:30	単日	新富山変電所	新港幹線1L構内/新富山275甲母線	LS009甲・甲E 12年、LS27 12年		更新	
0516503	北陸	2027/04/23 08:30	2027/04/23 17:30	単日	新富山変電所	新港幹線1L構内/新富山275乙母線	LS28 12年		更新	
0516234	北陸	2027/04/26 07:30	2027/04/29 17:30	毎日	送電線	志賀原子力線2L	定期点検(測定)		更新	
0516178	北陸	2027/05/17 08:30	2027/05/17 11:30	単日	中能登変電所	中能登275丙母線/中能登275母連	7Tr後備保護盤取替に伴う 丙母線電圧取込		更新	
0516242	北陸	2027/05/17 08:30	2027/05/17 17:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力変275甲母線	[碍子洗浄制御盤他取替]PT自動切替盤 甲母線切替		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0516349	北陸	2027/05/17 08:30	2027/05/17 17:30	連続	南条変電所	敦賀火力線1L/敦賀火力1L構内(南条)/南条275甲母線	敦賀火力線1LGIS LS087甲、LS17操作機構電装品修理		更新	
0516356	北陸	2027/05/17 08:30	2027/05/20 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線1L	鉄塔防錆塗装		更新	
0516358	北陸	2027/05/17 08:30	2027/05/20 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線1L	ボルト修理		更新	
0516179	北陸	2027/05/17 10:30	2027/05/17 12:30	単日	中能登変電所	中能登275丙母線/中能登275母連	7Tr後備保護盤取替に伴う 丙母線電圧検相		更新	
0516180	北陸	2027/05/17 12:30	2027/05/17 15:30	単日	中能登変電所	中能登275丁母線/中能登275母連	7Tr後備保護盤取替に伴う 丁母線電圧取込		更新	
0516181	北陸	2027/05/17 14:30	2027/05/17 16:30	単日	中能登変電所	中能登275丁母線/中能登275母連	7Tr後備保護盤取替に伴う 丁母線電圧検相		更新	
0516247	北陸	2027/05/17 16:30	2027/05/17 18:00	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力変275甲母線〔試験使用〕	〔碍子洗浄制御盤他取替〕PT自動切替盤 甲母線切替後の電圧検相		更新	
0516243	北陸	2027/05/18 08:30	2027/05/18 17:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力変275乙母線	〔碍子洗浄制御盤他取替〕PT自動切替盤 乙母線切替		更新	
0516344	北陸	2027/05/18 08:30	2027/05/19 17:30	毎日	南条変電所	敦賀火力線1L/敦賀火力1L構内(南条)	敦賀火力線1LGIS 引出し部塗装		更新	
0516248	北陸	2027/05/18 16:30	2027/05/18 18:00	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力変275乙母線〔試験使用〕	〔碍子洗浄制御盤他取替〕PT自動切替盤 乙母線切替		更新	
0516244	北陸	2027/05/19 08:30	2027/05/19 17:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力変275母連	〔碍子洗浄制御盤他取替〕PT自動切替盤 275kV母連切替		更新	
0516219	北陸	2027/05/20 08:30	2027/06/02 17:30	連続	中能登変電所	中能登2Tr/中能登66-2Tr3次母線/中能登2-1SHR	2Tr (R.S.T相)、2Tr2次 CB092、2次LA 機器塗装		更新	
0516245	北陸	2027/05/20 08:30	2027/05/20 17:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力線1L/敦賀火力1L構内(敦火)	〔碍子洗浄制御盤他取替〕PT自動切替盤 敦賀火力線1L切替		更新	
0516249	北陸	2027/05/20 16:30	2027/05/20 18:00	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力線1L/敦賀火力1L構内(敦火)〔試験使用〕	〔碍子洗浄制御盤他取替〕PT自動切替盤 敦賀火力線1L切替後の電圧検相		更新	
0516345	北陸	2027/05/24 08:30	2027/05/25 17:30	毎日	南条変電所	敦賀火力線2L/敦賀火力2L構内(南条)	敦賀火力線2LGIS 引出し部塗装		更新	
0516350	北陸	2027/05/24 08:30	2027/05/26 17:30	連続	南条変電所	敦賀火力線2L/敦賀火力2L構内(南条)/南条275甲母線	敦賀火力線2LGIS LS088甲、LS23操作機構電装品修理		更新	
0516357	北陸	2027/05/24 08:30	2027/05/27 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線2L	鉄塔防錆塗装		更新	
0516359	北陸	2027/05/24 08:30	2027/05/27 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線2L	ボルト修理		更新	
0516182	北陸	2027/05/27 08:30	2027/05/27 11:30	単日	中能登変電所	中能登275丙母線/中能登275母連	7Tr後備保護盤取替に伴う 丙母線バレット確認試験		更新	
0516246	北陸	2027/05/27 08:30	2027/05/27 17:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力線2L/敦賀火力2L構内(敦火)	〔碍子洗浄制御盤他取替〕PT自動切替盤 敦賀火力線2L切替		更新	
0516183	北陸	2027/05/27 12:30	2027/05/27 14:30	単日	中能登変電所	中能登275丁母線/中能登275母連	7Tr後備保護盤取替に伴う 丁母線バレット確認試験		更新	
0516156	北陸	2027/05/27 16:30	2027/05/27 18:00	単日	中能登変電所	中能登7Tr/中能登275母連/中能登275丁母線/中能登154-7NGR/〔停止〕2STr.7-1SHR	7Tr 1次・2次CB取替後の試充電		更新	
0516250	北陸	2027/05/27 16:30	2027/05/27 18:00	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力線2L/敦賀火力2L構内(敦火)〔試験使用〕	〔碍子洗浄制御盤他取替〕PT自動切替盤 敦賀火力線2L切替後の電圧検相		更新	
0516157	北陸	2027/05/27 17:00	2027/05/27 19:00	単日	中能登変電所	中能登7Tr/中能登275母連/中能登275丁母線/中能登154A母線/〔停止〕2STr.7-1SHR.7NGR	7Tr 1次・2次CB取替後の方向試験		更新	
0516226	北陸	2027/06/01 07:30	2027/06/01 17:30	単日	中能登変電所	大田火力線1L構内(中)/中能登275丙母線/中能登275母連	鉄構原寸調査		更新	
0516513	北陸	2027/06/01 07:30	2027/06/03 17:30	毎日	送電線	七尾大田火力線1L	定期点検(測定)		更新	
0516211	北陸	2027/06/01 09:00	2027/06/01 17:30	単日	中能登変電所	中能登275母連/中能登275丙母線	LS59 12年点検、CB700 12年点検・コ-キング処理・作動油交換		更新	
0516227	北陸	2027/06/02 07:30	2027/06/02 17:30	単日	中能登変電所	大田火力線1L構内(中)/中能登275丁母線/中能登275母連	鉄構原寸調査		更新	
0516212	北陸	2027/06/02 09:00	2027/06/02 17:30	単日	中能登変電所	中能登275母連/中能登275丁母線	LS60 12年点検		更新	
0516225	北陸	2027/06/03 07:30	2027/06/03 17:30	単日	中能登変電所	七尾大田火力線1L/大田火力線1L構内(中)	鉄構原寸調査		更新	
0516162	北陸	2027/06/08 07:30	2027/07/26 09:30	連続	送電線	新富山幹線2L	新富山幹線鉄塔建替No.38~No.44他に伴う停止		更新	
0516229	北陸	2027/06/08 07:30	2027/06/08 17:30	単日	中能登変電所	大田火力線2L構内(中)/中能登275丙母線/中能登275母連	鉄構原寸調査		更新	
0516514	北陸	2027/06/08 07:30	2027/06/10 17:30	毎日	送電線	七尾大田火力線2L	定期点検(測定)		更新	
0516230	北陸	2027/06/09 07:30	2027/06/09 17:30	単日	中能登変電所	大田火力線2L構内(中)/中能登275丁母線/中能登275母連	鉄構原寸調査		更新	
0516228	北陸	2027/06/10 07:30	2027/06/10 17:30	単日	中能登変電所	七尾大田火力線2L/大田火力線2L構内(中)	鉄構原寸調査		更新	
0516209	北陸	2027/06/14 07:30	2027/06/15 17:30	毎日	送電線	中央幹線1L	測定点検		更新	
0516510	北陸	2027/06/14 08:30	2027/06/16 17:30	毎日	送電線	中央幹線1L	定期点検		更新	
0516184	北陸	2027/06/15 08:30	2027/06/15 15:30	単日	中能登変電所	中能登500甲母線/中能登500母連/500kV43-87HA(中能登)/500kV43CBZHA(中能登)/500タイ43-87THA(中能)	500kV母線分離Ry取替に伴う甲母線電圧取込、BP(A)・母連Ry(A)切替試験		更新	
0516285	北陸	2027/06/15 08:30	2027/06/15 17:30	単日	南条変電所	南条275甲母線	[275kVBP取替]275kV甲母線PD2次電圧切替、母連ケーブル切替		更新	
0516185	北陸	2027/06/15 14:30	2027/06/15 16:30	単日	中能登変電所	中能登500甲母線/中能登500母連	500kV母線分離Ry取替に伴う甲母線電圧検相		更新	
0516286	北陸	2027/06/15 16:30	2027/06/15 18:30	単日	南条変電所	南条275甲母線〔試験使用〕	[275kVBP取替]275kV甲母線PD2次電圧検相		更新	
0516186	北陸	2027/06/16 08:30	2027/06/16 15:30	単日	中能登変電所	中能登500乙母線/中能登500母連/500kV43-87HB(中能登)/500kV43CBZHB(中能登)/500タイ43-87THB(中能)	500kV母線分離Ry取替に伴う乙母線電圧取込、BP(B)・母連Ry(B)切替試験		更新	
0516287	北陸	2027/06/16 08:30	2027/06/16 17:30	単日	南条変電所	南条275乙母線	[275kVBP取替]275kV乙母線PD2次電圧切替		更新	
0516488	北陸	2027/06/16 08:30	2027/06/16 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線1L(構内)/中央幹線1L	LS015甲、甲E操作箱取替(電動→電動)		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0516187	北陸	2027/06/16 14:30	2027/06/16 16:30	単日	中能登変電所	中能登500乙母線/中能登500母連	500kV母線分離Ry取替に伴う乙母線電圧検相		更新	
0516188	北陸	2027/06/16 15:30	2027/06/16 17:00	単日	中能登変電所	中能登500母連	500kV母線分離Ry取替に伴う位相測定		更新	
0516288	北陸	2027/06/16 16:30	2027/06/16 18:30	単日	南条変電所	南条275乙母線/[試験使用]	[275kV乙母線PD2次電圧検相]		更新	
0516297	北陸	2027/06/17 08:30	2027/06/17 13:30	単日	南条変電所	敦賀火力1L構内(南条)/南条275甲母線/ 敦火線143CA(南条)/敦火線143CB(南条)/ 敦火線143RCA0(南条)/敦火線 143RCB0(南条)	[275kVBP取替]敦賀火力線1Lケーブル切替、甲母線LSパレット取込		更新	
0516298	北陸	2027/06/17 12:30	2027/06/17 17:30	単日	南条変電所	敦賀火力1L構内(南条)/南条275乙母線/ 敦火線143CA(南条)/敦火線143CB(南条)/ 敦火線143RCA0(南条)/敦火線 143RCB0(南条)	[275kVBP取替]敦賀火力線1Lケーブル切替、乙母線LSパレット取込		更新	
0516299	北陸	2027/06/17 16:30	2027/06/17 18:30	単日	南条変電所	敦賀火力1L構内(南条)/南条275乙母線/ 南条275母連/[試験使用]	[275kVBP取替]敦賀火力線1L 位相測定・差電流確認		更新	
0516300	北陸	2027/06/18 08:30	2027/06/18 13:30	単日	南条変電所	敦賀火力2L構内(南条)/南条275甲母線/ 敦火線243CA(南条)/敦火線243CB(南条)/ 敦火線243RCA0(南条)/敦火線 243RCB0(南条)	[275kVBP取替]敦賀火力線2Lケーブル切替、甲母線LSパレット取込		更新	
0516301	北陸	2027/06/18 12:30	2027/06/18 17:30	単日	南条変電所	敦賀火力2L構内(南条)/南条275乙母線/ 敦火線243CA(南条)/敦火線243CB(南条)/ 敦火線243RCA0(南条)/敦火線 243RCB0(南条)	[275kVBP取替]敦賀火力線2Lケーブル切替、乙母線LSパレット取込		更新	
0516302	北陸	2027/06/18 16:30	2027/06/18 18:30	単日	南条変電所	敦賀火力2L構内(南条)/南条275乙母線/ 南条275母連/[試験使用]	[275kVBP取替]敦賀火力線2L 位相測定・差電流確認		更新	
0516303	北陸	2027/06/19 08:30	2027/06/19 13:30	単日	南条変電所	南条1Tr/南条275甲母線/南条154- 1NGR/南条1STr	[275kVBP取替]1Trケーブル切替、甲母線LSパレット取込		更新	
0516304	北陸	2027/06/19 12:30	2027/06/19 17:30	単日	南条変電所	南条1Tr/南条275乙母線/南条154- 1NGR/南条1STr	[275kVBP取替]1Trケーブル切替、乙母線LSパレット取込		更新	
0516305	北陸	2027/06/19 16:30	2027/06/19 18:30	単日	南条変電所	南条1Tr/南条275乙母線/南条275母連 /[試験使用]	[275kVBP取替]1Tr 位相測定・差電流確認		更新	
0516306	北陸	2027/06/20 08:30	2027/06/20 13:30	単日	南条変電所	南条2Tr/南条275甲母線/南条154- 2NGR/南条2STr	[275kVBP取替]2Trケーブル切替、甲母線LSパレット取込		更新	
0516307	北陸	2027/06/20 12:30	2027/06/20 17:30	単日	南条変電所	南条2Tr/南条275乙母線/南条154- 2NGR/南条2STr	[275kVBP取替]2Trケーブル切替、乙母線LSパレット取込		更新	
0516308	北陸	2027/06/20 16:30	2027/06/20 18:30	単日	南条変電所	南条2Tr/南条275乙母線/南条275母連 /[試験使用]	[275kVBP取替]2Tr 位相測定・差電流確認		更新	
0516210	北陸	2027/06/21 07:30	2027/06/22 17:30	毎日	送電線	中央幹線2L	測定点検		更新	
0516291	北陸	2027/06/21 08:30	2027/06/21 13:30	単日	南条変電所	南条越前1L構内(南条)/南条275甲母線/ 南条越前143CA(南条)/南条越前 143CB(南条)/南越線143RCA0(南条)/南 越線143RCB0(南条)	[275kVBP取替]南条越前線1Lケーブル切替、甲母線LSパレット取込		更新	
0516489	北陸	2027/06/21 08:30	2027/06/21 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線2L(構内)/新富山幹線2L	LS014甲、甲E操作箱取替(電動→電動)		更新	
0516511	北陸	2027/06/21 08:30	2027/06/23 17:30	毎日	送電線	中央幹線2L	定期点検		更新	
0516292	北陸	2027/06/21 12:30	2027/06/21 17:30	単日	南条変電所	南条越前1L構内(南条)/南条275乙母線/ 南条越前143CA(南条)/南条越前 143CB(南条)/南越線143RCA0(南条)/南 越線143RCB0(南条)	[275kVBP取替]南条越前線1Lケーブル切替、乙母線LSパレット取込		更新	
0516293	北陸	2027/06/21 16:30	2027/06/21 18:30	単日	南条変電所	南条越前1L構内(南条)/南条275乙母線/ 南条275母連/[試験使用]	[275kVBP取替]南条越前線1L 位相測定・差電流確認		更新	
0516278	北陸	2027/06/22 08:30	2027/06/22 17:30	単日	東金津変電所	東金津275丙母線	[275kVDP自切盤取替]275kV丙母線電圧切替		更新	
0516294	北陸	2027/06/22 08:30	2027/06/22 13:30	単日	南条変電所	南条越前2L構内(南条)/南条275甲母線/ 南条越前243CA(南条)/南条越前 243CB(南条)/南越線243RCA0(南条)/南 越線243RCB0(南条)	[275kVBP取替]南条越前線2Lケーブル切替、甲母線LSパレット取込		更新	
0516490	北陸	2027/06/22 08:30	2027/06/22 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線2L(構内)/中央幹線2L	LS016甲、甲E操作箱取替(電動→電動)		更新	
0516295	北陸	2027/06/22 12:30	2027/06/22 17:30	単日	南条変電所	南条越前2L構内(南条)/南条275乙母線/ 南条越前243CA(南条)/南条越前 243CB(南条)/南越線243RCA0(南条)/南 越線243RCB0(南条)	[275kVBP取替]南条越前線2Lケーブル切替、乙母線LSパレット取込		更新	
0516279	北陸	2027/06/22 16:30	2027/06/22 18:00	単日	東金津変電所	東金津275丙母線/[試験使用]	[275kVDP自切盤取替]275kV丙母線電圧切替後の位相測定		更新	
0516296	北陸	2027/06/22 16:30	2027/06/22 18:30	単日	南条変電所	南条越前2L構内(南条)/南条275乙母線/ 南条275母連/[試験使用]	[275kVBP取替]南条越前線2L 位相測定・差電流確認		更新	
0516280	北陸	2027/06/23 08:30	2027/06/23 17:30	単日	東金津変電所	東金津275丁母線	[275kVDP自切盤取替]275kV丁母線電圧切替		更新	
0516281	北陸	2027/06/23 16:30	2027/06/23 18:00	単日	東金津変電所	東金津275丁母線/[試験使用]	[275kVDP自切盤取替]275kV丁母線電圧切替後の位相測定		更新	
0516166	北陸	2027/07/26 08:30	2027/07/26 13:30	単日	送電線	新富山幹線2L	新富山幹線鉄塔建替No.38~No.44使用前自主検査(絶縁抵抗測定)		更新	
0516164	北陸	2027/07/26 12:30	2027/07/26 17:30	単日	送電線	新富山幹線2L	新富山幹線鉄塔建替No.38~No.44に伴う使用前自主検査(絶縁耐力試験他)		更新	
0516323	北陸	2027/09/06 07:30	2027/09/06 12:30	単日	越前変電所	越前275丙母線	[5号変圧器保護盤取替]丙母線BPT2次電圧ケーブル分離		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0516324	北陸	2027/09/06 12:30	2027/09/06 17:30	単日	越前変電所	越前275丁母線	[5号変圧器保護盤取替]丁母線BPT2次電圧ケーブル切離し		更新	
0516217	北陸	2027/09/09 07:30	2027/09/09 17:30	単日	中能登変電所	中能登275母連/中能登275丙母線	LS59E 接地機構撤去		更新	
0516218	北陸	2027/09/10 07:30	2027/09/10 17:30	単日	中能登変電所	中能登275母連/中能登275丁母線	LS60E 接地機構撤去		更新	
0516270	北陸	2027/09/10 07:30	2027/09/10 12:30	単日	越前変電所	越前275丙母線	[5号変圧器保護盤取替]丙母線BPT2次電圧ケーブル接続、LS開閉試験		更新	
0516271	北陸	2027/09/10 11:30	2027/09/10 13:30	単日	越前変電所	越前275丙母線/越前275母連/[試験使用]	[5号変圧器保護盤取替]丙母線BPT2次電圧検相		更新	
0516272	北陸	2027/09/10 12:30	2027/09/10 17:30	単日	越前変電所	越前275丁母線	[5号変圧器保護盤取替]丁母線BPT2次電圧ケーブル接続、LS開閉試験		更新	
0516273	北陸	2027/09/10 16:30	2027/09/10 18:30	単日	越前変電所	越前275丁母線/越前275母連/[試験使用]	[5号変圧器保護盤取替]丁母線BPT2次電圧検相		更新	
0516057	北陸	2027/09/13 07:00	2027/09/13 18:00	単日	送電線	加賀東金津線1L	測定点検		更新	
0516061	北陸	2027/09/13 07:00	2027/09/13 18:00	単日	送電線	加賀東金津線1L	定期点検No.70, 76, 82		更新	
0516325	北陸	2027/09/13 07:30	2027/09/13 12:30	単日	越前変電所	越前275丙母線	[6号変圧器保護盤取替]丙母線BPT2次電圧ケーブル切離し		更新	
0516074	北陸	2027/09/13 08:00	2027/09/13 18:00	単日	東金津変電所	加賀東金津1L構内(東)/加賀東143CA(東金津)/加賀東143CB(東金津)/加賀東143RCA0(東金津/加賀東143RCAM(東金津/加賀東143RCB0(東金津/加賀東143RCBM(東金津/加賀東金津線1L	[275kVPD自切盤取替]加賀東金津線2L切替		更新	
0516329	北陸	2027/09/13 08:30	2027/09/13 16:30	単日	東金津変電所	東金津275丁母線	[275kVPD自切盤取替]加賀東金津線1L切替に伴う275kV丁母線停止		更新	
0516326	北陸	2027/09/13 12:30	2027/09/13 17:30	単日	越前変電所	越前275丁母線	[6号変圧器保護盤取替]丁母線BPT2次電圧ケーブル切離し		更新	
0516330	北陸	2027/09/13 15:30	2027/09/13 17:30	単日	東金津変電所	東金津275丁母線/[試験使用]	[275kVPD自切盤取替]加賀東金津線1L切替後のBPD検相		更新	
0516058	北陸	2027/09/14 07:00	2027/09/14 18:00	単日	送電線	加賀東金津線2L	測定点検		更新	
0516062	北陸	2027/09/14 07:00	2027/09/14 18:00	単日	送電線	加賀東金津線2L	定期点検No.70, 76, 82		更新	
0516075	北陸	2027/09/14 08:00	2027/09/14 18:00	単日	東金津変電所	加賀東金津2L構内(東)/加賀東243CA(東金津)/加賀東243CB(東金津)/加賀東243RCA0(東金津/加賀東243RCAM(東金津/加賀東243RCB0(東金津/加賀東243RCBM(東金津/加賀東金津線2L	[275kVPD自切盤取替]加賀東金津線2L切替		更新	
0516172	北陸	2027/09/14 08:30	2027/09/14 17:30	単日	城端開閉所	城端開275乙母線/城端開275母連	LS114点検・開閉試験		更新	
0516331	北陸	2027/09/14 08:30	2027/09/14 16:30	単日	東金津変電所	東金津275丁母線	[275kVPD自切盤取替]加賀東金津線2L切替に伴う275kV丁母線停止		更新	
0516332	北陸	2027/09/14 15:30	2027/09/14 17:30	単日	東金津変電所	東金津275丁母線/[試験使用]	[275kVPD自切盤取替]加賀東金津線2L切替後のBPD検相		更新	
0516094	北陸	2027/09/15 08:00	2027/09/17 18:00	毎日	送電線	越前線1L	防錆塗装(No.51)		更新	
0516173	北陸	2027/09/15 08:30	2027/09/15 17:30	単日	城端開閉所	城端開275甲母線/城端開275母連/関西LS103	LS113点検・開閉試験		更新	
0516208	北陸	2027/09/15 15:30	2027/09/15 17:30	単日	中能登変電所	中能登500母連	500BP(A系)取替に伴う 入力電気量・差電流確認試験		更新	
0516174	北陸	2027/09/16 08:30	2027/09/16 17:30	単日	城端開閉所	城端連系乙側(構内)/関西城端開275乙母線	LS102点検・開閉試験・バックイン交換		更新	
0516274	北陸	2027/09/17 07:30	2027/09/17 12:30	単日	越前変電所	越前275丙母線	[6号変圧器保護盤取替]丙母線BPT2次電圧ケーブル切替、LS開閉試験		更新	
0516175	北陸	2027/09/17 08:30	2027/09/17 17:30	単日	城端開閉所	城端開275乙母線/城端連系乙側(構内)	LS104点検・開閉試験・バックイン交換、監視制御盤(連系乙)点検		更新	
0516275	北陸	2027/09/17 11:30	2027/09/17 13:30	単日	越前変電所	越前275丙母線/越前275母連/[試験使用]	[6号変圧器保護盤取替]丙母線BPT2次電圧検相		更新	
0516276	北陸	2027/09/17 12:30	2027/09/17 17:30	単日	越前変電所	越前275丁母線	[6号変圧器保護盤取替]丁母線BPT2次電圧ケーブル切替、LS開閉試験		更新	
0516277	北陸	2027/09/17 16:30	2027/09/17 18:30	単日	越前変電所	越前275丁母線/越前275母連/[試験使用]	[6号変圧器保護盤取替]丁母線BPT2次電圧検相		更新	
0516095	北陸	2027/09/20 08:00	2027/09/22 18:00	毎日	送電線	越前線2L	防錆塗装(No.51)		更新	
0516163	北陸	2027/09/25 07:30	2027/11/09 09:30	連続	送電線	新富山幹線1L	新富山幹線鉄塔建替No.38~No.44に伴う停止		更新	
0516351	北陸	2027/09/27 08:30	2027/09/29 17:30	連続	南条変電所	南条275甲母線	275kV甲母線BE操作機構、現地盤電装品修理		更新	
0516506	北陸	2027/09/27 08:30	2027/09/28 17:30	毎日	新富山変電所	新富山幹線1L構内/新富山275甲母線/新富山275母連	碍子取替		更新	
0516512	北陸	2027/09/27 08:30	2027/09/27 17:30	単日	送電線	新富山幹線1L	電線乗り出し訓練		更新	
0516189	北陸	2027/09/28 08:30	2027/09/28 17:30	単日	中能登変電所	中能登275母連/中能登275丙母線	275kV母線保護B系リレー設置のうち丙母線電圧、母連CT要素取込み		更新	
0516190	北陸	2027/09/28 16:30	2027/09/28 17:40	単日	中能登変電所	中能登275母連/中能登275丙母線	275kV母線保護B系リレー設置のうち丙母線電圧検相		更新	
0516072	北陸	2027/09/29 08:00	2027/09/29 18:00	単日	東金津変電所	東金津新福井1L構内(東)/東金津新143CA(東金津/東金津新143CB(東金津/東金津新143RCA0(東金/東金津新143RCAM(東金/東金津新143RCB0(東金/東金津新143RCBM(東金/東金津新福井線1L	[275kVPD自切盤取替]東金津新福井線1L切替		更新	
0516191	北陸	2027/09/29 08:30	2027/09/29 17:30	単日	中能登変電所	中能登275母連/中能登275丁母線	275kV母線保護B系リレー設置のうち丁母線電圧取込み、警報回路接続		更新	
0516507	北陸	2027/09/29 08:30	2027/09/30 17:30	毎日	新富山変電所	新富山幹線1L構内/新富山275乙母線/新富山275母連	碍子取替		更新	
0516520	北陸	2027/09/29 08:30	2027/09/29 16:30	単日	東金津変電所	東金津275丁母線	[275kVPD自切盤、275kV自動同期盤取替]東金津新福井線1L切替に伴う275kV丁母線停止		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0516521	北陸	2027/09/29 15:30	2027/09/29 17:30	単日	東金津変電所	東金津275丁母線/[試験使用]	[275kVPD自切盤、275kV自動同期盤取替]東金津新福井線1L切替後のBPD検相		更新	
0516192	北陸	2027/09/29 16:30	2027/09/29 17:40	単日	中能登変電所	中能登275母連/中能登275丁母線	275kV母線保護B系リレー設置のうち丁母線電圧検相		更新	
0516201	北陸	2027/09/29 16:40	2027/09/29 18:30	単日	中能登変電所	中能登275母連	275kV母線保護B系リレー設置のうち母連CT取込み後の方向試験		更新	
0516282	北陸	2027/09/30 07:30	2027/09/30 12:30	単日	東金津変電所	東金津275母連	[275kVPD自切盤取替]275母連切替		更新	
0516515	北陸	2027/09/30 07:30	2027/09/30 11:30	単日	東金津変電所	東金津275丙母線	[275kVPD自切盤、275kV自動同期盤取替]275kV母連(丙母線側)切替に伴う丙母線停止		更新	
0516516	北陸	2027/09/30 10:30	2027/09/30 12:30	単日	東金津変電所	東金津275丙母線/[試験使用]	[275kVPD自切盤、275kV自動同期盤取替]275kV母連(丙母線側)切替後のBPD検相		更新	
0516517	北陸	2027/09/30 12:30	2027/09/30 17:30	単日	東金津変電所	東金津275母連/43ASY(東金津)	[275kVPD自切盤、275kV自動同期盤取替]275kV母連(丁母線側)切替		更新	
0516518	北陸	2027/09/30 12:30	2027/09/30 16:30	単日	東金津変電所	東金津275丁母線	[275kVPD自切盤、275kV自動同期盤取替]275kV母連(丁母線側)切替に伴う丁母線停止		更新	
0516519	北陸	2027/09/30 15:30	2027/09/30 17:30	単日	東金津変電所	東金津275丁母線/[試験使用]	[275kVPD自切盤、275kV自動同期盤取替]275kV母連(丁母線側)切替後のBPD検相		更新	
0516500	北陸	2027/10/01 08:30	2027/10/01 17:30	単日	新富山変電所	新富山幹線1L/新富山幹線1L構内/新富山275乙母線	LS35 12年、BCU 12年		更新	
0516497	北陸	2027/10/04 07:30	2027/10/04 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線1L/新富山幹線1L(構内)/城端開275甲母線/関西LS103	新富山幹線1L 鉄構碍子金物修理(Yブス側)		更新	
0516508	北陸	2027/10/04 08:30	2027/10/08 17:30	連続	新富山変電所	新港幹線1L構内	CB009 電装品交換18年.開閉試験		更新	
0516522	北陸	2027/10/04 08:30	2027/10/04 16:30	単日	東金津変電所	東金津275丁母線	[275kVPD自切盤取替]CDT切替に伴う275kV丁母線停止		更新	
0516523	北陸	2027/10/04 15:30	2027/10/04 17:30	単日	東金津変電所	東金津275丁母線/[試験使用]	[275kVPD自切盤取替]CDT切替後のBPD検相		更新	
0516317	北陸	2027/10/05 07:30	2027/10/05 10:30	単日	南条変電所	南条275甲母線/南条275母連	[275kV母線分離装置取替]甲母線PD2次電圧ケーブル切替		更新	
0516495	北陸	2027/10/05 07:30	2027/10/05 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線1L/新富山幹線1L(構内)/城端開275甲母線/関西LS103	甲ブス 鉄構碍子金物修理(新富山幹線1L側)		更新	
0516195	北陸	2027/10/05 08:30	2027/10/05 17:30	単日	中能登変電所	志賀原線1L構内(中能)/中能登275丙母線/志賀原線1L43CA(中能)/志賀原線1L43CB(中能)/志賀原線1L43D56(中能)/志賀原線1L43RCA0(中)/志賀原線1L43RCAM(中)/志賀原線1L43RCB0(中)/志賀原線1L43RCBM(中)	275kV母線保護B系リレー設置のうち志賀原子力線1LCT取込みおよび模擬潮流試験		更新	
0516336	北陸	2027/10/05 08:30	2027/10/05 17:30	単日	新福井変電所	新福井275甲母線/新福井4Tr/新福井33母線4B/新福井4-1ShR/新福井4-2ShR/新福井4-3ShR/新福井4-4ShR	LS65 開閉・精密・各種手入12年		更新	
0516524	北陸	2027/10/05 08:30	2027/10/05 16:30	単日	東金津変電所	東金津275丁母線	[275kVPD自切盤取替]系統安定化制御装置 (275kV分)切替に伴う275kV丁母線停止		更新	
0516318	北陸	2027/10/05 09:30	2027/10/05 11:30	単日	南条変電所	南条275甲母線/[試験使用]	[275kV母線分離装置取替]甲母線PD2次電圧ケーブル検相		更新	
0516319	北陸	2027/10/05 10:30	2027/10/05 14:30	単日	南条変電所	南条275乙母線/南条275母連	[275kV母線分離装置取替]乙母線PD2次電圧ケーブル切替		更新	
0516321	北陸	2027/10/05 13:30	2027/10/05 15:30	単日	南条変電所	南条275乙母線/[試験使用]	[275kV母線分離装置取替]乙母線PD2次電圧ケーブル検相		更新	
0516320	北陸	2027/10/05 14:30	2027/10/06 18:30	連続	南条変電所	南条275母連	[275kV母線分離装置取替]母連CT他切替		更新	
0516525	北陸	2027/10/05 15:30	2027/10/05 17:30	単日	東金津変電所	東金津275丁母線/[試験使用]	[275kVPD自切盤取替]系統安定化制御装置 (275kV分)切替後のBPD検相		更新	
0516092	北陸	2027/10/06 08:00	2027/10/08 18:00	毎日	送電線	東金津新福井線1L	定期点検(No.5.11.17.23)がはいし連SP(No.000.1)		更新	
0516168	北陸	2027/10/06 08:30	2027/10/06 15:30	単日	南福光変電所	南福光500甲-1母線/南福光500母連/500kV母線分離リレーロック	制御ケーブル切替及び甲母線電圧取込		更新	
0516196	北陸	2027/10/06 08:30	2027/10/06 17:30	単日	中能登変電所	志賀原線2L構内(中能)/中能登275丙母線/志賀原線2L43CA(中能)/志賀原線2L43CB(中能)/志賀原線2L43D56(中能)/志賀原線2L43RCA0(中)/志賀原線2L43RCAM(中)/志賀原線2L43RCB0(中)/志賀中線2L43RCBM(中)	275kV母線保護B系リレー設置のうち志賀原子力線2LCT取込みおよび模擬潮流試験		更新	
0516337	北陸	2027/10/06 08:30	2027/10/06 17:30	単日	新福井変電所	新福井275乙母線/新福井4Tr/新福井33母線4B/新福井4-1ShR/新福井4-2ShR/新福井4-3ShR/新福井4-4ShR	LS66 開閉・精密・各種手入12年		更新	
0516499	北陸	2027/10/06 08:30	2027/10/06 17:30	単日	新富山変電所	新富山幹線1L/新富山幹線1L構内/新富山275甲母線	LS011甲・甲E 12年、LA-011 12年、LS35 12年		更新	
0516169	北陸	2027/10/06 14:30	2027/10/06 16:30	単日	南福光変電所	南福光500甲-1母線/500kV母線分離リレーロック	甲母線電圧検相		更新	
0516322	北陸	2027/10/06 17:30	2027/10/06 19:30	単日	南条変電所	南条275乙母線/南条275母連/[潮流試験]	[275kV母線分離装置取替]275kV母線分離装置 潮流試験(位相測定)		更新	
0516170	北陸	2027/10/07 08:30	2027/10/07 15:30	単日	南福光変電所	南福光500乙-1母線/南福光500母連/500kV母線分離リレーロック	制御ケーブル切替及び乙母線電圧取込		更新	
0516197	北陸	2027/10/07 09:30	2027/10/07 16:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr	275kV母線保護B系リレー設置のうち1TrCT取込み		更新	
0516171	北陸	2027/10/07 14:30	2027/10/07 17:00	単日	南福光変電所	南福光500乙-1母線/500kV母線分離リレーロック	乙母線電圧検相、位相測定		更新	
0516204	北陸	2027/10/07 15:30	2027/10/07 16:40	単日	中能登変電所	中能登1Tr	275kV母線保護B系リレー設置のうち1TrCT取込み後の差電流測定		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0516198	北陸	2027/10/08 09:30	2027/10/08 16:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr	275kV母線保護B系リレー設置のうち2TrCT取込み		更新	
0516205	北陸	2027/10/08 15:30	2027/10/08 16:40	単日	中能登変電所	中能登2Tr	275kV母線保護B系リレー設置のうち2TrCT取込み後の差電流測定		更新	
0516509	北陸	2027/10/09 08:30	2027/10/13 17:30	連続	新富山変電所	新港幹線2L構内	CB010 電装品交換18年.開閉試験		更新	
0516341	北陸	2027/10/12 08:30	2027/10/14 17:30	連続	南条変電所	南条275母連	275kV母線連絡GIS CB操作機構油圧ユニット修理		更新	
0516199	北陸	2027/10/13 09:30	2027/10/13 16:30	単日	中能登変電所	中能登3Tr	275kV母線保護B系リレー設置のうち3TrCT取込み		更新	
0516206	北陸	2027/10/13 15:30	2027/10/13 16:40	単日	中能登変電所	中能登3Tr	275kV母線保護B系リレー設置のうち3TrCT取込み後の差電流測定		更新	
0516290	北陸	2027/10/13 16:30	2027/10/13 18:30	単日	南条変電所	南条275母連/南条275乙母線/[試験使用]	[275kVBP取替]275kV母連 位相測定・差電流確認		更新	
0516220	北陸	2027/10/14 07:30	2027/10/14 17:30	単日	中能登変電所	志賀原子力線2L/志賀原線2L構内(中能)	各所鉄構修理(27)のうち 鉄構部材修理		更新	
0516487	北陸	2027/10/15 08:30	2027/10/15 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線1L/新富山幹線1L	LS013甲、甲E操作箱取替(電動→電動)		更新	
0516193	北陸	2027/10/16 09:30	2027/10/16 16:30	単日	中能登変電所	大田火力線1L構内(中)/大田火力1L43D56(中能/大田火力1L43CA(中能)/大田火力1L43CB(中能)/大田火力1L43RCA0(中)/大田火力1L43RCAM(中)/大田火力1L43RCB0(中)/大田火力1L43RCBM(中)	275kV母線保護B系リレー設置のうち七尾大田火力線1LCT取込み		更新	
0516202	北陸	2027/10/16 15:30	2027/10/16 16:40	単日	中能登変電所	大田火力線1L構内(中)	275kV母線保護B系リレー設置のうち七尾大田火力線1LCT取込み後の差電流測定		更新	
0516194	北陸	2027/10/17 09:30	2027/10/17 16:30	単日	中能登変電所	大田火力線2L構内(中)/大田火力2L43D56(中能/大田火力2L43CA(中能)/大田火力2L43CB(中能)/大田火力2L43RCA0(中)/大田火力2L43RCAM(中)/大田火力2L43RCB0(中)/大田火力2L43RCBM(中)	275kV母線保護B系リレー設置のうち七尾大田火力線2LCT取込み		更新	
0516203	北陸	2027/10/17 15:30	2027/10/17 16:40	単日	中能登変電所	大田火力線2L構内(中)	275kV母線保護B系リレー設置のうち七尾大田火力線2LCT取込み後の差電流測定		更新	
0516223	北陸	2027/10/18 07:30	2027/10/18 17:30	単日	中能登変電所	志賀原子力線1L/志賀原線1L構内(中能)	鉄構修理		更新	
0516498	北陸	2027/10/18 07:30	2027/10/18 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線1L/中央幹線1L(構内)/城端開275甲母線/関西LS103	中央幹線1L 鉄構碍子金物修理(Yブス側)		更新	
0516496	北陸	2027/10/19 07:30	2027/10/19 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線1L/中央幹線1L(構内)/城端開275甲母線/関西LS103	甲ブス 鉄構碍子金物修理(中央幹線1L側)		更新	
0516200	北陸	2027/10/19 15:40	2027/10/19 17:00	単日	中能登変電所	中能登275丙母線	275kV母線保護B系リレー設置のうちLS/パレット確認試験		更新	
0516207	北陸	2027/10/19 16:00	2027/10/19 17:30	単日	中能登変電所	中能登CB700/中能登275丁母線	275kV母線保護B系リレー設置のうちLS/パレット確認試験		更新	
0516483	北陸	2027/10/21 15:30	2027/10/21 17:30	単日	新富山変電所	新富山275乙母線/新富山275母連/新富山連1Tr	連1Trケーブル切替後のBP差電流確認		更新	
0516485	北陸	2027/10/22 15:30	2027/10/22 17:30	単日	新富山変電所	新富山275乙母線/新富山275母連/新富山連2Tr	連2Trケーブル切替後のBP差電流確認		更新	
0516047	北陸	2027/10/23 08:00	2027/10/31 18:00	連続	加賀変電所	加賀幹線2L/加賀幹線2L構内(加賀)	GIS加賀幹線2Lユニット 6年点検 他		更新	
0516048	北陸	2027/10/23 08:00	2027/10/24 18:00	連続	加賀変電所	加賀500甲母線/加賀幹線2L構内(加賀)/加賀500母連	GIS加賀幹線2Lユニット(LS331) 6年点検		更新	
0516484	北陸	2027/10/23 15:30	2027/10/23 17:30	単日	新富山変電所	新富山275乙母線/新富山275母連/新富山連3Tr	連3Trケーブル切替後のBP差電流確認		更新	
0516486	北陸	2027/10/24 15:30	2027/10/24 17:30	単日	新富山変電所	新富山275乙母線/新富山275母連/新富山連4Tr	連4Trケーブル切替後のBP差電流確認		更新	
0516054	北陸	2027/10/25 07:00	2027/10/27 18:00	毎日	送電線	加賀幹線2L	測定点検		更新	
0516060	北陸	2027/10/25 07:00	2027/10/25 18:00	毎日	送電線	加賀幹線2L	定期点検No.93, 99		更新	
0516491	北陸	2027/10/25 07:30	2027/10/25 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線2L/中央幹線2L(構内)/城端開275甲母線/関西LS103	中央幹線2L 鉄構碍子金物修理(Yブス側)		更新	
0516049	北陸	2027/10/25 08:00	2027/10/26 18:00	連続	加賀変電所	加賀500乙母線/加賀幹線2L構内(加賀)/加賀500母連	GIS加賀幹線2Lユニット(LS332) 6年点検		更新	
0516494	北陸	2027/10/26 07:30	2027/10/26 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線2L/中央幹線2L(構内)/城端開275甲母線/関西LS103	甲ブス 鉄構碍子金物修理(中央幹線2L側)		更新	
0516050	北陸	2027/10/26 08:00	2027/10/26 18:00	単日	加賀変電所	加賀幹線2L構内(加賀)/加賀幹線2L/加賀幹2L43CA(加賀)/加賀幹2L43CB(加賀)/加賀幹2L43RCA0(加賀)/加賀幹2L43RCB0(加賀)/加賀幹2L43RCAM(加賀)/加賀幹2L43RCBM(加賀)	加賀幹線2L BCU 6年点検他		更新	
0516348	北陸	2027/10/26 08:30	2027/10/28 17:30	連続	南条変電所	南条275母連	母線連絡 LS900乙E操作機構、現地盤電装品修理		更新	
0516176	北陸	2027/11/01 07:30	2027/11/01 18:30	単日	城端開閉所	城端開275甲母線/城端開275母連/関西LS103	母連 鉄構碍子金物修理(LS114側)		更新	
0516526	北陸	2027/11/01 08:30	2027/11/01 16:30	単日	東金津変電所	東金津275丁母線	[275kVDP自切盤、275kV自動同期盤取替]4Tr切替に伴う275kV丁母線停止		更新	
0516571	北陸	2027/11/01 08:30	2027/11/03 17:30	連続	南条変電所	南条1Tr/南条275乙母線/南条1ShR/南条154-1NGR/南条1STr/南条275乙母線	1Tr1次GIS LS14操作機構、現地盤電装品修理		新規	
0516527	北陸	2027/11/01 15:30	2027/11/01 17:30	単日	東金津変電所	東金津275丁母線/[試験使用]	[275kVDP自切盤、275kV自動同期盤取替]4Tr切替後のBPD検相		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0516177	北陸	2027/11/02 07:30	2027/11/03 18:30	毎日	城端開閉所	城端開275甲母線/城端開275母連/関西LS103	甲ブス 鉄構碍子金物修理(母連 周囲柵側・中央幹線2L側)		更新	
0516528	北陸	2027/11/02 08:30	2027/11/02 16:30	単日	東金津変電所	東金津275丁母線	[275kVPD自切盤、275kV自動同期盤取替]5Tr切替に伴う275kV丁母線停止		更新	
0516529	北陸	2027/11/02 15:30	2027/11/02 17:30	単日	東金津変電所	東金津275丁母線/[試験使用]	[275kVPD自切盤、275kV自動同期盤取替]5Tr切替後のBPD検相		更新	
0516472	北陸	2027/11/03 08:30	2027/11/03 10:30	単日	新富山変電所	新富山275甲母線	甲母線PD2次ケーブル切替		更新	
0516473	北陸	2027/11/03 09:30	2027/11/03 11:00	単日	新富山変電所	新富山275甲母線	甲母線PD2次検相		更新	
0516474	北陸	2027/11/03 10:00	2027/11/03 17:30	単日	新富山変電所	新富山275乙母線/新富山275母連/275kV母線分離	ケーブル切替・試験		更新	
0516475	北陸	2027/11/03 16:30	2027/11/03 18:30	単日	新富山変電所	新富山275乙母線	乙母線PD2次検相		更新	
0516476	北陸	2027/11/03 17:30	2027/11/03 19:30	単日	新富山変電所	新富山275乙母線/新富山275母連/新富山連1Tr	潮流確認試験		更新	
0516283	北陸	2027/11/04 08:30	2027/11/04 12:30	単日	東金津変電所	東金津275丙母線	[275kVPD自切盤取替]275kV丙母線電圧切替		更新	
0516572	北陸	2027/11/04 08:30	2027/11/06 17:30	連続	南条変電所	南条2Tr/南条275乙母線/南条2ShR/南条154-2NGR/南条1STr/南条275乙母線	2Tr1次GIS LS16操作機構、現地盤電装品修理		新規	
0516284	北陸	2027/11/04 12:30	2027/11/04 17:30	単日	東金津変電所	東金津275丁母線	[275kVPD自切盤取替]275kV丁母線電圧切替		更新	
0516477	北陸	2027/11/08 08:30	2027/11/08 14:30	単日	新富山変電所	新富山幹線1L構内/LS011甲~CB011~LS35、LS36	新富山幹線1Lケーブル切替・試験		更新	
0516480	北陸	2027/11/08 08:30	2027/11/08 14:30	単日	新富山変電所	新港幹線1L構内/LS009甲~CB009~LS27、LS28	新港幹線1Lケーブル切替・試験		更新	
0516481	北陸	2027/11/08 13:30	2027/11/08 17:30	単日	新富山変電所	新港幹線2L構内/LS010甲~CB010~LS31、LS32	新港幹線2Lケーブル切替・試験		更新	
0516482	北陸	2027/11/08 16:30	2027/11/08 18:30	単日	新富山変電所	新港幹線1L構内/新港幹線2L構内/新富山275乙母線/新富山275母連	新港幹線ケーブル切替後のBP差電流確認		更新	
0516167	北陸	2027/11/09 08:30	2027/11/09 13:30	単日	送電線	新富山幹線1L	新富山幹線鉄塔建替No.38~No.44使用前自主検査(絶縁抵抗測定)		更新	
0516165	北陸	2027/11/09 12:30	2027/11/09 17:30	単日	送電線	新富山幹線1L	新富山幹線鉄塔建替No.38~No.44他に伴う使用前自主検査(絶縁耐力試験他)		更新	
0516492	北陸	2027/11/10 07:30	2027/11/10 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線2L/新富山幹線2L(構内)/城端開275甲母線/関西LS103	新富山幹線2L 鉄構碍子金物修理(ブス側)		更新	
0516493	北陸	2027/11/10 07:30	2027/11/10 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線2L/新富山幹線2L(構内)/城端開275甲母線/関西LS103	甲ブス 鉄構碍子金物修理(新富山幹線2L側)		更新	
0516478	北陸	2027/11/10 13:30	2027/11/10 17:30	単日	新富山変電所	新富山幹線2L構内/LS012甲~CB012~LS39、LS40	新富山幹線2Lケーブル切替・試験		更新	
0516479	北陸	2027/11/10 16:30	2027/11/10 18:30	単日	新富山変電所	新富山幹線1L構内/新富山幹線2L構内/新富山275乙母線/新富山275母連	新富山幹線ケーブル切替後のBP差電流確認		更新	
0516338	北陸	2027/11/13 08:30	2027/11/16 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	防錆塗装(No.48.49)		更新	
0516340	北陸	2027/11/15 08:30	2027/11/17 17:30	連続	南条変電所	南条越前1L構内(南条)	南条越前線1LGIS CB操作機構油圧ユニット修理		更新	
0516342	北陸	2027/11/15 08:30	2027/11/16 17:30	毎日	南条変電所	南条越前線1L/南条越前1L構内(南条)	南条越前線1LGIS 引出し部塗装		更新	
0516333	北陸	2027/11/16 07:30	2027/11/18 18:30	連続	越前変電所	越前500母連	CB5400 開閉・点検・操作機構トルク測定・各種手入6年、GIS 現地盤 点検6年		更新	
0516160	北陸	2027/11/16 08:30	2027/11/16 11:00	単日	中能登変電所	中能登275丙母線	新6Tr統合形保護盤 275母線電圧切替(丙母線)		更新	
0516161	北陸	2027/11/16 10:00	2027/11/16 12:30	単日	中能登変電所	中能登275丁母線	新6Tr統合形保護盤 275母線電圧切替(丁母線)		更新	
0516352	北陸	2027/11/17 08:30	2027/11/20 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	定期点検、ボルト修理		更新	
0516354	北陸	2027/11/17 08:30	2027/11/20 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	鉄塔防錆塗装		更新	
0516346	北陸	2027/11/18 08:30	2027/11/20 17:30	連続	南条変電所	南条越前線1L/南条越前1L構内(南条)/南条275甲母線	南条越前線1LGIS LS085甲E、LS16操作機構、現地盤電装品修理		更新	
0516334	北陸	2027/11/19 07:30	2027/11/19 18:30	単日	越前変電所	越前500母連/越前500甲母線	母連GIS(LS419) 開閉・点検6年、母線PTGIS 点検・各種手入6年		更新	
0516335	北陸	2027/11/20 07:30	2027/11/20 18:30	単日	越前変電所	越前500母連/越前500乙母線	母連GIS(LS420) 開閉・点検6年、母線PTGIS 点検・各種手入6年		更新	
0516339	北陸	2027/11/21 08:30	2027/11/24 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	防錆塗装(No.48.49)		更新	
0516353	北陸	2027/11/21 08:30	2027/11/24 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	定期点検、ボルト修理		更新	
0516355	北陸	2027/11/21 08:30	2027/11/24 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	鉄塔防錆塗装		更新	
0516343	北陸	2027/11/24 08:30	2027/11/25 17:30	毎日	南条変電所	南条越前線2L/南条越前2L構内(南条)	南条越前線2LGIS 引出し部塗装		更新	
0516347	北陸	2027/11/24 08:30	2027/11/26 17:30	連続	南条変電所	南条越前2L構内(南条)	南条越前線2LGIS 現地盤電装品修理		更新	
0516158	北陸	2027/12/10 16:30	2027/12/10 18:00	単日	中能登変電所	中能登6Tr/中能登275母連/中能登275丁母線/[停止]1STr	6Tr 1次・2次CB取替後の試充電		更新	
0516159	北陸	2027/12/10 17:00	2027/12/10 19:00	単日	中能登変電所	中能登6Tr/中能登275母連/中能登275丁母線/中能登154A母線/[停止]1STr.6NGR	6Tr 1次・2次CB、6Tr統合形保護盤取替後の方向試験(1-2次)		更新	
0516569	北陸	2027/12/10 17:30	2027/12/10 19:00	単日	中能登変電所	中能登275母連/中能登275丙母線/中能登6Tr/中能登66-6Tr3次母線/中能登1STr/[停止]2STr	6Tr統合形保護盤取替後の方向確認・検相(1-3次、Tr873次.64)		新規	
0516570	北陸	2027/12/10 17:30	2027/12/10 19:00	単日	中能登変電所	中能登275母連/中能登275丙母線/中能登6Tr/中能登66-6Tr3次母線/中能登1STr/[停止]2STr	6Tr統合形保護盤取替後の全要素取込後の確認試験(1-2-3次)		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0516251	北陸	2028/03/14 07:30	2028/03/14 12:30	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前3STr	[3号変圧器保護盤取替]既設3Tr1次DZ、3Tr脱分甲母線BPT2次電圧ケーブル切離し		更新	
0516255	北陸	2028/03/14 07:30	2028/03/14 12:30	単日	越前変電所	越前275丙母線	[3号変圧器保護盤取替]既設3Tr2次DZ、3Tr脱分丙母線BPT2次電圧ケーブル切離し		更新	
0516253	北陸	2028/03/14 12:30	2028/03/14 17:30	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前3STr	[3号変圧器保護盤取替]既設3Tr1次DZ、3Tr脱分乙母線BPT2次電圧ケーブル切離し		更新	
0516257	北陸	2028/03/14 12:30	2028/03/14 17:30	単日	越前変電所	越前275丁母線	[3号変圧器保護盤取替]既設3Tr2次DZ、3Tr脱分丁母線BPT2次電圧ケーブル切離し		更新	
0516235	北陸	2028/03/20 08:30	2028/03/20 10:30	単日	新福井変電所	新福井275甲母線	[275kV母線保護装置取替]275kV甲母線PD2次電圧切替		更新	
0516236	北陸	2028/03/20 09:30	2028/03/20 11:30	単日	新福井変電所	新福井275甲母線/[試験使用]	[275kV母線保護装置取替]275kV甲母線PD2次電圧検相		更新	
0516237	北陸	2028/03/20 10:30	2028/03/20 12:30	単日	新福井変電所	新福井275乙母線	[275kV母線保護装置取替]275kV乙母線PD2次電圧切替		更新	
0516238	北陸	2028/03/20 11:30	2028/03/20 13:30	単日	新福井変電所	新福井275乙母線/[試験使用]	[275kV母線保護装置取替]275kV乙母線PD2次電圧検相		更新	
0516239	北陸	2028/03/21 08:30	2028/03/21 17:30	単日	新福井変電所	新福井275母連/275kV43BUH(新福井)	[275kV母線保護装置取替]275kV母連ケーブル切替		更新	
0516240	北陸	2028/03/21 16:30	2028/03/21 18:30	単日	新福井変電所	新福井275母連/新福井275乙母線/[試験使用]	[275kV母線保護装置取替]275kV母連潮流試験		更新	
0516241	北陸	2028/03/22 08:30	2028/03/22 13:30	単日	新福井変電所	新福井1Tr/新福井275甲母線/新福井1-2ShR	[275kV母線保護装置取替]1Trケーブル切替、甲母線LSバレット取込		更新	
0516259	北陸	2028/03/22 12:30	2028/03/22 17:30	単日	新福井変電所	新福井1Tr/新福井275乙母線/新福井1-2ShR	[275kV母線保護装置取替]1Trケーブル切替、乙母線LSバレット取込		更新	
0516260	北陸	2028/03/22 16:30	2028/03/22 18:30	単日	新福井変電所	新福井1Tr/新福井275乙母線/新福井275母連/[試験使用]	[275kV母線保護装置取替]1Tr 位相測定・差電流確認		更新	
0516261	北陸	2028/03/23 08:30	2028/03/23 13:30	単日	新福井変電所	新福井2Tr/新福井275甲母線	[275kV母線保護装置取替]2Trケーブル切替、甲母線LSバレット取込		更新	
0516262	北陸	2028/03/23 12:30	2028/03/23 17:30	単日	新福井変電所	新福井2Tr/新福井275乙母線	[275kV母線保護装置取替]2Trケーブル切替、乙母線LSバレット取込		更新	
0516263	北陸	2028/03/23 16:30	2028/03/23 18:30	単日	新福井変電所	新福井2Tr/新福井275乙母線/新福井275母連/[試験使用]	[275kV母線保護装置取替]2Tr 位相測定・差電流確認		更新	
0516264	北陸	2028/03/24 08:30	2028/03/24 13:30	単日	新福井変電所	新福井3Tr/新福井275甲母線	[275kV母線保護装置取替]3Trケーブル切替、甲母線LSバレット取込		更新	
0516252	北陸	2028/03/24 11:30	2028/03/24 13:30	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前500母連/[試験使用]	[3号変圧器保護盤取替]甲母線BPT2次電圧検相		更新	
0516256	北陸	2028/03/24 11:30	2028/03/24 13:30	単日	越前変電所	越前275丙母線/越前275母連/[試験使用]	[3号変圧器保護盤取替]丙母線BPT2次電圧検相		更新	
0516265	北陸	2028/03/24 12:30	2028/03/24 17:30	単日	新福井変電所	新福井3Tr/新福井275乙母線	[275kV母線保護装置取替]3Trケーブル切替、乙母線LSバレット取込		更新	
0516254	北陸	2028/03/24 16:30	2028/03/24 18:30	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前500母連/[試験使用]	[3号変圧器保護盤取替]乙母線BPT2次電圧検相		更新	
0516258	北陸	2028/03/24 16:30	2028/03/24 18:30	単日	越前変電所	越前275丁母線/越前275母連/[試験使用]	[3号変圧器保護盤取替]丁母線BPT2次電圧検相		更新	
0516266	北陸	2028/03/24 16:30	2028/03/24 18:30	単日	新福井変電所	新福井3Tr/新福井275乙母線/新福井275母連/[試験使用]	[275kV母線保護装置取替]3Tr 位相測定・差電流確認		更新	
0516267	北陸	2028/03/25 08:30	2028/03/25 13:30	単日	新福井変電所	新福井4Tr/新福井275甲母線/新福井4-2ShR/新福井4-3ShR/新福井4-4ShR/新福井275甲母線	[275kV母線保護装置取替]4Trケーブル切替、甲母線LSバレット取込		更新	
0516268	北陸	2028/03/25 12:30	2028/03/25 17:30	単日	新福井変電所	新福井4Tr/新福井275乙母線/新福井4-2ShR/新福井4-3ShR/新福井4-4ShR/新福井275乙母線	[275kV母線保護装置取替]4Trケーブル切替、乙母線LSバレット取込		更新	
0516269	北陸	2028/03/25 16:30	2028/03/25 18:30	単日	新福井変電所	新福井4Tr/新福井275乙母線/新福井275母連/[試験使用]	[275kV母線保護装置取替]4Tr 位相測定・差電流確認		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0656389	関西	2026/04/03 13:00	2026/04/20 09:00	連続	小曽根支線	小曽根支線NO. 9TW～小曽根S/S	接続箱探油(23人孔)		変更	
0662346	関西	2026/04/06 09:00	2026/04/08 17:00	連続	新北陸幹線1L2	新愛本～城端	鉄塔防錆塗装工事	制約有	変更	
0650429	関西	2026/04/07 10:00	2026/04/07 17:00	単日	新生駒変電所	新生駒線1L線路及び構内	符号700連系に伴う(旧)姫二火力線電源制限装置(新生駒線)制御ケーブル切離しおよび確認試験(新生駒線1L関係)	制約有	変更	
0656385	関西	2026/04/09 09:00	2026/04/10 17:00	毎日	新生駒線2L	宝塚SW/S～新生駒S/S	2026年度小曽根電力所管内鉄塔防錆塗装工事:新生駒線No62防錆塗装	制約有	変更	
0656419	関西	2026/04/09 09:00	2026/04/13 18:00	毎日	南大阪線2L	金剛～南大阪	【電源開発送変電NW件名】熊野幹線NO. 230～231間圧縮接続管点検工事に伴う保安停止		変更	
0650433	関西	2026/04/09 10:00	2026/04/09 17:00	単日	新生駒変電所	新生駒線2L線路及び構内	符号700連系に伴う(旧)姫二火力線電源制限装置(新生駒線)制御ケーブル切離しおよび確認試験(新生駒線2L関係)	制約有	変更	
0663252	関西	2026/04/11 09:00	2026/04/12 17:00	毎日	丹波線2L	京北SW/S～猪名川S/S	丹波線No63がいし取替	制約有	変更	
0662328	関西	2026/04/13 09:00	2026/04/17 17:00	毎日	西播変電所	播磨線1L線路及び構内	西播変電所533LAR取替		変更	
0655160	関西	2026/04/14 10:00	2026/04/15 17:00	毎日	新生駒変電所	新生駒線1L線路および構内	新生駒線1LPCMRy取替に伴うケーブル切替、試験	制約有	変更	
0656502	関西	2026/04/14 10:00	2026/04/15 17:00	連続	宝塚開閉所	新生駒線1L線路及び構内	【宝塚開閉所275kV新生駒線保護リレー改良工事】新生駒線1LPCMRy取替に伴うケーブル切替、試験	制約有	変更	
0656503	関西	2026/04/14 10:00	2026/04/14 17:00	単日	宝塚開閉所	新生駒線1L線路及び構内	【BP要素ロックで作業可】【宝塚開閉所275kV新生駒線保護リレー改良工事】新生駒線1LPCMRy取替に伴うケーブル切替、試験	制約有	変更	
0663066	関西	2026/04/14 10:00	2026/04/15 17:00	連続	新生駒変電所		新生駒線1Lリレー改良に伴うリレー支障		変更	
0655161	関西	2026/04/15 10:00	2026/04/15 17:00	単日	新生駒変電所	新生駒線1L線路および構内	新生駒線1LPCMRy取替に伴う275kVBPトリップ・CBF関係ケーブル切替、試験	制約有	変更	
0655163	関西	2026/04/16 10:00	2026/04/17 17:00	毎日	新生駒変電所	新生駒線2L線路および構内	新生駒線2LPCMRy取替に伴うケーブル切替、試験	制約有	変更	
0656505	関西	2026/04/16 10:00	2026/04/17 17:00	連続	宝塚開閉所	新生駒線2L線路及び構内	【宝塚開閉所275kV新生駒線保護リレー改良工事】新生駒2LPCMRy取替に伴うケーブル切替、試験	制約有	変更	
0656506	関西	2026/04/16 10:00	2026/04/16 17:00	単日	宝塚開閉所	新生駒線2L線路及び構内	【BP要素ロックで作業可】【宝塚開閉所275kV新生駒線保護リレー改良工事】新生駒線2LPCMRy取替に伴うケーブル切替、試験	制約有	変更	
0663067	関西	2026/04/16 10:00	2026/04/17 17:00	連続	新生駒変電所		新生駒線2Lリレー改良に伴うリレー支障		変更	
0656386	関西	2026/04/17 09:00	2026/04/28 17:00	毎日	北大阪線1L	宝塚SW/S～西大阪S/S～北大阪S/S	2026年度小曽根電力所管内鉄塔防錆塗装工事:北大阪線No21、22、23、24、25、29防錆塗装		変更	
0655164	関西	2026/04/17 10:00	2026/04/17 17:00	単日	新生駒変電所	新生駒線2L線路および構内	新生駒線2LPCMRy取替に伴う275kVBPトリップ・CBF関係ケーブル切替、試験	制約有	変更	
0660741	関西	2026/04/21 09:00	2026/04/21 17:00	単日	下穂積支線2L	西大阪S/S～下穂積S/S～北豊中S/S	ケーブル事故点標定装置機能点検		変更	
0655062	関西	2026/04/29 09:00	2026/05/08 17:00	毎日	北大阪線2L	宝塚SW/S～西大阪S/S～北大阪S/S	2026年度小曽根電力所管内鉄塔防錆塗装工事:北大阪線No21、22、23、24、25、29防錆塗装		変更	
0663051	関西	2026/05/07 09:00	2026/05/07 17:00	単日	新神戸変電所	六甲線2L線路及び構内	【275kV変圧器他取替工事】LS124除却に伴う保安停止	制約有	変更	
0656337	関西	2026/05/07 10:00	2026/05/08 16:30	連続	北大阪変電所	北大阪線1L構内	CB03細密点検		変更	
0656501	関西	2026/05/11 10:00	2026/05/11 16:00	単日	宝塚開閉所		【伊丹変電所ほか275kV伊丹線保護リレー改良工事】伊丹線1/2LPCMRy据付に伴う北大阪線1L52TZ保安ロックによる支障		変更	
0656387	関西	2026/05/11 13:00	2026/05/11 17:00	単日	北大阪線1L	宝塚SW/S～西大阪S/S～北大阪S/S	北大阪線No10TW ジャンパーイン(北大阪新大岩線新設工事)	制約有	変更	
0656388	関西	2026/05/11 13:00	2026/05/11 17:00	単日	北大阪線2L	宝塚SW/S～西大阪S/S～北大阪S/S	北大阪線No10TW ジャンパーイン(北大阪新大岩線新設工事)	制約有	変更	
0656545	関西	2026/05/12 09:00	2026/05/17 17:00	毎日	丸山幹線1L	関～甲賀	1. 丸山幹線No275、276、277、278、294(5基)防錆塗装		変更	
0662315	関西	2026/05/12 10:00	2026/05/13 17:00	毎日	東大阪変電所	東大阪新生駒線1L線路及び構内	東大阪新生駒線1Lリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験		変更	
0662320	関西	2026/05/12 10:00	2026/05/13 17:00	毎日	新生駒変電所	東大阪新生駒線1L線路及び構内	東大阪新生駒線1Lリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験		変更	
0663068	関西	2026/05/12 10:00	2026/05/13 17:00	連続	新生駒変電所		東大阪新生駒線1Lリレー改良に伴うリレー支障		変更	
0663085	関西	2026/05/12 10:00	2026/05/13 17:00	連続	東大阪変電所		東大阪新生駒線1Lリレー改良に伴うリレー支障		変更	
0662322	関西	2026/05/14 10:00	2026/05/15 17:00	毎日	新生駒変電所	東大阪新生駒線2L線路及び構内	東大阪新生駒線2Lリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験		変更	
0663069	関西	2026/05/14 10:00	2026/05/15 17:00	連続	新生駒変電所		東大阪新生駒線2Lリレー改良に伴うリレー支障		変更	
0663086	関西	2026/05/14 10:00	2026/05/15 17:00	連続	東大阪変電所		東大阪新生駒線2Lリレー改良に伴うリレー支障		変更	
0662349	関西	2026/05/16 09:00	2026/05/24 17:00	連続	新北陸幹線1L2	新愛本～城端	鉄塔防錆塗装工事	制約有	変更	
0656546	関西	2026/05/18 09:00	2026/05/23 17:00	毎日	丸山幹線2L	関～甲賀	1. 丸山幹線No275、276、277、278、294(5基)防錆塗装		変更	
0656418	関西	2026/05/25 09:00	2026/05/29 18:00	毎日	南大阪線1L	金剛～南大阪	【電源開発送変電NW件名】熊野幹線NO. 230～231間圧縮接続管点検工事に伴う保安停止		変更	
0656486	関西	2026/05/27 09:00	2026/06/07 17:00	毎日	南近江線1L	東近江SW/S～新生駒S/S	南近江線No148他特定がいし取替工事(No148～154)		変更	
0656488	関西	2026/05/27 09:00	2026/06/05 17:00	毎日	南近江線1L	東近江SW/S～新生駒S/S	鉄塔防錆塗装工事		変更	
0660790	関西	2026/05/27 09:00	2026/06/05 17:00	連続	南近江線1L1	東近江SW/S～新生駒S/S	1. 南近江線 東近江SW/S～No7スペーサ取替(7径間)		変更	
0663026	関西	2026/05/27 10:00	2026/05/28 17:00	毎日	東近江開閉所	南近江線1L 線路及び構内	南近江線1L 577LPD直下のCF(カップリングフィルタ)撤去		変更	
0656407	関西	2026/06/02 09:00	2026/06/11 18:00	連続	北和泉線1L	信貴～金剛	【電源開発送変電NW件名】阪奈線No10他送電設備修繕工事		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0656489	関西	2026/06/08 09:00	2026/06/19 17:00	毎日	南近江線2L	東近江SW/S～新生駒S/S	南近江線No148他特定がいし取替工事(No148～154)		変更	
0656491	関西	2026/06/08 09:00	2026/06/17 17:00	毎日	南近江線2L	東近江SW/S～新生駒S/S	鉄塔防錆塗装工事		変更	
0660791	関西	2026/06/08 09:00	2026/06/17 17:00	連続	南近江線2L1	東近江SW/S～新生駒S/S	1. 南近江線 東近江SW/S～No7スベサ取替(7径間)		変更	
0663027	関西	2026/06/08 10:00	2026/06/09 17:00	毎日	東近江開閉所	南近江線2L 線路及び構内	南近江線2L 587LPD直下のCF(カップリングフルタ)撤去		変更	
0656408	関西	2026/06/12 09:00	2026/06/17 18:00	連続	北和泉線2L	信貴～金剛	【電源開発送変電NW件名】阪奈線No101他送電設備保守工事		変更	
0655063	関西	2026/09/14 09:00	2026/12/12 17:00	連続	小曽根支線	西大阪S/S～北豊中S/S～小曽根S/S	小曽根支線ケーブル取替工事		変更	
0655064	関西	2026/09/14 09:00	2026/12/12 17:00	連続	北豊中線1L	西大阪S/S～北豊中S/S～小曽根S/S	小曽根支線ケーブル取替工事(北豊中線1L接続)		変更	
0660742	関西	2026/09/14 09:00	2026/09/14 17:00	単日	小曽根支線	西大阪S/S～小曽根S/S～北豊中S/S	小曽根支線除却工事(J?OFF:No1Tw、電線撤去:No1?2)		変更	
0663070	関西	2026/10/02 10:00	2026/10/02 16:00	単日	西大阪変電所		【西大阪線リレー改良工事】西大阪線1/2LPCMリレー設置に伴う保安ロック		変更	
0655060	関西	2026/10/05 09:00	2026/10/23 17:00	毎日	淀川線1L	淀川S/S～北大阪S/S	淀川線No3他がいし取替工事		変更	
0655070	関西	2026/10/22 09:00	2026/10/23 17:00	毎日	泉南東大阪線1L	泉南～南河内～東大阪	終端箱絶縁油採油作業(泉南東大阪線No57Tw)		変更	
0656454	関西	2026/10/24 09:30	2026/10/24 17:30	単日	新綾部変電所	新綾部線1L及び構内	ED534E?1リミットスイッチ取替	制約有	変更	
0656455	関西	2026/10/25 09:30	2026/10/25 17:30	単日	新綾部変電所	新綾部線2L及び構内	ED544E?1リミットスイッチ取替	制約有	変更	
0655061	関西	2026/10/26 09:00	2026/11/05 17:00	毎日	淀川線2L	淀川S/S～北大阪S/S	淀川線No3他がいし取替工事		変更	
0656405	関西	2026/10/26 10:00	2026/10/28 17:00	連続	金剛変電所	南大阪線2L線路及び構内	GCB06細点		変更	
0660751	関西	2026/10/28 10:00	2026/10/28 17:00	単日	南大阪変電所	南大阪線2L線路および構内	遠方監視制御装置用変換器盤設置に伴うPCT回路切替・試験		変更	
0663028	関西	2026/10/28 10:00	2026/10/28 17:00	単日	金剛変電所	南大阪線2L線路及び構内	給電情報ITM除却に伴うPCT回路切替・試験		変更	
0660752	関西	2026/10/28 17:00	2026/10/28 18:00	単日	南大阪変電所	南大阪線2L線路および構内試験使用(常時系統)	遠方監視制御装置用変換器盤設置に伴う検相および実負荷試験		変更	
0663030	関西	2026/10/28 17:00	2026/10/28 18:00	単日	金剛変電所	南大阪線2L線路及び構内試験系統	給電情報ITM除却に伴うPCT回路切替後の検相試験		変更	
0656406	関西	2026/10/29 10:00	2026/10/31 17:00	連続	金剛変電所	南大阪線1L線路及び構内	GCB05細点		変更	
0660749	関西	2026/10/31 10:00	2026/10/31 17:00	単日	南大阪変電所	南大阪線1L線路および構内	遠方監視制御装置用変換器盤設置に伴うPCT回路切替・試験		変更	
0663029	関西	2026/10/31 10:00	2026/10/31 17:00	単日	金剛変電所	南大阪線1L線路及び構内	給電情報ITM除却に伴うPCT回路切替・試験		変更	
0660750	関西	2026/10/31 17:00	2026/10/31 18:00	単日	南大阪変電所	南大阪線1L線路および構内試験使用(常時系統)	遠方監視制御装置用変換器盤設置に伴う検相および実負荷試験		変更	
0663031	関西	2026/10/31 17:00	2026/10/31 18:00	単日	金剛変電所	南大阪線1L線路及び構内試験系統	給電情報ITM除却に伴うPCT回路切替後の検相試験		変更	
0656390	関西	2026/11/02 13:00	2026/12/02 09:00	連続	小曽根支線	小曽根支線NO. 9TW～小曽根S/S	接続箱採油(47人孔)		変更	
0656534	関西	2026/11/10 09:00	2026/11/13 17:00	毎日	南大和線1L	紀北C/S～東大和SW/S	臨時がいし点検(No83～88間)		変更	
0655186	関西	2026/11/10 10:00	2026/11/13 17:00	毎日	紀北変換所	南大和線1L線路および構内	南大和線1LPCMRY(A)制御ケーブル切替・試験		変更	
0656530	関西	2026/11/10 10:00	2026/11/13 17:00	毎日	東大和開閉所	南大和線1L線路及び構内	南大和線1LPCMRY(A系)ケーブル切替・試験		変更	
0656535	関西	2026/11/16 09:00	2026/11/19 17:00	毎日	南大和線2L	紀北C/S～東大和SW/S	臨時がいし点検(No83～88間)		変更	
0656548	関西	2026/11/16 09:00	2026/11/17 17:00	連続	紀北変換所	南大和線2L線路および構内	CB542、543LPD定期点検		変更	
0654869	関西	2026/11/16 10:00	2026/11/17 17:00	連続	西大阪変電所	西大阪線1L線路および構内	【西大阪線リレー改良工事】西大阪線1Lリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験		変更	
0654873	関西	2026/11/16 10:00	2026/11/17 17:00	連続	西大阪変電所		【西大阪線リレー改良工事】西大阪線1Lリレー改良に伴うリレー支障		変更	
0654875	関西	2026/11/16 10:00	2026/11/17 17:00	連続	能勢変電所	西大阪線1L線路および構内	【西大阪線リレー改良工事】西大阪線1L改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験		変更	
0654886	関西	2026/11/16 10:00	2026/11/17 17:00	連続	能勢変電所		【西大阪線リレー改良工事】西大阪線1L改良に伴うリレー支障		変更	
0655189	関西	2026/11/16 10:00	2026/11/19 17:00	毎日	紀北変換所	南大和線2L線路および構内	南大和線2LPCMRY(A)制御ケーブル切替・試験		変更	
0656531	関西	2026/11/16 10:00	2026/11/19 17:00	毎日	東大和開閉所	南大和線2L線路及び構内	南大和線2LPCMRY(A系)ケーブル切替・試験		変更	
0654897	関西	2026/11/17 10:00	2026/11/17 12:00	単日	能勢変電所	西大阪線1L線路および構内	【西大阪線リレー改良工事】西大阪線1L改良に伴う275kVB P・CBFTリップ関係試験		変更	
0654870	関西	2026/11/17 12:00	2026/11/17 14:00	単日	西大阪変電所	西大阪線1L線路および構内	【西大阪線リレー改良工事】西大阪線1Lリレー改良に伴う275kVB Pトリップ関係試験	制約有	変更	
0654871	関西	2026/11/18 10:00	2026/11/19 17:00	連続	西大阪変電所	西大阪線2L線路および構内	【西大阪線リレー改良工事】西大阪線2Lリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験		変更	
0654874	関西	2026/11/18 10:00	2026/11/19 17:00	連続	西大阪変電所		【西大阪線リレー改良工事】西大阪線2Lリレー改良に伴うリレー支障		変更	
0654931	関西	2026/11/18 10:00	2026/11/19 17:00	連続	能勢変電所	西大阪線2L線路および構内	【西大阪線リレー改良工事】西大阪線2L改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験		変更	
0663089	関西	2026/11/18 10:00	2026/11/19 17:00	連続	能勢変電所		【西大阪線リレー改良工事】西大阪線2L改良に伴うリレー支障		変更	
0654932	関西	2026/11/19 10:00	2026/11/19 12:00	単日	能勢変電所	西大阪線2L線路および構内	【西大阪線リレー改良工事】西大阪線2L改良に伴う275kVB P・CBFTリップ関係試験		変更	
0654872	関西	2026/11/19 12:00	2026/11/19 14:00	単日	西大阪変電所	西大阪線2L線路および構内	【西大阪線リレー改良工事】西大阪線2Lリレー改良に伴う275kVB Pトリップ関係試験		変更	
0655196	関西	2026/11/24 10:00	2026/11/27 17:00	毎日	紀北変換所	南大和線1L線路および構内	南大和線1LPCMRY(B)制御ケーブル切替・試験		変更	
0656532	関西	2026/11/24 10:00	2026/11/27 17:00	毎日	東大和開閉所	南大和線1L線路及び構内	南大和線1LPCMRY(B系)ケーブル切替・試験		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0663071	関西	2026/11/27 10:00	2026/11/27 16:00	単日	西大阪変電所		【西大阪線リレー改良工事】西大阪線1ノ2LPCMリレー除却に伴う保安ロック		変更	
0655193	関西	2026/11/30 10:00	2026/12/03 17:00	毎日	紀北変換所	南大和線2L線路および構内	南大和線2LPCMRY(B)制御ケーブル切替・試験		変更	
0656533	関西	2026/11/30 10:00	2026/12/03 17:00	毎日	東大和開閉所	南大和線2L線路及び構内	南大和線2LPCMRY(B系)ケーブル切替・試験		変更	
0656340	関西	2026/12/07 09:00	2026/12/10 17:00	毎日	北大和線1L1	南京都SノS～東大和SWノS	端子取替1基(No73)		変更	
0660743	関西	2026/12/13 09:00	2026/12/13 17:00	単日	北豊中線1L	西大阪SノS～北豊中SノS～小曽根SノS	新型標定装置設置工事に伴う開閉サージ試験(CB投入(5回)によるトリップ信号取り組み)		変更	
0655210	関西	2027/01/25 09:00	2027/01/28 17:00	毎日	西播線1L	姫路～西播	2026防錆塗装工事(西播線No37, 41, 46)		変更	
0656653	関西	2027/01/25 09:00	2027/01/27 17:00	毎日	西播線1L	姫路～西播	2026年度ダンパ工事(西播線1, 2, 5, 5G1, 7, 10, 11, 15, 26?28, 31?34)		変更	
0656420	関西	2027/01/25 09:30	2027/01/26 17:00	連続	洛南変電所	洛南支線2L構内	CB02細密点検(接触抵抗測定有り CTロック必要)		変更	
0656611	関西	2027/01/25 10:00	2027/01/25 17:00	単日	西播変電所	西播線1L線路および構内	275kVBPPrY(区分2)(B系) ケーブル切離し(西播線1L)		変更	
0656654	関西	2027/02/08 09:00	2027/02/12 17:00	毎日	西播線2L	姫路～西播	2026防錆塗装工事(西播線No37, 41, 46)		変更	
0656656	関西	2027/02/08 09:00	2027/02/17 17:00	連続	西播線2L	姫路～西播	姫路船線(No6)～10OPGW張替に伴う保安停止		変更	
0656421	関西	2027/02/08 09:30	2027/02/09 17:00	連続	洛南変電所	洛南支線1L構内	CB01細密点検(接触抵抗測定有り CTロック必要)		変更	
0656612	関西	2027/02/08 10:00	2027/02/08 17:00	単日	西播変電所	西播線2L線路および構内	275kVBPPrY(区分2)(B系) ケーブル切離し(西播線2L)		変更	
0656655	関西	2027/02/09 09:00	2027/02/11 17:00	毎日	西播線2L	姫路～西播	2026年度ダンパ工事(西播線1, 2, 5, 5G1, 7, 10, 11, 15, 26?28, 31?34)		変更	
0662319	関西	2027/02/10 09:30	2027/02/10 17:00	単日	洛南変電所	洛南支線1L及び構内	LS1不具合修理		変更	
0655077	関西	2027/03/02 10:00	2027/03/02 13:00	単日	西京都変電所	若狭幹線(里)1L線路及び構内	【西京都500kVBP改良】甲1BP(A系)の若狭幹線(里)1L要素ケーブル切替・試験		変更	
0655078	関西	2027/03/02 13:00	2027/03/02 15:00	単日	西京都変電所	若狭幹線(里)2L線路及び構内	【西京都500kVBP改良】甲1BP(A系)の若狭幹線(里)2L要素ケーブル切替・試験		変更	
0655086	関西	2027/03/03 10:00	2027/03/03 13:00	単日	西京都変電所	能勢線1L線路及び構内	【西京都500kVBP改良】甲2BP(A系)の能勢線1L要素ケーブル切替・試験		変更	
0655087	関西	2027/03/03 13:00	2027/03/03 15:00	単日	西京都変電所	能勢線2L線路及び構内	【西京都500kVBP改良】甲2BP(A系)の能勢線2L要素ケーブル切替・試験		変更	
0656536	関西	2027/03/14 09:00	2027/03/19 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)1L	新生駒SノS～信貴SノS	送電設備補修工事(防錆塗装(胴金部) 1基、防錆塗装(飛散防止) 2基、難着雪化対策 2径間、圧縮接続管点検 8基)		変更	
0656475	関西	2027/03/16 09:30	2027/03/17 17:00	連続	嶺南変電所	湖東線1L構内	CB023細密点検(12Y)		変更	
0655175	関西	2027/03/16 10:00	2027/03/19 17:00	連続	湖東変電所	湖東線1L 線路及び構内	【Ar取替工事】湖東線1LAr取替		変更	
0656537	関西	2027/03/20 09:00	2027/03/25 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)2L	新生駒SノS～信貴SノS	送電設備補修工事(防錆塗装(胴金部) 1基、防錆塗装(飛散防止) 2基、難着雪化対策 2径間、圧縮接続管点検 8基)		変更	
0656522	関西	2027/03/21 09:00	2027/03/21 17:00	単日	北摂変電所	東播線1L線路及び構内	【北摂500kV遮断器取替工事】CB552取替に伴うCB552～LS553間架線切離し		変更	
0656476	関西	2027/03/23 09:30	2027/03/24 17:00	連続	嶺南変電所	湖東線2L構内	CB024細密点検(12Y)		変更	
0655100	関西	2027/03/23 10:00	2027/03/23 13:00	単日	西京都変電所	能勢線1L線路及び構内	【西京都500kVBP改良】甲2BP(B系)の能勢線1L要素ケーブル切替・試験		変更	
0655176	関西	2027/03/23 10:00	2027/03/26 17:00	連続	湖東変電所	湖東線2L 線路及び構内	【Ar取替工事】湖東線2LAr取替		変更	
0655101	関西	2027/03/23 13:00	2027/03/23 15:00	単日	西京都変電所	能勢線2L線路及び構内	【西京都500kVBP改良】甲2BP(B系)の能勢線2L要素ケーブル切替・試験		変更	
0655092	関西	2027/03/24 10:00	2027/03/24 13:00	単日	西京都変電所	若狭幹線(里)1L線路及び構内	【西京都500kVBP改良】甲1BP(B系)の若狭幹線(里)1L要素ケーブル切替・試験		変更	
0655093	関西	2027/03/24 13:00	2027/03/24 15:00	単日	西京都変電所	若狭幹線(里)2L線路及び構内	【西京都500kVBP改良】甲1BP(B系)の若狭幹線(里)2L要素ケーブル切替・試験		変更	
0654958	関西	2027/03/30 10:00	2027/04/02 17:00	毎日	能勢変電所	播磨中央線1L線路および構内	【播磨中央線リレー改良工事】播磨中央線1LPCMRY(A)ケーブル切替・試験		変更	
0655361	関西	2027/03/30 10:00	2027/04/02 17:00	毎日	山崎開閉所	播磨中央線1L線路および構内	播磨中央線1LPCMRY(A)ケーブル切替・試験		変更	
0655362	関西	2027/03/31 10:00	2027/03/31 17:00	単日	山崎開閉所	播磨中央線1L線路および構内	播磨中央線1L(A系) トリップ、クローズ、CBパレット 制御ケーブル切替・試験		変更	
0660950	関西	2027/04/02 13:00	2027/04/19 09:00	連続	小曽根支線	小曽根支線NO. 9TW～小曽根SノS	接続箱採油(23人孔)		変更	
0661188	関西	2027/04/02 17:00	2027/04/02 18:00	単日	山崎開閉所	播磨中央線1L試験系統	播磨中央線1LPCMRY(A)実負荷試験		変更	
0662357	関西	2027/04/02 17:00	2027/04/02 18:00	単日	能勢変電所	播磨中央線1L試験系統	【播磨中央線リレー改良工事】播磨中央線1LPCMRY(A)実負荷方向試験		変更	
0655159	関西	2027/04/06 09:00	2027/04/07 17:00	毎日	丹後幹線1L1	新綾部～猪名川	甲No69がいし個取替		変更	
0656482	関西	2027/04/06 09:00	2027/04/09 17:00	連続	丹後幹線1L	新綾部SノS～猪名川SノS	鉄塔部材修繕工事		変更	
0656483	関西	2027/04/06 09:00	2027/04/09 17:00	連続	丹後幹線1L	新綾部SノS～猪名川SノS	鉄塔部材修繕工事		変更	
0660786	関西	2027/04/06 09:00	2027/04/09 17:00	毎日	丹後幹線1L1	新綾部～猪名川	甲No69他鉄塔防錆塗装		変更	
0655129	関西	2027/04/06 10:00	2027/04/09 17:00	毎日	新綾部変電所	丹後幹線1L線路及び構内	【新綾部変電所丹後幹線保護リレー改良工事】丹後幹線1LPCMRY(A)制御ケーブル切替・試験		変更	
0655146	関西	2027/04/06 10:00	2027/04/09 17:00	毎日	猪名川変電所	丹後幹線1L線路及び構内	丹後幹線1LPCMRY(A)制御ケーブル切替・試験		変更	
0661189	関西	2027/04/06 10:00	2027/04/09 17:00	毎日	山崎開閉所	播磨中央線2L線路及び構内	播磨中央線2LPCMRY(A)ケーブル切替・試験		変更	
0662358	関西	2027/04/06 10:00	2027/04/09 17:00	毎日	能勢変電所	播磨中央線2L線路および構内	【播磨中央線リレー改良工事】播磨中央線2LPCMRY(A)ケーブル切替・試験		変更	
0661190	関西	2027/04/07 10:00	2027/04/07 17:00	単日	山崎開閉所	播磨中央線2L線路および構内	播磨中央線2L(A系) トリップ、クローズ、CBパレット 制御ケーブル切替・試験		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0662359	関西	2027/04/07 10:00	2027/04/07 17:00	単日	能勢変電所	播磨中央線2L線路および構内	【播磨中央線リレー改良工事】播磨中央線2L(A)トリップ、クローズ、CBバレット、制御ケーブル切替、試験		変更	
0661191	関西	2027/04/09 17:00	2027/04/09 18:00	単日	山崎開閉所	播磨中央線2L試験系統	播磨中央線2LPCMRy(A)実負荷試験		変更	
0662360	関西	2027/04/09 17:00	2027/04/09 18:00	単日	能勢変電所	播磨中央線2L試験系統	【播磨中央線リレー改良工事】播磨中央線2LPCMRy(A)実負荷方向試験		変更	
0656484	関西	2027/04/12 09:00	2027/04/15 17:00	連続	丹後幹線2L	新綾部S/S～猪名川S/S	鉄塔部材修繕工事		変更	
0656485	関西	2027/04/12 09:00	2027/04/15 17:00	連続	丹後幹線2L	新綾部S/S～猪名川S/S	部材修繕工事		変更	
0660787	関西	2027/04/12 09:00	2027/04/15 17:00	毎日	丹後幹線2L1	新綾部～猪名川	乙No69他鉄塔防錆塗装		変更	
0655131	関西	2027/04/12 10:00	2027/04/15 17:00	毎日	新綾部変電所	丹後幹線2L線路及び構内	【新綾部変電所丹後幹線保護リレー改良工事】丹後幹線2LPCMRy(A)制御ケーブル切替、試験		変更	
0655148	関西	2027/04/12 10:00	2027/04/15 17:00	毎日	猪名川変電所	丹後幹線2L線路及び構内	丹後幹線2LPCMRy(A)制御ケーブル切替、試験		変更	
0663038	関西	2027/04/12 10:00	2027/04/12 12:00	単日	金剛変電所	北葛城線1L線路及び構内	給電情報ITM装置除却に伴う、ケーブル切替・試験(北葛城線1L)		変更	
0663039	関西	2027/04/12 12:00	2027/04/12 13:00	単日	金剛変電所	北葛城線1L線路及び構内試験使用	給電情報ITM装置除却に伴う、ケーブル切替後の検相試験(北葛城線1L)		変更	
0663040	関西	2027/04/12 13:00	2027/04/12 15:00	単日	金剛変電所	北葛城線2L線路及び構内	給電情報ITM装置除却に伴う、ケーブル切替・試験(北葛城線2L)		変更	
0663041	関西	2027/04/12 15:00	2027/04/12 16:00	単日	金剛変電所	北葛城線2L線路及び構内試験使用	給電情報ITM装置除却に伴う、ケーブル切替後の検相試験(北葛城線2L)		変更	
0661192	関西	2027/04/13 10:00	2027/04/16 17:00	毎日	山崎開閉所	播磨中央線1L線路及び構内	播磨中央線1LPCMRy(B)ケーブル切替、試験		変更	
0662361	関西	2027/04/13 10:00	2027/04/16 17:00	毎日	能勢変電所	播磨中央線1L線路および構内	【播磨中央線リレー改良工事】播磨中央線1LPCMRy(B)ケーブル切替、試験		変更	
0661193	関西	2027/04/14 10:00	2027/04/14 17:00	単日	山崎開閉所	播磨中央線1L線路および構内	播磨中央線1L(B系)トリップ、クローズ、CBバレット 制御ケーブル切替、試験		変更	
0662362	関西	2027/04/14 10:00	2027/04/14 17:00	単日	能勢変電所	播磨中央線1L線路および構内	【播磨中央線リレー改良工事】播磨中央線1L(B)トリップ、クローズ、CBバレット、制御ケーブル切替、試験		変更	
0661051	関西	2027/04/15 09:30	2027/04/16 17:00	連続	宝塚開閉所	宝塚線2L構内	CB016細密点検	制約有	変更	
0660931	関西	2027/04/15 10:00	2027/04/16 16:30	連続	淀川変電所	淀川線2L構内	CB04細密点検		変更	
0661194	関西	2027/04/16 17:00	2027/04/16 18:00	単日	山崎開閉所	播磨中央線1L試験系統	播磨中央線1LPCMRy(B)実負荷試験		変更	
0662363	関西	2027/04/16 17:00	2027/04/16 18:00	単日	能勢変電所	播磨中央線1L試験系統	【播磨中央線リレー改良工事】播磨中央線1LPCMRy(B)実負荷方向試験		変更	
0655133	関西	2027/04/20 10:00	2027/04/23 17:00	毎日	新綾部変電所	丹後幹線1L線路及び構内	【新綾部変電所丹後幹線保護リレー改良工事】丹後幹線1LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験		変更	
0655150	関西	2027/04/20 10:00	2027/04/23 17:00	毎日	猪名川変電所	丹後幹線1L線路及び構内	丹後幹線1LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験		変更	
0661195	関西	2027/04/20 10:00	2027/04/23 17:00	毎日	山崎開閉所	播磨中央線2L線路及び構内	播磨中央線2LPCMRy(B)ケーブル切替、試験		変更	
0662364	関西	2027/04/20 10:00	2027/04/23 17:00	毎日	能勢変電所	播磨中央線2L線路および構内	【播磨中央線リレー改良工事】播磨中央線2LPCMRy(B)ケーブル切替、試験		変更	
0661196	関西	2027/04/21 10:00	2027/04/21 17:00	単日	山崎開閉所	播磨中央線2L線路および構内	播磨中央線2L(B系)トリップ、クローズ、CBバレット 制御ケーブル切替、試験		変更	
0662365	関西	2027/04/21 10:00	2027/04/21 17:00	単日	能勢変電所	播磨中央線2L線路および構内	【播磨中央線リレー改良工事】播磨中央線2L(B)トリップ、クローズ、CBバレット、制御ケーブル切替、試験		変更	
0660946	関西	2027/04/23 09:00	2027/05/10 17:00	連続	西京都線1L	西京都S/S～淀川S/S	淀川北大阪線西京都線No32～12改良工事:淀川北大阪線No3～西京都線No32 架線工事に伴う保安停止		変更	
0660947	関西	2027/04/23 09:00	2027/05/10 17:00	毎日	西京都線1L	西京都S/S～淀川S/S	2027年度小曽根電力所管内鉄塔防錆塗装工事:西京都線No7、19、21、22、25、27、28防錆塗装		変更	
0661197	関西	2027/04/23 17:00	2027/04/23 18:00	単日	山崎開閉所	播磨中央線2L試験系統	播磨中央線2LPCMRy(B)実負荷試験		変更	
0662366	関西	2027/04/23 17:00	2027/04/23 18:00	単日	能勢変電所	播磨中央線2L試験系統	【播磨中央線リレー改良工事】播磨中央線2LPCMRy(B)実負荷方向試験		変更	
0655135	関西	2027/04/25 10:00	2027/04/28 17:00	毎日	新綾部変電所	丹後幹線2L線路及び構内	【新綾部変電所丹後幹線保護リレー改良工事】丹後幹線2LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験		変更	
0655153	関西	2027/04/25 10:00	2027/04/28 17:00	毎日	猪名川変電所	丹後幹線2L線路及び構内	丹後幹線2LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験		変更	
0661157	関西	2027/04/27 09:30	2027/04/28 17:30	連続	新加古川変電所	西神戸線1L構内	CB017細密点検	制約有	変更	
0661049	関西	2027/05/06 09:00	2027/05/07 17:00	連続	神戸変電所	北神線1L構内	CB01細密点検		変更	
0660869	関西	2027/05/11 09:00	2027/05/14 17:00	毎日	山城東線1L	東近江～南京都	1. 損傷部材取替 2. 防錆塗装		変更	
0660948	関西	2027/05/11 09:00	2027/05/22 17:00	連続	西京都線2L	西京都S/S～淀川S/S	淀川北大阪線西京都線No32～12改良工事:淀川北大阪線No3～西京都線No32 架線工事に伴う保安停止		変更	
0660949	関西	2027/05/11 09:00	2027/05/22 17:00	毎日	西京都線2L	西京都S/S～淀川S/S	2027年度小曽根電力所管内鉄塔防錆塗装工事:西京都線No7、19、21、22、25、27、28防錆塗装		変更	
0661046	関西	2027/05/11 09:00	2027/05/20 17:00	連続	湖東線1L	嶺南S/S～湖東S/S	越前嶺南線一部改良工事(横断箇所架線時の防護対策)に伴う保安停止		変更	
0661047	関西	2027/05/11 09:00	2027/05/20 17:00	連続	湖東線1L	嶺南S/S～湖東S/S	湖東線一部改良工事(湖東線No1 基礎掘削の矢板圧入)に伴う保安停止		変更	
0661140	関西	2027/05/11 09:00	2027/05/15 17:00	毎日	湖東線1L1	嶺南～湖東	1. No48ほか3基防錆塗装		変更	
0661055	関西	2027/05/11 10:00	2027/05/14 17:00	毎日	猪名川変電所	東播線1L線路及び構内	東播線1LPCMRy(A)制御ケーブル切替、試験		変更	
0661081	関西	2027/05/11 10:00	2027/05/14 17:00	毎日	北摂変電所	東播線1L線路及び構内	東播線1LPCMRy(A)制御ケーブル切替、試験		変更	
0661060	関西	2027/05/14 09:00	2027/05/16 17:00	毎日	北摂変電所	東播線1L線路及び構内	【北摂500kV遮断器取替工事】CB552取替に伴うBsg組立		変更	
0660870	関西	2027/05/17 09:00	2027/05/20 17:00	毎日	山城東線2L	東近江～南京都	1. 損傷部材取替 2. 防錆塗装		変更	
0661056	関西	2027/05/17 10:00	2027/05/20 17:00	毎日	猪名川変電所	東播線2L線路及び構内	東播線2LPCMRy(A)制御ケーブル切替、試験		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0661082	関西	2027/05/17 10:00	2027/05/20 17:00	毎日	北摂変電所	東播線2L線路及び構内	東播線2LPCMRy(A)制御ケーブル切替、試験		変更	
0661039	関西	2027/05/20 09:00	2027/05/22 17:00	毎日	南京都線2L	南京都S／S～洛南S／S～枚方S／S	鉄塔防錆塗装工事		変更	
0663095	関西	2027/05/21 10:00	2027/05/21 16:00	単日	三宮線1L	神戸～三宮	終端箱調査(三宮線No. 3TW)		変更	
0661141	関西	2027/05/25 09:00	2027/05/29 17:00	毎日	湖東線2L1	嶺南～湖東	1. No48ほか3基防錆塗装		変更	
0661050	関西	2027/05/25 09:30	2027/05/25 17:00	単日	神戸変電所	三宮線1L線路	JPS製275kVVCVケーブル終端部ガス分析(同機種No347)		変更	
0661057	関西	2027/05/25 10:00	2027/05/28 17:00	毎日	猪名川変電所	東播線1L線路及び構内	東播線1LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験		変更	
0661058	関西	2027/05/25 10:00	2027/05/28 17:00	毎日	猪名川変電所	東播線2L線路及び構内	東播線2LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験		変更	
0661083	関西	2027/05/25 10:00	2027/05/28 17:00	毎日	北摂変電所	東播線1L線路及び構内	東播線1LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験		変更	
0661084	関西	2027/05/31 10:00	2027/06/03 17:00	毎日	北摂変電所	東播線2L線路及び構内	東播線2LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験		変更	
0660792	関西	2027/06/01 09:00	2027/06/02 17:00	毎日	甲賀線1L	甲賀～南京都	1. ダンバ修繕(No. 42、43、46、47)		変更	
0660793	関西	2027/06/01 09:00	2027/06/02 17:00	毎日	甲賀線1L	甲賀～南京都	ダンバ修繕(No. 32、36、37、39、40)		変更	
0661007	関西	2027/06/01 09:00	2027/06/04 17:00	連続	南京都変電所	甲賀線1L及び構内	【南京都275kVLPD取替】3LPD取替		変更	
0661011	関西	2027/06/01 09:30	2027/06/03 17:00	連続	南京都変電所	甲賀線1L線路及び同構内	【南京都変電所275KV断路器操作箱他修繕工事】LS3、3E操作装置取替、社内試験		変更	
0661062	関西	2027/06/06 09:00	2027/06/06 17:00	単日	北摂変電所	東播線1L線路	【北摂500kV遮断器取替工事】CB552取替に伴う東播線1L側架線接続		変更	
0660794	関西	2027/06/07 09:00	2027/06/08 17:00	毎日	甲賀線2L	甲賀～南京都	ダンバ修繕(No. 42、43、46、47)		変更	
0660795	関西	2027/06/07 09:00	2027/06/08 17:00	毎日	甲賀線2L	甲賀～南京都	ダンバ修繕(No. 32、36、37、39、40)		変更	
0661008	関西	2027/06/07 09:00	2027/06/10 17:00	連続	南京都変電所	甲賀線2L及び構内	【南京都275kVLPD取替】4LPD取替		変更	
0661006	関西	2027/06/07 09:30	2027/06/08 17:00	連続	南京都変電所	甲賀線2L構内	CB04細密点検		変更	
0661009	関西	2027/06/07 09:30	2027/06/09 17:00	連続	南京都変電所	甲賀線2L線路及び同構内	【南京都変電所275KV断路器操作箱他修繕工事】LS4、4E操作装置取替、社内試験		変更	
0661038	関西	2027/06/14 09:00	2027/06/16 17:00	毎日	南京都線1L	南京都S／S～洛南S／S～枚方S／S	鉄塔防錆塗装工事		変更	
0661012	関西	2027/06/14 09:30	2027/06/16 17:00	連続	南京都変電所	南京都線1L線路及び同構内	【南京都変電所275KV断路器操作箱他修繕工事】LS7、7E、71操作装置取替、社内試験		変更	
0661005	関西	2027/06/17 09:30	2027/06/18 17:00	連続	南京都変電所	南京都線1L構内	CB07細密点検		変更	
0661014	関西	2027/06/17 09:30	2027/06/19 17:00	連続	南京都変電所	南京都線1L構内	【南京都変電所275KV断路器操作箱他修繕工事】LS72操作装置取替、社内試験		変更	
0661048	関西	2027/09/28 00:00	2027/10/17 00:00	連続	湖東線1L	嶺南S／S～湖東S／S	湖東線一部改良工事(湖東線No1 基礎掘削時の矢板撤去)に伴う保安停止		変更	
0660860	関西	2027/10/01 09:00	2027/11/12 17:00	連続	北近江線2L	嶺南S／S～東近江SW／S	越前嶺南線一部改良工事(越前嶺南線No177 鉄塔組立)に伴う保安停止		変更	
0660932	関西	2027/10/01 10:00	2027/10/01 13:00	単日	淀川変電所	淀川線1L構内	大黒部幹線電源制限リレー改良に伴う制御ケーブル切替および確認試験(淀川線1L要素)		変更	
0660933	関西	2027/10/01 13:00	2027/10/01 16:00	単日	淀川変電所	淀川線2L構内	大黒部幹線電源制限リレー改良に伴う制御ケーブル切替および確認試験(淀川線2L要素)		変更	
0663043	関西	2027/10/03 10:00	2027/10/03 13:00	単日	西京都変電所	西京都線1L線路および構内	【城端開閉所他電源制限装置増強工事】大黒部幹線電源制限リレー-西京都線1L要素ケーブル切替・試験		変更	
0663044	関西	2027/10/03 13:00	2027/10/03 16:00	単日	西京都変電所	西京都線2L線路および構内	【城端開閉所他電源制限装置増強工事】大黒部幹線電源制限リレー-西京都線2L要素ケーブル切替・試験		変更	
0656507	関西	2027/10/25 10:00	2027/10/26 16:00	連続	宝塚開閉所	伊丹線1L線路及び構内	【伊丹変電所ほか275kV伊丹線保護リレー改良工事】伊丹線1LPCMRy取替およびトリップコイル盤除却に伴うケーブル切替、試験	制約有	変更	
0656910	関西	2027/10/25 10:00	2027/10/26 16:00	連続	伊丹変電所	伊丹線1L線路及び構内	伊丹線1LPCMRy取替に伴うケーブル切替、試験	制約有	変更	
0660779	関西	2027/10/25 10:00	2027/10/25 16:00	単日	伊丹変電所	伊丹線1L線路及び構内	伊丹線1LPCMRy取替に伴うケーブル切替、試験	制約有	変更	
0660781	関西	2027/10/26 10:00	2027/10/26 16:00	単日	宝塚開閉所	伊丹線1L線路及び構内	【伊丹変電所ほか275kV伊丹線保護リレー改良工事】伊丹線1LPCMRy取替およびトリップコイル監視盤除却に伴うケーブル切替、試験	制約有	変更	
0656509	関西	2027/10/27 10:00	2027/10/28 16:00	連続	宝塚開閉所	伊丹線2L線路及び構内	【伊丹変電所ほか275kV伊丹線保護リレー改良工事】伊丹線2LPCMRy取替およびトリップコイル監視盤除却に伴うケーブル切替、試験	制約有	変更	
0656911	関西	2027/10/27 10:00	2027/10/28 16:00	連続	伊丹変電所	伊丹線2L線路及び構内	伊丹線2LPCMRy取替に伴うケーブル切替、試験	制約有	変更	
0660780	関西	2027/10/27 10:00	2027/10/27 16:00	単日	伊丹変電所	伊丹線2L線路及び構内	伊丹線2LPCMRy取替に伴うケーブル切替、試験	制約有	変更	
0660782	関西	2027/10/28 10:00	2027/10/28 16:00	単日	宝塚開閉所	伊丹線2L線路及び構内	【伊丹変電所ほか275kV伊丹線保護リレー改良工事】伊丹線2LPCMRy取替およびトリップコイル監視盤除却に伴うケーブル切替、試験	制約有	変更	
0660796	関西	2027/11/01 09:00	2027/11/05 17:00	連続	栗東線2L	栗東～湖南	栗東線架空地線張替No6～9		変更	
0660951	関西	2027/11/02 13:00	2027/12/02 09:00	連続	小曾根支線	小曾根支線NO. 9TW～小曾根S／S	接続箱探油(47人孔)		変更	
0661016	関西	2027/11/04 09:00	2027/11/17 17:00	連続	南京都変電所	北大和線2L線路及び構内	【500kV断路器536他改良工事】LS564導電部・操作箱取替および確認試験		変更	
0661129	関西	2027/11/23 09:00	2027/11/29 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)1L	新生駒S／S～信貴S／S	送電設備補修工事(圧縮接続管点検 10基)		変更	
0661130	関西	2027/11/30 09:00	2027/12/06 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)2L	新生駒S／S～信貴S／S	送電設備補修工事(圧縮接続管点検 10基)		変更	
0661034	関西	2027/12/01 09:00	2027/12/13 17:00	毎日	能勢線1L	能勢S／S～西京都S／S	能勢線特定がたい取替(No3、7、8、9、15、18、19、21、23、24、26、27、33)		変更	
0660982	関西	2027/12/08 09:00	2027/12/19 18:00	連続	北和泉線1L	信貴～金剛	【電源開発送変電NW件名】阪奈線No3他送電設備補修工事		変更	
0660988	関西	2027/12/10 09:00	2028/01/31 17:00	連続	南和泉線1L	金剛～紀の川	【南和泉線線No68他がたい子装置取替工事】がたい子装置取替(3工区)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0660989	関西	2027/12/10 09:00	2028/01/31 17:00	連続	南和泉線1L	金剛～紀の川	【南和泉線線No68他がい子装置取替工事】がいし装置取替(4工区)		変更	
0661035	関西	2027/12/14 09:00	2027/12/26 17:00	毎日	能勢線2L	能勢S/S～西京都S/S	能勢線特定がいし取替(No3、7、8、9、15、18、19、21、23、24、26、27、33)		変更	
0660983	関西	2028/01/12 09:00	2028/01/23 18:00	連続	北和泉線2L	信貴～金剛	【電源開発送変電NW件名】阪奈線No3他送電設備保修工事		変更	
0661214	関西	2028/01/31 09:00	2028/02/02 17:00	毎日	西播線1L	姫路～西播	防錆塗装工事(西播線No1、2)		変更	
0661215	関西	2028/01/31 09:00	2028/02/05 17:00	毎日	西播線1L	姫路～西播	防錆塗装工事(西播線No10、63、64)		変更	
0660990	関西	2028/02/10 09:00	2028/03/27 17:00	連続	南和泉線2L	金剛～紀の川	【南和泉線No68他がい子装置取替工事】がいし装置取替(3工区)		変更	
0660991	関西	2028/02/10 09:00	2028/03/27 17:00	連続	南和泉線2L	金剛～紀の川	【南和泉線No68他がい子装置取替工事】がいし装置取替(4工区)		変更	
0661216	関西	2028/02/14 09:00	2028/02/16 17:00	毎日	西播線2L	姫路～西播	防錆塗装工事(西播線No1、2)		変更	
0661217	関西	2028/02/14 09:00	2028/02/19 17:00	毎日	西播線2L	姫路～西播	防錆塗装工事(西播線No10、63、64)		変更	
0660919	関西	2028/03/01 09:30	2028/03/03 16:30	連続	枚方変電所	東大阪線1L構内	CBO5細密点検		変更	
0660992	関西	2028/03/04 09:00	2028/03/05 17:00	毎日	泉南東大阪線1L	泉南～南河内～東大阪	終端箱絶縁油採油作業(泉南東大阪線No57Tw)		変更	
0663231	関西	2028/03/05 10:00	2028/03/05 13:00	単日	泉南変電所	泉南東大阪線1L線路及び構内	給電情報ITM除却に伴うPCT回路切替・試験(泉南東大阪線1L)		変更	
0661092	関西	2028/03/06 09:00	2028/03/10 17:00	毎日	六甲線1L	新神戸～西神戸	六甲線No6他鉄塔防錆塗装		変更	
0663233	関西	2028/03/12 10:00	2028/03/12 13:00	単日	泉南変電所	泉南東大阪線2L線路及び構内	給電情報ITM除却に伴うPCT回路切替・試験(泉南東大阪線2L)		変更	
0661093	関西	2028/03/13 09:00	2028/03/17 17:00	毎日	六甲線2L	新神戸～西神戸	六甲線No6他鉄塔防錆塗装		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0722680	中国	2026/04/13 09:00	2026/04/15 17:00	連続	新広島変電所	500kV母連	IP-DCS取替(500kV母連)		変更	
0722811	中国	2026/04/16 09:00	2026/04/17 17:00	連続	日野変電所	北松江幹線1L	北松江幹線1L断路器修理ほか		変更	
0722583	中国	2026/04/23 09:00	2026/04/24 17:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0722568	中国	2026/04/27 09:00	2026/05/01 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0724406	中国	2026/04/27 09:00	2026/04/28 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線1L	超高压線路耐震対策工事		変更	
0724460	中国	2026/04/27 09:00	2026/04/27 17:00	単日	新山口変電所	中国西幹線1L	中国西幹線1L LPD採油		変更	
0724469	中国	2026/04/27 09:00	2026/05/01 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線1L	電線劣化診断(渦流探傷)		変更	
0722760	中国	2026/04/28 09:00	2026/04/28 17:00	単日	中国西幹線	中国西幹線1L	圧縮クランプ細密点検工事		変更	
0722569	中国	2026/05/03 09:00	2026/05/07 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0724407	中国	2026/05/03 09:00	2026/05/04 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線2L	超高压線路耐震対策工事		変更	
0724461	中国	2026/05/03 09:00	2026/05/03 17:00	単日	新山口変電所	中国西幹線2L	中国西幹線2L LPD採油		変更	
0724470	中国	2026/05/03 09:00	2026/05/07 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線2L	電線劣化診断(渦流探傷)		変更	
0722643	中国	2026/05/05 09:00	2026/05/05 17:00	単日	新山口変電所	中国西幹線2L	中国西幹線2号遮断器センサ取付ほか普通点検		変更	
0722761	中国	2026/05/07 09:00	2026/05/07 17:00	単日	中国西幹線	中国西幹線2L	圧縮クランプ細密点検工事		変更	
0722640	中国	2026/05/09 09:00	2026/05/09 17:00	単日	新山口変電所	新山口幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	新山口幹線2号遮断器センサ取付ほか普通点検		変更	
0724463	中国	2026/05/09 09:00	2026/05/09 16:00	単日	新山口変電所	新山口幹線2L	新山口幹線2L LPD採油		変更	
0725283	中国	2026/05/09 09:00	2026/05/09 16:00	単日	新山口幹線	東山口幹線1L	がいし装置耐震対策工事		新規	
0722639	中国	2026/05/10 09:00	2026/05/10 17:00	単日	新山口変電所	新山口幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	新山口幹線1号遮断器センサ取付ほか普通点検		変更	
0724462	中国	2026/05/10 09:00	2026/05/10 16:00	単日	新山口変電所	新山口幹線1L	新山口幹線1L LPD採油		変更	
0725282	中国	2026/05/10 09:00	2026/05/10 16:00	単日	新山口幹線	東山口幹線1L	がいし装置耐震対策工事		新規	
0725475	中国	2026/05/18 09:00	2026/05/21 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線	電線劣化診断(渦流探傷)		新規	
0722600	中国	2026/05/19 09:00	2026/05/21 17:00	毎日	新山口連絡線	新山口連絡線	支持物塗装工事		変更	
0722778	中国	2026/05/19 09:00	2026/05/19 18:30	単日	山口変電所	新山口連絡線	220kVARE取替工事【新山口連絡線】		変更	
0722848	中国	2026/05/19 09:00	2026/05/20 17:00	毎日	新山口変電所	220kV甲母線/新山口連絡線	220kV甲母線関係碍子取替工事(新山口連絡線)		変更	
0724443	中国	2026/05/19 09:00	2026/05/19 17:00	単日	新山口連絡線	新山口連絡線	がいし連耐震対策工事		変更	
0724464	中国	2026/05/19 09:00	2026/05/19 17:00	単日	新山口変電所	新山口連絡線	新山口連絡線LPD採油		変更	
0725476	中国	2026/05/22 09:00	2026/05/23 17:00	毎日	新山口幹線		電線劣化診断(渦流探傷)		新規	
0722495	中国	2026/05/23 08:00	2026/07/28 17:00	連続	北松江幹線	北松江幹線2L	北松江幹線電線張替工事(I-1工区)2L		変更	
0722685	中国	2026/05/23 09:00	2026/05/27 12:00	連続	新広島変電所	新西広島幹線1L	IP-DCS取替(500kV新西広島幹線1L)		変更	
0722819	中国	2026/05/23 09:00	2026/05/24 17:00	連続	新広島変電所	新西広島幹線1L	制御電源盤取替(500kV新西広島幹線1L)(IP-DCS取替同調)		変更	
0722582	中国	2026/05/25 09:00	2026/05/26 17:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0722602	中国	2026/05/26 09:00	2026/05/27 17:00	毎日	松江連絡線	松江連絡線1L	支持物塗装工事		変更	
0722603	中国	2026/05/28 09:00	2026/05/29 17:00	毎日	松江連絡線	松江連絡線2L	支持物塗装工事		変更	
0722588	中国	2026/06/01 09:00	2026/06/03 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0722651	中国	2026/06/01 09:00	2026/06/02 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線1L	圧縮クランプ細密点検工事		変更	
0722658	中国	2026/06/01 09:00	2026/06/03 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線1L	接地板取付		変更	
0722835	中国	2026/06/01 09:00	2026/06/05 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線1L	圧縮引留クランプ点検ほか		変更	
0724471	中国	2026/06/01 09:00	2026/06/05 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線1L	電線劣化診断(渦流探傷)		変更	
0722496	中国	2026/06/01 09:30	2026/06/02 19:00	連続	広島中央変電所	広島中央線1L	IP-DCS取替工事(広島中央線1L切替)		変更	
0722515	中国	2026/06/02 10:00	2026/06/02 19:00	単日	広島変電所	広島西幹線1L/220kV甲母線	N-1電制設置工事(広島西幹線1号切替)		変更	
0724451	中国	2026/06/03 09:00	2026/06/04 17:00	毎日	北松江幹線	北松江幹線2L	がいし装置耐震対策工事		変更	
0722481	中国	2026/06/04 09:00	2026/06/05 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	直線スリーブ細密点検他		変更	
0722589	中国	2026/06/04 09:00	2026/06/06 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0722650	中国	2026/06/04 09:00	2026/06/05 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	直線スリーブ細密点検工事		変更	
0722659	中国	2026/06/04 09:00	2026/06/06 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線2L	接地板取付		変更	
0724465	中国	2026/06/04 09:00	2026/06/04 12:00	単日	広島西幹線	広島西幹線2L	営業撤去		変更	
0722497	中国	2026/06/04 09:30	2026/06/05 19:00	連続	広島中央変電所	広島中央線2L	IP-DCS取替工事(広島中央線2L切替)		変更	
0722860	中国	2026/06/04 09:30	2026/06/05 16:30	毎日	新徳山変電所	220kV甲母線/山口幹線2L	山口幹線2号関係母線細密点検		変更	
0722625	中国	2026/06/04 10:00	2026/06/04 16:00	単日	新徳山変電所	山口幹線2L	山口幹線2号遮断器センサ取付ほか普通点検		変更	
0722672	中国	2026/06/05 09:00	2026/06/05 17:00	単日	南山口支線	南山口支線2L	圧縮クランプ細密点検		変更	
0724455	中国	2026/06/05 09:30	2026/06/05 16:30	単日	新徳山変電所	山口幹線2L	山口幹線2号802LEコーベル板修理		変更	
0722517	中国	2026/06/05 10:00	2026/06/05 19:00	単日	広島変電所	広島西幹線2L	N-1電制設置工事(広島西幹線2号)		変更	
0722572	中国	2026/06/06 09:00	2026/06/06 16:30	単日	広島中央変電所	広島中央線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV広島中央線2L関係機器点検		変更	
0722637	中国	2026/06/08 09:00	2026/06/12 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0722652	中国	2026/06/08 09:00	2026/06/09 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線2L	圧縮クランプ細密点検工事		変更	
0722836	中国	2026/06/08 09:00	2026/06/12 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線2L	圧縮引留クランプ点検ほか		変更	
0724472	中国	2026/06/08 09:00	2026/06/12 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線2L	電線劣化診断(渦流探傷)		変更	
0722480	中国	2026/06/09 09:00	2026/06/11 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	直線スリーブ細密点検他		変更	
0722649	中国	2026/06/09 09:00	2026/06/10 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	直線スリーブ細密点検工事		変更	
0722671	中国	2026/06/09 09:00	2026/06/09 17:00	単日	南山口支線	南山口支線1L	圧縮クランプ細密点検		変更	
0724432	中国	2026/06/09 09:00	2026/06/26 16:00	毎日	笠岡幹線	笠岡幹線2L	JR西日本新鶴方線笠岡(変)引込変更に伴う予防停電		新規	
0722859	中国	2026/06/09 09:30	2026/06/10 16:30	毎日	新徳山変電所	山口幹線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	山口幹線1号関係母線細密点検		変更	
0722624	中国	2026/06/09 10:00	2026/06/09 16:00	単日	新徳山変電所	山口幹線1L	山口幹線1号遮断器センサ取付ほか普通点検		変更	
0722790	中国	2026/06/10 09:30	2026/06/10 16:30	単日	新鳥取変電所	新鳥取連絡線1L/220kV甲母線	新鳥取連絡線1L903CB取替他に伴う原寸調査		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0722779	中国	2026/06/11 09:00	2026/06/11 18:30	単日	山口変電所	山口幹線1L	220kVARE取替工事【山口幹線1L】		変更	
0722780	中国	2026/06/12 09:00	2026/06/12 16:30	単日	山口変電所	山口幹線2L	220kVARE取替工事【山口幹線2L】		変更	
0722531	中国	2026/06/15 09:00	2026/06/18 16:00	連続	新岡山変電所	新岡山連絡線1L	新岡山連絡線1L関係切替 【新岡山(変)DCS取替工事】		変更	
0722856	中国	2026/06/17 09:00	2026/06/26 17:00	毎日	日野変電所	500kV甲母線/500kV乙母線/#2MTTr	No. 2MTTr1次 鉄構塗装		変更	
0722708	中国	2026/06/22 10:00	2026/06/22 16:30	単日	黒瀬変電所	黒瀬幹線1L	【220kVARE取替工事】 黒瀬幹線1号切替		変更	
0722532	中国	2026/06/23 09:00	2026/06/26 16:00	連続	新岡山変電所	新岡山連絡線2L	新岡山連絡線2L関係切替 【新岡山(変)DCS取替工事】		変更	
0722715	中国	2026/06/23 10:00	2026/06/23 16:30	単日	黒瀬変電所	黒瀬幹線2L	【220kVARE取替工事】 黒瀬幹線2号切替		変更	
0724433	中国	2026/07/01 09:00	2026/07/18 17:00	毎日	笠岡幹線	笠岡幹線2L	JR西日本新鴨方線笠岡(変)引込変更に伴う予防停電		新規	
0722533	中国	2026/07/07 09:00	2026/07/10 16:00	連続	新岡山変電所	井原連絡線1L	井原連絡線1L関係切替 【新岡山(変)DCS取替工事】		変更	
0722534	中国	2026/07/21 09:00	2026/07/24 16:00	連続	新岡山変電所	井原連絡線2L	井原連絡線2L関係切替 【新岡山(変)DCS取替工事】		変更	
0722611	中国	2026/09/07 10:00	2026/09/07 16:00	単日	新岡山変電所	新岡山連絡線1L/220kV甲1母線/220kV乙1母線	新岡山連絡線1L関係機器点検		変更	
0722513	中国	2026/09/08 09:00	2026/09/11 17:00	連続	新岡山変電所	新岡山連絡線1L/220kV甲1母線/220kV乙1母線	新岡山連絡線1L LS電動化工事		変更	
0722610	中国	2026/09/14 10:00	2026/09/14 16:00	単日	新岡山変電所	新岡山連絡線2L/220kV甲1母線/220kV乙1母線	新岡山連絡線2L関係機器点検		変更	
0722514	中国	2026/09/15 09:00	2026/09/18 17:00	毎日	新岡山変電所	新岡山連絡線2L/220kV甲1母線/220kV乙1母線	新岡山連絡線2L LS電動化工事		変更	
0722467	中国	2026/09/20 08:00	2026/11/25 17:00	連続	新西広島幹線	新西広島幹線2L	新西広島幹線2L電線張替工事		変更	
0722735	中国	2026/09/24 09:00	2026/10/09 17:00	連続	新西広島変電所	新西広島幹線2L/500kV甲母線	500kV新西広島幹線2L鉄構塗装		変更	
0722871	中国	2026/09/24 09:00	2026/09/24 17:40	単日	井原開閉所	井原連絡線1L	【笠岡幹線1・2号遮断器ほか取替工事】井原連絡線1L避雷器設置		変更	
0722872	中国	2026/09/25 09:00	2026/09/25 17:40	単日	井原開閉所	井原連絡線2L	【笠岡幹線1・2号遮断器ほか取替工事】井原連絡線2L避雷器設置		変更	
0724419	中国	2026/10/03 09:00	2026/10/04 19:00	連続	新西広島変電所	東山口幹線1L	東山口幹線1LCB(903)電磁フック分解点検		変更	
0725280	中国	2026/10/03 09:00	2026/10/03 16:00	単日	東山口幹線	東山口幹線1L	がいし装置耐震対策工事		新規	
0722703	中国	2026/10/07 09:00	2026/10/30 11:00	連続	笠岡幹線	笠岡幹線2L	笠岡幹線増強(1期)に伴う架線工事他(2L)		変更	
0722573	中国	2026/10/13 09:00	2026/10/14 17:00	毎日	新西広島変電所	新西広島幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV新西広島幹線2号関係機器点検		変更	
0722482	中国	2026/10/17 09:00	2026/10/18 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線1L	直線スリーブ細密点検		変更	
0724404	中国	2026/10/17 09:00	2026/10/18 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線1L	直線スリーブ細密点検		変更	
0724435	中国	2026/10/17 09:00	2026/10/18 18:00	連続	新西広島変電所	東山口幹線1L	東山口幹線1LCB(903)青相油圧ポンプ修理工事		変更	
0724459	中国	2026/10/17 09:00	2026/10/18 17:00	毎日	東山口変電所	500kV甲1母線	東山口幹線1号関係懸垂導子修理		変更	
0722555	中国	2026/10/19 09:00	2026/10/20 17:00	連続	新西広島変電所	新西広島幹線2L	新西広島幹線2LCB(902)電磁フック分解点検		変更	
0722469	中国	2026/10/20 09:00	2026/10/20 17:00	単日	新広島変電所	黒瀬幹線2L	220kV黒瀬幹線2L242CB開閉時間測定装置設置		変更	
0722677	中国	2026/10/20 09:00	2026/10/22 17:00	連続	松江変電所	松江連絡線1L	TC取替工事(松江連絡線1L関係)		変更	
0722775	中国	2026/10/20 09:00	2026/10/21 17:00	毎日	新広島変電所	黒瀬幹線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV黒瀬幹線2L母線細密点検		変更	
0724468	中国	2026/10/20 09:00	2026/10/20 17:00	単日	新広島変電所	黒瀬幹線2L	黒瀬幹線2L242乙接触子調整		変更	
0724482	中国	2026/10/20 09:00	2026/10/20 17:00	単日	新広島変電所	新広島連絡線1L	新広島(変)243LE検回調整工事		変更	
0722722	中国	2026/10/21 09:00	2026/10/23 17:30	連続	東山口変電所	東山口幹線1L	監視制御装置他取替工事【東山口線1L関係切替】		変更	
0724409	中国	2026/10/21 09:00	2026/10/21 17:00	単日	東山口変電所	東山口幹線1L	東山口幹線1L切替(直流盤取替)		変更	
0722483	中国	2026/10/24 09:00	2026/10/25 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線2L	直線スリーブ細密点検		変更	
0724405	中国	2026/10/24 09:00	2026/10/25 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線2L	直線スリーブ細密点検		変更	
0725281	中国	2026/10/24 09:00	2026/10/24 16:00	単日	東山口幹線	東山口幹線1L	がいし装置耐震対策工事		新規	
0722678	中国	2026/10/27 09:00	2026/10/29 17:00	連続	松江変電所	松江連絡線2L	TC取替工事(松江連絡線2L関係)		変更	
0722739	中国	2026/10/27 09:00	2026/10/28 17:00	毎日	新岡山連絡線	新岡山連絡線1L	圧縮形引留クランプ点検工事		変更	
0722740	中国	2026/10/29 09:00	2026/10/30 17:00	毎日	新岡山連絡線	新岡山連絡線2L	圧縮形引留クランプ点検工事		変更	
0722723	中国	2026/10/30 09:00	2026/11/01 17:30	連続	東山口変電所	東山口幹線2L	監視制御装置他取替工事【東山口幹線2L関係切替】		変更	
0724412	中国	2026/10/30 09:00	2026/10/30 17:00	単日	東山口変電所	東山口幹線2L	東山口幹線2L切替(直流盤取替)		変更	
0722704	中国	2026/10/30 11:00	2026/10/30 14:00	単日	笠岡幹線	笠岡幹線2L	笠岡幹線増強(1期)に伴う使用前自主検査(2L)		変更	
0722705	中国	2026/11/02 09:00	2026/11/20 11:00	連続	笠岡幹線	笠岡幹線1L	笠岡幹線増強(1期)に伴う架線工事他(1L)		変更	
0722596	中国	2026/11/04 09:00	2026/11/06 17:00	毎日	新鳥取連絡線	新鳥取連絡線1L	支持物塗装工事		変更	
0722597	中国	2026/11/09 09:00	2026/11/11 17:00	毎日	新鳥取連絡線	新鳥取連絡線2L	支持物塗装工事		変更	
0722669	中国	2026/11/09 09:00	2026/11/13 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線1L	スベサほか取替工事		変更	
0722691	中国	2026/11/11 09:00	2026/11/13 17:00	連続	新広島変電所	黒瀬幹線1L	IP-DCS取替(220kV黒瀬幹線1L)		変更	
0722829	中国	2026/11/11 09:00	2026/11/12 17:00	連続	新広島変電所	黒瀬幹線1L	制御電源盤取替(220kV黒瀬幹線1L) (IP-DCS取替同調)		変更	
0722518	中国	2026/11/12 10:00	2026/11/12 17:00	単日	作木変電所	作木支線1L	N-1電制設置工事 (作木支線1号)		変更	
0722731	中国	2026/11/12 10:00	2026/11/12 16:00	単日	作木変電所	作木支線1L	220kV作木支線1L切替(自動同期盤取替)		変更	
0722670	中国	2026/11/16 09:00	2026/11/20 16:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線2L	スベサほか取替工事		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0722692	中国	2026/11/17 09:00	2026/11/19 17:00	連続	新広島変電所	黒瀬幹線2L	IP-DCS取替(220kV黒瀬幹線2L)		変更	
0722830	中国	2026/11/18 09:00	2026/11/19 17:00	連続	新広島変電所	黒瀬幹線2L	制御電源盤取替(220kV黒瀬幹線2L) (IP-DCS取替同調)		変更	
0722521	中国	2026/11/19 10:00	2026/11/19 17:00	単日	作木変電所	作木支線2L	N-1電制設置工事 (作木支線2号)		変更	
0724478	中国	2026/11/19 10:00	2026/11/19 16:00	単日	作木変電所	作木支線2L	220kV作木支線2L切替(自動同期盤取替)		変更	
0722706	中国	2026/11/20 11:00	2026/11/20 14:00	単日	笠岡幹線	笠岡幹線1L	笠岡幹線増強(1期)に伴う使用前自主検査(1L)		変更	
0722686	中国	2026/11/21 09:00	2026/11/25 12:00	連続	新広島変電所	新西広島幹線2L	IP-DCS取替(500kV新西広島幹線2L)		変更	
0722820	中国	2026/11/23 09:00	2026/11/24 17:00	連続	新広島変電所	新西広島幹線2L	制御電源盤取替(500kV新西広島幹線2L) (IP-DCS取替同調)		変更	
0724401	中国	2026/11/24 09:00	2026/11/25 17:00	毎日	広島東幹線	北尾道支線2L	御調開閉所除却工事		変更	
0724402	中国	2026/11/26 09:00	2026/11/27 17:00	毎日	広島東幹線	北尾道支線2L	御調開閉所除却工事		変更	
0722798	中国	2026/11/30 09:00	2026/11/30 17:00	単日	東岡山変電所	東岡山連絡線2L	東岡山連絡線2L関係母線細密点検		変更	
0722746	中国	2026/12/21 09:00	2026/12/24 17:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線1L	圧縮形引留クランプ改修ほか工事		変更	
0725462	中国	2026/12/22 09:00	2026/12/24 17:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線1L	圧縮形引留クランプ改修工事		新規	
0722747	中国	2027/01/12 09:00	2027/01/15 17:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線2L	圧縮形引留クランプ改修ほか工事		変更	
0725463	中国	2027/01/13 09:00	2027/01/14 17:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線2L	圧縮形引留クランプ改修工事		新規	
0725464	中国	2027/02/15 09:00	2027/02/19 17:00	毎日	東岡山連絡線	東岡山連絡線1L	架線金具取替工事		新規	
0724427	中国	2027/02/22 09:00	2027/02/26 17:00	毎日	東岡山連絡線	東岡山連絡線2L	架線金具取替工事		変更	
0722689	中国	2027/03/01 09:00	2027/03/03 17:00	連続	新広島変電所	新広島連絡線1L	IP-DCS取替(220kV新広島連絡線1L)		変更	
0722707	中国	2027/03/01 09:00	2027/03/08 11:00	連続	笠岡幹線	笠岡幹線1L	笠岡幹線増強に伴う・25鉄塔改造・電線支持点変更工事(1L)		変更	
0722833	中国	2027/03/01 09:00	2027/03/02 17:00	連続	新広島変電所	新広島連絡線1L	制御電源盤取替(220kV新広島連絡線1L) (IP-DCS取替同調)		変更	
0722468	中国	2027/03/04 09:00	2027/03/04 17:00	単日	新広島変電所	新広島連絡線1L	220kV新広島連絡線1L243CB開閉時間測定装置設置		変更	
0722570	中国	2027/03/04 09:00	2027/03/04 17:00	単日	広島変電所	新広島連絡線1L	220kV新広島連絡線1L開閉時間測定装置設置		変更	
0722772	中国	2027/03/04 09:00	2027/03/05 17:00	毎日	新広島変電所	新広島連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV新広島連絡線1L母線細密点検		変更	
0722724	中国	2027/03/06 09:00	2027/03/08 17:30	連続	東山口変電所	新山口幹線1L	監視制御装置他取替工事【新山口幹線1L関係切替】		変更	
0724410	中国	2027/03/06 09:00	2027/03/06 17:00	単日	東山口変電所	新山口幹線1L	新山口幹線1L切替(直流盤取替)		変更	
0722598	中国	2027/03/08 09:00	2027/03/09 17:00	毎日	南山口支線	南山口支線1L	支持物塗装工事		変更	
0722690	中国	2027/03/08 09:00	2027/03/10 17:00	連続	新広島変電所	新広島連絡線2L	IP-DCS取替(220kV新広島連絡線2L)		変更	
0722773	中国	2027/03/08 09:00	2027/03/09 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	経年鉄塔建替に伴う原寸調査		変更	
0722834	中国	2027/03/08 09:00	2027/03/09 17:00	連続	新広島変電所	新広島連絡線2L	制御電源盤取替(220kV新広島連絡線2L) (IP-DCS取替同調)		変更	
0724454	中国	2027/03/08 09:00	2027/03/09 17:00	連続	新徳山変電所	山口幹線1L	山口幹線1号GCB油圧リレ-修理工事		変更	
0722709	中国	2027/03/08 11:00	2027/03/08 13:00	単日	笠岡幹線	笠岡幹線1L	笠岡幹線増強(2期)に伴う社内検査(1L)		変更	
0722710	中国	2027/03/09 09:00	2027/03/23 11:00	連続	笠岡幹線	笠岡幹線2L	笠岡幹線増強に伴う・24.25鉄塔改造・電線支持点変更工事(2L)		変更	
0722732	中国	2027/03/09 09:00	2027/03/09 18:10	単日	山口変電所	山口幹線1L	N-1電源制限装置設置工事【山口幹線1L切替】		変更	
0722599	中国	2027/03/10 09:00	2027/03/11 17:00	毎日	南山口支線	南山口支線2L	支持物塗装工事		変更	
0722774	中国	2027/03/10 09:00	2027/03/11 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	経年鉄塔建替に伴う原寸調査		変更	
0724392	中国	2027/03/10 09:00	2027/03/10 18:10	単日	山口変電所	山口幹線2L	N-1電源制限装置設置工事【山口幹線2L切替】		変更	
0722781	中国	2027/03/11 09:00	2027/03/12 17:00	毎日	新広島変電所	新広島連絡線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV新広島連絡線2L母線細密点検		変更	
0724388	中国	2027/03/11 09:00	2027/03/12 17:00	毎日	新広島変電所	220kV甲母線/220kV乙母線/新広島連絡線2L	220kV新広島連絡線2L関係機器点検		変更	
0722725	中国	2027/03/13 09:00	2027/03/15 17:30	毎日	東山口変電所	新山口幹線2L	監視制御装置他取替工事【新山口幹線2L関係切替】		変更	
0724411	中国	2027/03/13 09:00	2027/03/13 17:00	単日	東山口変電所	新山口幹線2L	新山口幹線2L切替(直流盤取替)		変更	
0722791	中国	2027/03/16 09:00	2027/04/05 17:00	連続	新鳥取変電所	新鳥取連絡線1L/220kV甲母線	新鳥取連絡線1L903CB他取替		変更	
0722527	中国	2027/03/18 09:00	2027/03/21 16:00	連続	新岡山変電所	新広島幹線1L	新広島幹線1L関係切替 【新岡山(変)DCS取替工事】		変更	
0722666	中国	2027/03/18 09:00	2027/03/18 17:00	単日	新広島幹線	新広島幹線1L	圧縮クランプ抵抗測定ほか		変更	
0722683	中国	2027/03/18 09:00	2027/03/21 17:00	連続	新広島変電所	新広島幹線1L	IP-DCS取替(500kV新広島幹線1L)		変更	
0722821	中国	2027/03/18 09:00	2027/03/19 17:00	連続	新広島変電所	新広島幹線1L	制御電源盤取替(500kV新広島幹線1L) (IP-DCS取替同調)		変更	
0722528	中国	2027/03/23 09:00	2027/03/26 16:00	連続	新岡山変電所	新広島幹線2L	新広島幹線2L関係切替 【新岡山(変)DCS取替工事】		変更	
0722667	中国	2027/03/23 09:00	2027/03/24 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線2L	直線スリプ抵抗測定ほか工事		変更	
0722684	中国	2027/03/23 09:00	2027/03/26 17:00	連続	新広島変電所	新広島幹線2L	IP-DCS取替(500kV新広島幹線2L)		変更	
0722822	中国	2027/03/23 09:00	2027/03/24 17:00	連続	新広島変電所	新広島幹線2L	制御電源盤取替(500kV新広島幹線2L) (IP-DCS取替同調)		変更	
0724416	中国	2027/03/23 09:00	2027/03/23 17:00	単日	新広島幹線	新広島幹線2L	がしスペース取付工事		変更	
0722711	中国	2027/03/23 11:00	2027/03/23 13:00	単日	笠岡幹線	笠岡幹線2L	笠岡幹線増強(2期)に伴う社内検査(2L)		変更	
0722712	中国	2027/03/24 09:00	2027/03/24 17:00	単日	笠岡幹線	笠岡幹線1L	笠岡幹線増強に伴う新・25鉄塔組立工事(1/2面:1L側#15パネル)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0722713	中国	2027/03/25 09:00	2027/03/28 17:00	毎日	笠岡幹線	笠岡幹線2L	笠岡幹線増強に伴う新・25鉄塔組立工事(1/2面・2L側 #15ハネル・#12ハネル)		変更	
0722714	中国	2027/03/29 09:00	2027/04/03 17:00	毎日	笠岡幹線	笠岡幹線1L	笠岡幹線増強に伴う新・25鉄塔組立工事(1/2面・1L側 #14ハネル・#12ハネル、全面: #11ハネル・頂部、1L腕金部)		変更	
0724579	中国	2027/04/04 09:00	2027/04/04 17:00	毎日	笠岡幹線	笠岡幹線2L	笠岡幹線増強に伴う新・25鉄塔組立工事(2L腕金部)		変更	
0724580	中国	2027/04/05 09:00	2027/04/06 17:00	毎日	笠岡幹線	笠岡幹線1L	笠岡幹線増強に伴う新・25クライミングクレーン撤去		変更	
0724561	中国	2027/04/06 09:00	2027/04/08 16:00	連続	新鳥取変電所	新鳥取連絡線1L/220kV甲母線	新鳥取連絡線1L903甲取替		変更	
0724521	中国	2027/04/10 09:00	2027/04/13 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線2L	直線スリーブ細密点検他		変更	
0724628	中国	2027/04/10 09:00	2027/04/14 17:00	毎日	新西広島幹線	新西広島幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0724790	中国	2027/04/10 09:00	2027/04/11 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線2L	直線スリーブ細密点検工事		変更	
0724949	中国	2027/04/10 09:00	2027/04/11 17:00	毎日	東山口変電所	東山口幹線1L/500kV甲1母線/500kV乙1母線	東山口幹線2号母線細密点検		変更	
0725497	中国	2027/04/12 09:00	2027/04/13 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線2L	電線劣化診断(過流探傷)		新規	
0724778	中国	2027/04/12 10:00	2027/04/12 16:00	毎日	東山口変電所	東山口幹線2L	東山口幹線2号遮断器センサ取付		変更	
0724649	中国	2027/04/13 09:00	2027/04/15 16:00	連続	新鳥取変電所	新鳥取連絡線1L/220kV乙母線	新鳥取連絡線1L903乙取替		変更	
0724761	中国	2027/04/13 09:00	2027/05/12 11:00	連続	笠岡幹線	笠岡幹線2L	笠岡幹線増強(1期)に伴う架線工事(2L)		変更	
0724942	中国	2027/04/13 09:00	2027/05/12 15:00	連続	井原開閉所	笠岡幹線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	【笠岡幹線遮断器ほか取替】笠岡幹線2L切替		変更	
0725312	中国	2027/04/14 09:00	2027/04/14 16:00	毎日	西島根変電所	500kV甲母線	500kV BP・BTS切替(500kV甲母線)		変更	
0725313	中国	2027/04/15 09:00	2027/04/15 16:00	毎日	西島根変電所	500kV乙母線	500kV BP・BTS切替(500kV乙母線)		変更	
0725314	中国	2027/04/16 09:00	2027/04/16 18:00	毎日	西島根変電所	#2MTr	500kV BP切替(2MTr)		変更	
0724520	中国	2027/04/17 09:00	2027/04/20 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線1L	直線スリーブ細密点検他		変更	
0724629	中国	2027/04/17 09:00	2027/04/21 17:00	毎日	新西広島幹線	新西広島幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0724789	中国	2027/04/17 09:00	2027/04/18 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線1L	直線スリーブ細密点検工事		変更	
0725315	中国	2027/04/17 09:00	2027/04/17 18:00	毎日	西島根変電所	500kV甲母線	500kV BP・BTS切替(母線連絡)		変更	
0725316	中国	2027/04/18 09:00	2027/04/18 18:00	毎日	西島根変電所	#3MTr	500kV BP切替(3MTr)		変更	
0725496	中国	2027/04/18 09:00	2027/04/20 16:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線1L	電線劣化診断(過流探傷)		新規	
0725317	中国	2027/04/19 09:00	2027/04/19 18:00	毎日	西島根変電所	#1MTr	500kV BP切替(1MTr)		変更	
0724777	中国	2027/04/19 10:00	2027/04/19 16:00	毎日	東山口変電所	東山口幹線1L	東山口幹線1号遮断器センサ取付		変更	
0724774	中国	2027/04/21 10:00	2027/04/21 16:00	毎日	笠岡変電所	笠岡幹線2L	笠岡幹線2L関係機器点検		変更	
0724708	中国	2027/04/22 09:00	2027/04/22 16:30	毎日	広島中央変電所	広島中央線1L	220kV広島中央線1L701CB開閉時間測定装置設置		変更	
0724865	中国	2027/04/22 09:00	2027/04/30 16:00	連続	広島西幹線	広島西幹線1L	鉄塔防錆塗装工事		変更	
0725318	中国	2027/04/24 09:00	2027/04/24 17:00	毎日	西島根変電所	中国西幹線1L	500kV BP切替(中国西幹線1号)		変更	
0725319	中国	2027/04/25 09:00	2027/04/25 17:00	毎日	西島根変電所	中国西幹線2L	500kV BP切替(中国西幹線2号)		変更	
0724733	中国	2027/04/26 09:00	2027/04/27 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0724821	中国	2027/04/28 09:00	2027/05/01 16:00	連続	西島根変電所	中国中幹線1L	中国中幹線1LGIS臨時点検		新規	
0724610	中国	2027/04/29 09:00	2027/05/03 17:00	毎日	中国中幹線	中国中幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0724612	中国	2027/04/29 09:00	2027/05/03 17:00	毎日	中国中幹線	中国中幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0724658	中国	2027/04/29 09:00	2027/05/01 17:00	毎日	日野変電所	中国中幹線1L	中国中幹線1L断路器修理ほか		変更	
0724673	中国	2027/04/29 09:00	2027/05/03 17:00	毎日	中国中幹線	中国中幹線1L	圧縮引留クランプ劣化診断ほか		変更	
0724879	中国	2027/04/29 09:00	2027/05/01 17:00	毎日	日野変電所	中国中幹線1L	中国中幹線1L703CB修理工事		変更	
0724927	中国	2027/04/29 09:00	2027/05/03 17:00	毎日	中国中幹線	中国中幹線1L	電線劣化診断(過流探傷)		変更	
0725320	中国	2027/05/01 09:00	2027/05/01 18:00	毎日	西島根変電所	西島根幹線1L	500kV BP切替(西島根幹線1号)		変更	
0725321	中国	2027/05/02 09:00	2027/05/02 18:00	毎日	西島根変電所	西島根幹線2L	500kV BP切替(西島根幹線2号)		変更	
0725308	中国	2027/05/03 09:00	2027/05/03 16:30	毎日	西島根変電所	500kV甲母線	No.3MTr1次#823甲止操作回路改修工事		変更	
0725322	中国	2027/05/04 08:00	2027/05/04 17:00	毎日	西島根変電所	中国中幹線2L	500kV BP切替(中国中幹線2号)		変更	
0724611	中国	2027/05/04 09:00	2027/05/08 17:00	毎日	中国中幹線	中国中幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0724613	中国	2027/05/04 09:00	2027/05/08 17:00	毎日	中国中幹線	中国中幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0724659	中国	2027/05/04 09:00	2027/05/06 17:00	毎日	日野変電所	中国中幹線2L	中国中幹線2L断路器修理ほか		変更	
0724674	中国	2027/05/04 09:00	2027/05/08 17:00	毎日	中国中幹線	中国中幹線2L	圧縮引留クランプ劣化診断ほか		変更	
0724929	中国	2027/05/04 09:00	2027/05/08 17:00	毎日	中国中幹線	中国中幹線2L	電線劣化診断(過流探傷)		変更	
0725309	中国	2027/05/04 09:00	2027/05/04 16:30	毎日	西島根変電所	500kV乙母線	No.3MTr1次#823乙止操作回路改修工事		変更	
0724866	中国	2027/05/06 09:00	2027/05/14 16:00	連続	広島西幹線	広島西幹線2L	鉄塔防錆塗装工事		変更	
0724734	中国	2027/05/07 09:00	2027/05/10 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0724617	中国	2027/05/10 09:00	2027/05/14 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0724622	中国	2027/05/11 09:00	2027/05/15 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0724624	中国	2027/05/11 09:00	2027/05/15 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0724626	中国	2027/05/11 09:00	2027/05/15 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0724872	中国	2027/05/11 09:00	2027/05/14 17:00	連続	作木変電所	作木支線2L	作木(変)302CBアキュームレータ修理工事	制約有	変更	
0725494	中国	2027/05/11 09:00	2027/05/13 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線1L	電線劣化診断(過流探傷)		新規	
0724551	中国	2027/05/12 09:00	2027/05/12 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線1L	直線スリーブ抵抗測定		変更	
0724714	中国	2027/05/12 09:00	2027/05/12 16:00	毎日	広島変電所	広島西幹線2L	220kV広島西幹線2L関係機器点検		変更	
0724762	中国	2027/05/12 11:00	2027/05/12 14:00	毎日	笠岡幹線	笠岡幹線2L	笠岡幹線増強(1期)に伴う使用前自主検査(2L)		変更	
0724655	中国	2027/05/13 09:00	2027/05/14 17:00	連続	広島変電所	広島西幹線2L/220kV乙母線	No.2主要変圧器取替工事(220kVTr1次乙LS組立)		変更	
0724763	中国	2027/05/13 09:00	2027/06/11 11:00	連続	笠岡幹線	笠岡幹線1L	笠岡幹線増強(1期)に伴う架線工事(1L)		変更	
0724944	中国	2027/05/13 09:00	2027/06/11 15:00	連続	井原開閉所	笠岡幹線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	【笠岡幹線遮断器ほか取替】笠岡幹線1L切替		変更	
0724954	中国	2027/05/13 09:00	2027/05/13 17:00	毎日	新山口変電所	新山口幹線2L/500kV乙母線	402CE不調修理工事		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0724498	中国	2027/05/16 09:00	2027/05/16 17:00	単日	新岡山変電所	新広島幹線1L	500・220kVARE取替工事(新広島幹線1L切替)		変更	
0724499	中国	2027/05/17 09:00	2027/05/17 17:00	単日	新岡山変電所	新広島幹線2L	500・220kVARE取替工事(新広島幹線2L切替)		変更	
0724616	中国	2027/05/17 09:00	2027/05/21 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0724627	中国	2027/05/18 09:00	2027/05/22 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0724623	中国	2027/05/19 09:00	2027/05/23 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0724625	中国	2027/05/19 09:00	2027/05/23 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0724924	中国	2027/05/19 09:00	2027/05/24 18:00	毎日	東山口変電所	新山口幹線1L	新山口幹線1号関係懸垂碍子修理		変更	
0725495	中国	2027/05/19 09:00	2027/05/21 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線2L	電線劣化診断(過流探傷)		新規	
0724719	中国	2027/05/26 09:00	2027/05/28 17:00	毎日	新山口連絡線	新山口連絡線	支持物塗装工事		変更	
0724857	中国	2027/05/26 09:00	2027/05/28 17:00	毎日	新山口連絡線	新山口連絡線	直線スリープ細密点検		変更	
0724791	中国	2027/06/01 09:00	2027/06/02 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線1L	クランプ細密点検工事		変更	
0724792	中国	2027/06/03 09:00	2027/06/04 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線2L	クランプ細密点検工事		変更	
0724764	中国	2027/06/11 11:00	2027/06/11 14:00	単日	笠岡幹線	笠岡幹線1L	笠岡幹線増強(1期)に伴う使用前自主検査(1L)		変更	
0724753	中国	2027/06/16 09:00	2027/06/18 17:00	毎日	井原連絡線	井原連絡線1L	支持物塗装工事		変更	
0724833	中国	2027/06/17 09:00	2027/06/18 17:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線1L	圧縮形引留クランプ改修工事		変更	
0725490	中国	2027/06/18 09:00	2027/06/18 16:00	単日	新倉敷変電所	岡山幹線1L	岡山幹線1L母線細密点検		新規	
0725491	中国	2027/06/18 09:00	2027/06/18 16:00	単日	新倉敷変電所	岡山幹線1L	220kV岡山幹線1L青相表示修理		新規	
0724773	中国	2027/06/18 10:00	2027/06/18 16:00	単日	新倉敷変電所	岡山幹線1L	岡山幹線1L関係機器点検		変更	
0724834	中国	2027/06/21 09:00	2027/06/23 17:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線2L	圧縮型引留クランプ改修工事		変更	
0724754	中国	2027/06/22 09:00	2027/06/24 17:00	毎日	井原連絡線	井原連絡線2L	支持物塗装工事		変更	
0724776	中国	2027/06/25 09:00	2027/06/26 17:00	毎日	井原開閉所	井原連絡線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	井原連絡線2L関係機器点検		変更	
0724938	中国	2027/06/25 09:00	2027/06/26 17:00	毎日	井原開閉所	井原連絡線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	井原連絡線2L関係母線細密点検		変更	
0724715	中国	2027/07/07 09:00	2027/07/09 17:00	毎日	南山口支線	南山口支線1L	支持物塗装工事		変更	
0724716	中国	2027/07/12 09:00	2027/07/14 17:00	毎日	南山口支線	南山口支線2L	支持物塗装工事		変更	
0724815	中国	2027/07/15 09:00	2027/07/15 17:00	単日	東山口変電所	東山口連絡線2L	東山口連絡線2L切替(直流盤取替)		変更	
0724926	中国	2027/07/20 09:00	2027/07/23 17:00	連続	新徳山変電所	東山口連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	東山口連絡線1号LS操作装置修理工事		変更	
0724496	中国	2027/07/20 09:30	2027/07/22 16:30	連続	東岡山変電所	東岡山連絡線1L	東岡山連絡線1L関係切替【東岡山(変)DCS取替工事】		変更	
0724585	中国	2027/07/21 09:00	2027/07/23 17:30	連続	東山口変電所	東山口連絡線1L	監視制御装置他取替工事【東山口連絡線1L関係切替】		変更	
0724814	中国	2027/07/21 09:00	2027/07/21 17:00	単日	東山口変電所	東山口連絡線1L	東山口連絡線1L切替(直流盤取替)		変更	
0724497	中国	2027/07/27 09:30	2027/07/29 16:30	連続	東岡山変電所	東岡山連絡線2L	東岡山連絡線2L関係切替【東岡山(変)DCS取替工事】		変更	
0724525	中国	2027/08/16 09:00	2027/08/18 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	直線スリープ細密点検		変更	
0724556	中国	2027/08/16 09:00	2027/08/17 17:00	連続	山口変電所	山口幹線2L	山口幹線2LA系リレー取替工事		変更	
0724558	中国	2027/08/16 09:00	2027/08/17 17:00	連続	南山口変電所	南山口支線2L	南山口支線2LA系リレー取替工事		変更	
0724560	中国	2027/08/23 09:00	2027/08/17 17:00	連続	新徳山変電所	山口幹線2L	山口幹線2LA系リレー取替工事		変更	
0724820	中国	2027/08/16 09:00	2027/08/20 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	圧縮クランプ細密点検ほか工事		変更	
0724741	中国	2027/08/17 09:00	2027/08/18 17:00	毎日	新鳥取連絡線	新鳥取連絡線1L	支持物塗装工事		変更	
0724755	中国	2027/08/17 09:00	2027/08/20 17:00	毎日	新岡山連絡線	新岡山連絡線1L	支持物塗装工事		変更	
0724816	中国	2027/08/17 09:00	2027/08/18 17:00	毎日	新鳥取連絡線	新鳥取連絡線1L	【停電作業】接地板取付		変更	
0725288	中国	2027/08/17 09:30	2027/08/19 16:30	連続	東岡山変電所	500kV甲母線	500kV母連・電圧共通関係切替【東岡山(変)DCS取替工事】		変更	
0724742	中国	2027/08/19 09:00	2027/08/20 17:00	毎日	新鳥取連絡線	新鳥取連絡線2L	支持物塗装工事		変更	
0724817	中国	2027/08/19 09:00	2027/08/20 17:00	毎日	新鳥取連絡線	新鳥取連絡線2L	【停電作業】接地板取付		変更	
0724784	中国	2027/08/19 10:00	2027/08/19 15:00	単日	山口変電所	山口幹線2L	山口幹線2号遮断器センサ取付		変更	
0724524	中国	2027/08/23 09:00	2027/08/26 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	塔上避雷がいし細密点検他		変更	
0724555	中国	2027/08/23 09:00	2027/08/24 17:00	連続	山口変電所	山口幹線1L	山口幹線1LA系リレー取替工事		変更	
0724557	中国	2027/08/23 09:00	2027/08/24 17:00	連続	南山口変電所	南山口支線1L	南山口支線1LA系リレー取替工事		変更	
0724559	中国	2027/08/23 09:00	2027/08/24 17:00	連続	新徳山変電所	山口幹線1L	山口幹線1LA系リレー取替工事		変更	
0724819	中国	2027/08/23 09:00	2027/08/27 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	圧縮クランプ細密点検ほか工事		変更	
0724756	中国	2027/08/24 09:00	2027/08/27 17:00	毎日	新岡山連絡線	新岡山連絡線2L	支持物塗装工事		変更	
0724695	中国	2027/09/01 09:00	2027/09/03 17:00	連続	日野変電所	北松江幹線1L	IP-DCS取替(500kV北松江幹線1号)		変更	
0724899	中国	2027/09/01 09:00	2027/09/02 17:00	連続	日野変電所	北松江幹線1L	制御電源盤取替(500kV北松江幹線1L) ※IP-DCS取替同調		変更	
0724667	中国	2027/09/04 09:00	2027/09/06 17:00	連続	日野変電所	北松江幹線2L	IP-DCS取替(500kV北松江幹線2号) 制御電源盤取替(500kV北松江幹線2L) ※IP-DCS取替同調		変更	
0724900	中国	2027/09/04 09:00	2027/09/05 17:00	連続	日野変電所	北松江幹線2L	IP-DCS取替(500kV北松江幹線2号) 制御電源盤取替(500kV北松江幹線2L) ※IP-DCS取替同調		変更	
0724642	中国	2027/09/06 09:00	2027/09/07 15:30	毎日	新広島変電所	黒瀬幹線1L	黒瀬幹線1L 線路側避雷器設置工事		変更	
0724646	中国	2027/09/06 09:00	2027/09/07 15:30	毎日	黒瀬変電所	黒瀬幹線1L	黒瀬幹線1L避雷器設置工事		変更	
0724562	中国	2027/09/06 09:30	2027/09/07 16:00	毎日	新広島変電所	黒瀬幹線1L	【黒瀬幹線リレー取替工事】 黒瀬幹線1号切替		変更	
0724566	中国	2027/09/06 09:30	2027/09/07 17:00	連続	黒瀬変電所	黒瀬幹線1L	【黒瀬幹線リレー取替工事】 黒瀬幹線1号切替		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0724517	中国	2027/09/07 09:00	2027/09/07 17:00	単日	日野変電所	北松江幹線2L	500kV北松江幹線2LCBセンサ取付		変更	
0724578	中国	2027/09/07 09:00	2027/09/09 17:00	毎日	日野変電所	北松江幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV北松江幹線2L母線細密点検		変更	
0724660	中国	2027/09/07 09:00	2027/09/08 17:00	連続	日野変電所	北松江幹線2L	北松江幹線2L断路器修理ほか		変更	
0724878	中国	2027/09/07 09:00	2027/09/08 17:00	連続	日野変電所	北松江幹線2L	北松江幹線2L 708GCB臨時点検		変更	
0725500	中国	2027/09/07 09:00	2027/09/09 17:00	毎日	北松江変電所	北松江幹線2L	500kV北松江幹線2L送電線引出し用V吊り碍子修理		新規	
0724643	中国	2027/09/08 09:00	2027/09/09 15:30	毎日	新広島変電所	黒瀬幹線2L	黒瀬幹線2L 線路側避雷器設置工事		変更	
0724647	中国	2027/09/08 09:00	2027/09/09 15:30	毎日	黒瀬変電所	黒瀬幹線2L	黒瀬幹線2L避雷器設置工事		変更	
0724563	中国	2027/09/08 09:30	2027/09/09 17:00	毎日	新広島変電所	黒瀬幹線2L	【黒瀬幹線リレー取替工事】 黒瀬幹線2号切替		変更	
0724567	中国	2027/09/08 09:30	2027/09/09 17:00	連続	黒瀬変電所	黒瀬幹線2L	【黒瀬幹線リレー取替工事】 黒瀬幹線2号切替		変更	
0724921	中国	2027/09/12 09:00	2027/09/13 17:00	毎日	北松江幹線	北松江幹線2L	耐震対策		変更	
0724593	中国	2027/09/14 08:00	2027/11/19 17:00	連続	北松江幹線	北松江幹線1L	北松江幹線電線張替工事(Ⅰ-2工区)1L		変更	
0724854	中国	2027/09/14 09:00	2027/09/15 17:00	毎日	北松江幹線	北松江幹線1L	耐震対策		変更	
0725501	中国	2027/09/16 09:00	2027/09/18 16:00	毎日	北松江変電所	北松江幹線1L	500kV北松江幹線1L送電線引出し用V吊り碍子修理		新規	
0724939	中国	2027/09/27 09:00	2027/09/28 17:00	連続	新西広島変電所	西島根幹線1L	所内電源3系統化工事(電柱設置)		変更	
0724581	中国	2027/10/01 09:00	2027/10/30 11:00	連続	笠岡幹線	笠岡幹線1L	笠岡幹線増強(2期)に伴う架線工事(1L)		変更	
0724651	中国	2027/10/01 09:00	2027/10/30 15:30	連続	笠岡変電所	笠岡幹線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	笠岡幹線増強に伴う笠岡幹線CBほか取替(1L新旧切替)		変更	
0724941	中国	2027/10/09 09:00	2027/10/19 17:00	毎日	新山口変電所	中国西幹線1L	中国西幹線1L関係鉄構塗装工事		変更	
0724618	中国	2027/10/12 09:00	2027/10/16 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0724620	中国	2027/10/12 09:00	2027/10/16 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0724656	中国	2027/10/12 09:00	2027/11/12 12:00	連続	広島変電所	広島西幹線2L	No.2主要変圧器取替工事(停電切替)		変更	
0724795	中国	2027/10/12 09:00	2027/10/13 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線1L	圧縮引留クランプ細密点検工事		変更	
0724936	中国	2027/10/12 09:00	2027/10/12 17:00	単日	中国西幹線	中国西幹線1L	圧縮形引留クランプ細密点検ほか		変更	
0724516	中国	2027/10/19 09:00	2027/10/19 17:00	単日	日野変電所	北松江幹線1L	日野(変)500kV北松江幹線1L関係CBセンサ取付		変更	
0724577	中国	2027/10/19 09:00	2027/10/21 17:00	毎日	日野変電所	北松江幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV北松江幹線1L母線細密点検		変更	
0724619	中国	2027/10/20 09:00	2027/10/24 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0724621	中国	2027/10/20 09:00	2027/10/24 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0724931	中国	2027/10/20 09:00	2027/10/21 17:00	毎日	北松江幹線	北松江幹線1L	がいし装置耐震対策工事		変更	
0724796	中国	2027/10/21 09:00	2027/10/22 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線2L	圧縮クランプ細密点検工事		変更	
0724937	中国	2027/10/21 09:00	2027/10/21 17:00	単日	中国西幹線	中国西幹線2L	圧縮形引留クランプ細密点検		変更	
0724548	中国	2027/10/22 10:00	2027/10/22 16:00	単日	北松江変電所	北松江幹線1L	500kV北松江幹線1号101CBセンサ取付ほか 制御電源盤取替(500kV43PD切替、甲母線) ※IP-DCS取替同調		変更	
0725310	中国	2027/10/25 09:00	2027/10/25 16:00	単日	日野変電所	500kV甲母線	IP-DCS取替(500kV甲母連)		変更	
0725323	中国	2027/10/25 09:00	2027/10/27 17:00	連続	日野変電所	500kV乙母線	制御電源盤取替(500kV乙母線) ※IP-DCS取替同調		変更	
0725311	中国	2027/10/28 09:00	2027/10/28 16:00	単日	日野変電所	500kV乙母線	IP-DCS取替(500kV乙母連)		変更	
0725324	中国	2027/10/28 09:00	2027/10/30 17:00	連続	日野変電所	500kV乙母線	笠岡幹線増強(2期)に伴う使用前自主検査(1L)		変更	
0724582	中国	2027/10/30 11:00	2027/10/30 14:00	単日	笠岡幹線	笠岡幹線1L	経年建替に伴う原寸調査		変更	
0724508	中国	2027/11/01 09:00	2027/11/02 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	スベーサほか取替		変更	
0724583	中国	2027/11/01 09:00	2027/11/30 11:00	連続	笠岡幹線	笠岡幹線2L	笠岡幹線増強(2期)に伴う架線工事(2L)		変更	
0724652	中国	2027/11/01 09:00	2027/11/30 15:30	連続	笠岡変電所	笠岡幹線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	笠岡幹線増強に伴う笠岡幹線CBほか取替(2L新旧切替)		変更	
0725307	中国	2027/11/01 09:00	2027/11/05 17:00	毎日	西島根幹線		支持物塗装工事		変更	
0724509	中国	2027/11/04 09:00	2027/11/05 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	経年建替に伴う原寸調査		変更	
0724717	中国	2027/11/08 09:00	2027/11/12 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線1L	スベーサほか取替		変更	
0724727	中国	2027/11/10 09:00	2027/11/12 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0725292	中国	2027/11/10 09:00	2027/11/10 17:00	単日	北松江変電所	松江連絡線1L	500kV北松江幹線1L縦母線点検		変更	
0724718	中国	2027/11/15 09:00	2027/11/19 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線2L	スベーサほか取替		変更	
0724728	中国	2027/11/15 09:00	2027/11/17 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0724584	中国	2027/11/30 11:00	2027/11/30 14:00	単日	笠岡幹線	笠岡幹線2L	笠岡幹線増強(2期)に伴う使用前自主検査(2L)		変更	
0724665	中国	2027/12/01 09:00	2027/12/10 17:00	連続	新倉敷変電所	岡山幹線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	岡山幹線1L GIS臨時点検(電装品取替)		変更	
0724849	中国	2027/12/07 09:00	2027/12/10 17:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線1L	クランプ改修工事		変更	
0724666	中国	2027/12/13 09:00	2027/12/22 17:00	連続	新倉敷変電所	岡山幹線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	岡山幹線2L GIS臨時点検(電装品取替)		変更	
0724848	中国	2027/12/14 09:00	2027/12/14 17:00	単日	岡山幹線	岡山幹線2L	クランプ改修工事		変更	
0724919	中国	2028/01/13 09:30	2028/01/13 17:30	単日	山口変電所	山口幹線1L	新山口系SSC取替工事【220kV山口幹線1L切替】		変更	
0724920	中国	2028/01/14 09:30	2028/01/14 17:30	単日	山口変電所	山口幹線2L	新山口系SSC取替工事【220kV山口幹線2L切替】		変更	
0724526	中国	2028/01/17 09:00	2028/01/20 17:00	毎日	東山口連絡線	東山口連絡線1L	直線スリーブ細密点検他		変更	
0724725	中国	2028/01/18 09:00	2028/01/19 17:00	毎日	東山口連絡線	東山口連絡線1L	支持物塗装工事		変更	
0724527	中国	2028/01/24 09:00	2028/01/27 17:00	毎日	東山口連絡線	東山口連絡線2L	直線スリーブ細密点検他		変更	
0724726	中国	2028/01/24 09:00	2028/01/25 17:00	毎日	東山口連絡線	東山口連絡線2L	支持物塗装工事		変更	
0724575	中国	2028/02/15 09:00	2028/02/16 17:00	連続	新西広島変電所	広島西幹線1L	DCS取替工事 (220kV広島西幹線1号関係切替)		変更	
0724576	中国	2028/02/17 09:00	2028/02/18 17:00	連続	新西広島変電所	広島西幹線2L	DCS取替工事 (220kV広島西幹線2号関係切替)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0724859	中国	2028/03/03 09:00	2028/03/04 17:00	毎日	松江連絡線	松江連絡線1L	耐震対策		変更	
0724860	中国	2028/03/05 09:00	2028/03/06 16:00	毎日	松江連絡線	松江連絡線2L	耐震対策		変更	
0724522	中国	2028/03/14 09:00	2028/03/14 18:00	単日	新倉敷変電所	岡山幹線1L	岡山幹線1L停電切替 【220kVBP・ARE取替工事】		変更	
0724863	中国	2028/03/14 09:00	2028/03/15 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	経年建替に伴う難着雪リング撤去工事		変更	
0724523	中国	2028/03/15 09:00	2028/03/15 18:00	単日	新倉敷変電所	岡山幹線2L	岡山幹線2L停電切替 【220kVBP・ARE取替工事】		変更	
0724864	中国	2028/03/16 09:00	2028/03/17 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	経年建替に伴う難着雪リング撤去工事		変更	
0724568	中国	2028/03/18 09:30	2028/03/20 17:30	連続	西島根変電所	中国中幹線1L	中国中幹線リレー取替(1L)		変更	
0724783	中国	2028/03/18 09:30	2028/03/20 17:30	連続	日野変電所	中国中幹線1L	中国中幹線リレー取替工事(1L)		変更	
0724895	中国	2028/03/22 09:30	2028/03/22 17:30	単日	新山口変電所	新山口連絡線	新山口系SSC取替工事【220kV新山口連絡線切替】		変更	
0724569	中国	2028/03/24 09:30	2028/03/26 17:30	連続	西島根変電所	中国中幹線2L	中国中幹線リレー取替(2L)		変更	
0724786	中国	2028/03/24 09:30	2028/03/26 17:30	連続	日野変電所	中国中幹線2L	中国中幹線リレー取替工事(2L)		変更	
0724953	中国	2028/03/29 09:00	2028/03/31 17:00	連続	松江変電所	松江連絡線2L/220kV甲母線	220kV松江連絡線2L#404甲LS耐震化工事		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0816943	四国	2026/04/20 08:30	2026/04/20 17:30	単日	北松山SS	甲ブス(187kV)	松山西線1L GIS細密点検(甲LS)		更新	
0816945	四国	2026/04/20 08:30	2026/04/21 17:30	連続	北松山SS	松山西線1L	松山西線1L GIS細密点検、GCB油圧P修繕		更新	
0817272	四国	2026/04/23 08:30	2026/04/24 17:30	連続	送電線	新改高知線1L	平山線他ルート変更 新改高知線No.1 腕金改造		更新	
0816953	四国	2026/04/27 08:00	2026/04/27 18:00	単日	鳴門SS	阿波鳴門線1L	・阿波鳴門線1L GCB細密点検1、L-LS細密点検 ・阿波鳴門線1L甲乙LS細密点検		更新	
0816917	四国	2026/05/11 08:30	2026/05/12 17:30	連続	送電線	新改高知線1L	平山線他ルート変更 【保安停止】 豊永線No.86-新改SS GW 旧線撤去・新線延線・緊線・検査 豊永線No.87 腕金改造		更新	
0817011	四国	2026/05/13 08:30	2026/05/19 17:30	毎日	送電線	松山東線1L	鉄塔塗装 松山東線 No.1～7 計7基		更新	
0819345	四国	2026/05/13 08:30	2026/05/14 17:30	毎日	送電線	新改幹線1L	新改幹線No.131-132 計1径間 近接樹木調査		更新	
0819346	四国	2026/05/15 08:30	2026/05/15 17:30	単日	送電線	新改幹線2L	新改幹線No.131-132 計1径間 近接樹木調査		更新	
0816946	四国	2026/05/18 08:30	2026/05/19 17:30	連続	北松山SS	松山東線1L	松山東線1L GIS細密点検、GCB油圧P修繕		更新	
0816949	四国	2026/05/20 08:30	2026/05/21 17:30	連続	北松山SS	松山東線2L	松山東線2L GIS細密点検、GCB油圧P修繕		更新	
0817012	四国	2026/05/20 08:30	2026/05/26 17:30	毎日	送電線	松山東線2L	鉄塔塗装 松山東線No.1～7 計7基		更新	
0816930	四国	2026/05/21 08:40	2026/05/21 17:20	単日	西条SS	松山東線2L	松山東2L-CB(細)・甲乙LS(普・細)・L-LS(普・細)		更新	
0817030	四国	2026/07/13 08:30	2026/07/21 17:30	毎日	送電線	川内幹線1L	・スベークサ補修 No.76～77, 78～81, 86～88 計6径間		更新	
0817032	四国	2026/07/13 08:30	2026/07/17 17:30	毎日	送電線	川内幹線1L	・腕金塗装 No.25.54.91 計3基		更新	
0817031	四国	2026/07/23 08:30	2026/07/30 17:30	毎日	送電線	川内幹線2L	・スベークサ補修 No.76～77, 78～81, 86～88, 計6径間		更新	
0817033	四国	2026/07/23 08:30	2026/07/29 17:30	毎日	送電線	川内幹線2L	・腕金塗装 No.25.54.91 計3基		更新	
0817090	四国	2026/07/27 08:00	2026/08/28 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	・簡易型避雷装置取付(No.39～73 計35基)		更新	
0818738	四国	2026/08/24 08:30	2026/08/28 17:30	毎日	送電線	三島西線1L	・腕金塗装 No.1～5 計5基		更新	
0818739	四国	2026/08/31 08:30	2026/09/04 17:30	毎日	送電線	三島西線2L	・腕金塗装 No.1～5 計5基		更新	
0817052	四国	2026/09/24 08:30	2026/09/24 17:30	単日	新改PS	新改幹線1L	新改幹線1LGCB(細点)、LLS(普点)、甲LS(普点)、乙(普点)		更新	
0817072	四国	2026/09/24 08:30	2026/09/25 17:30	毎日	送電線	新改幹線1L	新改幹線No.114.115 計2基 鉄塔腕金塗装		更新	
0817073	四国	2026/09/28 08:30	2026/09/29 17:30	毎日	送電線	新改幹線2L	新改幹線No.114.115 計2基 鉄塔腕金塗装		更新	
0817065	四国	2026/09/29 08:00	2026/10/23 21:00	連続	讃岐SS	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	【讃岐ssCB取替(讃岐鳴門線1・2L)】讃岐鳴門線1L CB, LLS, 甲乙LS, LVT取替, 制御ケーブル切替, 総合動作試験, 社内検査		更新	
0817066	四国	2026/09/29 08:00	2026/10/09 18:00	連続	讃岐SS	香川線2L	【讃岐ssCB取替(讃岐鳴門線1・2L)】香川線2L(保安停止)		更新	
0817093	四国	2026/10/05 08:00	2026/10/09 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	・腕金塗装(No.50～53:4基)		更新	
0819352	四国	2026/10/06 09:30	2026/10/07 12:00	連続	讃岐SS	香川線2L	香川線2LCB ガス圧調整作業		更新	
0817036	四国	2026/10/14 08:30	2026/10/14 17:30	単日	送電線	本川線1L	・腕金塗装 No.25 1基		更新	
0817037	四国	2026/10/15 08:30	2026/10/15 17:30	単日	送電線	本川線2L	・腕金塗装 No.25 1基		更新	
0817071	四国	2026/10/26 08:00	2026/11/13 21:00	連続	讃岐SS	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	【讃岐ssCB取替(讃岐鳴門線1・2L)】讃岐鳴門線2L CB, LLS, 甲乙LS, LVT取替, 制御ケーブル切替, 総合動作試験, 社内検査		更新	
0817209	四国	2026/10/26 08:00	2026/10/30 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	・腕金塗装(No.50～53:4基)		更新	
0817091	四国	2026/11/09 08:00	2026/11/13 17:30	毎日	送電線	香川線1L	・腕金塗装(No.31:1基)		更新	
0819351	四国	2026/11/09 09:30	2026/11/10 12:00	連続	讃岐SS	香川線1L	香川線1LCB ガス圧調整作業		更新	
0819356	四国	2026/11/09 09:30	2026/11/10 12:00	連続	坂出火力SS	坂出火力線1L	【YWM2876 讃岐SS 香川線1L停止(CBガス圧調整作業)に伴う停止】		更新	
0817092	四国	2026/11/16 08:00	2026/11/20 17:30	毎日	送電線	香川線2L	・腕金塗装(No.31:1基)		更新	
0817042	四国	2026/11/16 09:00	2026/11/20 17:30	連続	鳴門SS	阿波鳴門線1L	【鳴門ss阿波鳴門線リレー取替】阿波鳴門線1L(A系)リレー取替(トロイット)		更新	
0817044	四国	2026/11/16 09:00	2026/11/20 17:30	連続	阿波SS	阿波鳴門線1L	【阿波ss阿波鳴門線リレー取替】阿波鳴門線1L(A系)リレー取替(トロイット)		更新	
0817119	四国	2026/11/18 08:40	2026/11/18 17:20	単日	東予SS	三島西線2L	三島西線2L GCS(普・細)、丙丁LS(普・細)		更新	
0817117	四国	2026/11/19 08:40	2026/11/20 17:20	連続	東予SS	三島西線1L	三島西線1L GCS(普・細)、丙丁LS(普・細)、GCB漏油修繕		更新	
0818726	四国	2026/11/23 09:00	2026/11/27 17:30	連続	鳴門SS	阿波鳴門線1L	【鳴門ss阿波鳴門線リレー取替】阿波鳴門線1L(B系)リレー取替(トロイット)		更新	
0818727	四国	2026/11/23 09:00	2026/11/27 17:30	連続	阿波SS	阿波鳴門線1L	【阿波ss阿波鳴門線リレー取替】阿波鳴門線1L(B系)リレー取替(トロイット)		更新	
0817043	四国	2026/11/30 09:00	2026/12/04 17:30	連続	鳴門SS	阿波鳴門線2L	【鳴門ss阿波鳴門線リレー取替】阿波鳴門線2L(A系)リレー取替(トロイット)		更新	
0817045	四国	2026/11/30 09:00	2026/12/04 17:30	連続	阿波SS	阿波鳴門線2L	【阿波ss阿波鳴門線リレー取替】阿波鳴門線2L(A系)リレー取替(トロイット)		更新	
0818728	四国	2026/12/07 09:00	2026/12/11 17:30	連続	鳴門SS	阿波鳴門線2L	【鳴門ss阿波鳴門線リレー取替】阿波鳴門線2L(B系)リレー取替(トロイット)		更新	
0818729	四国	2026/12/07 09:00	2026/12/11 17:30	連続	阿波SS	阿波鳴門線2L	【阿波ss阿波鳴門線リレー取替】阿波鳴門線2L(B系)リレー取替(トロイット)		更新	
0817179	四国	2026/12/07 14:30	2026/12/07 17:30	単日	井川SS	新改幹線1L	【井川SS No.1連TR1次GIS取替工事】新No.1連TR1次GIS・3次CB箱他試充電および方向試験		更新	
0818745	四国	2026/12/21 08:30	2026/12/23 17:30	毎日	送電線	高知幹線1L	高知幹線No.63-65 計2径間 OPGW張替		更新	
0817588	四国	2026/12/23 15:30	2026/12/23 17:30	単日	井川SS	新改幹線1L	【井川SS No.1連TR1次GIS取替工事】新187kVGIS丙母線ユニット試充電		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0817590	四国	2026/12/26 15:30	2026/12/26 17:30	単日	井川SS	新改幹線1L	【井川SS No.1連TR1次GIS取替工事】新187kVGIS丁母線ユニット試充電		更新	
0817135	四国	2027/02/18 08:30	2027/02/21 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線1L	・腕金塗装 No.112, 114, 115, 116 計4基		更新	
0817198	四国	2027/02/18 08:30	2027/02/23 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線1L	ラインスペーサ補修 四国中央中幹線No.15～24 計10基		更新	
0818721	四国	2027/02/18 08:40	2027/02/23 17:20	連続	東予SS	四国中央中幹線1L	中幹線1LGCS電装品修繕、油槽ユニット・アキュムレーター修繕		更新	
0817208	四国	2027/02/22 08:00	2027/02/26 17:30	毎日	送電線	吉野川線1L	・腕金塗装(No.17～21:5基)		更新	
0817136	四国	2027/02/24 08:30	2027/02/27 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線2L	・腕金塗装 No.112, 114, 115, 116 計4基		更新	
0817199	四国	2027/02/24 08:30	2027/03/01 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線2L	ラインスペーサ補修 四国中央中幹線No.15～24 計10基		更新	
0817206	四国	2027/03/02 08:00	2027/03/06 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	・腕金塗装(No.21,27:2基)		更新	
0817133	四国	2027/03/02 08:30	2027/03/05 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	・腕金塗装 No.88,89,102,104 計4基		更新	
0817150	四国	2027/03/02 08:30	2027/03/06 17:30	連続	讃岐SS	四国中央東幹線1L	GIS細密点検、丙丁LLS細密点検		更新	
0817164	四国	2027/03/02 08:30	2027/03/05 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	鉄塔腕金塗装 No.35,56 計2基		更新	
0817147	四国	2027/03/02 08:40	2027/03/07 17:20	連続	東予SS	四国中央東幹線1L	四国中央東幹線1L GIS電装品修繕、油槽ユニット修繕、アキュムレータ交換		更新	
0817207	四国	2027/03/08 08:00	2027/03/12 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	・腕金塗装(No.21,27:2基)		更新	
0817153	四国	2027/03/08 08:30	2027/03/12 17:30	連続	讃岐SS	四国中央東幹線2L	GIS細密点検、丙丁LLS細密点検		更新	
0817148	四国	2027/03/08 08:40	2027/03/13 17:20	連続	東予SS	四国中央東幹線2L	四国中央東幹線2L GIS電装品修繕、油槽ユニット修繕、アキュムレータ交換		更新	
0817134	四国	2027/03/09 08:30	2027/03/12 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	・腕金塗装 No.88,89,102,104 計4基		更新	
0817165	四国	2027/03/09 08:30	2027/03/12 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	ラインスペーサ点検 No.40～41,52～53,64～65,77～78 計4箇所 鉄塔腕金塗装 No.35,56 計2基		更新	
0817174	四国	2027/03/15 06:30	2027/03/15 12:30	単日	井川SS	三島東線1L	【井川SS 187kV43PD切替盤取替】三島東線1Lケーブル切替、確認試験		更新	
0817175	四国	2027/03/15 12:30	2027/03/15 18:30	単日	井川SS	三島東線2L	【井川SS 187kV43PD切替盤取替】三島東線2Lケーブル切替、確認試験		更新	
0817170	四国	2027/03/16 06:30	2027/03/16 12:30	単日	井川SS	吉野川線1L	【井川SS 187kV43PD切替盤取替】吉野川線1Lケーブル切替、確認試験		更新	
0817171	四国	2027/03/16 12:30	2027/03/16 18:30	単日	井川SS	吉野川線2L	【井川SS 187kV43PD切替盤取替】吉野川線2Lケーブル切替、確認試験		更新	
0817176	四国	2027/03/17 06:30	2027/03/17 12:30	単日	井川SS	新改幹線1L	【井川SS 187kV43PD切替盤取替】新改幹線1Lケーブル切替、確認試験		更新	
0817226	四国	2027/03/17 08:00	2027/03/21 17:30	毎日	送電線	吉野川線2L	・腕金塗装(No.17～21:5基)		更新	
0817177	四国	2027/03/17 12:30	2027/03/17 18:30	単日	井川SS	新改幹線2L	【井川SS 187kV43PD切替盤取替】新改幹線2Lケーブル切替、確認試験		更新	
0819052	四国	2027/03/27 08:30	2027/03/31 17:30	毎日	送電線	松山幹線1L	松山幹線No.2,3 (川内幹線併架) がいし取替 計2基		変更	
0819053	四国	2027/03/27 08:30	2027/03/31 17:30	毎日	送電線	川内幹線1L	川内幹線No.3,4 (松山幹線併架) がいし取替 計2基		変更	
0819054	四国	2027/04/01 08:30	2027/04/05 17:30	毎日	送電線	松山幹線2L	松山幹線No.2,3 (川内幹線併架) がいし取替 計2基		変更	
0819055	四国	2027/04/01 08:30	2027/04/05 17:30	毎日	送電線	川内幹線2L	川内幹線No.3,4 (松山幹線併架) がいし取替 計2基		変更	
0818808	四国	2027/04/05 08:40	2027/04/05 17:20	単日	西条SS	川内幹線2L	川内幹線2LCB(細) 丙丁LS(普,細) L-LS(普,細)		更新	
0818805	四国	2027/04/06 08:40	2027/04/06 17:20	単日	西条SS	川内幹線1L	川内幹線1LCB(細) 丙丁LS(普,細) L-LS(普,細)		更新	
0818800	四国	2027/04/09 08:40	2027/04/09 17:20	単日	西条SS	西条線2L	西条線2LCB(細) 丙丁LS(普,細) L-LS(普,細)		更新	
0818870	四国	2027/04/12 08:00	2027/04/16 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	・腕金塗装(No.22,23:2基)		更新	
0818871	四国	2027/04/19 08:00	2027/04/23 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	・腕金塗装(No.22,23:2基)		更新	
0818844	四国	2027/04/27 08:00	2027/04/27 18:00	単日	鳴門SS	阿波鳴門線2L	・阿波鳴門線2L GCB細密点検1、L-LS細密点検 ・阿波鳴門線2L 甲乙LS細密点検		更新	
0818877	四国	2027/05/06 09:00	2027/05/06 17:00	単日	川内SS	四国中央中幹線2L	43VT盤取替に伴うケーブル切替・確認試験		更新	
0818876	四国	2027/05/07 09:00	2027/05/07 17:00	単日	川内SS	四国中央中幹線1L	43VT盤取替に伴うケーブル切替・確認試験		更新	
0818966	四国	2027/05/17 08:00	2027/05/21 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	・腕金塗装(No.39～42,54～57:8基)		変更	
0818895	四国	2027/05/17 08:40	2027/05/17 17:20	単日	西条SS	西条線1L	西条線1LCB(細) 丙丁LS(普,細) L-LS(普,細)		新規	
0818898	四国	2027/05/18 08:40	2027/05/19 17:20	連続	三島SS	三島東線1L	三島東線1LGCB(細)、甲乙L-LS(普,細)、三島東線1LGCB共通欠陥対策・電装品修繕		新規	
0818901	四国	2027/05/20 08:40	2027/05/21 17:20	連続	三島SS	三島東線2L	三島東線2LGCB(細)、甲乙L-LS(普,細)、三島東線2LGCB共通欠陥対策・電装品修繕		新規	
0818967	四国	2027/05/24 08:00	2027/05/28 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	・腕金塗装(No.39～42,54～57:8基)		変更	
0818963	四国	2027/05/31 08:30	2027/06/02 17:30	毎日	送電線	松山西線1L	松山西線 鉄塔塗装 No19～24 (6基)		新規	
0818964	四国	2027/06/03 08:30	2027/06/07 17:30	毎日	送電線	松山西線2L	松山西線 鉄塔塗装 No19～24 (6基)		新規	
0818974	四国	2027/06/14 08:30	2027/06/21 17:30	毎日	送電線	西条線1L	・スペーサ補修 東予SS～No.6		新規	
0818975	四国	2027/06/22 08:30	2027/06/29 17:30	毎日	送電線	西条線2L	・スペーサ補修 東予SS～No.6		新規	
0818923	四国	2027/07/07 08:30	2027/07/23 17:30	毎日	送電線	三島東線1L	ダンバ補修 No.60～73,83～87,91～95 計24基		新規	
0818960	四国	2027/07/12 08:30	2027/07/16 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L/大洲北幹線2L	大洲北幹線 ダンバ補修 No83～90 (8基) 1・2L同時停止		新規	
0818961	四国	2027/07/13 08:30	2027/07/14 17:30	毎日	送電線	川内幹線1L	川内幹線 鉄塔塗装 No14～17 (4基)		新規	
0818962	四国	2027/07/21 08:30	2027/07/22 17:30	毎日	送電線	川内幹線2L	川内幹線 鉄塔塗装 No14～17 (4基)		新規	
0818968	四国	2027/07/26 08:00	2027/08/27 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	・簡易型避雷(No.74～92,大川支線No.1～SS:計35基)		変更	
0818924	四国	2027/07/26 08:30	2027/08/10 17:30	毎日	送電線	三島東線2L	ダンバ補修 No.60～73,83～87,91～95 計24基		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0818971	四国	2027/08/23 08:30	2027/09/03 17:30	毎日	送電線	三島西線2L	・腕金塗装 No.6～15 計10基		新規	
0818970	四国	2027/09/06 08:30	2027/09/17 17:30	毎日	送電線	三島西線1L	・腕金塗装 No.6～15 計10基		新規	
0817088	四国	2027/09/07 08:30	2027/09/09 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	ダンパ補修 大洲北幹線 No.1～8 計8基		更新	
0817089	四国	2027/09/14 08:30	2027/09/16 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	ダンパ補修 大洲北幹線 No.1～8 計8基		更新	
0818969	四国	2027/10/13 08:00	2027/10/13 17:30	単日	送電線	吉野川線1L	・圧縮接続管点検(No.21:1基)		新規	
0818925	四国	2027/10/19 08:00	2027/10/20 18:00	連続	阿波SS	阿波国府線1L	・GIS(CB,LLS,ELS)細点 ・現地箱制御器具点検 ・漏れ電流測定		新規	
0818926	四国	2027/10/21 08:00	2027/10/22 18:00	連続	阿波SS	阿波国府線2L	・GIS(CB,LLS,ELS)細点 ・現地箱制御器具点検 ・漏れ電流測定		新規	
0819016	四国	2027/10/25 09:00	2027/10/29 17:30	連続	阿波SS	阿波国府線1L	阿波国府線1L(A系)リレー取替(レトロフィット)		新規	
0819017	四国	2027/10/25 09:00	2027/10/29 17:30	連続	国府SS	阿波国府線1L	阿波国府線1L(A系)リレー取替(レトロフィット)		新規	
0819057	四国	2027/11/01 08:30	2027/11/05 17:30	毎日	送電線	新改高知線1L	新改高知線No.61,62,63,64,高知SS 計5基 クランプ・架線金具補修		変更	
0819047	四国	2027/11/01 09:00	2027/11/05 17:30	連続	阿波SS	阿波国府線1L	阿波国府線1L(B系)リレー取替(レトロフィット)		新規	
0819048	四国	2027/11/01 09:00	2027/11/05 17:30	連続	国府SS	阿波国府線1L	阿波国府線1L(B系)リレー取替(レトロフィット)		新規	
0819018	四国	2027/11/08 09:00	2027/11/12 17:30	連続	阿波SS	阿波国府線2L	阿波国府線2L(A系)リレー取替(レトロフィット)		新規	
0819019	四国	2027/11/08 09:00	2027/11/12 17:30	連続	国府SS	阿波国府線2L	阿波国府線2L(A系)リレー取替(レトロフィット)		新規	
0819049	四国	2027/11/15 09:00	2027/11/19 17:30	連続	阿波SS	阿波国府線2L	阿波国府線2L(B系)リレー取替(レトロフィット)		新規	
0819050	四国	2027/11/15 09:00	2027/11/19 17:30	連続	国府SS	阿波国府線2L	阿波国府線2L(B系)リレー取替(レトロフィット)		新規	
0819058	四国	2027/11/22 08:30	2027/11/26 17:30	毎日	送電線	新改高知線2L	新改高知線No.61,62,63,64,高知SS 計5基 クランプ・架線金具補修		変更	
0819028	四国	2028/02/28 08:30	2028/03/03 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	鉄塔腕金塗装 No.34,39,40,41,42 計5基		新規	
0819363	四国	2028/03/01 08:00	2028/03/03 17:00	連続	送電線	本四連系統1L/本四連系統2L	児島CH 本四連系統#1・2L直接運転 信号変換版改造による直接運転		更新	
0818998	四国	2028/03/06 08:30	2028/03/07 17:30	連続	香川SS	坂出火力線1L	坂出火力線1L GIS細密点検		新規	
0819029	四国	2028/03/06 08:30	2028/03/10 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	鉄塔腕金塗装 No.34,39,40,41,42 計5基		新規	
0819364	四国	2028/03/07 08:00	2028/03/09 17:00	連続	送電線	本四連系統1L/本四連系統2L	坂出CH 本四連系統#1・2L直接運転 信号変換版改造による直接運転		更新	
0819006	四国	2028/03/13 08:30	2028/03/14 17:30	連続	香川SS	香川線1L	香川線1L GIS細密点検		新規	
0819009	四国	2028/03/15 08:30	2028/03/16 17:30	連続	香川SS	香川線2L	香川線2L GIS細密点検		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932300	九州	2026/04/01 08:00	2026/04/03 17:00	毎日	北九州ss	北九州ss 500kV 豊前北幹線1L/北九州ss 500kV1号母線	北九州ss500kVGIS取替工事(1号母線下、豊前北幹線1L付近の杭打設工事)		変更	
0932687	九州	2026/04/01 09:00	2026/04/02 17:00	毎日	220kV 到津線1L	220kV 到津線1L	220kV到津線 1L採油業務【昼】		変更	
0932703	九州	2026/04/01 09:00	2026/04/03 17:00	連続	220kV 西佐世保武雄線1L(2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L(2025/06 運開)	【西佐世保武雄線1号線】鉄塔防錆		変更	
0935612	九州	2026/04/01 09:00	2026/04/23 17:00	連続	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L/220kV 西佐世保武雄線1L(西佐世保ss～No.70)	【西佐世保武雄線1L】一部変更工事(潜木地区)		変更	
0936408	九州	2026/04/01 09:00	2026/04/01 17:00	単日	220kV 西佐世保武雄線1L(2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L(2025/06 運開)	【西佐世保武雄線1号線】一部変更工事(潜木地区)のうちNo.70ジャンパ開放		変更	
0932688	九州	2026/04/03 21:00	2026/04/04 05:00	連続	220kV 到津線1L	220kV 到津線1L	220kV到津線1L 採油業務【夜】		変更	
0932300	九州	2026/04/06 08:00	2026/04/07 17:00	毎日	北九州ss	北九州ss 500kV 豊前北幹線1L/北九州ss 500kV1号母線	北九州ss500kVGIS取替工事(1号母線下、豊前北幹線1L付近の杭打設工事)		変更	
0932201	九州	2026/04/06 09:00	2026/06/19 17:00	連続	北九州ss	220kV 上津役線1L/北九州ss 20-70[加圧停止]/北九州ss 220kV 上津役線1L PCM(A)/北九州ss 220kV 上津役線1L PCM(B)	北九州ss 20-70CB取替工事		変更	
0935611	九州	2026/04/06 09:00	2026/04/08 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	2025年度鉄塔防錆塗装修繕工事(西佐世保武雄線1号線)		変更	
0935642	九州	2026/04/06 09:00	2026/04/06 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線1L(2026/04 運開)	220kV 鳥栖木佐木線1L(2026/04 運開)	鳥栖三池線関連停止【鳥栖三池線総合更新工事(平田町地区)】に伴うジャンパ接続		変更	
0935700	九州	2026/04/06 09:00	2026/04/14 17:00	連続	宮崎ss	500kV 宮崎幹線1L/宮崎ss 50-70[加圧停止]/宮崎ss 500kV 宮崎幹線1L PCM+DZ(A)/宮崎ss 500kV 宮崎幹線1L PCM+DZ(B)/宮崎ss 500kV 宮崎幹線1L PT自動切替盤/宮崎ss 500kV 宮崎幹線1L 500kV自動オンロ送信盤/宮崎ss 宮崎幹線1L制御端末(BCU)A系/宮崎ss 宮崎幹線1L制御端末(BCU)B系	宮崎ss 500kV制御装置取替工事を実施する。		変更	
0935800	九州	2026/04/06 09:00	2026/04/15 17:00	連続	500kV 豊前北幹線1L	500kV 豊前北幹線1L	豊前北幹線鉄塔防錆塗装修繕工事(1L)		変更	
0936412	九州	2026/04/06 17:00	2026/04/08 17:00	連続	220kV 鳥栖木佐木線1L(2026/04 運開)	220kV 鳥栖木佐木線1L(2026/04 運開)	鳥栖三池線総合更新工事(平田町地区)のうち使用前自主検査に伴う1L(春)停止		変更	
0932532	九州	2026/04/08 09:00	2026/04/10 17:00	連続	宮崎ss	500kV 宮崎幹線1L/宮崎ss 50-70[加圧停止]/宮崎ss 500kV 宮崎幹線1L PCM+DZ(A)/宮崎ss 500kV 宮崎幹線1L PCM+DZ(B)/宮崎ss 500kV[1-2] BP+LB盤/宮崎ss 500kVPT自動切替盤(500kV宮崎幹線1L)	宮崎ss オンラインSSC南部系安定化対策工事のうち起動装置設置(50-70切替)		変更	
0935665	九州	2026/04/08 09:00	2026/04/08 17:00	単日	鳥栖ss	220kV 鳥栖木佐木線1L/鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線1L 43KH	鳥栖三池線総合更新工事(平田町地区)1L使用前自主検査(電気試験)		変更	
0935643	九州	2026/04/09 09:00	2026/06/13 09:00	連続	220kV 鳥栖木佐木線2L(2026/04 運開)(鳥栖ss～#36)	220kV 鳥栖木佐木線2L(2026/04 運開)(鳥栖ss～#36)	鳥栖三池線総合更新工事(平田町地区)2L停止		変更	
0935644	九州	2026/04/09 09:00	2026/04/09 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線2L(2026/04 運開)	220kV 鳥栖木佐木線2L(2026/04 運開)	鳥栖三池線関連停止【鳥栖三池線総合更新工事(平田町地区)】に伴うジャンパ開放		変更	
0936431	九州	2026/04/09 09:00	2026/04/09 17:00	単日	南九州ss	220kV 鹿児島南線1L[受電停止]	●新設:500kVDP自動切換盤×4、 撤去:500kVDP自動切換盤×2		変更	
0932872	九州	2026/04/10 09:00	2026/06/03 17:00	連続	220kV 武雄線2L	220kV 武雄線2L	西九州武雄線総合更新工事(桃川地区)のうち2L架線及び撤去工事		変更	
0936443	九州	2026/04/10 09:00	2026/04/10 17:00	単日	南九州ss	220kV 鹿児島南線2L[受電停止]	●新設:500kVDP自動切換盤×4、 撤去:500kVDP自動切換盤×2		変更	
0932388	九州	2026/04/13 09:00	2026/04/17 18:00	連続	中央ss	500kV 豊前西幹線1L/中央ss 50-30[加圧停止]/中央ss 500kV 豊前西幹線1L DZ盤/中央ss 500kV 豊前西幹線1L PCM+DZ(A)/中央ss 500kV 豊前西幹線1L PCM+DZ(B)/中央ss 500kV[3-4] BP盤 常時監視ロック/中央ss 500kV[3-4] LB盤 常時監視ロック	中央ss 50-30 550kVガス絶縁開閉装置外部点検を行う。		変更	
0935611	九州	2026/04/13 09:00	2026/04/15 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	2025年度鉄塔防錆塗装修繕工事(西佐世保武雄線1号線)		変更	
0932644	九州	2026/04/13 09:30	2026/04/17 16:30	連続	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線鉄塔防錆塗装工事(2026年度)		変更	
0936671	九州	2026/04/15 07:00	2026/04/15 19:00	単日	長崎ss	220kV 長崎幹線1L/長崎ss 220kV1号母線/長崎ss 20-50 [加圧停止]/長崎ss 220kV2号 主要変圧器	長崎ss 220kV1号母線 外部点検(＃1)		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932797	九州	2026/04/15 09:00	2026/04/17 17:00	連続	北佐賀ss	220kV 北佐賀木佐木線1L/北佐賀ss 20-50[加圧停止]/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線1L PCM+DZ(A)/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線1L PCM+DZ(B)/北佐賀ss 220kV母線保護装置(220kV北佐賀木佐木1L関係)/北佐賀ss 220kV自動オシロ(220kV北佐賀木佐木1L関係)/北佐賀ss トランスジューサ盤(220kV北佐賀木佐木1L関係)/北佐賀ss 制御補助盤(220kV北佐賀木佐木1L関係)/北佐賀ss 220kVDPD自動切替盤(220kV北佐賀木佐木1L関係)	北佐賀ssTC取替工事(220kV北佐賀木佐木1L関係)		変更	
0935558	九州	2026/04/15 09:00	2026/04/17 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L	220kV南宮崎線(1L)鉄塔防錆塗装(2026年度本社実施分) 2025年度発注分		変更	
0932200	九州	2026/04/16 09:00	2026/04/17 17:00	連続	北九州ss	220kV 西谷2号線/北九州ss 20-240/北九州ss 220kV 西谷2号線 PCM(A)	北九州変電所 20-13他線路PD取替(既設PD移設後新設) 20-243線路PD取替(既設PD移設後新設)		変更	
0936677	九州	2026/04/20 07:10	2026/04/20 18:50	単日	長崎ss	長崎ss 220kV1号母線/長崎ss 20T-10(220kV母線連絡用)加圧停止]	長崎ss 20T-10 220kVガスしゃ断器外部点検(東芝, GSR, 2000A)を行う。		新規	
0932647	九州	2026/04/20 09:30	2026/04/24 16:30	連続	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線鉄塔防錆塗装工事(2026年度)		変更	
0935558	九州	2026/04/21 09:00	2026/04/23 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L	220kV南宮崎線(1L)鉄塔防錆塗装(2026年度本社実施分) 2025年度発注分		変更	
0932798	九州	2026/04/22 09:00	2026/04/24 17:00	連続	北佐賀ss	220kV 北佐賀木佐木線2L/北佐賀ss 20-60[加圧停止]/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線2L PCM+DZ(A)/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線2L PCM+DZ(B)/北佐賀ss 220kV母線保護装置(220kV北佐賀木佐木2L関係)/北佐賀ss 220kV自動オシロ(220kV北佐賀木佐木2L関係)/北佐賀ss トランスジューサ盤(220kV北佐賀木佐木2L関係)/北佐賀ss 制御補助盤(220kV北佐賀木佐木2L関係)/北佐賀ss 220kVDPD自動切替盤(220kV北佐賀木佐木2L関係)	北佐賀ssTC取替工事(220kV北佐賀木佐木2L関係)		変更	
0932202	九州	2026/04/23 09:00	2026/04/27 17:00	連続	220kV 南苅田線	220kV 南苅田線	関門連系線電線精密点検(1L)に伴う南苅田北九州線関連停止		変更	
0932635	九州	2026/04/23 09:00	2026/04/23 12:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	鳥栖三池線関連停止【鳥栖三池線総合更新工事(平田町地区)】に伴うジャンパ接続(2026年度)		変更	
0935613	九州	2026/04/23 09:00	2026/04/23 17:00	単日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L/220kV 西佐世保武雄線1L(西佐世保ss~No.70)	【西佐世保武雄線1L】一部変更工事(潜水地区)のうち試充電試験		変更	
0936409	九州	2026/04/23 09:00	2026/04/23 16:00	単日	220kV 西佐世保武雄線1L(2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L(2025/06 運開)	【西佐世保武雄線1号線】一部変更工事(潜水地区)のうちN o. 70ジャンパ接続		変更	
0932640	九州	2026/04/27 09:00	2026/06/05 17:00	連続	220kV 鳥栖木佐木線2L(鳥栖ss~#36)	220kV 鳥栖木佐木線2L(鳥栖ss~#36)	鳥栖三池線総合更新工事(平田町地区)2L停止		変更	
0934701	九州	2026/05/08 08:30	2026/05/08 17:30	単日	北九州ss	220kV 上津役線2L/北九州ss 20-80	北九州ss 20-83・E LS 外部点検を行う。		変更	
0934727	九州	2026/05/08 09:00	2026/05/13 17:00	毎日	220kV 西谷門司線2L[予防停止]	220kV 西谷門司線2L[予防停止]	220kV西谷門司線一部変更工事(葛原地区)		変更	
0936378	九州	2026/05/11 00:10	2026/05/12 04:55	毎日	JR新坂本ss	JR新坂本ss 220kV 大平人吉線1L [受電停止]/JR新坂本ss 220kV 大平人吉線2L [受電停止]	★【調整中】JR新坂本ss 受電設備定期点検(き電用変圧器(2号)2次側断路器A602・B602検査)		変更	
0932788	九州	2026/05/11 08:30	2026/05/11 17:30	単日	鳥栖ss	220kV 鳥栖木佐木線2L/鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線2L CR-A/鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線2L CR-B/鳥栖ss 20-40[加圧停止]/鳥栖ss 220kV母線保護盤 常時監視 [ロック]	鳥栖ss 20-40 220KVガスしゃ断器外部点検を行う。		変更	
0935701	九州	2026/05/11 09:00	2026/05/19 17:00	連続	宮崎ss	500kV 宮崎幹線2L/宮崎ss 50-80[加圧停止]/宮崎ss 500kV 宮崎幹線2L PCM+DZ(A)/宮崎ss 500kV 宮崎幹線2L PCM+DZ(B)/宮崎ss 500kV 宮崎幹線2L PT自動切替盤/宮崎ss 500kV 宮崎幹線2L 500kV自動オシロ送信盤/宮崎ss 宮崎幹線2L制御端末(BCU)A系/宮崎ss 宮崎幹線2L制御端末(BCU)B系	宮崎ss 500kV制御装置取替工事を実施する。		変更	
0936402	九州	2026/05/11 09:00	2026/05/13 17:00	連続	220kV 大分南線1L	220kV 大分南線1L	大分幹線ボルトナット緩み防止金具修繕工事(大分南線1L)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932364	九州	2026/05/12 09:00	2026/05/12 18:00	単日	脊振ss	脊振ss 500kV 北九州幹線1L/脊振ss 500kV 北九州幹線1L PCM+DZ(A)/脊振ss 500kV 北九州幹線1L PCM+DZ(B)/脊振ss 500kV[1-2] BP+LB(A)/脊振ss 500kV[1-2] BP+LB(B)	脊振ss他保護・制御装置取替工事(旧BP撤去のうち50-50切離し)		変更	
0935616	九州	2026/05/12 09:00	2026/05/28 17:00	連続	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	【西佐世保武雄線2L】一部変更工事(潜木地区)		変更	
0936410	九州	2026/05/12 09:00	2026/05/12 17:00	単日	220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開)	【西佐世保武雄線2号線】一部変更工事(潜木地区)のうちNo.70ジャンパ開放		変更	
0932365	九州	2026/05/13 09:00	2026/05/13 18:00	単日	脊振ss	脊振ss 500kV 北九州幹線2L/脊振ss 500kV 北九州幹線2L PCM+DZ(A)/脊振ss 500kV 北九州幹線2L PCM+DZ(B)/脊振ss 500kV[1-2] BP+LB(A)/脊振ss 500kV[1-2] BP+LB(B)	脊振ss他保護・制御装置取替工事(旧BP撤去のうち50-60切離し)		変更	
0932534	九州	2026/05/13 09:00	2026/05/15 17:00	連続	宮崎ss	500kV 宮崎幹線2L/宮崎ss 50-80[加圧停止]/宮崎ss 500kV 宮崎幹線2L PCM+DZ(A)/宮崎ss 500kV 宮崎幹線2L PCM+DZ(B)/宮崎ss 500kV[1-2] BP+LB盤/宮崎ss 500kVPT自動切替盤(500kV宮崎幹線2L)	宮崎ss オンラインSSC南部系安定化対策工事のうち起動装置設置(50-80切替)		変更	
0932704	九州	2026/05/13 09:00	2026/05/15 17:00	連続	220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開)/220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開)(西佐世保ss~No.70)	【西佐世保武雄線2号線】鉄塔防錆		変更	
0935615	九州	2026/05/13 09:00	2026/05/15 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	2025年度鉄塔防錆塗装修繕工事(西佐世保武雄線2号線)		変更	
0932374	九州	2026/05/18 09:00	2026/05/18 13:00	単日	脊振ss	脊振ss 220kV 脊振鳥栖線1L/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線1L PCM+DZ(A)/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線1L PCM+DZ(B)/脊振ss 220kV[1-2] BP+LB盤	脊振ss他保護・制御装置取替工事(旧BP撤去のうち20-10切離し)		変更	
0935615	九州	2026/05/18 09:00	2026/05/20 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	2025年度鉄塔防錆塗装修繕工事(西佐世保武雄線2号線)		変更	
0932375	九州	2026/05/18 13:00	2026/05/18 17:00	単日	脊振ss	脊振ss 220kV 脊振鳥栖線2L/脊振ss 20-20 [加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線2L PCM+DZ(A)/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線2L PCM+DZ(B)/脊振ss 220kV[1-2] BP+LB盤	脊振ss他保護・制御装置取替工事(旧BP撤去のうち20-20切離し)		変更	
0934883	九州	2026/05/19 08:00	2026/05/19 18:00	単日	海崎ss	220kV 海崎線2L/海崎ss 20-60[加圧停止]/海崎ss 4号主変/海崎ss 20-140 (20-140) [加圧停止]/海崎ss 6-140 [加圧停止]	海崎ss 20TB-1 220kV水平1点切AOPE無し外部点検		変更	
0932751	九州	2026/05/19 09:00	2026/06/05 17:00	毎日	220kV 熊本南熊本線2L (2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線2L (2025/06 運開)	【2026】保安対策(熊本地区)のうち電線付属品修繕工事		変更	
0934727	九州	2026/05/19 09:00	2026/05/19 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L[予防停止]	220kV 西谷門司線2L[予防停止]	220kV西谷門司線一部変更工事(葛原地区)		変更	
0935560	九州	2026/05/20 09:00	2026/05/22 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L	220kV南宮崎線(2L)鉄塔防錆塗装(2026年度本社実施分)		変更	
0932203	九州	2026/05/22 09:00	2026/05/26 17:00	連続	220kV 南苅田線	220kV 南苅田線	2025年度発注分		変更	
0934704	九州	2026/05/22 09:00	2026/05/27 17:00	連続	220kV 南苅田線	220kV 南苅田線	関門連系線電線精密点検(2L)に伴う南苅田北九州線関連停止		変更	
0934897	九州	2026/05/25 08:00	2026/05/25 18:00	単日	日田ss	220kV 熊本日田線2L (2025/12 運開)/日田ss 220kV 熊本日田線2L (2025/12 運開) 43CA[ロック]/日田ss 220kV 熊本日田線2L (2025/12 運開) 43CB[ロック]/日田ss 220kV 熊本日田線2L (2025/12 運開) 43RCA[ロック]/日田ss 220kV 熊本日田線2L (2025/12 運開) 43RCB[ロック]/日田ss 20-20[加圧停止]/日田ss 220kV ローカルバックアップトリップ回路監視 [ロック]/日田ss 220kV 母線保護盤(2) トリップ回路監視 [ロック]	日田ss 20-20 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)		変更	
0936693	九州	2026/05/25 09:00	2026/05/25 12:00	単日	北九州ss	北九州ss 220kV 南苅田線/北九州ss 20-150	マホータイによる修繕		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932814	九州	2026/05/26 07:00	2026/05/26 19:00	単日	西大分ss	220kV 大分南線2L/西大分ss 20-80[加圧停止]/西大分ss 220kV 大分南線2L 43CA[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線2L 43CB[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線2L 43RCA[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線2L 43RCB[ロック]/西大分ss 西大分ss SSC起動装置(A) 43JKA [ロック]/西大分ss 西大分ss 220kV大分南線2LPCM+DZ盤(A)243JKA [ロック]/西大分ss 西大分ss 220kV大分南線2LPCM+DZ盤(B)243JKB [ロック]/西大分ss 西大分ss 220kV母線保護盤 20-80トリップロック赤T・T [ロック]/西大分ss 220kV母線保護盤(1)常時監視 43JK [ロック]/西大分ss 西大分ss SSC 起動装置(B)43JKB [ロック]	西大分ss 20-80 220KVガスしゃ断器外部点検(日立、OFPTB、3000A)		変更	
0935672	九州	2026/05/26 08:00	2026/05/26 18:00	単日	西大分ss	220kV 大分南線2L/西大分ss 20-80[加圧停止]	西大分ss 20-80 油圧計不良修繕		変更	
0932054	九州	2026/05/26 09:00	2026/05/26 17:00	単日	日田ss	日田ss 220kV 熊本日田線1L/日田ss 20-10 [加圧停止]	日田ss 20-13 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検		変更	
0935560	九州	2026/05/26 09:00	2026/05/28 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L	220kV南宮崎線(2L)鉄塔防錆塗装(2026年度本社実施分) 2025年度発注分		変更	
0932059	九州	2026/05/27 07:00	2026/05/27 19:00	単日	日田ss	日田ss 220kV 熊本日田線2L/日田ss 20-20 [加圧停止]	日田ss 220kV日田線2L(P204～P205) 屋外鉄構外部点検		変更	
0932060	九州	2026/05/27 09:00	2026/05/27 17:00	単日	日田ss	日田ss 220kV 熊本日田線2L/日田ss 20-20 [加圧停止]	日田ss 20-23 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検		変更	
0932441	九州	2026/05/28 09:00	2026/05/29 17:00	毎日	西九州ss	220kV 武雄線2L/西九州ss 20-40[加圧停止]	西九州ss 武雄線1、2L鉄構P-24～P-26間 GW (P26鉄構)架空地線外部点検		変更	
0932442	九州	2026/05/28 09:00	2026/05/29 17:00	毎日	西九州ss	220kV 武雄線2L/西九州ss 20-40[加圧停止]	西九州ss 武雄線2L鉄構P-26～北佐賀線1L鉄構P-1間 GW (P26鉄構)架空地線外部点検		変更	
0932443	九州	2026/05/28 09:00	2026/05/29 17:00	毎日	西九州ss	220kV 武雄線2L/西九州ss 20-40[加圧停止]	西九州ss 武雄線2L引留鉄構(P-25～P-26) 屋外鉄構外部点検		変更	
0935640	九州	2026/05/28 09:00	2026/05/28 17:00	単日	220kV 西佐世保武雄線2L (2026/05 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2026/05 運開)	【西佐世保武雄線2L】一部変更工事(潜水地区)のうち試充電試験		変更	
0936411	九州	2026/05/28 09:00	2026/05/28 17:00	単日	220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開)	【西佐世保武雄線2号線】一部変更工事(潜水地区)のうちN o. 70ジャンパ接続		変更	
0931858	九州	2026/06/01 07:30	2026/06/01 18:30	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV 2号母線/唐津ss 20-50[加圧停止]/唐津ss 220kV2号 主要変圧器/唐津ss 6-120[加圧停止]/唐津ss 20-120(#2主変1次)[加圧停止]/唐津ss 20T-10 [加圧停止]/唐津ss 220kV母線保護盤 常時監視 [ロック]/唐津ss 220kV母線分離盤 常時監視 [ロック]	唐津ss 20T-10 220KVガスしゃ断器外部点検を行う。		変更	
0931859	九州	2026/06/01 07:30	2026/06/01 18:30	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV 2号母線/唐津ss 20-50[加圧停止]/唐津ss 220kV2号 主要変圧器/唐津ss 6-120[加圧停止]/唐津ss 20-120(#2主変1次)[加圧停止]/唐津ss 20T-10 [加圧停止]	唐津ss 220kV1号 碍子洗浄装置 20T-10 碍洗ノズル外部点検を行う		変更	
0936664	九州	2026/06/01 08:30	2026/06/04 17:30	連続	220kV 唐津西九州線1L	220kV 唐津西九州線1L	作業鉄塔:1、2		新規	
0932413	九州	2026/06/01 09:00	2026/06/05 17:00	連続	西九州ss	西九州ss 500kV 佐賀幹線2L [予防停止]/西九州ss 50-20	西九州ss500kVVGIS更新工事(新3号母線接続 予防停止 2026年6月)		変更	
0935702	九州	2026/06/01 09:00	2026/06/09 17:00	連続	宮崎ss	500kV 小丸川幹線1L/宮崎ss 50-10[加圧停止]/宮崎ss 500kV 小丸川幹線1L PCM+DZ(A)/宮崎ss 500kV 小丸川幹線1L PCM+DZ(B)/宮崎ss 500kV 小丸川幹線1L PT自動切替盤/宮崎ss 500kV 小丸川幹線1L 500kV自動オシロ送信盤/宮崎ss 小丸川幹線1L制御端末(BCU)A系/宮崎ss 小丸川幹線1L制御端末(BCU)B系	宮崎ss 500kV制御装置取替工事を実施する。		変更	
0935592	九州	2026/06/02 09:00	2026/06/11 17:00	連続	220kV 中九州南熊本線2L (中九州ss～南熊本ss)	220kV 中九州南熊本線2L(中九州ss～南熊本ss)	中九州大平線架空地線張替工事(原田地区)		変更	
0936697	九州	2026/06/02 09:00	2026/06/02 12:00	単日	豊前ss	220kV 東豊前線1L	ノズル清掃、配管内フラッシング		新規	
0931855	九州	2026/06/03 08:30	2026/06/05 17:30	連続	220kV 唐津西九州線1L	220kV 唐津西九州線1L	鉄塔防錆 唐津西九州線 2基		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932588	九州	2026/06/03 09:00	2026/06/05 17:00	連続	ひむかss	500kV 小丸川幹線1L/ひむかss 50-10 [加圧停止]/ひむかss 500kV 小丸川幹線1L PCM+DZ(A)/ひむかss 500kV 小丸川幹線1L PCM+DZ(B)/ひむかss 500kV[1-2] BP+LB盤/ひむかss 500kVPT自動切替盤(500kV小丸川幹線1L)/ひむかss 微地絡検出盤(受信)(500kV小丸川幹線1L)	ひむかss オンラインSSC南部系安定化対策工事のうち起動装置設置(50-10切替)		変更	
0932868	九州	2026/06/03 09:00	2026/06/03 17:00	単日	西九州ss	220kV 武雄線2L/西九州ss 西九州ss 20-43 [ロック]	西九州武雄線総合更新工事(桃川地区)のうち2L電気試験		変更	
0936695	九州	2026/06/03 09:00	2026/06/03 12:00	単日	北九州ss	220kV 西谷3号線	碇洗ノズル清掃、配管フラッシング		新規	
0931854	九州	2026/06/04 08:30	2026/06/04 17:30	単日	220kV 唐津西九州線1L	220kV 唐津西九州線1L	唐津西九州線 ボルトナット修繕 1基		変更	
0936755	九州	2026/06/04 09:00	2026/06/04 17:00	単日	西九州ss	220kV 武雄線1L/西九州ss 20-30[加圧停止]	西九州ss 20-33EリミットSW不具合修繕		新規	
0932641	九州	2026/06/05 09:00	2026/06/05 12:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	鳥栖三池線関連停止【鳥栖三池線総合更新工事(平田町地区)に伴うジャンパ接続(2026年度)		変更	
0932413	九州	2026/06/08 09:00	2026/06/12 17:00	連続	西九州ss	西九州ss 500kV 佐賀幹線2L [予防停止]/西九州ss 50-20	西九州ss500kV/GIS更新工事(新3号母線接続 予防停止 2026年6月)		変更	
0934743	九州	2026/06/08 09:00	2026/06/08 17:00	単日	苅田ss	220kV 西谷門司線1L/苅田ss 20-10	苅田ss20-13ELS動作確認装置修繕を実施する。		変更	
0934744	九州	2026/06/08 09:00	2026/06/08 17:00	単日	苅田ss	220kV 西谷門司線1L/苅田ss 20-10	苅田ss20-13LS動作確認装置修繕を実施する。		変更	
0934751	九州	2026/06/08 09:00	2026/06/10 17:00	連続	門司ss	220kV 西谷門司線1L/門司ss 220kV 西谷門司線1L 43LPA[ロック]/門司ss 220kV 西谷門司線1L 43LPB[ロック]/門司ss 20-50	他電力で発生した投入動作不具合事例を受け、同型機器への水平展開(修繕)を行う。		変更	
0936403	九州	2026/06/08 09:00	2026/06/10 17:00	連続	220kV 大分南線2L	220kV 大分南線2L	大分幹線ボルトナット緩み防止金具修繕工事(大分南線2L)		変更	
0934742	九州	2026/06/11 09:00	2026/06/11 17:00	単日	苅田ss	220kV 苅田連絡線/苅田ss 20-91[切]	動作確認装置の取替えを行う。		変更	
0936791	九州	2026/06/13 09:00	2026/06/14 09:00	連続	220kV 鳥栖木佐木線2L (2026/06 運開)	220kV 鳥栖木佐木線2L (2026/06 運開)	鳥栖三池線関連停止【鳥栖三池線総合更新工事(平田町地区)に伴うジャンパ接続部端子長さ合わせ		新規	
0935649	九州	2026/06/14 09:00	2026/06/14 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線2L (2026/06 運開)	220kV 鳥栖木佐木線2L (2026/06 運開)	鳥栖三池線関連停止【鳥栖三池線総合更新工事(平田町地区)に伴うジャンパ接続		変更	
0936413	九州	2026/06/14 17:00	2026/06/16 17:00	連続	220kV 鳥栖木佐木線2L (2026/06 運開)	220kV 鳥栖木佐木線2L (2026/06 運開)	鳥栖三池線総合更新工事(平田町地区)のうち使用前自主検査に伴う2L停止		変更	
0932413	九州	2026/06/15 09:00	2026/06/19 17:00	連続	西九州ss	西九州ss 500kV 佐賀幹線2L [予防停止]/西九州ss 50-20	西九州ss500kV/GIS更新工事(新3号母線接続 予防停止 2026年6月)		変更	
0934705	九州	2026/06/15 09:00	2026/06/19 17:00	連続	220kV 筑豊線1L	220kV 筑豊線1L	筑豊線・7 鉄塔部材修繕工事 ・主柱材 :4本 ・斜材 :2本		変更	
0934745	九州	2026/06/15 09:00	2026/06/15 17:00	単日	苅田ss	220kV 西谷門司線2L/苅田ss 20-20	苅田ss20-23LS動作確認装置修繕を実施する。		変更	
0934746	九州	2026/06/15 09:00	2026/06/15 17:00	単日	苅田ss	220kV 西谷門司線2L/苅田ss 20-20	苅田ss20-23ELS動作確認装置修繕を実施する。		変更	
0935703	九州	2026/06/15 09:00	2026/06/23 17:00	連続	宮崎ss	500kV 小丸川幹線2L/宮崎ss 50-20[加圧停止]/宮崎ss 500kV 小丸川幹線2L PCM+DZ(A)/宮崎ss 500kV 小丸川幹線2L PCM+DZ(B)/宮崎ss 500kV 小丸川幹線2L PT自動切替盤/宮崎ss 500kV 小丸川幹線2L 220kV自動オンロ送信盤/宮崎ss 小丸川幹線2L制御端末(BCU)A系/宮崎ss 小丸川幹線2L制御端末(BCU)B系	宮崎ss 500kV制御装置取替工事を実施する。		変更	
0934706	九州	2026/06/16 09:00	2026/06/19 17:00	連続	220kV 筑豊線1L	220kV 筑豊線1L	・2～・6・9 7基のダンパ取替		変更	
0935667	九州	2026/06/16 09:00	2026/06/16 17:00	単日	鳥栖ss	220kV 鳥栖木佐木線2L (2026/06 運開)/鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線2L 43KH	鳥栖三池線総合更新工事(平田町地区)2L使用前自主検査(電気試験)		変更	
0932238	九州	2026/06/17 08:30	2026/06/17 17:30	単日	筑豊ss	筑豊ss 220kV 筑豊線1L/筑豊ss 20-10	筑豊ss 20-13・E LS 外部点検を行う。		変更	
0932239	九州	2026/06/17 09:00	2026/06/17 17:00	単日	筑豊ss	筑豊ss 220kV 筑豊線1L/筑豊ss 20-10	筑豊ss 20-13 LPD 簡易点検を行う。		変更	
0932589	九州	2026/06/17 09:00	2026/06/19 17:00	連続	ひむかss	500kV 小丸川幹線2L/ひむかss 50-20 [加圧停止]/ひむかss 500kV 小丸川幹線2L PCM+DZ(A)/ひむかss 500kV 小丸川幹線2L PCM+DZ(B)/ひむかss 500kV[1-2] BP+LB盤/ひむかss 500kVPT自動切替盤(500kV小丸川幹線2L)/ひむかss 微地絡検出盤(受信)(500kV小丸川幹線2L)	ひむかss オンラインSSC南部系安定化対策工事のうち起動装置設置(50-20切替)		変更	
0936703	九州	2026/06/18 09:00	2026/06/18 17:00	単日	筑豊ss	220kV 筑豊線1L/筑豊ss 20-10	2025年11月19日(水)筑豊ss 20-10 GCB 外部点検時に投入時間管理値逸脱を発見したため、今回、臨時点検を行う。		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932007	九州	2026/06/19 07:30	2026/06/19 13:30	単日	南福岡ss	220kV 中央南福岡線1L(中央ss～南福岡ss)/南福岡ss 中央南福岡線1L LPT切離し	1号線 ・46接続所～南福岡SS 1. 3km CV1×1400mm2 高経年 ケーブル張替(超高压) 北九州ss 20～70CB取替工事		変更	
0932237	九州	2026/06/19 09:00	2026/06/19 17:00	単日	上津役ss	220kV 上津役線1L/上津役ss 20～70[加圧停止]/上津役ss 220kV 上津役線1L 43RCA[ロック]/上津役ss 220kV 上津役線1L 43RCB[ロック]/上津役ss 220kV 上津役線1L(A系) 43KH[仮保護]			変更	
0931992	九州	2026/06/19 12:30	2026/06/19 17:30	単日	220kV 中央南福岡線1L(中央ss～南福岡ss)	220kV 中央南福岡線1L(中央ss～南福岡ss)	1号線 ・46接続所～南福岡SS 1. 3km CV1×1400mm2 高経年 ケーブル張替(超高压)		変更	
0936666	九州	2026/06/22 08:00	2026/06/22 18:00	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 20～60[加圧停止]/唐津ss 20～110[加圧停止]/唐津ss 220kV1号母線/唐津ss 220kV1号 主要変圧器/唐津ss 20T-10[加圧停止]	唐津ss220kV1号母線の碍洗配管が腐食し漏水しているため修繕を行う。		新規	
0932413	九州	2026/06/22 09:00	2026/06/26 17:00	連続	西九州ss	西九州ss 500kV 佐賀幹線2L [予防停止]/西九州ss 50～20	西九州ss500kVVGIS更新工事(新3号母線接続 予防停止 2026年6月)		変更	
0932003	九州	2026/06/23 08:00	2026/06/23 18:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線1L[予防停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器	終端箱のシリコン油採油(1回/3年) ・西福岡ss:3相 ・赤 坂ss:3相		変更	
0932004	九州	2026/06/23 09:00	2026/06/23 18:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線1L/赤坂ss 66kV1号母線/赤坂ss 6T-10(#1、#2母線連絡用)[加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂ss 6-110(#1MTr2次)[加圧停止]/赤坂ss 赤坂ss 66kV1号事故継続分離盤 [ロック]	赤坂ss 66kV1号事故継続分離盤 特性試験を行う。		変更	
0934708	九州	2026/06/23 09:00	2026/06/26 17:00	連続	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	・2～・6・9 7基のダンパ取替		変更	
0932005	九州	2026/06/24 08:00	2026/06/24 18:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線2L[予防停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器	2016年度より終端箱のシリコン油採油を実施しており、今回、3回目の採油を実施する。 ・西福岡ss:3相 ・赤 坂ss:3相		変更	
0932242	九州	2026/06/24 08:30	2026/06/24 17:30	単日	筑豊ss	220kV 筑豊線2L/筑豊ss 20～20	筑豊ss 20～20 GCB 外部点検を行う。		変更	
0932006	九州	2026/06/24 09:00	2026/06/24 18:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線2L/赤坂ss 66kV2号母線/赤坂ss 6T-10(#1、#2母線連絡用)[加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器/赤坂ss 6-120(#2MTr2次)[加圧停止]/赤坂ss 赤坂ss 66kV2号事故継続分離盤 [ロック]	赤坂ss 66kV2号事故継続分離盤 特性試験を行う。		変更	
0935826	九州	2026/06/27 09:00	2026/09/02 17:00	連続	500kV 佐賀幹線1L(2026/09 運開)	500kV 佐賀幹線1L(2026/09 運開)	佐賀幹線電線張替工事(2期)第2延線[1L]		変更	
0935827	九州	2026/06/27 09:00	2026/09/02 17:00	連続	500kV 佐賀幹線1L(2026/09 運開)	500kV 佐賀幹線1L(2026/09 運開)	佐賀幹線電線張替工事(2期)第7延線[1L]		変更	
0935828	九州	2026/06/27 09:00	2026/09/02 17:00	連続	500kV 佐賀幹線1L(2026/09 運開)	500kV 佐賀幹線1L(2026/09 運開)	佐賀幹線電線張替工事(2期)第14延線[1L]		変更	
0934707	九州	2026/06/29 09:00	2026/07/03 17:00	連続	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	筑豊線・7 鉄塔部材修繕工事 ・主柱材:4本 ・斜材 :2本		変更	
0931993	九州	2026/06/29 09:30	2026/06/29 12:30	単日	脊振ss	脊振ss 220kV 脊振西福岡線1L/脊振ss 20～30[加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振西福岡線1L PCM+DZ(A)/脊振ss 220kV 脊振西福岡線1L PCM+DZ(B)	福岡総制分の停止入力用		変更	
0931994	九州	2026/06/29 12:30	2026/06/29 17:30	単日	脊振ss	脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L/脊振ss 20～40[加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L PCM+DZ(A)/脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L PCM+DZ(B)	福岡総制分の停止入力用		変更	
0931997	九州	2026/06/30 09:00	2026/06/30 13:00	単日	脊振ss	脊振ss 220kV 脊振伊都線1L/脊振ss 20～50[加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振伊都線1L PCM+DZ(A)/脊振ss 220kV 脊振伊都線1L PCM+DZ(B)/伊都ss 220kV1号 送電用変圧器	福岡総制分の停止入力用		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0931995	九州	2026/06/30 12:00	2026/06/30 18:00	単日	脊振ss	脊振ss 220kV 脊振伊都線2L/脊振ss 2 0-60 [加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振 伊都線2L PCM+DZ(A)/脊振ss 220kV 脊振伊都線2L PCM+DZ(B)/伊 都ss 220kV2号 送電用変圧器	福岡総制分の停止入力用		変更	
0932281	九州	2026/07/02 09:00	2026/09/04 17:00	連続	500kV 佐賀幹線1L	500kV 佐賀幹線1L	佐賀幹線電線張替工事(2期)第8延線【1L】		変更	
0932282	九州	2026/07/02 09:00	2026/09/04 17:00	連続	500kV 佐賀幹線1L	500kV 佐賀幹線1L	佐賀幹線電線張替工事(2期)第3延線【1L】		変更	
0932283	九州	2026/07/02 09:00	2026/09/04 17:00	連続	500kV 佐賀幹線1L	500kV 佐賀幹線1L	佐賀幹線電線張替工事(2期)第1延線【1L】		変更	
0932115	九州	2026/07/08 09:00	2026/07/08 17:00	単日	220kV 東豊前線1L	220kV 東豊前線1L	220kV#1.2母線横断の架空地線修繕を実施する。		変更	
0932498	九州	2026/07/13 08:00	2026/07/15 20:00	連続	中九州ss	中九州ss 500kV 南九州幹線1L (2025/10 運開)/中九州ss 50-10[加圧停止]	中九州ss 50-10 550kVガス絶縁開閉装置外部点検を行 う。		変更	
0934600	九州	2026/07/13 08:30	2026/07/17 17:30	連続	220kV 中央南福岡線1L	220kV 中央南福岡線1L	2026年度発注(2力年分)6基実施予定 ・11(中央南福岡線・16併架)		変更	
0934722	九州	2026/07/14 09:00	2026/07/19 17:00	毎日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	220kV西谷門司線一部変更工事(葛原地区)		変更	
0935717	九州	2026/07/14 09:00	2026/07/15 17:00	連続	南九州ss	南九州ss 500kV 南九州幹線1L (2025/10 運開) DZ盤/南九州ss 500kV 南九州幹 線1L (2025/10 運開) PCM(A)/南九州 ss 500kV 南九州幹線1L (2025/10 運開) PCM(B)/南九州ss 500kV[1-2] BP 盤/南九州ss 50-10/南九州ss 500kV 自動オンロ送信装置 [ロック]/南九州ss PQVF測定装置 [ロック]/南九州ss 500kV脱調分離盤 [ロック]	南九州ssオンラインSSC南部系安定化対策工事【500kV南九 州幹線1L】		変更	
0934689	九州	2026/07/21 08:30	2026/07/21 17:30	単日	北九州ss	北九州ss 20-240/220kV 西谷2号線	北九州ss 20-243・E LS 外部点検を行う。		変更	
0935829	九州	2026/07/22 09:00	2026/07/29 17:00	連続	500kV 佐賀幹線1L (2026/09 運開)	500kV 佐賀幹線1L (2026/09 運開)	★2026・2027年度福岡・熊本エリア防錆塗装修繕工事(佐賀幹 線)・165		変更	
0932200	九州	2026/07/23 09:00	2026/07/24 17:00	連続	北九州ss	220kV 西谷2号線/北九州ss 20-240/ 北九州ss 220kV 西谷2号線 PCM(A)	北九州変電所 20-13他線路PD取替(既設PD移設後新設) 20-243線路PD取替(既設PD移設後新設)		変更	
0934722	九州	2026/07/23 09:00	2026/07/23 17:00	単日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	220kV西谷門司線一部変更工事(葛原地区)		変更	
0932499	九州	2026/07/27 08:00	2026/07/29 20:00	連続	中九州ss	中九州ss 500kV 南九州幹線2L (2025/10 運開)/中九州ss 50-20[加圧停止]	中九州ss 50-20 550kVガス絶縁開閉装置外部点検を行 う。		変更	
0935718	九州	2026/07/28 09:00	2026/07/29 17:00	連続	南九州ss	南九州ss 500kV 南九州幹線2L (2025/10 運開) DZ盤/南九州ss 500kV 南九州幹 線2L (2025/10 運開) PCM(A)/南九州 ss 500kV 南九州幹線2L (2025/10 運開) PCM(B)/南九州ss 500kV[1-2] BP 盤/南九州ss 50-20/南九州ss 500kV 自動オンロ送信装置 [ロック]/南九州ss 500kV脱調分離盤 [ロック]/南九州ss PQVF測定装置 [ロック]	南九州ssオンラインSSC南部系安定化対策工事【500kV南九 州幹線2L】		変更	
0935832	九州	2026/08/20 09:00	2026/08/27 17:00	連続	500kV 佐賀幹線1L	500kV 佐賀幹線1L	★2026・2027年度福岡・熊本エリア防錆塗装修繕工事(佐賀幹 線)・166		変更	
0934601	九州	2026/08/24 08:30	2026/08/28 17:30	連続	220kV 中央南福岡線2L	220kV 中央南福岡線2L	2026年度発注(2力年分)6基実施予定 ・11(中央南福岡線・16併架)		変更	
0934716	九州	2026/08/24 09:00	2026/08/24 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	220kV西谷門司線1L,2Lｼﾞｬﾝﾊﾞ開閉(220kV谷門司線・33作業 時) ・ｼﾞｬﾝﾊﾞ開放…2L, 2回、1L, 2回 ・ｼﾞｬﾝﾊﾞ接続…2L, 2回、1L, 2回		変更	
0934711	九州	2026/08/25 09:00	2026/09/17 17:00	連続	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	220kV西谷門司線一部変更工事(葛原地区)		変更	
0932000	九州	2026/09/01 08:30	2026/09/08 17:30	連続	220kV 脊振西福岡線1L	220kV 脊振西福岡線1L	3基実施予定		変更	
0934602	九州	2026/09/01 08:30	2026/09/08 17:30	連続	220kV 脊振西福岡線1L	220kV 脊振西福岡線1L	2026年発注(2力年)4基		変更	
0932209	九州	2026/09/01 09:00	2026/09/10 17:00	連続	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	220kV西谷門司線一部変更工事(葛原地区)		変更	
0932224	九州	2026/09/01 09:00	2026/09/01 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	220kV#13240:西谷門司線1L,2Lｼﾞｬﾝﾊﾞ開閉(220kV西谷 門司線・33作業時) ・ｼﾞｬﾝﾊﾞ開放…2L, 2回、1L, 1回 ・ｼﾞｬﾝﾊﾞ接続…2L, 2回、1L, 1回		変更	
0932303	九州	2026/09/03 08:00	2026/09/04 17:00	毎日	北九州ss	北九州ss 500kV 豊前北幹線2L/北九州 ss 500kV1号母線	北九州ss500kVGIS取替工事(豊前北幹線1L線路GIS据 付)		変更	
0934695	九州	2026/09/08 08:30	2026/09/08 17:30	単日	北九州ss	220kV 西谷2号線/北九州ss 20-240	北九州ss 20-241 LS 外部点検を行う。		変更	
0932001	九州	2026/09/09 08:30	2026/09/16 17:30	連続	220kV 脊振西福岡線2L	220kV 脊振西福岡線2L	3基実施予定		変更	
0934603	九州	2026/09/09 08:30	2026/09/16 17:30	連続	220kV 脊振西福岡線2L	220kV 脊振西福岡線2L	2026年発注(2力年)4基		変更	
0932225	九州	2026/09/10 09:00	2026/09/10 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	220kV#13240:西谷門司線1L,2Lｼﾞｬﾝﾊﾞ開閉(220kV西谷 門司線・33作業時) ・ｼﾞｬﾝﾊﾞ開放…2L, 2回、1L, 1回 ・ｼﾞｬﾝﾊﾞ接続…2L, 2回、1L, 1回		変更	
0932204	九州	2026/09/11 09:00	2026/10/07 17:00	連続	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	220kV西谷門司線一部変更工事(葛原地区)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932218	九州	2026/09/11 09:00	2026/09/11 17:00	単日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	220㎸西谷門司線1L,2Lｼﾞｬﾝﾊﾞ 開閉(220㎸西谷門司線・33作業時) ・ｼﾞｬﾝﾊﾞ開放…2L,2回、1L,1回 ・ｼﾞｬﾝﾊﾞ接続…2L,2回、1L,1回		変更	
0934872	九州	2026/09/15 07:00	2026/09/18 14:00	毎日	220kV 熊本日田線1L (2025/12 運開)	220kV 熊本日田線1L (2025/12 運開)	熊本日田線一部変更工事(国武・平野地区)のうち・103基礎工事(1L)〔予防停止〕		変更	
0934717	九州	2026/09/18 09:00	2026/09/18 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	220kV西谷門司線1L,2Lｼﾞｬﾝﾊﾞ 開閉(220kV谷門司線・33作業時) ・ｼﾞｬﾝﾊﾞ開放…2L,2回、1L,2回 ・ｼﾞｬﾝﾊﾞ接続…2L,2回、1L,2回		変更	
0934872	九州	2026/09/19 07:00	2026/10/10 17:00	毎日	220kV 熊本日田線1L (2025/12 運開)	220kV 熊本日田線1L (2025/12 運開)	熊本日田線一部変更工事(国武・平野地区)のうち・103基礎工事(1L)〔予防停止〕		変更	
0932415	九州	2026/09/21 09:00	2026/11/06 17:00	連続	西九州ss	西九州ss 500kV 佐賀幹線2L/西九州ss 50-20	西九州ss500kVGIS更新工事(50-20切替)		変更	
0932769	九州	2026/09/24 08:00	2026/09/24 18:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss 20-10 [加圧停止]	木佐木ss 20-13(13E) LS 外部点検		変更	
0934712	九州	2026/09/24 09:00	2026/09/24 17:00	単日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	苅田分岐線地線金具他修繕工事(1L)		変更	
0934713	九州	2026/09/24 09:00	2026/09/24 17:00	単日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	220kV西谷門司線1L,2Lｼﾞｬﾝﾊﾞ 開閉(220kV谷門司線・33作業時) ・ｼﾞｬﾝﾊﾞ開放…2L,2回、1L,2回 ・ｼﾞｬﾝﾊﾞ接続…2L,2回、1L,2回		変更	
0934721	九州	2026/09/24 09:00	2026/09/24 17:00	単日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	苅田分岐線ｼﾞｬﾝﾊﾞ線金具修繕工事(1L)		変更	
0934723	九州	2026/09/24 09:00	2026/09/25 17:00	毎日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	西谷門司線鉄塔防錆塗装修繕工事(1L)		変更	
0935659	九州	2026/09/25 08:00	2026/09/25 18:00	単日	三池ss	三池ss 220kV 木佐木三池線2L/三池ss 20-20[加圧停止]/三池ss 220kV 木佐木三池線2L PCM+DZ(A)/三池ss 220kV 木佐木三池線2L PCM+DZ(B)/三池ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	三池ss 20-20 GCB 外部点検		変更	
0934710	九州	2026/09/25 09:00	2026/10/07 17:00	連続	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	220kV西谷門司線一部変更工事(葛原地区)		変更	
0933452	九州	2026/09/28 08:00	2026/12/17 18:00	連続	北九州ss	北九州ss 220kV 西谷3号線/北九州ss 20-170/北九州ss 220kV西谷線3L(A) [ロック]/北九州ss 220kV西谷線3L(B) [ロック]	20-170、171、172老朽更新		変更	
0934700	九州	2026/09/28 09:00	2026/12/09 17:00	連続	北九州ss	220kV 上津役線1L/北九州ss 20-70[加圧停止]/北九州ss 220kV 上津役線1L PCM(A)/北九州ss 220kV 上津役線1L PCM(B)	北九州ss 20-70CB取替工事		変更	
0934723	九州	2026/09/28 09:00	2026/10/01 17:00	毎日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	西谷門司線鉄塔防錆塗装修繕工事(1L)		変更	
0935830	九州	2026/09/28 09:00	2026/10/05 17:00	連続	500kV 佐賀幹線2L (2026/09 運開)	500kV 佐賀幹線2L (2026/09 運開)	★2026・2027年度福岡・熊本エリア防錆塗装修繕工事(佐賀幹線)・166		変更	
0934892	九州	2026/09/29 07:00	2026/09/29 19:00	単日	日田ss	220kV 熊本日田線1L (2025/12 運開)/日田ss 20-10[加圧停止]	日田ss 220kV日田線1L(P202～P203) 屋外鉄構外部点検		変更	
0934893	九州	2026/09/29 09:00	2026/09/29 17:00	単日	日田ss	220kV 熊本日田線1L (2025/12 運開)/日田ss 20-10[加圧停止]	日田ss 20-13 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検		変更	
0933442	九州	2026/09/30 08:00	2026/10/02 18:00	毎日	北九州ss	北九州ss 220kV 西谷1号線/北九州ss 20-230	20-170、171、172老朽更新		変更	
0932299	九州	2026/10/01 08:00	2026/11/20 17:00	連続	北九州ss	北九州ss 500kV 豊前北幹線1L/北九州ss 500kV 豊前北幹線1L PCM+DZ(A)/北九州ss 500kV 豊前北幹線1L PCM+DZ(B)/北九州ss 50-10[加圧停止]/北九州ss 北九州ss 500kVBP盤(A),(B) 50-10CTプラグ/北九州ss 北九州ss 500kVVOG盤 50-10CTプラグ/北九州ss 北九州ss 豊前北幹線1L 制御端末(A),(B)	北九州ss500kVGIS取替工事(豊前北幹線1L切替)		変更	
0932305	九州	2026/10/01 08:00	2026/10/02 17:00	毎日	北九州ss	北九州ss 500kV1号母線	北九州ss500kVGIS取替工事(豊前北幹線1LGIB組立、既設GIS1号母線側Bg撤去)		変更	
0932306	九州	2026/10/01 08:00	2026/10/01 17:00	単日	北九州ss	北九州ss 500kV1号母線	北九州ss500kVGIS取替工事(豊前北幹線1L既設GIS1号母線側架線撤去)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0935890	九州	2026/10/01 08:00	2026/11/19 17:00	連続	北九州ss	北九州ss 500kV 豊前北幹線1L/北九州ss 500kV 豊前北幹線1L PCM+DZ(A)/北九州ss 500kV 豊前北幹線1L PCM+DZ(B)/北九州ss 50-10[加圧停止]/北九州ss 北九州ss 500kVBP盤(A)(B) 50-10CTプラグ/北九州ss 北九州ss 500kVOG盤 50-10CTプラグ/北九州ss 北九州ss 豊前北幹線1L 制御端末(A)(B)	北九州ss500kVGIS取替工事(豊前北幹線1L切替)		変更	
0929764	九州	2026/10/01 09:00	2026/11/16 17:00	連続	220kV 武雄線1L	220kV 武雄線1L	西九州武雄線大規模改修工事(桃川地区)のうち1L架線及び撤去工事		変更	
0935648	九州	2026/10/01 09:00	2026/10/01 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線2L (2026/06 運開)[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線2L (2026/06 運開)[予防停止]	管内送電線路営業除去業務(2026年度)		変更	
0932767	九州	2026/10/02 08:00	2026/10/02 18:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線1L (2026/06 運開)/木佐木ss 20-30 [加圧停止]/木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線1L PCM+DZ(A)/木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線1L PCM+DZ(B)/木佐木ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	木佐木ss 20-30 GCB 外部点検		変更	
0932768	九州	2026/10/02 08:00	2026/10/02 18:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線1L (2026/06 運開)/木佐木ss 20-30 [加圧停止]	木佐木ss 20-33(33E) LS 外部点検		変更	
0932002	九州	2026/10/02 09:00	2026/10/02 18:00	単日	古賀ss	古賀ss 220kV2号母線/古賀ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/古賀ss 220kV2号 主要変圧器/古賀ss 20-120(#2MTr 1次) [加圧停止]	古賀ss 20-120 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(空気)を行う。 対象機器:20-120,20-122.20TB-2.20-120E.20-122E		変更	
0935646	九州	2026/10/02 09:00	2026/11/27 09:00	連続	220kV 鳥栖木佐木線1L (2026/06 運開)(鳥栖ss～#36)	220kV 鳥栖木佐木線1L (2026/06 運開)(鳥栖ss～#36)	鳥栖三池線総合更新工事(平田町地区)1L停止		変更	
0935647	九州	2026/10/02 09:00	2026/10/02 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線1L (2026/06 運開)	220kV 鳥栖木佐木線1L (2026/06 運開)	鳥栖三池線開連停止【鳥栖三池線総合更新工事(平田町地区)に伴うジャンパ開放		変更	
0934760	九州	2026/10/05 07:30	2026/10/05 18:30	単日	人吉ss	人吉ss 220kV 大平人吉線1L (2025/11 運開) [受電停止]/人吉ss 20-30 [加圧停止]	人吉SS 20-30 GCB外部点検(三菱、200-SFMT-40E、2000A)		変更	
0932305	九州	2026/10/05 08:00	2026/10/09 17:00	毎日	北九州ss	北九州ss 500kV1号母線	北九州ss500kVGIS取替工事(豊前北幹線1LGIB組立、既設GIS1号母線側Bg撤去)		変更	
0935548	九州	2026/10/05 08:00	2026/10/10 17:00	連続	220kV 高野線1L	220kV 高野線1L	高野線鉄塔防錆塗装修繕工事(1L)		変更	
0935549	九州	2026/10/05 08:00	2026/10/07 17:00	連続	220kV 高野線1L	220kV 高野線1L/220kV 霧島分岐線1L	霧島分岐線鉄塔防錆塗装修繕工事2026(1L)		変更	
0934605	九州	2026/10/05 08:30	2026/10/10 17:30	毎日	220kV 柏田線1L	220kV 柏田線1L	・5.6.9.10(4基)未契約		変更	
0934765	九州	2026/10/05 08:30	2026/10/05 17:30	単日	大平sws	大平sws 220kV 大平人吉線1L/大平sws 20-30[加圧停止]	大平ps 20-30 磁器碍管超音波探傷測定		変更	
0936274	九州	2026/10/05 08:30	2026/10/05 17:30	単日	JR九州新鳥栖ss	220kV 鳥栖JR新鳥栖線1L	JR九州新鳥栖ss 受電設備点検検査(1号側避雷器 個別検査)		変更	
0931998	九州	2026/10/05 09:00	2026/10/06 18:00	連続	脊振ss	220kV 脊振伊都線1L/脊振ss 20-50[加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振伊都線1L PCM+DZ(A)/脊振ss 220kV 脊振伊都線1L PCM+DZ(B)/伊都ss 220kV1号送電用変圧器	脊振ss 20-50 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。		変更	
0934720	九州	2026/10/05 09:00	2026/10/08 17:00	毎日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	苅田分岐線鉄塔防錆塗装修繕工事(1L)		変更	
0935576	九州	2026/10/05 09:00	2026/10/09 17:00	連続	220kV 北九州豊前線2L	220kV 北九州豊前線2L	大分幹線がいし金具他修繕工事(2L)		変更	
0935577	九州	2026/10/05 09:00	2026/10/06 17:00	毎日	220kV 北九州豊前線2L	220kV 北九州豊前線2L	大分幹線ジャンパ線ほか修繕工事(2L)		変更	
0935812	九州	2026/10/05 09:00	2026/10/07 17:00	連続	500kV 東九州幹線1L	500kV 東九州幹線1L	500kV 東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事(2026年度)1L		変更	
0931999	九州	2026/10/05 09:30	2027/06/18 17:30	連続	220kV 中央南福岡線2L (中央ss～南福岡ss)	220kV 中央南福岡線2L (中央ss～南福岡ss)/220kV 中央南福岡線2L CFD [ロック]	2号線 ・46接続所～南福岡SS 1. 3km CV1×1400mm2 高経年 ケーブル張替(超高压)		変更	
0932078	九州	2026/10/06 07:30	2026/10/06 18:30	単日	人吉ss	人吉ss 220kV 大平人吉線2L [受電停止]/人吉ss 20-40 [加圧停止]	人吉SS 20-40 GCB外部点検(三菱、200-SFMT-40E、2000A)		変更	
0934611	九州	2026/10/06 07:30	2026/10/07 18:30	連続	柏田ss	220kV 柏田線1L/柏田ss 20-50[加圧停止]	柏田ss 20-50GISユニットブッシング超音波探傷測定(線路側3本)を行う。		変更	
0932748	九州	2026/10/06 08:00	2026/10/06 14:00	単日	220kV 熊本南熊本線2L (2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線2L (2025/06 運開)/220kV 弓削分岐線2L	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事に伴うジャンパ開放(2L)		変更	
0933443	九州	2026/10/06 08:00	2026/10/09 18:00	毎日	北九州ss	北九州ss 220kV 西谷1号線/北九州ss 20-230	20-170、171、172老朽更新		変更	
0935550	九州	2026/10/06 08:00	2026/10/09 17:00	毎日	220kV 高野線1L	220kV 高野線1L	高野線鉄塔ボルト修繕工事(1L)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0934612	九州	2026/10/06 08:30	2026/10/06 17:30	単日	柏田ss	220kV 柏田線1L/柏田ss 20-50[加圧停止]	柏田ss 20-50.60GISユニットガスバルブハンドル15個に腐食が見られるため交換修繕を行う。		変更	
0934730	九州	2026/10/06 08:30	2026/10/06 17:30	単日	西谷ss	220kV 西谷門司線1L/西谷ss 20-10	西谷ss 220kV電力ケーブル(西谷門司1L) 外部点検を行う。		変更	
0934732	九州	2026/10/06 08:30	2026/10/07 17:30	連続	西谷ss	西谷ss 220kV 西谷門司線1L 43LPA[ロック]/西谷ss 220kV 西谷門司線1L 43LPB[ロック]/220kV 西谷門司線1L/西谷ss 20-10/西谷ss 220kV BP 常時監視/西谷ss 220kV LB 常時監視	西谷ss 20-10 GIS 外部点検(12年点検)を行う。		変更	
0934733	九州	2026/10/06 08:30	2026/10/06 17:30	単日	西谷ss	220kV 西谷門司線1L/西谷ss 20-10/西谷ss 220kV1号母線	西谷ss 20-10 GIS 外部点検(12年点検)を行う。		変更	
0934767	九州	2026/10/06 08:30	2026/10/06 17:30	単日	大平sws	大平sws 220kV 大平人吉線2L/大平sws 20-40[加圧停止]	大平ps 20-40 磁器碍管超音波探傷測定		変更	
0936275	九州	2026/10/06 08:30	2026/10/06 17:30	単日	JR九州新鳥栖ss	220kV 鳥栖JR新鳥栖線2L	JR九州新鳥栖ss 受電設備定期検査(2号側避雷器 個別検査)		変更	
0932650	九州	2026/10/06 09:00	2026/10/08 17:00	連続	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	2026年度北九州・大分エリア防錆塗装修繕工事(2026年度実施分、大分幹線(北線))		変更	
0934731	九州	2026/10/06 09:00	2026/10/06 17:00	単日	西谷ss	220kV 西谷門司線1L/西谷ss 20-10	西谷ss 20-13 LPD 簡易点検を行う。		変更	
0934764	九州	2026/10/07 07:30	2026/10/07 18:30	単日	大平sws	大平sws 220kV 大平人吉線1L [受電停止]/大平sws 20-30 [加圧停止]	大平SWS 20-30GCB外部点検		変更	
0936684	九州	2026/10/07 08:10	2026/11/19 17:50	連続	諫早ss	諫早ss 220kV2号母線/諫早ss 20T-10	諫早ss220kV2号母線耐震・耐塩化工事(母線支持碍子取替)		新規	
0934734	九州	2026/10/07 08:30	2026/10/07 17:30	単日	西谷ss	220kV 西谷門司線1L/西谷ss 20-10/西谷ss 220kV2号母線	西谷ss 20-10 GIS 外部点検(12年点検)を行う。		変更	
0934756	九州	2026/10/07 08:30	2026/10/07 17:30	単日	人吉ss	人吉ss 220kV 大平人吉線1L/人吉ss 20-30[加圧停止]	人吉ss 20-30 磁器碍管超音波探傷測定		変更	
0931996	九州	2026/10/07 09:00	2026/10/07 18:00	単日	脊振ss	220kV 脊振伊都線2L/脊振ss 20-60[加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振伊都線2L PCM+DZ(A)/脊振ss 220kV 脊振伊都線2L PCM+DZ(B)/伊都ss 220kV2号送電用変圧器	脊振ss 20-60 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。		変更	
0932219	九州	2026/10/07 09:00	2026/10/07 17:00	単日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	220㎸西谷門司線1L,2Lｼﾞｬﾝﾊﾞ開閉(220㎸西谷門司線・33作業時) ・ｼﾞｬﾝﾊﾞ開放…2L,2回、1L,1回 ・ｼﾞｬﾝﾊﾞ接続…2L,2回、1L,1回		変更	
0932230	九州	2026/10/07 09:00	2026/10/07 17:00	単日	西谷ss	西谷ss 220kV 西谷2号線 PCM+DZ(A)/北九州ss 220kV 西谷2号線 43CA[ロック]/北九州ss 220kV 西谷2号線 43CB[ロック]/220kV 西谷2号線/西谷ss 20-40/西谷ss 220kV 西谷2号線 PCM+DZ(B)/西谷ss 220kV[1-2] BP盤/西谷ss 西谷ss 220kVBP一括BOX[ロック]	220kV母線保護装置、ローカルバックアップ装置、母線分離盤の取替工事を実施する。		変更	
0934766	九州	2026/10/08 07:30	2026/10/08 18:30	単日	大平sws	大平sws 220kV 大平人吉線2L [受電停止]/大平sws 20-40 [加圧停止]	大平SWS 20-40GCB外部点検		変更	
0932565	九州	2026/10/08 08:00	2026/10/08 18:00	単日	南九州ss	220kV 高野線1L/南九州ss 20-30[加圧停止]	南九州ss 20-30 220KVガスしや断器外部点検を行う。		変更	
0935775	九州	2026/10/08 08:00	2026/10/09 18:00	連続	東九州ss	東九州ss 50-50[加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L 43CA[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L 43CB[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L 43RCA[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L 43RCB[ロック]/東九州ss 500kV[1-2] BP(A)43JK[ロック]/東九州ss 500kV[1-2] BP(B)43JK[ロック]/東九州ss 東九州ss 東九州幹線1号(B)PCM 常時監視43JK [ロック]/東九州ss 東九州ss 東九州幹線1号(A)PCM 常時監視43JK [ロック]/東九州ss 東九州ss 東九州幹線1号(後備)DZ 常時監視43JK [ロック]/東九州ss 東九州ss 500kV母線保護盤B(2)BP 50-50トリップロック赤T・T外し [ロック]/東九州ss 東九州ss 500kV母線保護盤A(2)BP 50-50トリップロック赤T・T外し [ロック]	東九州ss 50-50 GIS外部点検(6年点検)		変更	
0934758	九州	2026/10/08 08:30	2026/10/08 17:30	単日	人吉ss	人吉ss 220kV 大平人吉線2L/人吉ss 20-40[加圧停止]	人吉ss 20-40 磁器碍管超音波探傷測定		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932228	九州	2026/10/08 09:00	2026/10/08 17:00	単日	西谷ss	220kV 西谷門司線1L/西谷ss 220kV 西谷門司線1L PCM+DZ(A)/西谷ss 220kV 西谷門司線1L PCM+DZ(B)/西谷ss 20-10/西谷ss 220kV[1-2] BP盤/西谷ss 西谷ss 220kVBP一括BOX	220kV母線保護装置、ローカルバックアップ装置、母線分離盤の取替工事を実施する。		変更	
0934714	九州	2026/10/08 09:00	2026/10/08 17:00	単日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	220kV西谷門司線1L2Lジャンパ開閉(220kV谷門司線・33作業時) ・ジャンパ開放…2L、2回、1L、2回 ・ジャンパ接続…2L、2回、1L、2回		変更	
0935575	九州	2026/10/08 09:00	2026/10/09 17:00	毎日	220kV 北九州豊前線2L	220kV 北九州豊前線2L	大分幹線地線金具他修繕工事(2L)		変更	
0935751	九州	2026/10/08 09:00	2026/10/15 17:00	連続	豊前ss	500kV 東九州幹線1L/豊前ss 50-50/豊前ss 500kV 東九州幹線1L PCM+DZ(A)/豊前ss 500kV 東九州幹線1L PCM+DZ(B)/豊前ss 500kV[1-2] PD自動切替盤/豊前ss 500kV[1-2] BP+LB(A)/豊前ss SSC起動装置(A)/豊前ss SSC起動装置(B)/豊前ss 自動オシロ送信盤/豊前ss PQVF測定装置/豊前ss 500kV 脱調分離盤/豊前ss 500kV トランスユーザー盤(1)/豊前ss 500kV 母線保護装置(B) (50-50)/豊前ss 500kV 母線保護一括CT集合箱 (50-50)	豊前変電所 監視制御装置ほか取替工事(500kV東九州幹線1L)		変更	
0935813	九州	2026/10/08 09:00	2026/10/09 17:00	連続	500kV 東九州幹線1L	500kV 東九州幹線1L	500kV東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事(1L)【連続】		変更	
0932232	九州	2026/10/09 09:00	2026/10/09 17:00	単日	西谷ss	西谷ss 220kV 西谷3号線 PCM(A)/北九州ss 220kV 西谷3号線 43CA[ロック]/北九州ss 220kV 西谷3号線 43CB[ロック]/220kV 西谷3号線/西谷ss 20-70/西谷ss 220kV 西谷3号線 PCM(B)/西谷ss 220kV[1-2] BP盤/西谷ss 西谷ss 220kVBP一括BOX	220kV母線保護装置、ローカルバックアップ装置、母線分離盤の取替工事を実施する。		変更	
0932233	九州	2026/10/13 09:00	2026/10/13 17:00	単日	西谷ss	220kV 西谷門司線2L/西谷ss 220kV 西谷門司線2L PCM+DZ(A)/西谷ss 220kV 西谷門司線2L PCM+DZ(B)/西谷ss 20-20/西谷ss 220kV[1-2] BP盤/西谷ss 西谷ss 220kVBP一括BOX	220kV母線保護装置、ローカルバックアップ装置、母線分離盤の取替工事を実施する。		変更	
0934718	九州	2026/10/13 09:00	2026/10/13 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	220kV西谷門司線1L2Lジャンパ開閉(220kV谷門司線・33作業時) ・ジャンパ開放…2L、2回、1L、2回 ・ジャンパ接続…2L、2回、1L、2回		変更	
0936701	九州	2026/10/13 09:00	2026/12/23 14:00	連続	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		新規	
0932229	九州	2026/10/14 09:00	2026/10/14 17:00	単日	西谷ss	西谷ss 220kV 西谷1号線 PCM+DZ(A)/北九州ss 220kV 西谷1号線 43CA[ロック]/北九州ss 220kV 西谷1号線 43CB[ロック]/220kV 西谷1号線/西谷ss 20-30/西谷ss 220kV 西谷1号線 PCM+DZ(B)/西谷ss 220kV[1-2] BP盤/西谷ss 西谷ss 220kVBP一括BOX	220kV母線保護装置、ローカルバックアップ装置、母線分離盤の取替工事を実施する。		変更	
0934711	九州	2026/10/14 09:00	2026/12/22 17:00	連続	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	220kV西谷門司線一部変更工事(葛原地区)		変更	
0934872	九州	2026/10/15 07:00	2026/10/20 17:00	毎日	220kV 熊本日田線1L (2025/12 連開)	220kV 熊本日田線1L (2025/12 連開)	熊本日田線一部変更工事(国武・平野地区)のうち・103基礎工事(1L)【予防停止】		変更	
0934741	九州	2026/10/15 08:30	2026/10/15 17:30	単日	苅田ss	苅田ss 20-20/苅田ss 220kV 西谷門司2号線	苅田ss 20-23・E LS 外部点検を行う。		変更	
0934715	九州	2026/10/15 09:00	2026/10/16 17:00	毎日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	苅田分岐線地線金具他修繕工事(2L)		変更	
0932008	九州	2026/10/15 09:10	2026/10/15 17:50	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV1号母線	西福岡ss 20-110 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。		変更	
0934726	九州	2026/10/16 09:00	2026/10/16 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	苅田分岐線ジャンパ線金具修繕工事(2L)		変更	
0934728	九州	2026/10/16 09:00	2026/10/16 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	西谷門司線鉄塔防錆塗装修繕工事(2L)		変更	
0932009	九州	2026/10/16 09:10	2026/10/16 17:50	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV2号母線	西福岡ss 20-110 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。		変更	
0935814	九州	2026/10/18 09:00	2026/10/20 17:00	連続	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事(2026年度)2L		変更	
0932766	九州	2026/10/19 08:00	2026/10/19 18:00	単日	久留米ss	久留米ss 220kV 鳥栖木佐木線1L (2026/06 連開)/久留米ss 20-30[加圧停止]/久留米ss 220kV 鳥栖木佐木線1L PCM+DZ(A)/久留米ss 220kV 鳥栖木佐木線1L PCM+DZ(B)	久留米ss 20-30 GISユニット 外部点検【母線PT、線路PT含む】(12年点検)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0935552	九州	2026/10/19 08:00	2026/10/24 17:00	連続	220kV 高野線2L	220kV 高野線2L	高野線鉄塔防錆塗装修繕工事(2L)		変更	
0935553	九州	2026/10/19 08:00	2026/10/21 17:00	連続	220kV 高野線2L	220kV 高野線2L/220kV 霧島分岐線2L	霧島分岐線鉄塔防錆塗装修繕工事2026(2L)		変更	
0935752	九州	2026/10/19 08:00	2026/10/20 18:00	連続	豊前ss	豊前ss 500kV 東九州幹線2L/豊前ss 50-60/豊前ss 500kV東九州幹線2L PCM+DZ(A)/豊前ss 500kV東九州幹線2L PCM+DZ(B)/豊前ss 500kV BP+LB(A) 常時監視/豊前ss 500kV BP+LB(B) 常時監視	豊前ss 50-60 GIS 外部点検(6年点検)		変更	
0934606	九州	2026/10/19 08:30	2026/10/24 17:30	毎日	220kV 柏田線2L	220kV 柏田線2L	・・5.6.9.10(4基)未契約		変更	
0934613	九州	2026/10/19 08:30	2026/10/20 17:30	連続	柏田ss	220kV 柏田線2L/柏田ss 20-60[加圧停止]	柏田ss 20-60GISユニットブッシング超音波探傷測定(線路側3本)を行う。		変更	
0932030	九州	2026/10/19 09:00	2026/10/21 12:00	連続	熊本ss	220kV 熊本日田線1L/熊本ss 20-10[加圧停止]	熊本ss 増強工事のうち220kV母線保護装置取替(熊本日田1L切替)		変更	
0932632	九州	2026/10/19 09:00	2026/10/19 12:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	鳥栖三池線間連停止【鳥栖三池線大規模改修工事(平田町地区)に伴うジャンパ開放(2026年度)】		変更	
0932634	九州	2026/10/19 09:00	2026/11/24 17:00	連続	220kV 鳥栖木佐木線1L(鳥栖ss～#36)	220kV 鳥栖木佐木線1L(鳥栖ss～#36)	鳥栖三池線総合更新工事(平田町地区)1L停止		変更	
0934728	九州	2026/10/19 09:00	2026/10/23 17:00	毎日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	西谷門司線鉄塔防錆塗装修繕工事(2L)		変更	
0934853	九州	2026/10/19 09:00	2026/10/21 12:00	連続	熊本ss	220kV 熊本日田線1L(2025/12 運開)/熊本ss 20-10[加圧停止]	熊本ss 増強工事のうち220kV母線保護装置取替(熊本日田1L切替)		変更	
0935571	九州	2026/10/19 09:00	2026/10/24 17:00	連続	220kV 槻田線2L	220kV 槻田線2L	槻田線鉄塔防錆塗装修繕工事(2L)		変更	
0935645	九州	2026/10/19 09:00	2026/10/19 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線1L(2026/06 運開)[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線1L(2026/06 運開)[予防停止]	管内送電線路営業除去業務(2026年度)		変更	
0933575	九州	2026/10/20 08:00	2026/10/22 17:00	連続	500kV 南九州幹線1L(2025/10 運開)	500kV 南九州幹線1L(2025/10 運開)	南九州幹線がよいし改修工事(2期)1L		変更	
0935554	九州	2026/10/20 08:00	2026/10/23 17:00	毎日	220kV 高野線2L	220kV 高野線2L	高野線鉄塔ボルト修繕工事(2L)		変更	
0935678	九州	2026/10/20 08:00	2026/10/20 18:00	単日	霧島ss	霧島ss 220kV 高野線2L [受電停止]/霧島ss 220kV 高野線2L CR-A/霧島ss 220kV 高野線2L CR-B/霧島ss 20-40[加圧停止]/霧島ss 220kV 高野線2L 43Jk [ロック]	霧島ss 20-40 220KVガスしゃ断器外部点検を行う。		変更	
0936418	九州	2026/10/20 08:00	2026/10/20 18:00	単日	霧島ss	霧島ss 220kV 高野線2L [受電停止]/霧島ss 220kV 高野線2L RC-A/霧島ss 220kV 高野線2L RC-B/霧島ss 20-40 [加圧停止]	霧島ss20-40三菱製240kVGCB試験用プラグ不具合修繕		変更	
0932650	九州	2026/10/20 09:00	2026/10/22 17:00	連続	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	2026年度北九州・大分エリア防錆塗装修繕工事(2026年度実施分、大分幹線(北線))		変更	
0932742	九州	2026/10/20 09:00	2026/10/22 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線2L(2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線2L(2025/06 運開)	【2026】2025年度発注 鉄塔防錆塗装修繕工事【2025-2026】220kV熊本南熊本線2L		変更	
0932743	九州	2026/10/20 09:00	2026/10/20 17:00	単日	220kV 熊本南熊本線2L(2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線2L(2025/06 運開)	【2026】管内送電設備(熊本地区)のうがいの金具修繕工事220kV熊本南熊本線2L		変更	
0932750	九州	2026/10/20 09:00	2026/10/22 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線2L(2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線2L(2025/06 運開)	2026年度鉄塔防錆塗装修繕工事【2026-2027】220kV熊本南熊本線2L		変更	
0935551	九州	2026/10/21 08:00	2026/10/21 17:00	単日	220kV 高野線2L	220kV 高野線2L/220kV 霧島分岐線2L	霧島分岐線電線精密点検(2L)【直営技術作業】		変更	
0935778	九州	2026/10/21 08:00	2026/10/23 18:00	連続	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線2L/東九州ss 50-60[加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43CA[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43CB[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43RCA[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43RCB[ロック]/東九州ss 500kV[1-2] BP(A)43JK[ロック]/東九州ss 500kV[1-2] BP(B)43JK[ロック]/東九州ss 東九州ss 東九州幹線2号(B)PCM 常時監視43JK [ロック]/東九州ss 東九州ss 東九州幹線2号(A)PCM 常時監視43JK [ロック]/東九州ss 東九州ss 東九州幹線2号(後備)DZ 常時監視43JK [ロック]/東九州ss 東九州ss 500kV母線保護盤A(2)BP 50-60トリップロック赤T・T外し [ロック]/東九州ss 東九州ss 500kV母線保護盤B(2)BP 50-60トリップロック赤T・T外し [ロック]	東九州ss 50-60 550KVガス絶縁開閉装置外部点検		変更	
0934614	九州	2026/10/21 08:30	2026/10/21 17:30	単日	柏田ss	220kV 柏田線2L/柏田ss 20-60[加圧停止]	柏田ss 20-50.60GISユニットガスバルブハンドル15個に腐食が見られるため交換修繕を行う。		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0935753	九州	2026/10/21 09:00	2026/10/28 17:00	連続	豊前ss	500kV 東九州幹線2L/豊前ss 50-60/豊前ss 500kV 東九州幹線2L PCM+DZ(A)/豊前ss 500kV 東九州幹線2L PCM+DZ(B)/豊前ss 500kV[1-2] PD自動切替盤/豊前ss 500kV[1-2] BP+LB(A)/豊前ss SSC起動装置(A)/豊前ss SSC起動装置(B)/豊前ss 500kV脱調分離盤/豊前ss 自動オシロ送信盤/豊前ss PQVF測定装置/豊前ss 500kVトランスジューサー盤(1)/豊前ss 500kV母線保護装置(B) (50-60)/豊前ss 500kV 母線保護一括CT集合箱 (50-60)	豊前変電所 監視制御装置ほか代替工事(500kV東九州幹線2L)		変更	
0935815	九州	2026/10/21 09:00	2026/10/22 17:00	連続	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	500kV東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事(2L)【連続】		変更	
0936773	九州	2026/10/21 09:00	2026/10/30 17:00	連続	220kV 北九州豊前線1L	220kV 北九州豊前線1L	大分幹線がいし金具他修繕工事(1L)		新規	
0932011	九州	2026/10/21 09:10	2026/10/21 17:50	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV3号母線	西福岡ss 20-130 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。		変更	
0932036	九州	2026/10/21 12:00	2026/10/23 17:00	連続	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本日田線2L/熊本ss 20-20 [加圧停止]	熊本ss 増強工事のうち220kV母線保護装置取替(熊本日田線2L切替)		変更	
0934861	九州	2026/10/21 12:00	2026/10/23 17:00	連続	熊本ss	220kV 熊本日田線2L(2025/12 運開)/熊本ss 20-20 [加圧停止]	熊本ss 増強工事のうち220kV母線保護装置取替(熊本日田線2L切替)		変更	
0936679	九州	2026/10/22 08:00	2026/11/19 18:00	連続	諫早ss	220kV 諫早分岐線1L/220kV 長崎幹線1L/諫早ss 20-50/諫早ss 220kV2号母線/諫早ss 220kV3号 主要変圧器/諫早ss 6-130/諫早ss 20-130/諫早ss 20T-10	諫早ss220kV2号母線耐震・耐塩化工事(母線支持碍子取替)		新規	
0932209	九州	2026/10/22 09:00	2026/10/29 17:00	連続	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	220kV西谷門司線一部変更工事(葛原地区)		変更	
0932226	九州	2026/10/22 09:00	2026/10/22 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	220㎸:西谷門司線1L,2Lジャンパ開閉(220㎸:西谷門司線・33作業時) ・ジャンパ開放…2L, 2回、1L, 1回 ・ジャンパ接続…2L, 2回、1L, 1回		変更	
0935573	九州	2026/10/22 09:00	2026/10/23 17:00	毎日	220kV 北九州豊前線1L	220kV 北九州豊前線1L	大分幹線ジャンパ線ほか修繕工事(1L)		変更	
0932010	九州	2026/10/22 09:10	2026/10/22 17:50	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV2号母線	西福岡ss 20-130 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。		変更	
0932749	九州	2026/10/23 08:00	2026/10/23 14:00	単日	220kV 熊本南熊本線2L(2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線2L(2025/06 運開)/220kV 弓削分岐線2L	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事に伴うジャンパ接続(2L)		変更	
0935780	九州	2026/10/23 08:00	2026/10/23 18:00	単日	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線2L/東九州ss 50-60[加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43CA[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43CB[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43RCA[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43RCB[ロック]/東九州ss 500kV2号母線/東九州ss 500kV[1-2] BP(A)43JK[ロック]/東九州ss 500kV[1-2] BP(B)43JK[ロック]/東九州ss 50T-10[加圧停止]/東九州ss 東九州幹線2号(B)PCM 常時監視43JK [ロック]/東九州ss 東九州幹線2号(A)PCM 常時監視43JK [ロック]/東九州ss 東九州幹線2号(後備)DZ 常時監視43JK [ロック]/東九州ss 500kV母線保護盤A(2)BP 50-60トリップロック赤・T外し [ロック]/東九州ss 500kV母線保護盤B(2)BP 50-60トリップロック赤・T外し [ロック]	東九州ss 50-60 550KVガス絶縁開閉装置外部点検		変更	
0936726	九州	2026/10/23 13:00	2026/10/23 16:00	単日	北九州ss	220kV 北九州豊前線1L	北九州ss220kV碼洗ノズル目詰まり(20-190~193間)修繕		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932772	九州	2026/10/26 08:00	2026/10/26 18:00	単日	武雄ss	220kV 武雄線1L/武雄ss 20-30[加圧停止]/武雄ss 220kV 武雄線1L PCM+DZ(A)/武雄ss 220kV 武雄線1L PCM+DZ(B)/西九州ss 220kV 武雄線1L 43CA[ロック]/西九州ss 220kV 武雄線1L 43CB[ロック]/武雄ss 220kV[1-2] BP盤/武雄ss 220kV[1-2] LB盤/武雄ss 220・110kV自動オシロ送信盤(1) 220kV武雄線1L CTプラグ [ロック]/武雄ss 220kVVTM一次変換器盤 220kV西九州保武雄線1L CTプラグ [ロック]/武雄ss 電気所サーバ入出力架1-2 220kV武雄線1L CT2次プラグ [ロック]	武雄ss 220kV母線保護装置他取替工事(西九州武雄線1L切替1)		変更	
0934761	九州	2026/10/26 08:10	2026/10/26 14:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV1号母線/人吉ss 20T-10[加圧停止]	人吉ss220kV母線保護装置取替工事のうち(220kV1号母線関係切替)		変更	
0936291	九州	2026/10/26 08:30	2026/10/26 17:30	単日	北九州ss	220kV 上津役線1L/北九州ss 20-70	北九州ss 220kV上津役線1L 屋外鉄構(P16~P17) 外部点検を行う。		変更	
0932292	九州	2026/10/26 09:00	2026/10/30 17:00	連続	500kV 南九州幹線1L (2025/10 運開)	500kV 南九州幹線1L (2025/10 運開)	南九州幹線がいし金具他修繕工事(1L)		変更	
0934873	九州	2026/10/26 09:00	2026/12/23 17:00	連続	220kV 熊本日田線1L (2025/12 運開)	220kV 熊本日田線1L (2025/12 運開)	熊本日田線一部変更工事(国武・平野地区)のうち架線工事(1L)既・102~・105		変更	
0936696	九州	2026/10/26 09:00	2026/11/02 17:00	連続	北九州ss	220kV 上津役線1L	ドローン巡視で引留鉄構上部の著しい発錆を発見したため、塗装を行う。		新規	
0934763	九州	2026/10/26 13:10	2026/10/26 17:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV2号母線/人吉ss 20T-10[加圧停止]	人吉ss220kV母線保護装置取替工事のうち(220kV2号母線関係切替)		変更	
0932774	九州	2026/10/27 08:00	2026/10/27 18:00	単日	武雄ss	220kV 武雄線2L/武雄ss 20-40[加圧停止]/武雄ss 220kV 武雄線2L PCM+DZ(A)/武雄ss 220kV 武雄線2L PCM+DZ(B)/西九州ss 220kV 武雄線2L 43CA[ロック]/西九州ss 220kV 武雄線2L 43CB[ロック]/武雄ss 220kV[1-2] BP盤/武雄ss 220kV[1-2] LB盤/武雄ss 220・110kV自動オシロ送信盤(1) 220kV武雄線2L CTプラグ [ロック]/武雄ss 220kVVTM一次変換器盤 220kV西九州保武雄線2L CTプラグ /武雄ss 電気所サーバ入出力架1-3 220kV武雄線2L CT2次プラグ [ロック]	武雄ss 220kV母線保護装置他取替工事(西九州武雄線2L切替1)		変更	
0933575	九州	2026/10/27 08:00	2026/10/30 17:00	連続	500kV 南九州幹線1L (2025/10 運開)	500kV 南九州幹線1L (2025/10 運開)	南九州幹線がいし改修工事(2期) 1L		変更	
0936436	九州	2026/10/27 08:00	2026/10/29 17:00	連続	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L/220kV 大隅線1L(高野SWS~大隅ss)	大隅線・109, 110, 111 3基		変更	
0936437	九州	2026/10/27 08:00	2026/10/29 17:00	連続	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L/220kV 大隅線1L(高野SWS~大隅ss)	大隅線・49, 51(全鹿兒島エリア)・62, 63(22工区)		変更	
0934757	九州	2026/10/27 08:30	2026/10/28 17:30	連続	人吉ss	人吉ss 220kV 大平人吉線1L [受電停止]/人吉ss 20-30[加圧停止]/人吉ss 220kV 大平人吉線1L CR-A/人吉ss 220kV 大平人吉線1L CR-B/人吉ss 電気所サーバ(20-30関係) [ロック]/人吉ss 自動オシロ送信盤(20-30関係) [ロック]	人吉ss220kV母線保護装置取替工事のうち(20-30関係切替)		変更	
0932737	九州	2026/10/28 08:30	2026/10/28 14:00	単日	220kV 熊本南熊本線1L (2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線1L (2025/06 運開)/220kV 弓削分岐線1L	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事に伴うジャンパ開放(1L)		変更	
0934759	九州	2026/10/29 08:30	2026/10/30 17:30	連続	人吉ss	人吉ss 220kV 大平人吉線2L [受電停止]/人吉ss 20-40[加圧停止]/人吉ss 220kV 大平人吉線2L CR-A/人吉ss 220kV 大平人吉線2L CR-B/人吉ss 電気所サーバ(20-40関係) [ロック]/人吉ss 自動オシロ送信盤(20-40関係)	人吉ss220kV母線保護装置取替工事のうち(20-40関係切替)		変更	
0932227	九州	2026/10/29 09:00	2026/10/29 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	220㎸西谷門司線1L,2L;ジャンパ開閉(220㎸西谷門司線・33作業時)・ジャンパ開放…2L,2回、1L,1回・ジャンパ接続…2L,2回、1L,1回		変更	
0933444	九州	2026/11/04 08:00	2026/11/06 18:00	毎日	北九州ss	北九州ss 220kV 西谷1号線/北九州ss 20-230	20-170、171、172老朽更新		変更	
0932642	九州	2026/11/04 09:00	2026/11/07 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	管内送電線電線付属品修繕工事(佐賀地区)ダンパ:木佐木線1号線【2026年度】		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932643	九州	2026/11/04 09:00	2026/11/07 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	管内送電線電線付属品修繕工事(佐賀地区)スぺーサ:木佐木線1号線【2026年度】		変更	
0932649	九州	2026/11/04 09:00	2026/11/05 17:00	毎日	220kV 北九州豊前線2L	220kV 北九州豊前線2L	大分幹線地線金具他修繕工事(2L)		変更	
0932736	九州	2026/11/04 09:00	2026/11/06 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線1L (2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線1L (2025/06 運開)	【2026】2025年度発注 鉄塔防錆塗装修繕工事【2025-2026】220kV熊本南熊本線1L		変更	
0932741	九州	2026/11/04 09:00	2026/11/06 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線1L (2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線1L (2025/06 運開)	2026年度鉄塔防錆塗装修繕工事【2026-2027】 220kV熊本南熊本線1L		変更	
0935567	九州	2026/11/04 09:00	2026/11/06 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	管内送電線鉄塔防錆修繕工事(佐賀地区)木佐木線1号線		変更	
0935570	九州	2026/11/04 09:00	2026/11/09 17:00	連続	220kV 槻田線1L	220kV 槻田線1L	槻田線鉄塔防錆塗装修繕工事(1L)		変更	
0935576	九州	2026/11/04 09:00	2026/11/06 17:00	連続	220kV 北九州豊前線2L	220kV 北九州豊前線2L	大分幹線がいし金具他修繕工事(2L)		変更	
0936274	九州	2026/11/05 08:30	2026/11/05 17:30	単日	JR九州新鳥栖ss	220kV 鳥栖JR新鳥栖線1L	JR九州新鳥栖ss 受電設備点検検査(1号側避雷器 個別検査)		変更	
0935759	九州	2026/11/05 09:00	2026/11/12 17:00	連続	豊前ss	220kV 北九州豊前線2L/豊前ss 20-20 O/豊前ss 220kV 北九州豊前線2L PCM+DZ(A)/豊前ss 220kV 北九州豊前線2L PCM+DZ(B)/豊前ss 220kV[1-2] PD自動切替盤/豊前ss 220kV1-2母線 BP+LB盤 (220kV北九州豊前2L)/豊前ss SSC遮断装置(A)/豊前ss SS C遮断装置(B)/豊前ss SSC起動装置(A)/豊前ss SSC起動装置(B)/豊前ss 220kV トランスジョーサー盤(2)/豊前ss 220kV オシロ送信盤	豊前変電所 監視制御装置ほか取替工事(220kV北九州豊前線2L)		変更	
0935677	九州	2026/11/06 08:00	2026/11/06 18:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 熊本南熊本線1L/南熊本ss 20-50[加圧停止]	南熊本SS 20-53磁気近接SW修繕		変更	
0935774	九州	2026/11/06 08:00	2026/11/06 18:00	単日	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本南熊本線1L [受電停止]/熊本ss 20-50[加圧停止]	熊本ss 20-50 220KVガスしゃ断器外部点検を行う。		変更	
0932738	九州	2026/11/06 08:30	2026/11/06 14:00	単日	220kV 熊本南熊本線1L (2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線1L (2025/06 運開)/220kV 弓削分岐線1L	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事に伴うジャンパ接続(1L)		変更	
0935838	九州	2026/11/06 08:30	2026/11/06 17:30	単日	北九州ss	220kV 北九州豊前線2L/北九州ss 20-20O	北九州ss 20-203・E LS 外部点検		変更	
0936275	九州	2026/11/06 08:30	2026/11/06 17:30	単日	JR九州新鳥栖ss	220kV 鳥栖JR新鳥栖線2L	JR九州新鳥栖ss 受電設備定期検査(2号側避雷器 個別検査)		変更	
0935569	九州	2026/11/06 09:00	2026/11/06 17:00	単日	220kV 槻田線1L	220kV 槻田線1L	槻田線地線金具他修繕工事(1L)		変更	
0932217	九州	2026/11/07 09:00	2026/11/07 17:00	単日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	架空地線金具修繕他 苅田分岐線・3他 計3基		変更	
0932221	九州	2026/11/07 09:00	2026/11/08 17:00	毎日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	架空地線金具修繕他 苅田分岐線・3他 計3基		変更	
0932795	九州	2026/11/09 08:00	2026/11/10 18:00	連続	北佐賀ss	220kV 北佐賀木佐木線1L/北佐賀ss 20-50[加圧停止]/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線1L PCM(A)/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線1L PCM(B)/北佐賀ss 220kV母線保護盤 常時監視 [ロック]/北佐賀ss 220kV母線保護盤 自動点検 [ロック]	北佐賀ss 20-50 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(空気)		変更	
0932796	九州	2026/11/09 08:00	2026/11/10 18:00	連続	北佐賀ss	220kV 北佐賀木佐木線1L/北佐賀ss 20-50[加圧停止]/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線1L PCM(A)/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線1L PCM(B)/北佐賀ss 220kV母線保護盤 常時監視 [ロック]/北佐賀ss 220kV母線保護盤 自動点検 [ロック]	北佐賀ss 20-50ユニット 220KVガス絶縁周装置外部点検		変更	
0932288	九州	2026/11/09 09:00	2026/11/11 17:00	連続	500kV 東九州幹線1L	500kV 東九州幹線1L	500kV東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事(1L)【連続】		変更	
0932489	九州	2026/11/09 09:00	2026/11/11 12:00	連続	熊本ss	220kV 熊本南熊本線1L (2026/06 運開)[受電停止]/熊本ss 20-50 [加圧停止]	熊本ss 増強工事のうち220kV母線保護装置取替(南熊本線1L切替)		変更	
0932642	九州	2026/11/09 09:00	2026/11/11 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	管内送電線電線付属品修繕工事(佐賀地区)ダンパ:木佐木線1号線【2026年度】		変更	
0932643	九州	2026/11/09 09:00	2026/11/11 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	管内送電線電線付属品修繕工事(佐賀地区)スぺーサ:木佐木線1号線【2026年度】		変更	
0934869	九州	2026/11/09 09:00	2026/11/09 17:00	単日	220kV 東九州分岐線2L	220kV 東九州分岐線2L/220kV 海崎線2L	220kV海崎線外電線付属品修繕の実施(東九州分岐線2L)		変更	
0934871	九州	2026/11/09 09:00	2026/11/13 17:00	連続	220kV 海崎線2L	220kV 海崎線2L	220kV 海崎線外電線付属品修繕工事(海崎線2L)		変更	
0935567	九州	2026/11/09 09:00	2026/11/11 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	管内送電線鉄塔防錆修繕工事(佐賀地区)木佐木線1号線		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0934890	九州	2026/11/10 07:00	2026/11/10 19:00	単日	日田ss	220kV 熊本日田線1L(2025/12 運開)/日田ss 220kV 熊本日田線1L(2025/12 運開) 43CA[ロック]/日田ss 220kV 熊本日田線1L(2025/12 運開) 43CB[ロック]/日田ss 220kV 熊本日田線1L(2025/12 運開) 43RCA[ロック]/日田ss 220kV 熊本日田線1L(2025/12 運開) 43RCB[ロック]/日田ss 20-10[加圧停止]/日田ss 220kV母線保護盤(2)トリップ回路監視 [ロック]/日田ss 220kVローカルバックアップ トリップ回路監視 [ロック]	日田ss 20-10 GIS外部点検(6年点検)		変更	
0932081	九州	2026/11/10 07:10	2026/11/10 18:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV1号母線/人吉ss 20-11 [切]/人吉ss 20-12 [切]	人吉SS 220kV 1号母線3区間(旧一ツ瀬線:20P10~20P18)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)		変更	
0932089	九州	2026/11/10 07:10	2026/11/10 18:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV1号母線/人吉ss 20-11 [切]/人吉ss 20-12 [切]	人吉SS 旧一ツ瀬線(20P10~20P11)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)		変更	
0933445	九州	2026/11/10 08:00	2026/11/11 18:00	毎日	北九州ss	北九州ss 220kV 西谷1号線/北九州ss 20-230	20-170、171、172老朽更新		変更	
0935557	九州	2026/11/10 08:00	2026/11/10 17:00	単日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L	220kV南宮崎線スベアー取替(1L)【直営技術作業】		変更	
0935559	九州	2026/11/10 09:00	2026/11/12 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L	宮崎エリア防錆塗装修繕工事(1L)(220kV南宮崎線)2026年度発注分		変更	
0932082	九州	2026/11/11 07:10	2026/11/11 18:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV1号母線/人吉ss 20-11 [切]/人吉ss 20-12 [切]	人吉SS 220kV 1号母線4区間(旧一ツ瀬線:20P11~20P19)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)		変更	
0932091	九州	2026/11/11 07:10	2026/11/11 18:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV1号母線/人吉ss 20-11 [切]/人吉ss 20-12 [切]	人吉SS 220kV 人吉一ツ瀬線(20P18~20P19)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)		変更	
0932490	九州	2026/11/11 12:00	2026/11/13 17:00	連続	熊本ss	220kV 熊本南熊本線2L(2026/06 運開)[受電停止]/熊本ss 20-60[加圧停止]	熊本ss 増強工事のうち220kV母線保護装置取替(南熊本線2L切替)		変更	
0932093	九州	2026/11/12 07:10	2026/11/12 18:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV2号母線/人吉ss 20-11 [切]/人吉ss 20-12 [切]	人吉SS 220kV 2号母線3区間(旧一ツ瀬線側:20P10~20P18)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)		変更	
0932096	九州	2026/11/12 07:10	2026/11/12 18:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV2号母線/人吉ss 20-11 [切]/人吉ss 20-12 [切]	人吉SS 旧一ツ瀬線(20P10~20P11)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)		変更	
0932290	九州	2026/11/12 09:00	2026/11/14 17:00	連続	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	500kV東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事(2L)【連続】		変更	
0932094	九州	2026/11/13 07:10	2026/11/13 18:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV2号母線/人吉ss 20-11 [切]/人吉ss 20-12 [切]	人吉SS 220kV 2号母線4区間(旧一ツ瀬線:20P11~20P19)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)		変更	
0932098	九州	2026/11/13 07:10	2026/11/13 18:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV2号母線/人吉ss 20-11 [切]/人吉ss 20-12 [切]	人吉SS 220kV 人吉一ツ瀬線(20P18~20P19)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)		変更	
0932301	九州	2026/11/13 13:00	2026/11/13 17:00	単日	北九州ss	北九州ss 500kV 豊前北幹線1L/北九州ss 500kV 北九州幹線1L/脊振ss 500kV 北九州幹線1L 143KHB[仮保護]/北九州ss 500kV1号母線	北九州ss500kVGIS取替工事(500kV1号母線及び豊前北幹線1L 試充電)		変更	
0932084	九州	2026/11/16 07:10	2026/11/16 18:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV1号母線/人吉ss 20T-10 [加圧停止]	人吉SS G6架空地線(20P15側)+架空地線鉄構外部点検(緩み防止含)		変更	
0933594	九州	2026/11/16 09:00	2026/11/16 17:00	単日	西九州ss	220kV 武雄線1L/西九州ss 西九州ss 20-33 [ロック]	西九州武雄線総合更新工事(桃川地区)のうち1L電気試験		変更	
0933615	九州	2026/11/16 09:00	2026/11/16 17:00	単日	武雄ss	220kV 武雄線1L/220kV 武雄線1L[43RCロック]/武雄ss 武雄ss 220kV武雄線1L 43KH[仮保護]/武雄ss 武雄ss 武雄ss 20-33 [ロック]	西九州武雄線総合更新工事(桃川地区)のうち1L電気試験		変更	
0933806	九州	2026/11/16 09:00	2026/11/27 17:00	連続	日田ss	220kV 熊本日田線1L/日田ss 220kV 熊本日田線1L DZ盤/日田ss 220kV 熊本日田線1L PCM(A)/日田ss 220kV 熊本日田線1L PCM(B)/日田ss 20-10[加圧停止]	日田ss220kV熊本日田線保護装置取替工事(1L関係切替)		変更	
0934858	九州	2026/11/16 09:00	2026/11/27 17:00	連続	熊本ss	220kV 熊本日田線1L(2025/12 運開)/熊本ss 220kV 熊本日田線1L(2025/12 運開) DZ盤/熊本ss 220kV 熊本日田線1L(2025/12 運開) PCM(A)/熊本ss 220kV 熊本日田線1L(2025/12 運開) PC M(B)/熊本ss 20-10[加圧停止]	熊本ss500kV現地制御装置取替工事のうち220kV熊本日田1L関係切替		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0934859	九州	2026/11/16 09:00	2026/11/27 17:00	連続	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本日田線1L (2025/12 連開)/熊本ss 220kV 熊本日田線1L (2025/12 連開) DZ盤/熊本ss 220kV 熊本日田線1L (2025/12 連開) PCM(A)/熊本ss 220kV 熊本日田線1L (2025/12 連開) PCM(B)/熊本ss 20-10[加圧停止]	熊本ss 220kV熊本日田線保護装置取替工事(1L関係切替)		変更	
0934891	九州	2026/11/16 09:00	2026/11/27 17:00	連続	日田ss	220kV 熊本日田線1L (2025/12 連開)/日田ss 220kV 熊本日田線1L (2025/12 連開) DZ盤/日田ss 220kV 熊本日田線1L (2025/12 連開) PCM(A)/日田ss 220kV 熊本日田線1L (2025/12 連開) PCM(B)/日田ss 20-10[加圧停止]	日田ss220kV熊本日田線保護装置取替工事(1L関係切替)		変更	
0933600	九州	2026/11/17 08:00	2026/11/27 18:00	連続	220kV 松島火力線北線1L	220kV 松島火力線北線1L	<TCL-26-003>200kV松島火力線北線1L 電線路細密点検他		変更	
0934604	九州	2026/11/17 08:00	2026/11/17 18:00	単日	伊都ss	伊都ss 220kV 脊振伊都線1L/伊都ss 220kV 脊振伊都線1L PCM(A)/伊都ss 220kV 脊振伊都線1L PCM(B)/伊都ss 20-10[加圧停止]/伊都ss 220kV1号送電用変圧器 主変保護盤/伊都ss 220kV1号 送電用変圧器/伊都ss 6-110[加圧停止]	伊都ss 20-10 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(パネ)を行う。		変更	
0935561	九州	2026/11/17 09:00	2026/11/19 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L	宮崎エリア防錆塗装修繕工事(2L)(220kV南宮崎線)2026年度発注分		変更	
0936276	九州	2026/11/17 09:00	2026/11/17 18:00	単日	伊都ss	220kV 脊振伊都線1L/伊都ss 20-10[加圧停止]/伊都ss 66kV[1-2] 43BP+43LB[ロック]/伊都ss 220kV1号送電用変圧器/伊都ss 6-110 [加圧停止]	伊都ss 6-110 66kV GISユニット 外部点検(6年点検)を行う。		変更	
0936277	九州	2026/11/17 09:00	2026/11/17 18:00	単日	伊都ss	220kV 脊振伊都線1L/伊都ss 20-10[加圧停止]/伊都ss 220kV1号送電用変圧器/伊都ss 220kV1号送電用変圧器 変圧器保護盤/伊都ss 220kV1号送電用変圧器 LR盤/伊都ss 6-110 [加圧停止]	伊都ss 220kV1号 送電用変圧器 220kV 主変 外部点検を行う。		変更	
0936278	九州	2026/11/17 09:00	2026/11/17 18:00	単日	伊都ss	220kV 脊振伊都線1L/伊都ss 20-10[加圧停止]/伊都ss 220kV1号送電用変圧器/伊都ss 220kV1号送電用変圧器 変圧器保護盤/伊都ss 220kV1号送電用変圧器 LR盤/伊都ss 6-110 [加圧停止]	伊都ss 220kV1号 送電用変圧器 220kV 主変 LTC電動操作機構 外部点検を行う。		変更	
0936279	九州	2026/11/17 09:00	2026/11/17 18:00	単日	伊都ss	220kV 脊振伊都線1L/伊都ss 20-10[加圧停止]/伊都ss 220kV1号 送電用変圧器/伊都ss 6-110[加圧停止]	伊都ss 66kV電力ケーブル(6-110) 電力ケーブル外部点検を行う。		変更	
0932289	九州	2026/11/18 09:00	2026/11/19 17:00	毎日	500kV 東九州幹線1L	500kV 東九州幹線1L	500kV東九州幹線 ジャンパ補強装置修繕【2026年度:・69、・71】		変更	
0935578	九州	2026/11/18 09:00	2026/11/21 17:00	連続	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	220kV大分幹線がいにし金具他修繕工事(1L)		変更	
0935579	九州	2026/11/18 09:00	2026/11/20 17:00	連続	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	2026年度鉄塔塗装修繕工事(大分幹線1L)		変更	
0935580	九州	2026/11/18 09:00	2026/12/02 17:00	連続	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	大分幹線OPGW張替工事(田口地区)		変更	
0936398	九州	2026/11/18 09:00	2026/11/18 17:00	単日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	大分幹線ボルトナット緩み防止金具修繕工事(大分北線1L)		変更	
0935581	九州	2026/11/19 09:00	2026/11/20 17:00	毎日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	大分幹線がいにし金具他修繕工事(1L)		変更	
0932302	九州	2026/11/20 13:00	2026/11/20 17:00	単日	北九州ss	北九州ss 500kV 豊前北幹線1L/北九州ss 500kV 北九州幹線1L/脊振ss 500kV 北九州幹線1L 143KHB[仮保護]/北九州ss 500kV2号母線	北九州ss500kVGIS取替工事(500kV2号母線GIB 試充電)		変更	
0936672	九州	2026/11/24 08:30	2026/11/25 17:30	毎日	長崎ss	220kV 長崎幹線2L/長崎ss 20-60[加圧停止]	長崎ss 220kV長崎幹線2L(P10～P11)屋外鉄構点検		新規	
0936680	九州	2026/11/24 08:30	2026/11/25 17:30	毎日	諫早ss	220kV 諫早分岐線2L/220kV 長崎幹線2L/諫早ss 20-60[加圧停止]	諫早ss 220kV諫早分岐線2L(P201～P202)屋外点検		新規	
0934868	九州	2026/11/24 09:00	2026/11/24 17:00	単日	220kV 東九州分岐線1L	220kV 東九州分岐線1L/220kV 海崎線1L	220kV海崎線外電線付属品修繕の実施(東九州分岐線1L・2L)		変更	
0934870	九州	2026/11/24 09:00	2026/11/28 17:00	連続	220kV 海崎線1L	220kV 海崎線1L	海崎線外電線付属品修繕の実施。(1L)		変更	
0935562	九州	2026/11/24 09:00	2026/11/30 17:00	連続	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	東福岡幹線ジャンパ補強装置修繕工事		変更	
0935563	九州	2026/11/24 09:00	2026/11/29 17:00	連続	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	東福岡幹線鉄塔防錆塗装工事(2026-2027)		変更	
0935578	九州	2026/11/24 09:00	2026/11/27 17:00	連続	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	220kV大分幹線がいにし金具他修繕工事(1L)		変更	
0935579	九州	2026/11/24 09:00	2026/11/27 17:00	連続	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	2026年度鉄塔塗装修繕工事(大分幹線1L)		変更	
0936767	九州	2026/11/24 09:00	2026/12/01 17:00	連続	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	東福岡幹線ジャンパ修繕工事(2026)		新規	
0936768	九州	2026/11/24 09:00	2026/12/01 17:00	連続	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	東福岡幹線スベサ修繕工事(2026)		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0936769	九州	2026/11/24 09:00	2026/12/01 17:00	連続	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	東福岡幹線鉄塔防錆塗装工事(2026)		新規	
0932468	九州	2026/11/25 08:00	2026/11/25 18:00	単日	熊本ss	500kV 熊本幹線1L/熊本ss 50-50[加圧停止]	熊本SS 50-50GISガスブッシング健全性確認(UT測定)		変更	
0933576	九州	2026/11/25 08:00	2026/11/27 17:00	連続	500kV 南九州幹線2L (2025/10 運開)	500kV 南九州幹線2L (2025/10 運開)	南九州幹線がよいし改修工事(2期)2L		変更	
0934753	九州	2026/11/25 08:00	2026/11/25 18:00	単日	弓削ss	弓削ss 220kV1号母線/弓削ss 220kV1号主要変圧器/弓削ss 20-110(220kV1号主変1次) [加圧停止]/弓削ss 10-110(220kV1号主変3次)/弓削ss 6-110	弓削ss過負荷防止用転送遮断盤設置工事(220kV1号母線関係切替)		変更	
0932291	九州	2026/11/25 09:00	2026/11/26 17:00	毎日	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	500kV東九州幹線 ジャンパ補強装置修繕【2026年度:・69、・71】		変更	
0935674	九州	2026/11/25 09:00	2026/11/25 17:00	単日	弓削ss	弓削ss 220kV 熊本南熊本線1L (2026/06 運開) [受電停止]/弓削ss 20-50[加圧停止]/220kV 弓削分岐線1L[受電停止]	弓削ss過負荷防止用転送遮断盤設置工事(220kV1号母線関係切替)		変更	
0935809	九州	2026/11/25 09:00	2026/12/01 17:00	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	熊本幹線径間スパーサー修繕工事(1L)		変更	
0934854	九州	2026/11/25 10:00	2026/11/25 17:00	単日	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本日田線1L (2025/12 運開) PCM(A)	熊本ss 220kV熊本日田1L PCM盤(A系) 動作試験(デジタル)		変更	
0934754	九州	2026/11/26 08:10	2026/11/26 17:50	単日	弓削ss	弓削ss 220kV2号母線	弓削ss過負荷防止用転送遮断盤設置工事(220kV2号母線関係切替)		変更	
0934875	九州	2026/11/26 09:00	2026/12/01 17:00	連続	220kV 熊本日田線1L (2025/12 運開)	220kV 熊本日田線1L (2025/12 運開)	2025・2026年度福岡・熊本エリア防錆塗装修繕工事(熊本日田線)		変更	
0935673	九州	2026/11/26 09:00	2026/11/26 17:00	単日	弓削ss	弓削ss 220kV 熊本南熊本線2L (2026/06 運開) [受電停止]/220kV 弓削分岐線2L[受電停止]/弓削ss 20-60[加圧停止]	弓削ss過負荷防止用転送遮断盤設置工事を実施する。		変更	
0934856	九州	2026/11/26 10:00	2026/11/26 17:00	単日	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本日田線1L (2025/12 運開) PCM(B)	熊本ss 220kV熊本日田1L PCM盤(B系) 動作試験(デジタル)		変更	
0932789	九州	2026/11/27 08:30	2026/11/27 17:30	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線2L/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線2L CR-A/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線2L CR-B/鳥栖ss 20-20[加圧停止]/鳥栖ss 220kV母線保護盤 常時監視 [ロック]	鳥栖ss 20-20 220kVガスしゃ断器外部点検を行う。		変更	
0936792	九州	2026/11/27 09:00	2026/11/28 09:00	連続	220kV 鳥栖木佐木線1L (2026/11 運開)	220kV 鳥栖木佐木線1L (2026/11 運開)	鳥栖三池線関連停止【鳥栖三池線総合更新工事(平田町地区)】に伴うジャンパ接続部端子長さ合わせ		新規	
0934852	九州	2026/11/27 10:00	2026/11/27 17:00	単日	熊本ss	220kV 熊本日田線1L (2025/12 運開)/熊本ss 220kV 熊本日田線1L (2025/12 運開) DZ盤/熊本ss 20-10[加圧停止]	熊本ss 220kV熊本日田1LDZ盤(後備) 動作試験(デジタル)		変更	
0934855	九州	2026/11/27 10:00	2026/11/27 17:00	単日	熊本ss	220kV 熊本日田線1L (2025/12 運開)/熊本ss 220kV 熊本日田線1L (2025/12 運開) PCM(A)/熊本ss 20-10 [加圧停止]	熊本ss 220kV熊本日田1L PCM盤(A系) 動作試験(デジタル)		変更	
0934857	九州	2026/11/27 10:00	2026/11/27 17:00	単日	熊本ss	220kV 熊本日田線1L (2025/12 運開)/熊本ss 220kV 熊本日田線1L (2025/12 運開) PCM(B)/熊本ss 20-10[加圧停止]	熊本ss 220kV熊本日田1L PCM盤(B系) 動作試験(デジタル)		変更	
0935651	九州	2026/11/28 09:00	2026/11/28 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線1L (2026/11 運開)	220kV 鳥栖木佐木線1L (2026/11 運開)	鳥栖三池線関連停止【鳥栖三池線総合更新工事(平田町地区)】に伴うジャンパ接続		変更	
0936414	九州	2026/11/28 17:00	2026/11/30 17:00	連続	220kV 鳥栖木佐木線1L (2026/11 運開)	220kV 鳥栖木佐木線1L (2026/11 運開)	鳥栖三池線総合更新工事(平田町地区)のうち使用前自主検査に伴う1L(秋)停止		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932776	九州	2026/11/29 08:00	2026/11/29 18:00	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開)/武雄ss 20-10[加圧停止]/武雄ss 220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開) DZ盤/武雄ss 220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開) PCM (A)/武雄ss 220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開) PCM(B)/西佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開) 43CA[ロック]/東佐世保ss 220kV 東佐世保分岐線1L 43CA[ロック]/西佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開) 43CB[ロック]/東佐世保ss 220kV 東佐世保分岐線1L 43CB[ロック]/武雄ss 220kV[1-2] BP盤/武雄ss 220kV[1-2] LB盤/武雄ss 220・110kV自動オシロ送信盤(1) 220kV西佐世保武雄線1L CTプラグ [ロック]/武雄ss 220kVVTM一次変換器盤 220kV西佐世保武雄線1L CTプラグ [ロック]/武雄ss 電気所サーバ入出力架1-1 220kV西佐世保武雄線1L CT2次プラグ [ロック]	武雄ss 220kV母線保護装置他取替工事(西佐世保武雄線1L切替1)		変更	
0932778	九州	2026/11/30 08:00	2026/11/30 18:00	単日	武雄ss	220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開)/武雄ss 20-20[加圧停止]/武雄ss 220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開) DZ盤/武雄ss 220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開) PCM(A)/武雄ss 220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開) PCM(B)/西佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開) 43CA[ロック]/東佐世保ss 220kV 東佐世保分岐線2L 43CA[ロック]/西佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開) 43CB [ロック]/東佐世保ss 220kV 東佐世保分岐線2L 43CB[ロック]/武雄ss 220kV [1-2] BP盤/武雄ss 220kV[1-2] LB盤/武雄ss 220・110kV自動オシロ送信盤(1) 220kV西佐世保武雄線2L CTプラグ [ロック]/武雄ss 220kVVTM一次変換器盤 220kV西佐世保武雄線2L CTプラグ [ロック]/武雄ss 電気所サーバ入出力架1-1 220kV西佐世保武雄線2L CT2次プラグ [ロック]	武雄ss 220kV母線保護装置他取替工事(西佐世保武雄線2L切替1)		変更	
0936430	九州	2026/11/30 08:00	2026/11/30 18:00	単日	南九州ss	220kV 鹿児島南線1L	南九州ss 20-11 220kVパンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。		変更	
0932276	九州	2026/11/30 09:00	2026/12/01 17:00	毎日	500kV 熊本幹線1L[予防停止]	500kV 熊本幹線1L[予防停止]	500kV熊本幹線架空地線金具修繕工事(1L)【予防停止】		変更	
0932293	九州	2026/11/30 09:00	2026/12/04 17:00	連続	500kV 南九州幹線2L (2025/10 運開)	500kV 南九州幹線2L (2025/10 運開)	南九州幹線がよいし金具他修繕工事(2L)		変更	
0932363	九州	2026/11/30 09:00	2026/11/30 18:00	単日	脊振ss	脊振ss 500kV 脊振幹線2L/脊振ss 50-80 [加圧停止]/脊振ss 500kV 脊振幹線2L PCM+DZ(A)/脊振ss 500kV 脊振幹線2L PCM+DZ(B)/脊振ss 500kV[1-2] BP+LB(A)/脊振ss 500kV[1-2] BP+LB(B)	脊振ss他保護・制御装置取替工事(旧BP撤去のうち50-80切離し)		変更	
0932471	九州	2026/11/30 09:00	2026/12/01 17:00	連続	熊本ss	熊本ss 500kV 熊本幹線1L/熊本ss 50-50 [加圧停止]	熊本ss 増強工事のうち500kVPT自動切替盤及び自動オシロ取替【熊本幹線1L切替】		変更	
0933492	九州	2026/11/30 09:00	2027/03/02 17:00	連続	大隅ss	220kV 大隅線2L/大隅ss 20-20[加圧停止]/大隅ss 220kV 大隅線2L PCM+DZ [ロック]/大隅ss 220kV 大隅線2L DZ [ロック]/大隅ss 220kV母線保護装置(20-20関係) [ロック]/大隅ss 220/110kV自動オシロ送信装置(20-20関係) [ロック]/大隅ss 220kVトランスジューサ盤 (20-20関係) [ロック]	新設: GCB×1台(3000A、31.5kA) LS電動化×3組 撤去: GCB×1台(3000A、31.5kA) LS電動化×3組、碍子洗浄装置(CB区画)		変更	
0933493	九州	2026/11/30 09:00	2026/12/04 17:00	毎日	大隅ss	大隅ss 220kV1号母線	大隅ss 20-20CBほか取替工事のうちCB撤去		変更	
0935579	九州	2026/11/30 09:00	2026/12/02 17:00	連続	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	2026年度鉄塔塗装修繕工事(大分幹線1L)		変更	
0935666	九州	2026/11/30 09:00	2026/11/30 17:00	単日	鳥栖ss	220kV 鳥栖木佐木線1L (2026/11 運開)/鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線1L 43KH	鳥栖三池線総合更新工事(平田町地区)1L使用前自主検査(電気試験)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0935808	九州	2026/11/30 09:00	2026/11/30 17:00	単日	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	500kV熊本幹線架空地線金具修繕工事(1L)11月		変更	
0933577	九州	2026/12/01 08:00	2026/12/04 17:00	連続	500kV 南九州幹線2L (2025/10 運開)	500kV 南九州幹線2L (2025/10 運開)	南九州幹線がよいし改修工事(2期)2L		変更	
0933601	九州	2026/12/01 08:00	2026/12/11 18:00	連続	220kV 松島火力線北線2L	220kV 松島火力線北線2L	<TCL-26-004>200kV松島火力線北線2L 電線路細密点検 他		変更	
0934837	九州	2026/12/01 08:00	2026/12/03 17:00	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線・43～・44(※) 2L 径間スベーサ取替 ※直接での実施区間は請負会社の実施区間との兼ね合いで 変更の可能性あり		新規	
0935821	九州	2026/12/01 08:00	2026/12/04 17:00	連続	500kV 南九州幹線2L (2025/10 運開)	500kV 南九州幹線2L (2025/10 運開)	南九州幹線がよいし改修工事(2期)2L		変更	
0936432	九州	2026/12/01 08:00	2026/12/01 18:00	単日	南九州ss	220kV 鹿児島南線2L	南九州ss 20-21 220KV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を 行う。		変更	
0932362	九州	2026/12/01 09:00	2026/12/01 18:00	単日	脊振ss	脊振ss 500kV 脊振幹線1L/脊振ss 50- 70 [加圧停止]/脊振ss 500kV 脊振幹線 1L PCM+DZ(A)/脊振ss 500kV 脊振 幹線1L PCM+DZ(B)/脊振ss 500kV [1-2] BP+LB(A)/脊振ss 500kV[1 -2] BP+LB(B)	脊振ss他保護・制御装置取替工事(旧BP撤去のうち50-70切 離し)		変更	
0934838	九州	2026/12/01 09:00	2026/12/03 17:00	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	220kV大隅線スベーサ修繕工事(2L)を実施する。 実施箇所:・9～・27		新規	
0935807	九州	2026/12/01 09:00	2026/12/01 17:00	単日	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	500kV熊本幹線架空地線金具修繕工事(1L)12月		変更	
0936723	九州	2026/12/01 09:00	2026/12/14 17:00	連続	500kV 脊振幹線1L	500kV 脊振幹線1L	脊振幹線スベーサ修繕工事(2026)		新規	
0932279	九州	2026/12/02 09:00	2026/12/03 17:00	毎日	500kV 熊本幹線2L[予防停 止]	500kV 熊本幹線2L[予防停止]	500kV熊本幹線架空地線金具修繕工事(2L)【予防停止】		変更	
0932473	九州	2026/12/02 09:00	2026/12/03 17:00	連続	熊本ss	熊本ss 500kV 熊本幹線2L/熊本ss 50- 60 [加圧停止]	熊本ss 増強工事のうち500kVPT自動切替盤及び自動オシ ロ取替【熊本幹線2L切替】		変更	
0935810	九州	2026/12/02 09:00	2026/12/04 17:00	毎日	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	500kV熊本幹線架空地線金具修繕工事(2L)		変更	
0935811	九州	2026/12/02 09:00	2026/12/08 17:00	連続	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	熊本幹線径間スベーサ修繕工事(2L)		変更	
0932801	九州	2026/12/03 08:00	2026/12/03 18:00	単日	東佐世保ss	220kV 松島火力線北線2L/東佐世保ss 2 0-100[加圧停止]/東佐世保ss 220kV 松島火力線北線2L(A)(8R切、赤黄TT ロック)/東佐世保ss 220kV松島火力線 北線2L(B)(8R切、赤黄TTロック)/東佐 世保ss 220kV母線保護装置(BP+LB) 常時 監視 [ロック]	東佐世保ss 20-100GCB 外部点検		変更	
0935801	九州	2026/12/05 09:00	2026/12/05 17:00	単日	500kV 豊前北幹線1L	500kV 豊前北幹線1L	豊前北幹線1L ・38 がよいし金具修繕工事		変更	
0932465	九州	2026/12/07 09:00	2026/12/08 17:00	連続	熊本ss	熊本ss 500kV 中九州幹線1L/熊本ss 5 0-70 [加圧停止]	熊本ss 増強工事のうち500kVPT自動切替盤及び自動オシ ロ取替【中九州幹線1L切替】		変更	
0935802	九州	2026/12/07 09:00	2026/12/09 17:00	連続	500kV 北九州幹線1L	500kV 北九州幹線1L	北九州幹線がよいし金具修繕(1L)		変更	
0932467	九州	2026/12/09 09:00	2026/12/10 17:00	連続	熊本ss	熊本ss 500kV 中九州幹線2L/熊本ss 5 0-80 [加圧停止]	熊本ss 増強工事のうち500kVPT自動切替盤及び自動オシ ロ取替【中九州幹線2L切替】		変更	
0934752	九州	2026/12/09 09:00	2026/12/09 17:00	単日	上津役ss	220kV 上津役線1L/上津役ss 20-70[加 圧停止]/上津役ss 220kV 上津役線1L 4 3RCA[ロック]/上津役ss 220kV 上津役 線1L 43RCB[ロック]/上津役ss 220kV 上津役線1L(A系) 43KH「仮保護」	北九州ss 20-70CB取替工事		変更	
0932648	九州	2026/12/10 09:00	2026/12/10 17:00	単日	220kV 榎田線1L	220kV 榎田線1L	榎田線地線金具他修繕工事(1L)		変更	
0935583	九州	2026/12/10 09:00	2026/12/11 17:00	連続	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	2026年度鉄塔防錆塗装修繕工事(大分幹線2L)		変更	
0935584	九州	2026/12/10 09:00	2026/12/11 17:00	毎日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	大分幹線がよいし金具他修繕工事(2L)		変更	
0936399	九州	2026/12/10 09:00	2026/12/10 17:00	単日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	大分幹線ボルトナット緩み防止金具修繕工事(大分北線2L)		変更	
0936379	九州	2026/12/11 00:10	2026/12/12 04:55	毎日	JR新坂本ss	JR新坂本ss 220kV 大平人吉線1L [受 電停止]/JR新坂本ss 220kV 大平人吉線 2L [受電停止]	★【調整中】JR新坂本ss 受電設備定期点検(き電用変圧器・ BCT(1号)検査)		変更	
0934690	九州	2026/12/14 08:00	2026/12/17 18:00	毎日	北九州ss	北九州ss 220kV 西谷1号線/北九州ss 20-230	20-170、171、172老朽更新		変更	
0934699	九州	2026/12/14 08:00	2027/03/26 18:00	連続	北九州ss	北九州ss 220kV 西谷3号線/北九州ss 20-170/北九州ss 220kV西谷線3L (A) [ロック]/北九州ss 220kV西谷線3L (B) [ロック]/北九州ss 220kV西谷線3L (DZ) [ロック]	20-170、171、172老朽更新		変更	
0935746	九州	2026/12/14 08:00	2026/12/17 18:00	連続	豊前ss	500kV 豊前西幹線2L/豊前ss 50-40/ 豊前ss 500kV BP+LB(B) 常時監 視/豊前ss 500kV BP+LB(A) 常時 監視/豊前ss 500kV豊前西幹線2L P CM+DZ(A)/豊前ss 500kV豊前西幹 線2L PCM+DZ(B)	豊前ss 50-40 GIS 外部点検(12年点検)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932390	九州	2026/12/14 09:00	2026/12/18 18:00	連続	中央ss	500kV 豊前西幹線2L/中央ss 50-40[加圧停止]/中央ss 500kV 豊前西幹線2L DZ盤/中央ss 500kV 豊前西幹線2L PCM+DZ(A)/中央ss 500kV 豊前西幹線2L PCM+DZ(B)/中央ss 500kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/中央ss 500kV[1-2] LB盤 常時監視ロック	中央ss 50-40 500KVガス絶縁開閉装置外部点検(空気)を行う。		変更	
0935583	九州	2026/12/14 09:00	2026/12/18 17:00	連続	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	2026年度鉄塔防錆塗装修繕工事(大分幹線2L)		変更	
0935804	九州	2026/12/14 09:00	2026/12/14 17:00	単日	500kV 中九州幹線1L	500kV 中九州幹線1L	【2026】電線・地線修繕工事(熊本地区) 500kV中九州幹線1L		変更	
0935805	九州	2026/12/14 09:00	2026/12/19 17:00	連続	500kV 中九州幹線1L	500kV 中九州幹線1L	【2026】管内送電設備(熊本地区)径間スペーサ修繕工事 中九州幹線1L		変更	
0935582	九州	2026/12/16 09:00	2026/12/19 17:00	連続	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	220kV大分幹線がしいし金具他修繕工事(2L)		変更	
0935768	九州	2026/12/16 09:00	2026/12/16 18:00	単日	脊振ss	脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM+DZ(A)/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM+DZ(B)/脊振ss 50-40 [加圧停止]/脊振ss 500kV[1-2] BP+LB(A)/脊振ss 500kV[1-2] BP+LB(B)	脊振ss他保護・制御装置取替工事(旧BP撤去のうち50-40切離し)		変更	
0932231	九州	2026/12/17 08:00	2026/12/17 13:00	単日	西谷ss	西谷ss 220kV 西谷3号線/西谷ss 20-70[加圧停止]/西谷ss 220kV 西谷3号線 43RCA[ロック]/西谷ss 220kV 西谷3号線 43RCB[ロック]/西谷ss 220kV西谷線3L(A系) 43KH[仮保護]	20-170、171、172老朽更新		変更	
0932392	九州	2026/12/17 09:00	2026/12/18 18:00	連続	中央ss	500kV 豊前西幹線2L/500kV 脊振幹線1L/中央ss 50-40[加圧停止]/中央ss 50-70[加圧停止]	中央ss 50-40 500KVガス絶縁開閉装置外部点検(空気)を行う。		変更	
0933464	九州	2026/12/17 13:00	2026/12/17 17:00	単日	西谷ss	西谷ss 220kV 西谷3号線/西谷ss 20-70[加圧停止]/西谷ss 220kV 西谷3号線 43RCA[ロック]/西谷ss 220kV 西谷3号線 43RCB[ロック]/西谷ss 220kV西谷線3L(A系) 43KH[仮保護]	20-170、171、172老朽更新		変更	
0934762	九州	2026/12/18 08:00	2026/12/18 18:00	単日	人吉ss	人吉ss 220kV1号母線/人吉ss 220kV[1-2] BP+LB盤/人吉ss 110kV1号母線/人吉ss 110kV[1-2] BP+LB盤/人吉ss 66kV1号母線/人吉ss 66kV[1-2] BP+LB盤/人吉ss 220kV1号 主要変圧器/人吉ss 電気所サーバ 220kV1号母線PTプラグ [ロック]/人吉ss 電気所サーバ 110kV1号母線PTプラグ [ロック]/人吉ss 電気所サーバ 66kV1号母線PTプラグ [ロック]	人吉ss主変増強工事に伴う4号主変試充電試験		変更	
0932083	九州	2026/12/21 07:00	2026/12/21 19:00	単日	人吉ss	人吉ss 220kV1号母線/人吉ss 20T-10 [加圧停止]/人吉ss 220kV2号 主要変圧器/人吉ss 110kV 2号NGR/人吉ss 10-120 [加圧停止]/人吉ss 6-120 [加圧停止]/人吉ss 20-120 [加圧停止]	人吉SS 220kV 1号母線8区間(20P15~20P23)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)		変更	
0932090	九州	2026/12/21 07:00	2026/12/21 19:00	単日	人吉ss	人吉ss 220kV1号母線/人吉ss 20T-10 [加圧停止]/人吉ss 220kV2号 主要変圧器/人吉ss 110kV 2号NGR/人吉ss 10-120 [加圧停止]/人吉ss 6-120 [加圧停止]/人吉ss 20-120 [加圧停止]	人吉SS 20T-10 (20P14~20P15)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)		変更	
0935582	九州	2026/12/21 09:00	2026/12/24 17:00	連続	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	220kV大分幹線がしいし金具他修繕工事(2L)		変更	
0935583	九州	2026/12/21 09:00	2026/12/24 17:00	連続	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	2026年度鉄塔防錆塗装修繕工事(大分幹線2L)		変更	
0935803	九州	2026/12/21 09:00	2026/12/23 17:00	連続	500kV 北九州幹線2L	500kV 北九州幹線2L	北九州幹線がしいし金具修繕(2L)		変更	
0935806	九州	2026/12/21 09:00	2026/12/26 17:00	連続	500kV 中九州幹線2L	500kV 中九州幹線2L	【2026】管内送電設備(熊本地区)径間スペーサ修繕工事 中九州幹線2L		変更	
0932085	九州	2026/12/22 07:00	2026/12/22 19:00	単日	人吉ss	人吉ss 220kV1号母線/人吉ss 20T-10 [加圧停止]/人吉ss 220kV2号 主要変圧器/人吉ss 110kV 2号NGR/人吉ss 10-120 [加圧停止]/人吉ss 6-120 [加圧停止]/人吉ss 20-120 [加圧停止]	人吉SS 220kV 1号母線7区間(20P14~20P22)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932092	九州	2026/12/22 07:00	2026/12/22 19:00	単日	人吉ss	人吉ss 220kV1号母線/人吉ss 20T-10[加圧停止]/人吉ss 220kV2号 主要変圧器/人吉ss 110kV 2号NGR/人吉ss 10-120 [加圧停止]/人吉ss 6-120 [加圧停止]/人吉ss 20-120 [加圧停止]	人吉SS 2号主変(20P22~20P23)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)		変更	
0934691	九州	2026/12/22 08:00	2026/12/23 18:00	毎日	北九州ss	北九州ss 220kV 西谷1号線/北九州ss 20-230	20-170、171、172老朽更新		変更	
0932361	九州	2026/12/23 09:00	2026/12/24 18:00	連続	脊振ss	500kV 玄海幹線2L南線/脊振ss 50-40 [加圧停止]/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 DZ盤/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(A)/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(B)	脊振ss 50-40 500kV GISユニット 外部点検(6年点検)を行う。		変更	
0934719	九州	2026/12/23 09:00	2026/12/23 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	220kV西谷門司線1L2Lジャンパ開閉(220kV谷門司線・33作業時) ・ジャンパ開放…2L、2回、1L、2回 ・ジャンパ接続…2L、2回、1L、2回		変更	
0934874	九州	2026/12/23 09:00	2026/12/23 17:00	単日	220kV 熊本日田線1L (2025/12 運開)	220kV 熊本日田線1L (2025/12 運開)	熊本日田線一部変更工事(国武・平野地区)のうち架線工事(1L)既・102~・105【電気試験】		変更	
0936702	九州	2026/12/23 14:00	2026/12/23 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	西谷ss~・12、・16~・46 15.4km 電線張替作業		新規	
0935819	九州	2027/01/06 08:00	2027/01/13 17:00	連続	500kV 南九州幹線1L (2025/10 運開)	500kV 南九州幹線1L (2025/10 運開)	南九州幹線がいし改修工事(2期)1L		変更	
0932086	九州	2027/01/07 07:00	2027/01/07 19:00	単日	人吉ss	人吉ss 20T-10 [加圧停止]/人吉ss 220kV2号母線/人吉ss 220kV2号 主要変圧器/人吉ss 110kV 2号NGR/人吉ss 10-120 [加圧停止]/人吉ss 6-120 [加圧停止]/人吉ss 20-120 [加圧停止]	人吉SS 220kV 2号母線7区間(20P14~20P22)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)		変更	
0932097	九州	2027/01/07 07:00	2027/01/07 19:00	単日	人吉ss	人吉ss 220kV2号母線/人吉ss 20T-10 [加圧停止]/人吉ss 220kV2号 主要変圧器/人吉ss 110kV 2号NGR/人吉ss 10-110 [加圧停止]/人吉ss 6-120 [加圧停止]/人吉ss 20-120 [加圧停止]	人吉SS 20T-10 (20P14~20P15)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)		変更	
0935749	九州	2027/01/07 09:00	2027/01/14 17:00	連続	豊前ss	500kV 豊前北幹線1L/豊前ss 50-10/豊前ss 500kV 豊前北幹線1L PCM+DZ(A)/豊前ss 500kV 豊前北幹線1L PCM+DZ(B)/豊前ss 500kV[1-2] PD自動切替盤/豊前ss 500kV[1-2] BP+LB(A)/豊前ss 自動オンロ送信盤/豊前ss No1PQVF測定装置/豊前ss 500kV トランスジェーサー盤(1)/豊前ss 500kV 母線保護装置(B) (50-10)/豊前ss 豊前ss 500kV 母線保護一括CT集合箱 (50-10)	豊前変電所 監視制御装置ほか取替工事(500kV豊前北幹線1L)		変更	
0932087	九州	2027/01/08 07:00	2027/01/08 19:00	単日	人吉ss	人吉ss 20T-10 [加圧停止]/人吉ss 220kV2号母線/人吉ss 220kV2号 主要変圧器/人吉ss 110kV 2号NGR/人吉ss 10-120 [加圧停止]/人吉ss 6-120 [加圧停止]/人吉ss 20-120 [加圧停止]	人吉SS 220kV 2号母線8区間(20P15~20P23)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)		変更	
0932099	九州	2027/01/08 07:00	2027/01/08 19:00	単日	人吉ss	人吉ss 220kV2号母線/人吉ss 20T-10[加圧停止]/人吉ss 220kV2号 主要変圧器/人吉ss 110kV 2号NGR/人吉ss 10-120 [加圧停止]/人吉ss 6-120 [加圧停止]/人吉ss 20-120 [加圧停止]	人吉SS 2号主変(20P22~20P23)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)		変更	
0936380	九州	2027/01/11 00:10	2027/01/12 04:55	毎日	JR新坂本ss	JR新坂本ss 220kV 大平人吉線2L	★【調整中】JR新坂本ss 受電設備定期点検(受電用断路器2002L・2002LE検査)		変更	
0936381	九州	2027/01/11 00:10	2027/01/12 04:55	毎日	JR新坂本ss	JR新坂本ss 220kV 大平人吉線2L	★【調整中】JR新坂本ss 受電設備定期点検(計器用変成器CVT(2号)検査)		変更	
0934607	九州	2027/01/12 08:30	2027/01/14 17:30	毎日	220kV 都城線1L	220kV 都城線1L	220kV都城線ポルトナット修繕工事(1L)を実施。 作業場所:・4・6・15・19・20・21・23・25・27・30		変更	
0934608	九州	2027/01/12 08:30	2027/01/13 17:30	毎日	220kV 都城線1L	220kV 都城線1L	・・13,14(2基)未契約		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0933807	九州	2027/01/12 09:00	2027/01/20 17:00	連続	日田ss	220kV 熊本日田線2L/日田ss 220kV 熊本日田線2L DZ盤/日田ss 220kV 熊本日田線2L PCM(A)/日田ss 220kV 熊本日田線2L PCM(B)/日田ss 20-20[加圧停止]	日田ss220kV熊本日田線保護装置取替工事(2L関係切替)		変更	
0932284	九州	2027/01/13 09:00	2027/03/19 17:00	連続	500kV 佐賀幹線2L	500kV 佐賀幹線2L	佐賀幹線電線張替工事(2期)第8延線【2L】		変更	
0932285	九州	2027/01/13 09:00	2027/03/19 17:00	連続	500kV 佐賀幹線2L	500kV 佐賀幹線2L	佐賀幹線電線張替工事(2期)第11(12)延線【2L】		変更	
0932286	九州	2027/01/13 09:00	2027/03/19 17:00	連続	500kV 佐賀幹線2L	500kV 佐賀幹線2L	佐賀幹線電線張替工事(2期)第3延線【2L】		変更	
0932287	九州	2027/01/13 09:00	2027/03/19 17:00	連続	500kV 佐賀幹線2L	500kV 佐賀幹線2L	佐賀幹線電線張替工事(2期)第1延線【2L】		変更	
0934724	九州	2027/01/13 09:00	2027/01/13 17:00	単日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	220kV西谷門司線1L2Lジャンパ開閉(220kV谷門司線・33作業時) ・ジャンパ開放…2L、2回、1L、2回 ・ジャンパ接続…2L、2回、1L、2回		変更	
0934876	九州	2027/01/13 09:00	2027/02/19 17:00	連続	220kV 熊本日田線2L (2025/12 運開)	220kV 熊本日田線2L (2025/12 運開)	熊本日田線一部変更工事(国武・平野地区)のうち架線工事(2L)既・102～105		変更	
0935833	九州	2027/01/13 09:00	2027/03/19 17:00	連続	500kV 佐賀幹線2L (2027/03 運開)	500kV 佐賀幹線2L (2027/03 運開)	佐賀幹線電線張替工事(2期)第2延線【2L】		変更	
0935834	九州	2027/01/13 09:00	2027/03/19 17:00	連続	500kV 佐賀幹線2L (2027/03 運開)	500kV 佐賀幹線2L (2027/03 運開)	佐賀幹線電線張替工事(2期)第7延線【2L】		変更	
0935835	九州	2027/01/13 09:00	2027/03/19 17:00	連続	500kV 佐賀幹線2L (2027/03 運開)	500kV 佐賀幹線2L (2027/03 運開)	佐賀幹線電線張替工事(2期)第14延線【2L】		変更	
0934710	九州	2027/01/14 09:00	2027/03/10 17:00	連続	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	220kV西谷門司線一部変更工事(葛原地区)		変更	
0934877	九州	2027/01/14 09:00	2027/01/19 17:00	連続	220kV 熊本日田線2L (2025/12 運開)	220kV 熊本日田線2L (2025/12 運開)	2025・2026年度福岡・熊本エリア防錆塗装修繕工事(熊本日田線)		変更	
0935710	九州	2027/01/14 09:00	2027/01/22 17:00	連続	宮崎ss	220kV 南宮崎線1L/220kV 宮崎分岐線1L/宮崎ss 20-70[加圧停止]/宮崎ss 220kV 宮崎分岐線1L PCM+DZ(A)/宮崎ss 220kV 宮崎分岐線1L PCM+DZ(B)/宮崎ss 220kV 宮崎分岐線1L PT自動切替盤/宮崎ss 220kV 宮崎分岐線1L 220kV自動オシロ送信盤/宮崎ss 宮崎分岐線1L制御端末(BCU)A系/宮崎ss 宮崎分岐線1L制御端末(BCU)B系	宮崎ss 500kV制御装置取替工事を実施する。		変更	
0932746	九州	2027/01/19 09:00	2027/01/20 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線2L (2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線2L (2025/06 運開)/220kV 弓削分岐線2L	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事(電線接続・電気試験2L)		変更	
0934866	九州	2027/01/19 09:00	2027/01/29 17:00	連続	熊本ss	220kV 熊本日田線2L (2025/12 運開)/熊本ss 220kV 熊本日田線2L (2025/12 運開) DZ盤/熊本ss 220kV 熊本日田線2L (2025/12 運開) PCM(A)/熊本ss 220kV 熊本日田線2L (2025/12 運開) PC M(B)/熊本ss 20-20[加圧停止]	熊本ss500kV現地制御装置取替工事のうち220kV熊本日田2L関係切替		変更	
0934867	九州	2027/01/19 09:00	2027/01/29 17:00	連続	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本日田線2L (2025/12 運開)/熊本ss 220kV 熊本日田線2L (2025/12 運開) DZ盤/熊本ss 220kV 熊本日田線2L (2025/12 運開) PCM(A)/熊本ss 220kV 熊本日田線2L (2025/12 運開) PCM(B)/熊本ss 20-20[加圧停止]	熊本ss 220kV熊本日田線保護装置取替工事(2L関係切替)		変更	
0934896	九州	2027/01/19 09:00	2027/01/29 17:00	連続	日田ss	220kV 熊本日田線2L (2025/12 運開)/日田ss 220kV 熊本日田線2L (2025/12 運開) DZ盤/日田ss 220kV 熊本日田線2L (2025/12 運開) PCM(A)/日田ss 220kV 熊本日田線2L (2025/12 運開) PC M(B)/日田ss 20-20[加圧停止]	日田ss220kV熊本日田線保護装置取替工事(2L関係切替)		変更	
0936699	九州	2027/01/20 09:00	2027/03/11 17:00	連続	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		新規	
0932739	九州	2027/01/21 09:00	2027/01/22 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線1L (2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線1L (2025/06 運開)/220kV 弓削分岐線1L	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事(電線接続・電気試験1L)		変更	
0935750	九州	2027/01/21 09:00	2027/01/28 17:00	連続	豊前ss	500kV 豊前北幹線2L/豊前ss 50-20/豊前ss 500kV 豊前北幹線2L PCM+DZ(A)/豊前ss 500kV 豊前北幹線2L PC M+DZ(B)/豊前ss 500kV[1-2] PD自動切替盤/豊前ss 500kV[1-2] BP+LB(A)/豊前ss 自動オシロ送信盤/豊前ss PQVF測定装置/豊前ss 500kV トランスユーザー盤(1)/豊前ss 500kV 母線保護盤(B) (50-20)/豊前ss 500kV 母線保護一括CT集合箱 (50-20)	豊前変電所 監視制御装置ほか取替工事(500kV豊前北幹線2L)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0934862	九州	2027/01/21 10:00	2027/01/21 17:00	単日	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本日田線2L (2025/12 運開) PCM(A)	熊本ss 220kV熊本日田2L PCM盤(A系) 動作試験(デジタル)		変更	
0934864	九州	2027/01/22 10:00	2027/01/22 17:00	単日	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本日田線2L (2025/12 運開) PCM(B)	熊本ss 220kV熊本日田2L PCM盤(B系) 動作試験(デジタル)		変更	
0935820	九州	2027/01/25 08:00	2027/01/31 17:00	連続	500kV 南九州幹線2L (2025/10 運開)	500kV 南九州幹線2L (2025/10 運開)	南九州幹線がよいし改修工事(2期)2L		変更	
0934860	九州	2027/01/25 10:00	2027/01/25 17:00	単日	熊本ss	220kV 熊本日田線2L (2025/12 運開)/熊本ss 220kV 熊本日田線2L (2025/12 運開) DZ盤/熊本ss 20-20	熊本ss 220kV熊本日田2LDZ盤(後備) 動作試験(デジタル)		変更	
0934863	九州	2027/01/25 10:00	2027/01/25 17:00	単日	熊本ss	220kV 熊本日田線2L (2025/12 運開)/熊本ss 220kV 熊本日田線2L (2025/12 運開) PCM(A)/熊本ss 20-20[加圧停止]	熊本ss 220kV熊本日田2L PCM盤(A系) 動作試験(デジタル)		変更	
0934865	九州	2027/01/25 10:00	2027/01/25 17:00	単日	熊本ss	220kV 熊本日田線2L (2025/12 運開)/熊本ss 220kV 熊本日田線2L (2025/12 運開) PCM(B)/熊本ss 20-20[加圧停止]	熊本ss 220kV熊本日田2L PCM盤(B系) 動作試験(デジタル)		変更	
0934898	九州	2027/01/26 07:00	2027/01/26 19:00	単日	日田ss	220kV 熊本日田線2L (2025/12 運開)/日田ss 20-20 [加圧停止]	日田ss 220kV日田線2L(P204~P205) 屋外鉄構外部点検		変更	
0934609	九州	2027/01/26 08:30	2027/01/28 17:30	毎日	220kV 都城線2L	220kV 都城線2L	220kV都城線ボルトナット修繕工事(2L)を実施。 作業場所:・4・6・15・19・20・21・23・25・27・30		変更	
0934610	九州	2027/01/26 08:30	2027/01/27 17:30	毎日	220kV 都城線2L	220kV 都城線2L	・13,14(2基)未契約		変更	
0934899	九州	2027/01/26 09:00	2027/01/26 17:00	単日	日田ss	220kV 熊本日田線2L (2025/12 運開)/日田ss 20-20 [加圧停止]	日田ss 20-23 線路PD コンデンサ形計器用変圧器外部点検		変更	
0932469	九州	2027/01/27 09:00	2027/01/27 17:00	単日	熊本ss	500kV 熊本幹線1L	熊本ss 増強工事のうち500kVGIS接続に伴う試充電(#2BUS)		変更	
0933496	九州	2027/01/27 09:00	2027/01/29 17:00	毎日	大隅ss	大隅ss 220kV1号母線	大隅ss 20-20CBほか取替工事のうち20-21LS電動化		変更	
0932464	九州	2027/02/01 08:00	2027/02/01 18:00	単日	熊本ss	500kV 中九州幹線1L/熊本ss 50-70[加圧停止]	熊本SS 50-70GISガスプッシング健全性確認(UT測定)		変更	
0934839	九州	2027/02/01 08:00	2027/02/08 18:00	連続	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	がよいし取替 ・45、47、51、53、54、57、59、67		新規	
0934698	九州	2027/02/01 08:30	2027/02/01 17:30	単日	北九州ss	220kV 西谷3号線/北九州ss 20-170	北九州ss 20-173・E LS 外部点検を行う。		変更	
0934709	九州	2027/02/01 09:00	2027/02/03 17:00	連続	220kV 西谷3号線	220kV 西谷3号線	西谷南線鉄塔防錆塗装修繕工事		変更	
0935693	九州	2027/02/01 09:00	2027/02/05 17:00	連続	中九州ss	中九州ss 500kV 中九州幹線1L/中九州ss 500kV 中九州幹線1L PCM+DZ(A)/中九州ss 500kV 中九州幹線1L PCM+DZ(B)/中九州ss 50-70 [加圧停止]	中九州ss500kV現地制御装置取替工事のうち500kV中九州幹線1L関係切替		変更	
0935798	九州	2027/02/01 09:00	2027/02/06 17:00	連続	500kV 豊前西幹線1L	500kV 豊前西幹線1L	豊前西幹線電線付属品修繕工事(1L)		変更	
0936757	九州	2027/02/01 09:00	2027/02/05 17:00	連続	中九州ss	中九州ss 500kV 中九州幹線1L [受電停止]/中九州ss 50-70 [加圧停止]/中九州ss 500kV 中九州幹線1L PCM+DZ(A)/中九州ss 500kV 中九州幹線1L PCM+DZ(B)/中九州ss 500kVPT自動切替盤 (中九州幹線1L) [ロック]	中九州ssオンラインSSC南部系安定化対策工事のうち500kV中九州幹線1L関係切替		新規	
0935744	九州	2027/02/05 09:00	2027/02/12 17:00	連続	豊前ss	500kV 豊前西幹線1L/豊前ss 50-30/豊前ss 500kV 豊前西幹線1L PCM+DZ(A)/豊前ss 500kV 豊前西幹線1L PCM+DZ(B)/豊前ss 500kV[1-2] PD自動切替盤/豊前ss 500kV[1-2] BP+LB(A)/豊前ss 自動オシロ送信盤/豊前ss No1PQVF測定装置/豊前ss 500kV トランスユーザー盤(1)/豊前ss 500kV 母線保護装置(B) (50-30)/豊前ss 500kV 母線保護一括CT集合箱(50-30)	豊前変電所 監視制御装置ほか取替工事(500kV豊前西幹線1L)		変更	
0934709	九州	2027/02/08 09:00	2027/02/10 17:00	連続	220kV 西谷3号線	220kV 西谷3号線	西谷南線鉄塔防錆塗装修繕工事		変更	
0932273	九州	2027/02/10 09:00	2027/02/10 17:00	単日	熊本ss	500kV 熊本幹線1L	熊本ss 増強工事のうち500kVGIS接続に伴う試充電(#1BUS)		変更	
0932466	九州	2027/02/15 08:00	2027/02/15 18:00	単日	熊本ss	500kV 中九州幹線2L/熊本ss 50-80[加圧停止]	熊本SS 50-80GISガスプッシング健全性確認(UT測定)		変更	
0935695	九州	2027/02/15 09:00	2027/02/19 17:00	連続	中九州ss	中九州ss 500kV 中九州幹線2L/中九州ss 500kV 中九州幹線2L PCM+DZ(A)/中九州ss 500kV 中九州幹線2L PCM+DZ(B)/中九州ss 50-80 [加圧停止]	中九州ss500kV現地制御装置取替工事のうち500kV中九州幹線2L関係切替		変更	
0936467	九州	2027/02/15 09:00	2027/02/18 17:00	連続	大隅ss	220kV 大隅線2L/大隅ss 20-20[加圧停止]/大隅ss 220kV1号母線	大隅ss 20-20CBほか取替工事のうち20-21LS電動化		変更	
0936722	九州	2027/02/15 09:00	2027/02/19 17:00	連続	500kV 豊前西幹線2L	500kV 豊前西幹線2L	豊前西幹線電線付属品修繕工事(2L)		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0936758	九州	2027/02/15 09:00	2027/02/19 17:00	連続	中九州ss	中九州ss 500kV 中九州幹線2L [受電停止]/中九州ss 50-80 [加圧停止]/中九州ss 500kV 中九州幹線2L PCM+DZ(A)/中九州ss 500kV 中九州幹線2L PCM+DZ(B)/中九州ss 500kVPT自動切替盤 (中九州幹線2L) [ロック]	中九州ssオンラインSSC南部系安定化対策工事のうち500kV 中九州幹線2L関係切替		新規	
0936438	九州	2027/02/16 08:00	2027/02/18 17:00	連続	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線・43～・44(※) 2L 径間スペーサ取替 ※直技での実施区間は請負会社の実施区間との兼ね合いで変更の可能性あり		変更	
0936441	九州	2027/02/16 08:00	2027/02/18 17:00	連続	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L/220kV 大隅線2L(高野SWS～大隅ss)	大隅線・109, 110, 111 3基		変更	
0936442	九州	2027/02/16 08:00	2027/02/18 17:00	連続	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L/220kV 大隅線2L(高野SWS～大隅ss)	大隅線・49, 51(全鹿児島エリア) ・62, 63(22工区)		変更	
0934836	九州	2027/02/16 09:00	2027/02/18 17:00	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	220kV大隅線スペーサ修繕工事(1L)を実施する。 実施箇所:・9～・27		新規	
0934693	九州	2027/02/18 08:00	2027/02/19 18:00	毎日	北九州ss	北九州ss 220kV 西谷1号線/北九州ss 20-230	20-170, 171, 172老朽更新		変更	
0934878	九州	2027/02/19 09:00	2027/02/19 17:00	単日	220kV 熊本日田線2L (2027/02 運開)	220kV 熊本日田線2L (2027/02 運開)	熊本日田線一部変更工事(国武・平野地区)のうち架線工事(2L)既・102～・105【電気試験】		変更	
0935745	九州	2027/02/19 09:00	2027/02/26 17:00	連続	豊前ss	500kV 豊前西幹線2L/豊前ss 50-40/豊前ss 500kV 豊前西幹線2L PCM+DZ(A)/豊前ss 500kV 豊前西幹線2L PCM+DZ(B)/豊前ss 500kV[1-2] PD自動切替盤/豊前ss 500kV[1-2] BP+LB(A)/豊前ss 自動オシロ送信盤/豊前ss No1PQVF測定装置/豊前ss 500kV トランスジューサー盤(1)/豊前ss 500kV 母線保護装置(B) (50-40)/豊前ss 500kV 母線保護一括CT集合箱(50-40)	豊前変電所 監視制御装置ほか取替工事(500kV豊前西幹線2L)		変更	
0934692	九州	2027/02/22 08:00	2027/02/22 18:00	単日	北九州ss	北九州ss 220kV 西谷1号線/北九州ss 20-230	20-170, 171, 172老朽更新		変更	
0936468	九州	2027/02/22 09:00	2027/02/25 17:00	連続	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線2L/大隅ss 20-20 [加圧停止]	新設:GCB×1台(3000A、31.5kA) LS電動化×3組 撤去:GCB×1台(3000A、31.5kA) LS電動化×3組、碍子洗浄装置(CB区画)		変更	
0934692	九州	2027/02/24 08:00	2027/02/25 18:00	毎日	北九州ss	北九州ss 220kV 西谷1号線/北九州ss 20-230	20-170, 171, 172老朽更新		変更	
0931850	九州	2027/02/24 08:30	2027/02/25 17:30	毎日	西九州ss	220kV 唐津西九州線2L/西九州ss 20-60[加圧停止]	西九州ss 唐津線1, 2L鉄構P-4～P-6間 GW(P4鉄構)架空地線外部点検を行う。		変更	
0931851	九州	2027/02/24 08:30	2027/02/25 17:30	毎日	西九州ss	220kV 唐津西九州線2L/西九州ss 20-60[加圧停止]	西九州ss 220kV構内GW(G11:構内GW鉄構P-34～唐津線2L鉄構P-4間) 架空地線外部点検を行う。		変更	
0931852	九州	2027/02/24 08:30	2027/02/25 17:30	毎日	西九州ss	220kV 唐津西九州線2L/西九州ss 20-60[加圧停止]	西九州ss 唐津線2L引留鉄構(P-4～P-5) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0931856	九州	2027/02/24 08:30	2027/02/24 17:30	単日	220kV 唐津西九州線2L	220kV 唐津西九州線2L	唐津西九州線 ボルトナット修繕 1基		変更	
0931857	九州	2027/02/24 08:30	2027/02/26 17:30	連続	220kV 唐津西九州線2L	220kV 唐津西九州線2L	鉄塔防錆 唐津西九州線 2基		変更	
0936665	九州	2027/02/24 08:30	2027/02/27 17:30	連続	220kV 唐津西九州線2L	220kV 唐津西九州線2L	唐津西九州線、唐津神田線併架鉄塔での作業(作業鉄塔:1, 2)		新規	
0935831	九州	2027/02/24 09:00	2027/03/03 17:00	連続	500kV 佐賀幹線2L (2026/09 運開)	500kV 佐賀幹線2L (2026/09 運開)	★2026・2027年度福岡・熊本エリア防錆塗装修繕工事(佐賀幹線)・165		変更	
0932274	九州	2027/02/25 09:00	2027/02/25 17:00	単日	熊本ss	500kV 熊本幹線1L/熊本ss 500kV 熊本幹線1L 43KH[仮保護]	熊本ss 増強工事のうち500kVGIS接続に伴う試充電(#2BUS)		変更	
0932773	九州	2027/02/26 08:00	2027/02/26 13:00	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 武雄線1L/武雄ss 220kV 武雄線1L PCM+DZ(A)/武雄ss 220kV 武雄線1L PCM+DZ(B)/西九州ss 220kV 武雄線1L 43CA[ロック]/西九州ss 220kV 武雄線1L 43CB[ロック]/武雄ss 20-30 [加圧停止]	武雄ss 220kV母線保護装置他取替工事(西九州武雄線1L切替2)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932775	九州	2027/02/26 13:00	2027/02/26 18:00	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 武雄線2L/武雄ss 220kV 武雄線2L PCM+DZ(A)/武雄ss 220kV 武雄線2L PCM+DZ(B)/西九州ss 220kV 武雄線2L 43CA[ロック]/西九州ss 220kV 武雄線2L 43CB[ロック]/武雄ss 20-40 [加圧停止]	武雄ss 220kV母線保護装置他代替工事(西九州武雄線2L切替2)		変更	
0932270	九州	2027/03/01 09:00	2027/03/01 17:00	単日	500kV 中九州幹線1L	500kV 中九州幹線1L	【2026】電線・地線修繕工事(熊本地区) 500kV中九州幹線1L		変更	
0932271	九州	2027/03/01 09:00	2027/03/01 17:00	単日	500kV 中九州幹線1L	500kV 中九州幹線1L	【2026】管内送電設備(熊本地区)径間スベーサ修繕工事 中九州幹線1L		変更	
0932658	九州	2027/03/01 09:00	2027/03/03 17:00	連続	220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開)/220kV 東佐世保分岐線1L	【東佐世保分岐線1号線】鉄塔防錆		変更	
0935564	九州	2027/03/01 09:00	2027/03/07 17:00	連続	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	東福岡幹線ジャンパ補強装置修繕工事		変更	
0935565	九州	2027/03/01 09:00	2027/03/06 17:00	連続	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	東福岡幹線鉄塔防錆塗装工事(2026-2027)		変更	
0935614	九州	2027/03/01 09:00	2027/03/05 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	【西佐世保武雄線1号線】かしい金具修繕		変更	
0936724	九州	2027/03/01 09:00	2027/03/12 17:00	連続	500kV 脊振幹線2L	500kV 脊振幹線2L	脊振幹線スベーサ修繕工事(2026)		新規	
0936770	九州	2027/03/01 09:00	2027/03/08 17:00	連続	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	東福岡幹線ダンパ修繕工事(2026)		新規	
0936771	九州	2027/03/01 09:00	2027/03/08 17:00	連続	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	東福岡幹線スベーサ修繕工事(2026)		新規	
0936772	九州	2027/03/01 09:00	2027/03/08 17:00	連続	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	東福岡幹線鉄塔防錆塗装工事(2026)		新規	
0932777	九州	2027/03/02 08:00	2027/03/02 13:00	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開)/武雄ss 220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開) DZ盤/武雄ss 220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開) PCM(A)/武雄ss 220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開) PCM(B)/西佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開) 43CA[ロック]/西佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開) 43CB[ロック]/武雄ss 20-10[加圧停止]/東佐世保ss 220kV 東佐世保分岐線1L 43CA[ロック]/東佐世保ss 220kV 東佐世保分岐線1L 43CB[ロック]	武雄ss 220kV母線保護装置他代替工事(西佐世保武雄線1L切替2)		変更	
0932802	九州	2027/03/02 08:00	2027/03/02 18:00	単日	東佐世保ss	220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開)/東佐世保ss 20-10[加圧停止]/東佐世保ss 220kV東佐世保分岐線1LPCM+DZ(A) (8R切、赤黄TTロック)/東佐世保ss 220kV東佐世保分岐線1LPCM+DZ(B) (8R切、赤黄TTロック)/東佐世保ss 220kV母線保護装置(BP+LB) 常時監視 [ロック]	東佐世保ss 20-10GCB 外部点検		変更	
0935675	九州	2027/03/02 08:00	2027/03/02 18:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 中九州南熊本線2L/南熊本ss 20-80 [加圧停止]	南熊本SS 20-83ELS操作箱内電磁接触器修繕		変更	
0935676	九州	2027/03/02 08:00	2027/03/02 18:00	単日	南熊本ss	220kV 中九州南熊本線2L/南熊本ss 20-80[加圧停止]	南熊本SS 20-83LS操作箱内電磁接触器修繕		変更	
0933608	九州	2027/03/02 08:30	2027/03/05 17:30	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開)	管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線1号線		変更	
0935661	九州	2027/03/02 08:30	2027/03/02 17:30	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開) DZ盤/武雄ss 220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開) PCM(A)/武雄ss 220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開) PCM(B)/武雄ss 20-10[加圧停止]/武雄ss 武雄ss 220kV母線保護盤 トリップ回路監視 [ロック]/武雄ss 武雄ss 220kVローカルバックアップ盤 トリップ回路監視 [ロック]	武雄ss 20-10 220KVガスしゃ断器外部点検		変更	
0936678	九州	2027/03/02 08:30	2027/03/03 17:30	毎日	諫早ss	220kV 諫早分岐線1L/220kV 長崎幹線1L/諫早ss 20-50	諫早ss 220kV諫早分岐線1L(P202~P203)屋外鉄構点検		新規	
0933607	九州	2027/03/02 09:00	2027/03/04 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開)	佐賀長崎エリア鉄塔防錆塗装工事 西佐世保武雄線1号線		変更	
0933609	九州	2027/03/02 09:00	2027/03/05 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開)	管内送電線電線付属品修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線1号線		変更	
0933610	九州	2027/03/02 09:00	2027/03/04 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開)	管内送電線架線金具修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線1号線		変更	
0935600	九州	2027/03/02 09:00	2027/04/27 17:00	連続	220kV 中九州南熊本線2L (2026/11 運開)	220kV 中九州南熊本線2L (2026/11 運開)	中九州南熊本線一部変更工事(安見地区):・18鉄塔組立、2L架線作業		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0935711	九州	2027/03/02 09:00	2027/03/10 17:00	連続	宮崎ss	220kV 南宮崎線2L/220kV 宮崎分岐線2L/宮崎ss 20-80[加圧停止]/宮崎ss 220kV 宮崎分岐線2L PCM+DZ(A)/宮崎ss 220kV 宮崎分岐線2L PCM+DZ(B)/宮崎ss 220kV 宮崎分岐線2L PT自動切替盤/宮崎ss 220kV 宮崎分岐線2L 220kV自動オンシロ送信盤/宮崎ss 宮崎分岐線2L制御端末(BCU)A系/宮崎ss 宮崎ss 宮崎分岐線2L制御端末(BCU)B系	宮崎ss 500kV制御装置取替工事を実施する。		変更	
0935639	九州	2027/03/04 09:00	2027/03/06 17:00	連続	220kV 西佐世保武雄線1L(2026/05 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L(2026/05 運開)	【東佐世保分岐線1号線】鉄塔防錆		変更	
0936778	九州	2027/03/05 14:00	2027/03/05 18:00	単日	220kV 弓削分岐線1L	220kV 弓削分岐線1L/220kV 熊本南熊本線1L(2026/06 運開)	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事に伴うジャンパ開放(1L)		新規	
0936790	九州	2027/03/05 14:00	2027/04/22 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線1L	220kV 熊本南熊本線1L/220kV 熊本南熊本線1L(熊本ss～#59)	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事(熊本南熊本線1L架線工事)		新規	
0932779	九州	2027/03/08 08:00	2027/03/08 13:00	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 西佐世保武雄線2L(2025/06 運開)/武雄ss 220kV 西佐世保武雄線2L(2025/06 運開) DZ盤/武雄ss 220kV 西佐世保武雄線2L(2025/06 運開) PCM(A)/武雄ss 220kV 西佐世保武雄線2L(2025/06 運開) PCM(B)/西佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線2L(2025/06 運開) 43CA[ロック]/西佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線2L(2025/06 運開) 43CB[ロック]/武雄ss 20-20[加圧停止]/東佐世保ss 220kV 東佐世保分岐線2L 43CA[ロック]/東佐世保ss 220kV 東佐世保分岐線2L 43CB[ロック]	武雄ss 220kV母線保護装置他取替工事(西佐世保武雄線2L切替2)		変更	
0934615	九州	2027/03/08 08:00	2027/03/12 17:30	連続	一ツ瀬ss	一ツ瀬ss 220kV 柏田線1L/一ツ瀬ss 20-50[加圧停止]/一ツ瀬ss 220kV 柏田線1L DZ盤/一ツ瀬ss 220kV 柏田線1L PCM(A)/一ツ瀬ss 220kV 柏田線1L PCM(B)/一ツ瀬ss 220kVDPD自動切替盤(220kV柏田線1L)/一ツ瀬ss 220kV母線保護盤(220kV柏田線1L)/一ツ瀬ss 220kVローカルバックアップ盤(220kV柏田線1L)/一ツ瀬ss トランスジューサー盤(1)(220kV柏田線1L)/一ツ瀬ss トランスジューサー盤(220kV柏田線1L)/一ツ瀬ss 220kV自動オンシロ盤(220kV柏田線1L)/一ツ瀬ss 220kV制御補助(1)盤(220kV柏田線1L)	一ツ瀬ss TC取替工事を実施する		変更	
0932272	九州	2027/03/08 09:00	2027/03/08 17:00	単日	500kV 中九州幹線2L	500kV 中九州幹線2L	【2026】管内送電設備(熊本地区)径間スパーサ修繕工事 中九州幹線2L		変更	
0932659	九州	2027/03/08 09:00	2027/03/10 17:00	連続	220kV 西佐世保武雄線2L(2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L(2025/06 運開)/220kV 東佐世保分岐線2L	【東佐世保分岐線2号線】鉄塔防錆		変更	
0933611	九州	2027/03/08 09:00	2027/03/11 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L(2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L(2025/06 運開)	管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線2号線		変更	
0933612	九州	2027/03/08 09:00	2027/03/10 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L(2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L(2025/06 運開)	管内送電線架線金具修繕工事(武雄地区)(西佐世保武雄線2号線)		変更	
0933613	九州	2027/03/08 09:00	2027/03/11 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L(2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L(2025/06 運開)	管内送電線電線付属品修繕工事(武雄地区)(西佐世保武雄線2号線)		変更	
0933614	九州	2027/03/08 09:00	2027/03/10 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L(2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L(2025/06 運開)	佐賀長崎エリア鉄塔防錆塗装工事 西佐世保武雄線		変更	
0935617	九州	2027/03/08 09:00	2027/03/12 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	【西佐世保武雄線2号線】がいし金具修繕		変更	
0932619	九州	2027/03/09 09:00	2027/03/09 17:00	単日	220kV 霧島分岐線1L	220kV 霧島分岐線1L/220kV 高野線1L	高野線電線他改修工事(1期)第4延線に伴うジャンパ開放		変更	
0932618	九州	2027/03/09 17:00	2027/04/26 17:00	連続	220kV 高野線1L(南九州SS～No.63)	220kV 高野線1L(南九州SS～No.63)	高野線電線他改修工事(1期)のうち第4延線(1L)架線工事		変更	
0934755	九州	2027/03/10 07:30	2027/03/10 18:30	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 南熊本線川線1L/南熊本ss 20-10 [加圧停止]	南熊本SS 20-13E磁気近接SW修繕		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932805	九州	2027/03/10 08:00	2027/03/10 18:00	単日	東佐世保ss	220kV 西佐世保武雄線2L(2025/06 運用)/東佐世保ss 20-20[加圧停止]/東佐世保ss 220kV東佐世保分岐線2LPCM+DZ(A)(8R切、赤黄TTロック)/東佐世保ss 220kV東佐世保分岐線2LPCM+DZ(B)(8R切、赤黄TTロック)/東佐世保ss 220kV母線保護装置(BP+LB) 常時監視 [ロック]	東佐世保ss 20-20GCB 外部点検		変更	
0936440	九州	2027/03/11 08:00	2027/03/18 18:00	連続	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	がいし取替 ・45、47、51、53、54、57、59、67		変更	
0932645	九州	2027/03/11 09:00	2027/03/13 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	管内送電線電線付属品修繕工事(佐賀地区)スパーサ:木佐木線2号線【2026年度】		変更	
0932646	九州	2027/03/11 09:00	2027/03/13 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	管内送電線電線付属品修繕工事(佐賀地区)ダンパ:木佐木線2号線【2026年度】		変更	
0934725	九州	2027/03/11 09:00	2027/03/11 17:00	単日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	220kV西谷門司線1L2Lジャンパ開閉(220kV谷門司線・33作業時) ・ジャンパ開放…2L、2回、1L、2回 ・ジャンパ接続…2L、2回、1L、2回		変更	
0935568	九州	2027/03/11 09:00	2027/03/13 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	管内送電線鉄塔防錆修繕工事(佐賀地区)木佐木線2号線		変更	
0935641	九州	2027/03/11 09:00	2027/03/13 17:00	連続	220kV 西佐世保武雄線2L(2026/05 運用)	220kV 西佐世保武雄線2L(2026/05 運用)	【東佐世保分岐線2号線】鉄塔防錆		変更	
0936466	九州	2027/03/11 09:00	2027/04/21 17:00	連続	大隅ss	220kV 大隅線2L/大隅ss 20-20[加圧停止]/大隅ss 220kV 大隅線2L PCM+DZ [ロック]/大隅ss 220kV 大隅線2L DZ [ロック]/大隅ss 220kV母線保護装置(20-20関係) [ロック]/大隅ss 220/110kV自動オンロ送信装置(20-20関係) [ロック]/大隅ss 220kVトランスジューサ盤(20-20関係) [ロック]	新設:GCB×1台(3000A、31.5kA) LS電動化×3組 撤去:GCB×1台(3000A、31.5kA) LS電動化×3組、碍子洗浄装置(CB区画)		変更	
0936469	九州	2027/03/11 09:00	2027/03/12 17:00	連続	大隅ss	大隅ss 220kV1号母線	大隅ss 20-20CBIほか取替工事のうちCB撤去・据付・アルミパイプ採寸・仮合わせ・取付		変更	
0936700	九州	2027/03/11 09:00	2027/03/11 17:00	単日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業 一ツ瀬ss TC取替工事を実施する		新規	
0934616	九州	2027/03/15 08:00	2027/03/19 17:30	連続	一ツ瀬ss	一ツ瀬ss 220kV 柏田線2L/一ツ瀬ss 20-60[加圧停止]/一ツ瀬ss 220kV 柏田線2L DZ盤/一ツ瀬ss 220kV 柏田線2L PCM(A)/一ツ瀬ss 220kV 柏田線2L PCM(B)/一ツ瀬ss 220kVPD自動切替盤(220kV柏田線2L)/一ツ瀬ss 220kV母線保護盤(220kV柏田線2L)/一ツ瀬ss 220kVローカルバックアップ盤(220kV柏田線2L)/一ツ瀬ss トランスジューサー盤(1)(220kV柏田線2L)/一ツ瀬ss トランスジューサー盤(220kV柏田線2L)/一ツ瀬ss 220kV自動オンロ盤(220kV柏田線2L)/一ツ瀬ss 220kV制御補助(1)盤(220kV柏田線2L)			変更	
0932637	九州	2027/03/15 09:00	2027/04/28 17:00	連続	220kV 鳥栖木佐木線1L(鳥栖ss～#36)	220kV 鳥栖木佐木線1L(鳥栖ss～#36)	鳥栖三池線総合更新工事(平田町地区)1L停止		変更	
0935650	九州	2027/03/15 09:00	2027/04/26 09:00	連続	220kV 鳥栖木佐木線1L(2026/11 運用)(鳥栖ss～#36)	220kV 鳥栖木佐木線1L(2026/11 運用)(鳥栖ss～#36)	鳥栖三池線総合更新工事(平田町地区)1L停止		変更	
0935652	九州	2027/03/15 09:00	2027/03/15 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線1L(2026/11 運用)	220kV 鳥栖木佐木線1L(2026/11 運用)	鳥栖三池線関連停止【鳥栖三池線総合更新工事(平田町地区)に伴うジャンパ開放		変更	
0936469	九州	2027/03/15 09:00	2027/03/19 17:00	連続	大隅ss	大隅ss 220kV1号母線	大隅ss 20-20CBIほか取替工事のうちCB撤去・据付・アルミパイプ採寸・仮合わせ・取付		変更	
0932645	九州	2027/03/16 09:00	2027/03/19 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	管内送電線電線付属品修繕工事(佐賀地区)スパーサ:木佐木線2号線【2026年度】		変更	
0932646	九州	2027/03/16 09:00	2027/03/19 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	管内送電線電線付属品修繕工事(佐賀地区)ダンパ:木佐木線2号線【2026年度】		変更	
0935568	九州	2027/03/16 09:00	2027/03/18 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	管内送電線鉄塔防錆修繕工事(佐賀地区)木佐木線2号線		変更	
0934666	九州	2027/03/17 08:30	2027/04/28 17:30	連続	220kV 唐津西九州線2L	220kV 唐津西九州線2L	T410×2、設計:T410(2)×2、2.6km、鉄塔 5基 事故・障害 鋼管内面腐食(建替)		変更	
0936694	九州	2027/03/17 13:00	2027/03/17 17:00	単日	北九州ss	北九州ss 220kV 西谷1号線/北九州ss 20-230	20-170、171、172老朽更新		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0935758	九州	2027/03/18 09:00	2027/03/25 17:00	連続	豊前ss	220kV 北九州豊前線1L/豊前ss 20-19 O/豊前ss 220kV 北九州豊前線1L PCM+DZ(A)/豊前ss 220kV 北九州豊前線1L PCM+DZ(B)/豊前ss 220kV[1-2] PD自動切替盤/豊前ss 220kV1-2母線 BP+LB盤 (220kV北九州豊前1L)/豊前ss SSC遮断装置(A)/豊前ss SSC遮断装置(B)/豊前ss SSC起動装置(A)/豊前ss SSC起動装置(B)/豊前ss 220kV トランスジョーサー盤(2)/豊前ss オンロ送信装置	豊前変電所 監視制御装置ほか取替工事(220kV北九州豊前線1L)		変更	
0936469	九州	2027/03/22 09:00	2027/03/26 17:00	連続	大隅ss	大隅ss 220kV1号母線	大隅ss 20-20CBほか取替工事のうちCB撤去・据付・アルミパイプ採寸・仮合わせ・取付		変更	
0934702	九州	2027/03/26 11:00	2027/03/26 12:00	単日	北九州ss	220kV 西谷3号線/西谷ss 220kV 西谷3号線 43KH[仮保護]/西谷ss 220kV 西谷3号線 43RCA[ロック]/西谷ss 220kV 西谷3号線 43RCB[ロック]/西谷ss 20-70	20-170、171、172老朽更新		変更	
0934729	九州	2027/03/26 16:00	2027/03/26 17:00	単日	北九州ss	西谷ss 220kV 西谷3号線 43KH[仮保護]/西谷ss 220kV 西谷3号線/西谷ss 20-70[加圧停止]/西谷ss 220kV 西谷3号線 43RCA[ロック]/西谷ss 220kV 西谷3号線 43RCB[ロック]	20-170、171、172老朽更新		変更	
0936469	九州	2027/03/29 09:00	2027/03/31 17:00	連続	大隅ss	大隅ss 220kV1号母線	大隅ss 20-20CBほか取替工事のうちCB撤去・据付・アルミパイプ採寸・仮合わせ・取付		変更	
0934901	九州	2027/03/31 09:30	2027/03/31 17:30	単日	日田ss	220kV 熊本日田線1L(2027/02 運開)/日田ss 220kV 熊本日田線1L(2027/02 運開) PCM(A)/熊本ss 220kV 熊本日田線1L(2027/02 運開) 43CA[ロック]/日田ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/日田ss 20-10[加圧停止]	日田ss 日田1L(A) 動作試験(デジタル)【2026年度撤去予定】		変更	
0934902	九州	2027/03/31 09:30	2027/03/31 17:30	単日	日田ss	220kV 熊本日田線1L(2027/02 運開)/日田ss 220kV 熊本日田線1L(2027/02 運開) DZ盤/日田ss 20-10[加圧停止]	日田ss 日田1L(後備) 動作試験(デジタル)【2026年度撤去予定】		変更	
0934903	九州	2027/03/31 09:30	2027/03/31 17:30	単日	日田ss	220kV 熊本日田線1L(2027/02 運開)/日田ss 220kV 熊本日田線1L(2027/02 運開) PCM(B)/熊本ss 220kV 熊本日田線1L(2027/02 運開) 43CB[ロック]/日田ss 20-10[加圧停止]/日田ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	日田ss 日田1L(B) 動作試験(デジタル)【2026年度撤去予定】		変更	
0934904	九州	2027/03/31 09:30	2027/03/31 17:30	単日	日田ss	220kV 熊本日田線2L(2027/02 運開)/日田ss 220kV 熊本日田線2L(2027/02 運開) PCM(A)/熊本ss 220kV 熊本日田線2L(2027/02 運開) 43CA[ロック]/日田ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/日田ss 20-20[加圧停止]	日田ss 日田2L(A) 動作試験(デジタル)【2026年度撤去予定】		変更	
0934905	九州	2027/03/31 09:30	2027/03/31 17:30	単日	日田ss	220kV 熊本日田線2L(2027/02 運開)/日田ss 220kV 熊本日田線2L(2027/02 運開) PCM(B)/熊本ss 220kV 熊本日田線2L(2027/02 運開) 43CB[ロック]/日田ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/日田ss 20-20[加圧停止]	日田ss 日田2L(B) 動作試験(デジタル)【2026年度撤去予定】		変更	
0934906	九州	2027/03/31 09:30	2027/03/31 17:30	単日	日田ss	220kV 熊本日田線2L(2027/02 運開)/日田ss 220kV 熊本日田線2L(2027/02 運開) DZ盤/日田ss 20-20[加圧停止]	日田ss 日田2L(後備) 動作試験(デジタル)【2026年度撤去予定】		変更	
0935262	九州	2027/04/01 09:00	2027/04/06 17:00	連続	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	大分幹線鉄塔防錆塗装修繕工事(1L)		変更	
0935266	九州	2027/04/01 09:00	2027/04/06 17:00	連続	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	大分幹線鉄塔防錆塗装修繕工事(2L)		変更	
0935396	九州	2027/04/01 09:00	2027/04/02 17:00	毎日	220kV 到津線1L	220kV 到津線1L	220kV到津線1L 採油業務【昼】		変更	
0936280	九州	2027/04/01 09:00	2027/04/08 17:00	連続	豊前ss	220kV 東豊前線1L/豊前ss 220kV 東豊前線1L PCM+DZ(A)/豊前ss 220kV 東豊前線1L PCM+DZ(B)/豊前ss 20-10	豊前変電所 監視制御装置ほか取替を実施する。(500kV東九州幹線、500kV母線保護装置(A)、220kV大分北線、220kVPD自動切替盤、交流、直流所内盤)		変更	
0935397	九州	2027/04/01 15:00	2027/04/01 17:00	単日	220kV 到津線1L	220kV 到津線1L	220kV新小倉線OFケーブル部分放電測定を実施する。		変更	
0934617	九州	2027/04/02 08:30	2027/04/02 17:30	単日	北九州ss	北九州ss 220kV 南苅田線/北九州ss 20-150	北九州ss 20-153・E LS 外部点検を行う。		変更	
0935234	九州	2027/04/05 08:00	2027/04/10 17:00	連続	220kV 高野線1L(南九州SS~No.63)	220kV 高野線1L(南九州SS~No.63)	高野線防錆塗装修繕工事2027(1L)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0936704	九州	2027/04/05 08:00	2027/07/09 18:00	連続	北九州ss	北九州ss 220kV 南苅田線/北九州ss 20-150 [加圧停止]/北九州ss 220kV南苅田線(A) [ロック]/北九州ss 220kV南苅田線(B) [ロック]	20-150、20-151、20-152老朽更新		新規	
0936705	九州	2027/04/05 08:00	2027/04/05 18:00	単日	北九州ss	北九州ss 220kV 西谷3号線/北九州ss 20-170	20-150、20-151、20-152老朽更新		新規	
0936360	九州	2027/04/05 09:00	2027/04/05 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV1号母線	新設:GCB×1台(3000A、31.5kA) LS電動化×3組 撤去:GCB×1台(3000A、31.5kA) LS電動化×3組、碍子洗浄装置(CB区画)		変更	
0935398	九州	2027/04/05 21:00	2027/04/06 05:00	連続	220kV 到津線1L	220kV 到津線1L	220kV到津線1L 採油業務【夜】		変更	
0936706	九州	2027/04/06 08:00	2027/04/08 18:00	毎日	北九州ss	北九州ss 220kV 西谷3号線/北九州ss 20-170	20-150、20-151、20-152老朽更新		新規	
0936713	九州	2027/04/08 09:00	2027/04/28 17:00	連続	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		新規	
0936715	九州	2027/04/08 09:00	2027/04/08 17:00	単日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		新規	
0934630	九州	2027/04/09 09:00	2027/04/22 17:00	連続	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	関門連系線電線精密点検(1L)に伴う西谷門司線関連停止		変更	
0934631	九州	2027/04/09 09:00	2027/04/22 17:00	連続	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	関門連系線(JPTN)送電線補修工事(1号線)のうち鉄塔防錆塗装に伴う西谷門司線関連停止(1L)		変更	
0934553	九州	2027/04/12 08:30	2027/04/17 17:30	毎日	220kV 柏田線1L	220kV 柏田線1L	・・20.21.22.23(4基)未契約		変更	
0934948	九州	2027/04/13 08:00	2027/04/14 18:00	毎日	北九州ss	北九州ss 220kV 北九州豊前線1L/北九州ss 20-190	20-150、20-151、20-152老朽更新		変更	
0936707	九州	2027/04/13 08:00	2027/04/14 18:00	毎日	北九州ss	北九州ss 220kV 西谷3号線/北九州ss 20-170	20-150、20-151、20-152老朽更新		新規	
0934625	九州	2027/04/15 09:00	2027/04/22 17:00	連続	豊前ss	220kV 東豊前線2L/豊前ss 220kV 東豊前線2L PCM+DZ(A)/豊前ss 220kV 東豊前線2L PCM+DZ(B)/豊前ss 20-20[加圧停止]	豊前変電所 監視制御装置ほか取替を実施する。 (500kV東九州幹線、500kV母線保護装置(A)、220kV大分北線、220kVPD自動切替盤、交流、直流所内盤)		変更	
0934582	九州	2027/04/16 09:00	2027/04/16 16:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L/東福岡ss 20-90[加圧停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器/住吉ss 6-130 [加圧停止]	住吉ss 66kV電力ケーブル(3号主変2次) 66kV 電力ケーブル 外部点検(外側)を行う。		変更	
0934583	九州	2027/04/16 09:00	2027/04/16 18:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L/東福岡ss 20-90[加圧停止]/住吉ss 66kV[3-4] BP+LB盤 常時監視ロック/住吉ss 220kV 3号 主要変圧器/住吉ss 6-130[加圧停止]	住吉ss 6-130 66KVガス絶縁開閉装置外部点検(パネ)を行う。		変更	
0934554	九州	2027/04/19 08:30	2027/04/24 17:30	毎日	220kV 柏田線2L	220kV 柏田線2L	・・20.21.22.23(4基)未契約		変更	
0934627	九州	2027/04/19 09:00	2027/04/24 17:00	連続	220kV 南苅田線	220kV 南苅田線	南苅田北九州線鉄塔防錆塗装修繕工事		変更	
0933498	九州	2027/04/20 09:00	2027/04/21 17:00	毎日	大隅ss	大隅ss 220kV1号母線/大隅ss 直接運転/大隅ss 大隅ss 220kV母線保護装置[ロック]/大隅ss 大隅ss 220kVインターロック盤 [ロック]	大隅ss 20-20CBほか取替工事のうち20-20社内検査		変更	
0932740	九州	2027/04/22 08:00	2027/04/22 14:00	単日	220kV 熊本南熊本線1L (2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線1L (2025/06 運開)/220kV 弓削分岐線1L	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事に伴うジャンパ接続(1L)		変更	
0932873	九州	2027/04/22 08:00	2027/04/22 17:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 熊本南熊本線1L (2026/04 運開) 43KH[仮保護]/南熊本ss 220kV 熊本南熊本線1L (2026/04 運開) 43RCA[ロック]/南熊本ss 220kV 熊本南熊本線1L (2026/04 運開) 43RCB [ロック]/220kV 熊本南熊本線1L (2025/06 運開)/220kV 弓削分岐線1L	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事(熊本南熊本線1L電気試験)		変更	
0935510	九州	2027/04/26 09:00	2027/04/26 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線1L (2026/11 運開)	220kV 鳥栖木佐木線1L (2026/11 運開)	鳥栖三池線関連停止【鳥栖三池線総合更新工事(平田町地区)に伴うジャンパ接続		変更	
0936327	九州	2027/04/26 17:00	2027/04/28 17:00	連続	220kV 鳥栖木佐木線1L (2026/11 運開)	220kV 鳥栖木佐木線1L (2026/11 運開)	鳥栖三池線総合更新工事(平田町地区)のうち使用前自主検査に伴う1L停止		変更	
0935407	九州	2027/04/27 09:00	2027/04/27 17:00	単日	220kV 霧島分岐線1L	220kV 霧島分岐線1L/220kV 高野線1L	高野線電線他改修工事(1期)第4延線(1L)に伴うジャンパ接続		変更	
0935601	九州	2027/04/27 13:00	2027/04/27 17:00	単日	中九州ss	中九州ss 220kV 中九州南熊本線2L 43KH[仮保護]/220kV 中九州南熊本線2L (2026/11 運開)	中九州南熊本線一部変更工事(安見地区)(2L電気試験)		変更	
0935408	九州	2027/04/27 17:00	2027/04/28 17:00	連続	220kV 霧島分岐線1L	220kV 霧島分岐線1L/220kV 高野線1L	高野線電線他改修工事(1期)第4延線(1L)に伴う社内検査電気試験		変更	
0934563	九州	2027/04/28 07:30	2027/04/28 17:30	単日	西九州ss	220kV 唐津西九州線2L[43RCロック]/西九州ss 西九州ss 43KH[仮保護]/西九州ss 西九州ss 20-63	T410×2、設計:T410(2)×2、2.6km、鉄塔 5基 事故・障害 鋼管内面腐食(建替)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0934566	九州	2027/04/28 07:30	2027/04/28 17:30	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 唐津ss 20-63 [ロック]	T410×2、設計:T410(2)×2、2.6km、鉄塔 5基		変更	
0935470	九州	2027/04/28 09:00	2027/04/28 17:00	単日	鳥栖ss	220kV 鳥栖木佐木線1L(2026/11 連開)/鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線1L 43KH	事故・障害 鋼管内面腐食(建替) 鳥栖三池線総合更新工事(平田町地区)1L使用前自主検査(電気試験)		変更	
0936712	九州	2027/04/28 09:00	2027/04/28 17:00	単日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		新規	
0936716	九州	2027/04/28 09:00	2027/04/28 17:00	単日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		新規	
0934985	九州	2027/05/01 08:00	2027/05/04 18:00	連続	豊前ss	豊前ss 500kV 東九州幹線1L/豊前ss 50-50/豊前ss 500kV BP+LB(A)(B) 常時監視/豊前ss 500kV東九州幹線1L PCM+DZ(A)(B)	豊前ss 50-50 GIS 外部点検(12年点検)		変更	
0934619	九州	2027/05/01 08:30	2027/05/01 17:30	単日	北九州ss	220kV 西谷3号線/北九州ss 20-170	北九州ss 20-170 GCB 外部点検を行う。		変更	
0934624	九州	2027/05/01 08:30	2027/05/02 17:30	連続	豊前ss	220kV 東豊前線1L/豊前ss 20-10/豊前ss 220kV東豊前線1L PCM+DZ(A)(B)	豊前ss 20-10 GIS 外部点検(12年点検)を行う		変更	
0934989	九州	2027/05/01 08:30	2027/05/02 17:30	連続	豊前ss	220kV 大分北線1L/豊前ss 20-50/豊前ss 220kV大分北線1L PCM+DZ(A)(B)/豊前ss 220kV BP+LB 常時監視	豊前ss 20-50 GIS 外部点検(12年点検)		変更	
0935319	九州	2027/05/01 09:00	2027/05/01 17:00	単日	西大分ss	西大分ss 20-70[加圧停止]	西大分ss 20-70 開閉試験		変更	
0934623	九州	2027/05/07 08:00	2027/05/07 18:00	単日	北九州ss	220kV 上津役線2L/北九州ss 20-80	北九州ss 20TB-6 LS 外部点検を行う。		変更	
0931872	九州	2027/05/10 08:00	2027/05/17 18:00	連続	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	がいし取替 ・45、47、51、53、54、57、59、67		変更	
0932277	九州	2027/05/10 09:00	2027/05/14 17:00	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	【2026】管内送電設備(熊本地区)径間スペース修繕工事 500kV熊本幹線1L		変更	
0934802	九州	2027/05/10 09:00	2027/05/15 17:00	連続	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	作業箇所:・45、47、56、58		変更	
0934821	九州	2027/05/10 09:00	2027/06/22 17:00	連続	大隅ss	220kV 大隅線1L/大隅ss 20-10[加圧停止]	新設:GCB×1台(3000A、31.5kA) LS電動化×2組 新設:GCB×1台(3000A、31.5kA) LS電動化×2組、碍子洗浄装置(CB区画)		変更	
0934827	九州	2027/05/10 09:00	2027/05/14 17:00	連続	大隅ss	大隅ss 220kV1号母線	大隅ss 20-10CBほか取替工事のうちCB撤去他・据付・アルミバパイ採寸		変更	
0935054	九州	2027/05/10 09:00	2027/05/17 17:00	連続	西九州ss	西九州ss 500kV 佐賀幹線2L	西九州ss500kVGIS更新工事(佐賀2L用母線ユニット据付他)		変更	
0936717	九州	2027/05/10 09:00	2027/05/10 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		新規	
0936719	九州	2027/05/10 09:00	2027/06/01 17:00	連続	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		新規	
0935168	九州	2027/05/11 08:00	2027/05/12 19:00	連続	宮崎ss	500kV 宮崎幹線1L/宮崎ss 50-70[加圧停止]/宮崎ss 500kV 宮崎幹線1L PCM+DZ(A)/宮崎ss 500kV 宮崎幹線1L PCM+DZ(B)	宮崎ss 50-70ユニット 550kVガス絶縁周辺装置外部点検を行う。		変更	
0935169	九州	2027/05/11 08:00	2027/05/11 18:00	単日	宮崎ss	500kV 宮崎幹線1L/宮崎ss 50-70[加圧停止]	宮崎ss 500kV宮崎幹線1L(PA1～PA2) 屋外鉄構 外部点検を行う。		変更	
0935171	九州	2027/05/11 08:00	2027/05/13 18:00	連続	南九州ss	500kV 宮崎幹線1L/南九州ss 50-70[加圧停止]/南九州ss 500kV 宮崎幹線1L PCM+DZ(A)/南九州ss 500kV 宮崎幹線1L PCM+DZ(B)	南九州ss 50-70ユニット 500kVガスしや断器外部点検を行う。		変更	
0934564	九州	2027/05/11 08:30	2027/06/25 17:30	連続	220kV 唐津西九州線1L	220kV 唐津西九州線1L	T410×2、設計:T410(2)×2、2.6km、鉄塔 5基		変更	
0935093	九州	2027/05/11 08:30	2027/05/11 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 武雄線2L/西九州ss 220kV 武雄線2L CR-A/西九州ss 220kV 武雄線2L CR-B/西九州ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/西九州ss 20-40[加圧停止]	事故・障害 鋼管内面腐食(建替) 西九州ss 20-40 220kVガスしや断器外部点検		変更	
0935094	九州	2027/05/11 08:30	2027/05/11 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 武雄線2L/西九州ss 220kV 武雄線2L CR-A/西九州ss 220kV 武雄線2L CR-B/西九州ss 20-40 [加圧停止]	西九州ss 20-43 線路PD コンデンサー形計器用変圧器 測定試験(簡易点検)		変更	
0934634	九州	2027/05/11 09:00	2027/05/24 17:00	連続	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	関門連系線電線精密点検(2L)に伴う西谷門司線関連停止		変更	
0934635	九州	2027/05/11 09:00	2027/05/24 17:00	連続	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	関門連系線(JPTN)送電線補修工事(2号線)のうち鉄塔防錆塗装に伴う西谷門司線関連停止(2L)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0935465	九州	2027/05/11 09:00	2027/05/11 17:00	単日	武雄ss	武雄ss 20-40[加圧停止]/武雄ss 220kVローカルバックアップ盤トリップ回路監視 [ロック]/武雄ss 220kV母線保護装置トリップ回路監視 [ロック]/武雄ss 武雄線 2LA系 243CA, 243RCA, 赤TT, 黄TT, 208RA [ロック]/武雄ss 武雄線 2LB系 243CB, 243RCB, 赤TT, 黄TT, 208RB [ロック]/武雄ss 220kV武雄線 後備 常時監視ロック	武雄ss 20-40 220kVガスしゃ断器外部点検		変更	
0935466	九州	2027/05/11 09:00	2027/05/11 17:00	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 武雄線2L	武雄ss 20-43 線路PD コンデンサー形計器用変圧器 測定試験(簡易点検)		変更	
0935511	九州	2027/05/11 09:00	2027/05/11 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線2L (2026/11 運開)	220kV 鳥栖木佐木線2L (2026/11 運開)	鳥栖三池線開運停止【鳥栖三池線総合更新工事(平田町地区)】に伴うジャンパ開放		変更	
0935514	九州	2027/05/11 09:00	2027/06/22 09:00	連続	220kV 鳥栖木佐木線2L (2026/11 運開)(鳥栖ss～#36)	220kV 鳥栖木佐木線2L (2026/11 運開) (鳥栖ss～#36)	鳥栖三池線総合更新工事(平田町地区)2L停止		変更	
0935599	九州	2027/05/11 09:00	2027/06/23 17:00	連続	220kV 中九州南熊本線1L (2026/11 運開)	220kV 中九州南熊本線1L (2026/11 運開)	中九州南熊本線一部変更工事(安見地区):1L架線作業		変更	
0932747	九州	2027/05/12 14:00	2027/05/12 18:00	単日	220kV 熊本南熊本線2L (2025/06 運開)/220kV 弓削分岐線2L	220kV 熊本南熊本線2L (2025/06 運開)/220kV 弓削分岐線2L	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事に伴うジャンパ開放(2L)		変更	
0932871	九州	2027/05/12 14:00	2027/06/25 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線2L (熊本ss～#59)	220kV 熊本南熊本線2L(熊本ss～#59)	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事(熊本南熊本線2L架線工事)		変更	
0935170	九州	2027/05/14 08:00	2027/05/14 18:00	単日	宮崎ss	500kV 宮崎幹線2L/宮崎ss 50-80[加圧停止]	宮崎ss 500kV宮崎幹線2L(PA1～PA2) 屋外鉄構 外部点検を行う。		変更	
0932280	九州	2027/05/17 09:00	2027/05/21 17:00	毎日	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	【2026】管内送電設備(熊本地区)径間スペーサ修繕工事 500kV熊本幹線2L		変更	
0934827	九州	2027/05/17 09:00	2027/05/21 17:00	連続	大隅ss	大隅ss 220kV1号母線	大隅ss 20-10CBIほか取替工事のうちCB撤去他・据付・アルミパイプ採寸		変更	
0934910	九州	2027/05/17 09:00	2027/05/26 17:00	連続	500kV 脊振幹線1L	500kV 脊振幹線1L	脊振幹線鉄塔防錆塗装工事(2026-2027)		変更	
0935241	九州	2027/05/17 09:00	2027/05/17 17:00	単日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L	220kV宮崎分岐線がいし掃除(1L)【直営技術作業】		変更	
0935242	九州	2027/05/17 09:00	2027/05/21 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L	鉄塔防錆塗装(2027年度本社実施分)220kV南宮崎線(1L) 2026年度発注分		変更	
0936686	九州	2027/05/17 09:00	2027/05/18 17:00	毎日	日鉄大分エネセンss	220kV 大分製鉄線冬線	日鉄大分エネセンss 連系しゃ断器(20-40)開閉情報 制御盤改造	制約有	新規	
0936692	九州	2027/05/17 09:00	2027/05/18 17:00	毎日	日鉄大分エネセンss	220kV 大分製鉄線冬線	日鉄大分エネセンss 連系しゃ断器(20-40)開閉情報 制御盤改造	制約有	新規	
0935121	九州	2027/05/18 09:00	2027/05/18 17:00	単日	熊本ss	500kV 熊本幹線1L/熊本ss 50-50[加圧停止]	熊本SS 500kV熊本幹線1L屋外鉄構取付線路名称プレート撤去修繕		変更	
0935313	九州	2027/05/18 09:00	2027/05/18 17:00	単日	大分ss	大分ss 20-70[加圧停止]/大分ss 220kV大分南線1L PCM+DZ盤 143CA [ロック]/大分ss 220kV大分南線1L PCM+DZ盤 143CB [ロック]/大分ss 220kV大分南線1L PCM+DZ盤 143RCA [ロック]/大分ss 220kV大分南線1L PCM+DZ盤 143RCB [ロック]/大分ss 220kV大分南線1L PCM+DZ盤 143JKA [ロック]/大分ss 220kV大分南線1L PCM+DZ盤 143JKB [ロック]/大分ss 220kVBP盤 常時監視 43JK [ロック]	大分ss (新)20-70 220kVガスしゃ断器外部点検		変更	
0935418	九州	2027/05/18 09:00	2027/05/21 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	2027年度鉄塔防錆塗装修繕工事(西佐世保武雄線1号線)		変更	
0935330	九州	2027/05/19 08:00	2027/05/19 18:00	単日	南宮崎ss	南宮崎ss 220kV 南宮崎線1L [受電停止]/南宮崎ss 20-70 [加圧停止]	南宮崎ss 20-111 220kVハンタウ型(高岳, TPD2-L, 2000A, P15-90)外部点検を行う。		変更	
0936685	九州	2027/05/19 09:00	2027/05/20 17:00	毎日	日鉄大分エネセンss	220kV 大分製鉄線夏線	日鉄大分エネセンss 連系しゃ断器(20-30)開閉情報 制御盤改造	制約有	新規	
0936691	九州	2027/05/19 09:00	2027/05/20 17:00	毎日	日鉄大分エネセンss	220kV 大分製鉄線夏線	日鉄大分エネセンss 連系しゃ断器(20-30)開閉情報 制御盤改造	制約有	新規	
0934654	九州	2027/05/21 08:30	2027/05/21 17:30	単日	門司ss	門司ss 220kV 西谷門司線2L/門司ss 20-60	門司ss 20-60 GCB 外部点検を行う。		変更	
0935054	九州	2027/05/21 09:00	2027/05/21 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 500kV 佐賀幹線2L	西九州ss500kVGIS更新工事(佐賀2L用母線ユニット据付他)		変更	
0935252	九州	2027/05/23 09:00	2027/05/28 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線鉄塔防錆塗装工事(2027年度)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0934664	九州	2027/05/24 08:30	2027/05/24 17:30	単日	東豊前ss	220kV 東豊前線1L/東豊前ss 20-10/東豊前ss 220kV1号母線/東豊前ss 20T-10(220kV母線連絡)/東豊前ss 220kV 1号主要変圧器/東豊前ss 6-130/東豊前ss 20-130(1号主変)/東豊前ss 220kV BP 常時監視/東豊前ss 220kV LB 常時監視/東豊前ss 220kV BU 常時監視	東豊前ss 20T-10 GIS 外部点検(6年点検)を行う。		変更	
0934665	九州	2027/05/24 08:30	2027/05/24 17:30	単日	東豊前ss	220kV 東豊前線2L/東豊前ss 20-20/東豊前ss 220kV BP 常時監視/東豊前ss 220kV LB 常時監視/東豊前ss 220kV/東豊前線 PCM+DZ(A)(B)	東豊前ss 20-20 GIS 外部点検(6年点検)を行う。		変更	
0934574	九州	2027/05/24 09:00	2027/05/24 16:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss 20-50[加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂ss 6-110(#1MTr2次)[加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 220KV以下変圧器(LTC)操作トルク、タップ切替時間測定を行う。		変更	
0934588	九州	2027/05/24 09:00	2027/05/25 18:00	連続	西福岡ss	220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss 20-50[加圧停止]/西福岡ss 220kV 西福岡赤坂線1L CR-A/西福岡ss 220kV 西福岡赤坂線1L CR-B/西福岡ss 220kV 西福岡赤坂線1L DZ盤/西福岡ss 220kV[1-2] 43JK[ロック]/西福岡ss 220kV[1-3] 43JK[ロック]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂ss 6-110(#1MTr2次)[加圧停止]	西福岡ss 20-50 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。		変更	
0934827	九州	2027/05/24 09:00	2027/05/24 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV1号母線	大隅ss 20-10CBIほか取替工事のうちCB撤去他・据付・アルミパイプ採寸		変更	
0935054	九州	2027/05/24 09:00	2027/05/28 17:00	連続	西九州ss	西九州ss 500kV 佐賀幹線2L	西九州ss500kVGIS更新工事(佐賀2L用母線ユニット据付他)		変更	
0935243	九州	2027/05/24 09:00	2027/05/28 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L	鉄塔防錆塗装(2027年度本社実施分)220kV南宮崎線(2L)2026年度発注分		変更	
0934593	九州	2027/05/24 09:10	2027/05/24 17:50	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV1号母線	西福岡ss 20-50 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。		変更	
0935125	九州	2027/05/25 09:00	2027/05/25 17:00	単日	熊本ss	500kV 熊本幹線2L/熊本ss 50-60[加圧停止]	熊本SS 500kV熊本幹線2L屋外鉄構取付線路名称プレート撤去修繕		変更	
0935423	九州	2027/05/25 09:00	2027/05/28 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	2027年度鉄塔防錆塗装修繕工事(西佐世保武雄線2号線)		変更	
0934594	九州	2027/05/25 09:10	2027/05/25 17:50	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV2号母線	西福岡ss 20-50 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。		変更	
0934578	九州	2027/05/26 09:00	2027/05/26 16:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss 20-60[加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器/赤坂ss 6-120(#2MTr2次)[加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 220KV以下変圧器(LTC)操作トルク、タップ切替時間測定を行う。		変更	
0934589	九州	2027/05/26 09:00	2027/05/26 18:00	単日	西福岡ss	220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss 20-60[加圧停止]/西福岡ss 220kV 西福岡赤坂線2L CR-A/西福岡ss 220kV 西福岡赤坂線2L CR-B/西福岡ss 220kV 西福岡赤坂線2L DZ盤/西福岡ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/西福岡ss 220kV[2-3] BP+LB盤 常時監視ロック/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器/赤坂ss 6-120(#2MTr2次)[加圧停止]	西福岡ss 20-60 66KVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。		変更	
0935331	九州	2027/05/28 08:00	2027/05/28 18:00	単日	南宮崎ss	南宮崎ss 220kV 南宮崎線2L [受電停止]/南宮崎ss 20-80 [加圧停止]	南宮崎ss 20-81可とう導体(コーヘル板)の亀裂修繕		変更	
0935332	九州	2027/05/28 08:00	2027/05/28 18:00	単日	南宮崎ss	南宮崎ss 220kV 南宮崎線2L [受電停止]/南宮崎ss 20-80 [加圧停止]	南宮崎ss 20-81 220kVハンタラ型(高岳, TPD2-L, 3000A, P15-90)外部点検を行う。		変更	
0935333	九州	2027/05/28 08:00	2027/05/28 18:00	単日	南宮崎ss	南宮崎ss 220kV 南宮崎線2L [受電停止]/南宮崎ss 20-80 [加圧停止]	南宮崎ss 20-121 220kVハンタラ型(高岳, TPD2-L, 2000A, P15-90)外部点検を行う。		変更	
0935254	九州	2027/05/30 09:00	2027/06/04 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線鉄塔防錆塗装工事(2027年度)		変更	
0935054	九州	2027/05/31 09:00	2027/06/04 17:00	連続	西九州ss	西九州ss 500kV 佐賀幹線2L	西九州ss500kVGIS更新工事(佐賀2L用母線ユニット据付他)		変更	
0936708	九州	2027/06/01 08:00	2027/06/02 18:00	毎日	北九州ss	北九州ss 220kV 西谷3号線/北九州ss 20-170	20-150、20-151、20-152老朽更新		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0936714	九州	2027/06/01 09:00	2027/06/01 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		新規	
0936718	九州	2027/06/01 09:00	2027/06/01 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		新規	
0934826	九州	2027/06/02 09:00	2027/06/02 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV1号母線	新設:GCB×1台(4000A、31.5kA) LS電動化×2組、碍子洗浄装置(CB区画)		変更	
0936303	九州	2027/06/02 09:00	2027/08/10 17:00	連続	500kV 南九州幹線1L (2025/10 運開)	500kV 南九州幹線1L (2025/10 運開)	南九州幹線電線張替工事(1期)第3延線【1L】		変更	
0934577	九州	2027/06/03 09:00	2027/06/03 13:00	単日	赤坂ss	赤坂ss 220kV 西福岡赤坂線1L/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂ss 6-11 O(#1MTr2次)[加圧停止]/赤坂ss 西福岡赤坂線 転送受信盤1, 2L(A) [ロック]	赤坂ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LA 特性試験を行う。		変更	
0934586	九州	2027/06/03 09:00	2027/06/03 13:00	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss 20-50[加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器/西福岡ss 西福岡赤坂線 転送受信盤1, 2L(A) [ロック]	西福岡ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LA 特性試験を行う		変更	
0934576	九州	2027/06/03 12:00	2027/06/03 18:00	単日	赤坂ss	赤坂ss 220kV 西福岡赤坂線1L/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂ss 6-11 O(#1MTr2次)[加圧停止]/赤坂ss 西福岡赤坂線 転送受信盤1, 2L(B) [ロック]	赤坂ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LB 特性試験を行う。		変更	
0934587	九州	2027/06/03 12:00	2027/06/03 18:00	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss 20-50[加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器/西福岡ss 西福岡赤坂線 転送受信盤1, 2L(B) [ロック]	西福岡ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LB 特性試験を行う		変更	
0934581	九州	2027/06/04 09:00	2027/06/04 13:00	単日	赤坂ss	赤坂ss 220kV 西福岡赤坂線2L/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器/赤坂ss 6-12 O(#2MTr2次)[加圧停止]/赤坂ss 西福岡赤坂線 転送受信盤1, 2L(A) [ロック]	赤坂ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LA 特性試験を行う。		変更	
0934590	九州	2027/06/04 09:00	2027/06/04 13:00	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss 20-60[加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器/西福岡ss 西福岡赤坂線 転送受信盤1, 2L(A) [ロック]	西福岡ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LA 特性試験を行う		変更	
0934830	九州	2027/06/04 09:00	2027/06/04 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV1号母線	新設:GCB×1台(3000A、31.5kA) LS電動化×2組 新設:GCB×1台(3000A、31.5kA) LS電動化×2組、碍子洗浄装置(CB区画)		変更	
0934580	九州	2027/06/04 12:00	2027/06/04 18:00	単日	赤坂ss	赤坂ss 220kV 西福岡赤坂線2L/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器/赤坂ss 6-12 O(#2MTr2次)[加圧停止]/赤坂ss 西福岡赤坂線 転送受信盤1, 2L(B) [ロック]	赤坂ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LB 特性試験を行う。		変更	
0934591	九州	2027/06/04 12:00	2027/06/04 18:00	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss 20-60[加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器/西福岡ss 西福岡赤坂線 転送受信盤1, 2L(B) [ロック]	西福岡ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LB 特性試験を行う		変更	
0936709	九州	2027/06/07 08:00	2027/06/09 18:00	毎日	北九州ss	北九州ss 220kV 西谷3号線/北九州ss 20-170	20-150、20-151、20-152老朽更新		新規	
0935508	九州	2027/06/15 09:00	2027/06/17 17:00	連続	220kV 鳥栖木佐木線1L (2026/11 運開)	220kV 鳥栖木佐木線1L (2026/11 運開)	2026・2027年度福岡・熊本エリア防錆塗装修繕工事(久留米分岐線)		変更	
0936427	九州	2027/06/18 08:00	2027/06/18 13:00	単日	南福岡ss	220kV 中央南福岡線2L(中央ss～南福岡ss)/南福岡ss 中央南福岡線2L LPT切離し	中央南福岡線ケーブル張替工事(2号線)使用前自主検査のうち絶縁抵抗測定		変更	
0936426	九州	2027/06/18 13:00	2027/06/18 17:00	単日	220kV 中央南福岡線2L (中央ss～南福岡ss)	220kV 中央南福岡線2L(中央ss～南福岡ss)	中央南福岡線ケーブル張替工事(2号線)使用前自主検査のうち試充電試験		変更	
0934831	九州	2027/06/21 09:00	2027/06/22 17:00	毎日	大隅ss	大隅ss 220kV1号母線	新設:GCB×1台(3000A、31.5kA) LS電動化×2組 新設:GCB×1台(3000A、31.5kA) LS電動化×2組、碍子洗浄装置(CB区画)		変更	
0935512	九州	2027/06/21 09:00	2027/06/23 17:00	連続	220kV 鳥栖木佐木線2L (2026/11 運開)	220kV 鳥栖木佐木線2L (2026/11 運開)	2026・2027年度福岡・熊本エリア防錆塗装修繕工事(久留米分岐線)		変更	
0935515	九州	2027/06/22 09:00	2027/06/22 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線2L (2026/11 運開)	220kV 鳥栖木佐木線2L (2026/11 運開)	鳥栖三池線関連停止【鳥栖三池線総合更新工事(平田町地区)】に伴うジャンパ接続		変更	
0936329	九州	2027/06/22 17:00	2027/06/24 17:00	連続	220kV 鳥栖木佐木線2L (2026/11 運開)	220kV 鳥栖木佐木線2L (2026/11 運開)	鳥栖三池線総合更新工事(平田町地区)のうち使用前自主検査に伴う2L停止		変更	
0935399	九州	2027/06/23 13:00	2027/06/23 17:00	単日	中九州ss	中九州ss 220kV 中九州南熊本線1L 43 KH[板保護]/220kV 中九州南熊本線1L (2026/11 運開)	中九州南熊本線一部変更工事(安見地区)(1L電気試験)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0934562	九州	2027/06/25 07:30	2027/06/25 17:30	単日	西九州ss	220kV 唐津西九州線1L[43RCロック]/西九州ss 西九州ss 43KH[仮保護]/西九州ss 西九州ss 20-53	T410×2、設計:T410(2)×2、2.6km、鉄塔 5基 事故・障害 鋼管内面腐食(建替)		変更	
0934565	九州	2027/06/25 07:30	2027/06/25 17:30	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 唐津ss 20-53 [ロック]	T410×2、設計:T410(2)×2、2.6km、鉄塔 5基 事故・障害 鋼管内面腐食(建替)		変更	
0932745	九州	2027/06/25 08:00	2027/06/25 17:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 熊本南熊本線2L (2026/06 運開) 43KH[仮保護]/南熊本ss 220kV 熊本南熊本線2L (2026/06 運開) 43RCA[ロック]/南熊本ss 220kV 熊本南熊本線2L (2026/06 運開) 43RCB [ロック]/220kV 熊本南熊本線2L (2025/06 運開)/220kV 弓削分岐線2L	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事(熊本南熊本線2L電気試験)		変更	
0932744	九州	2027/06/25 08:30	2027/06/25 14:00	単日	220kV 熊本南熊本線2L (2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線2L (2025/06 運開)/220kV 弓削分岐線2L	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事に伴うジャンパ接続(2L)		変更	
0934653	九州	2027/06/28 09:00	2027/06/28 17:00	単日	苅田ss	220kV 苅田連絡線/苅田ss 20-90	苅田ss 20-90E LS 機械ロック装置 連結機構固着修繕を行う。		変更	
0936710	九州	2027/06/30 13:00	2027/06/30 17:00	単日	北九州ss	北九州ss 220kV 西谷3号線/北九州ss 20-170	20-150、20-151、20-152老朽更新		新規	
0935056	九州	2027/07/01 09:00	2027/09/15 17:00	連続	西九州ss	西九州ss 500kV 佐賀幹線2L	西九州ss500kVGIS更新工事(仮佐賀⇒佐賀2L切替)		変更	
0934931	九州	2027/07/06 09:00	2027/09/17 17:00	連続	500kV 佐賀幹線2L (2027/03 運開)	500kV 佐賀幹線2L (2027/03 運開)	佐賀幹線電線張替工事(2期)第3延線【2L】		変更	
0934932	九州	2027/07/06 09:00	2027/09/17 17:00	連続	500kV 佐賀幹線2L (2027/03 運開)	500kV 佐賀幹線2L (2027/03 運開)	佐賀幹線電線張替工事(2期)第10延線【2L】		変更	
0934933	九州	2027/07/06 09:00	2027/09/17 17:00	連続	500kV 佐賀幹線2L (2027/03 運開)	500kV 佐賀幹線2L (2027/03 運開)	佐賀幹線電線張替工事(2期)第8延線【2L】		変更	
0934934	九州	2027/07/06 09:00	2027/09/17 17:00	連続	500kV 佐賀幹線2L (2027/03 運開)	500kV 佐賀幹線2L (2027/03 運開)	佐賀幹線電線張替工事(2期)第13延線【2L】		変更	
0934935	九州	2027/07/06 09:00	2027/09/17 17:00	連続	500kV 佐賀幹線2L (2027/03 運開)	500kV 佐賀幹線2L (2027/03 運開)	佐賀幹線電線張替工事(2期)第5延線【2L】		変更	
0936721	九州	2027/07/09 11:00	2027/07/09 12:00	単日	上津役ss	北九州ss 220kV 上津役線2L/上津役ss 220kV 上津役線2L 43RCA [ロック]/上津役ss 220kV 上津役線2L 43RCB [ロック]/上津役ss 220kV 上津役線2L 43KH(A)[仮保護]	20-150、20-151、20-152老朽更新		新規	
0936720	九州	2027/07/09 16:00	2027/07/09 17:00	単日	西谷ss	西谷ss 220kV 西谷3号線/西谷ss 20-70/西谷ss 220kV 西谷線3L 43RCA/西谷ss 220kV 西谷線3L 43RCB/西谷ss 220kV 西谷線3L 43KH(A)[仮保護]	20-150、20-151、20-152老朽更新		新規	
0934669	九州	2027/07/21 08:30	2027/07/21 17:30	単日	大平sws	220kV 大平人吉線1L[受電停止]/大平sws 20-40[加圧停止]	大平sws 220kVローカルバックアップ 特性試験		変更	
0934913	九州	2027/08/16 09:00	2027/08/25 17:00	連続	500kV 脊振幹線2L	500kV 脊振幹線2L	脊振幹線鉄塔防錆塗装工事(2026-2027)		変更	
0935156	九州	2027/08/16 09:00	2027/08/20 17:00	連続	中九州ss	中九州ss 500kV 南九州幹線1L/中九州ss 500kV 南九州幹線1L PCM+DZ(A)/中九州ss 500kV 南九州幹線1L PCM+DZ(B)/中九州ss 50-10 [加圧停止]	中九州ss500kV現地制御装置取替工事のうち500kV南九州幹線1L関係切替		変更	
0935157	九州	2027/08/23 09:00	2027/08/27 17:00	連続	中九州ss	中九州ss 500kV 南九州幹線2L PCM+DZ(A)/中九州ss 500kV 南九州幹線2L PCM+DZ(B)/中九州ss 500kV 南九州幹線2L/中九州ss 50-20 [加圧停止]	中九州ss500kV現地制御装置取替工事のうち500kV南九州幹線2L関係切替		変更	
0935015	九州	2027/09/13 09:00	2027/09/13 18:00	単日	脊振ss	220kV 脊振鳥栖線2L/脊振ss 20-20[加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線2L C R-A/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線2L C R-B/脊振ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/脊振ss 220kV[1-2] LB盤 常時監視ロック/脊振ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	脊振ss 20-20 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。		変更	
0935014	九州	2027/09/14 09:00	2027/09/15 18:00	連続	脊振ss	220kV 脊振鳥栖線1L/脊振ss 20-10[加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線1L C R-A/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線1L C R-B/脊振ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/脊振ss 220kV[1-2] LB盤 常時監視ロック/脊振ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	脊振ss 20-10 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0934652	九州	2027/09/17 13:00	2027/09/17 17:00	単日	苅田ss	220kV 苅田連絡線/苅田ss 20-20/苅田ss 220kV1号母線/苅田ss 220kV[1-2] BP盤/苅田ss 66kV1号母線/苅田ss 66kV[1-2] BP盤/苅田ss 66kV1号 接地用変圧器/苅田ss 20-90/苅田ss 電気所サーバ入出力架 220kV1号母線PD2次フラグ [ロック]/苅田ss 電気所サーバ入出力架 66kV1号母線PD2次フラグ [ロック]	苅田ss1号主変取替工事を実施する。 【対象機器】 1号主変、1号主変2次66kV電力力ケーブル		変更	
0934620	九州	2027/09/21 08:30	2027/09/21 17:30	単日	北九州ss	220kV 上津役線1L/北九州ss 20-70/北九州ss 220kV上津役線1L PCM+DZ(A)(B)	北九州ss 20-70 GCB 外部点検を行う		変更	
0934621	九州	2027/09/21 08:30	2027/09/21 17:30	単日	北九州ss	北九州ss 220kV 上津役線1L/北九州ss 20-70	北九州ss 20-72 LS 外部点検を行う。		変更	
0934915	九州	2027/09/21 09:00	2027/09/24 17:00	毎日	500kV 中九州幹線1L	500kV 中九州幹線1L	【2027】管内送電設備(熊本地区)径間スペース修繕工事 500kV中九州幹線 1L		変更	
0935119	九州	2027/09/21 09:00	2027/09/21 17:00	単日	熊本ss	500kV 中九州幹線1L/熊本ss 50-70[加圧停止]	熊本ss 50-70ユニット 50-70GIS ガスBgUT測定ほかを行う。		変更	
0934622	九州	2027/09/22 08:30	2027/09/22 17:30	単日	北九州ss	220kV 上津役線2L/北九州ss 20-80	北九州ss 20-82 LS 外部点検を行う。		変更	
0934633	九州	2027/09/27 09:00	2027/10/02 17:00	連続	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	西谷門司線鉄塔防錆塗装修繕工事(1L)		変更	
0934640	九州	2027/09/28 08:30	2027/09/29 17:30	連続	西谷ss	220kV 西谷1号線/西谷ss 20-30	西谷ss 20-30 GIS 外部点検(12年点検)(#1母線PTユニット含む)を行う		変更	
0934641	九州	2027/09/28 08:30	2027/09/28 17:30	単日	西谷ss	220kV 西谷1号線/西谷ss 20-30/西谷ss 220kV1号母線	西谷ss 20-30 GIS 外部点検(12年点検)(#1母線PTユニット含む)を行う		変更	
0934639	九州	2027/09/28 09:00	2027/09/28 17:00	単日	西谷ss	220kV 西谷1号線/西谷ss 20-30	西谷ss 220kV電力ケーブル(西谷1L) 外部点検を行う。		変更	
0934916	九州	2027/09/28 09:00	2027/10/01 17:00	毎日	500kV 中九州幹線2L	500kV 中九州幹線2L	【2027】管内送電設備(熊本地区)径間スペース修繕工事 500kV中九州幹線 2L		変更	
0935120	九州	2027/09/28 09:00	2027/09/28 17:00	単日	熊本ss	500kV 中九州幹線2L/熊本ss 50-80[加圧停止]	熊本ss 50-80ユニット 50-80GIS ガスBgUT測定ほかを行う。		変更	
0935509	九州	2027/09/28 09:00	2027/09/28 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線1L (2026/11 運開)[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線1L (2026/11 運開)[予防停止]	管内架空送電線路営業除去業務の委託(220kV久留米分岐線)		変更	
0934642	九州	2027/09/29 08:30	2027/09/29 17:30	単日	西谷ss	220kV 西谷1号線/西谷ss 20-30/西谷ss 220kV2号母線	西谷ss 20-30 GIS 外部点検(12年点検)(#1母線PTユニット含む)を行う		変更	
0935513	九州	2027/09/29 09:00	2027/09/29 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線2L (2026/11 運開)[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線2L (2026/11 運開)[予防停止]	管内架空送電線路営業除去業務の委託(220kV久留米分岐線)		変更	
0935457	九州	2027/09/30 08:00	2027/09/30 18:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線2L (2026/11 運開)/木佐木ss 20-40[加圧停止]/木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線2L PCM+DZ(A)/木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線2L PCM+DZ(B)/木佐木ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	木佐木ss 20-40 GCB 外部点検		変更	
0935456	九州	2027/10/01 08:00	2027/10/01 18:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線1L (2026/11 運開) [受電停止]/木佐木ss 20-30[加圧停止]	木佐木ss 20TB-1 LS 外部点検		変更	
0935255	九州	2027/10/01 09:00	2027/10/06 17:00	連続	220kV 槻田線1L	220kV 槻田線1L	槻田線鉄塔防錆塗装修繕工事(1L)		変更	
0935256	九州	2027/10/01 09:00	2027/10/06 17:00	連続	220kV 槻田線2L	220kV 槻田線2L	槻田線鉄塔防錆塗装修繕工事(2L)		変更	
0935257	九州	2027/10/01 09:00	2027/10/01 17:00	単日	220kV 北九州豊前線1L	220kV 北九州豊前線1L	大分幹線電線付属品修繕工事(1L)		変更	
0935259	九州	2027/10/01 09:00	2027/10/01 17:00	単日	220kV 北九州豊前線2L	220kV 北九州豊前線2L	大分幹線電線付属品修繕工事(2L)		変更	
0934561	九州	2027/10/04 08:30	2027/11/05 17:30	連続	西九州ss	220kV 唐津西九州線1L (2023/11 運開)/西九州ss 20-50[加圧停止]	西九州ss20-51LS他耐震化工事(20-51, 52関係)		変更	
0934568	九州	2027/10/04 08:30	2027/10/09 17:30	連続	220kV 脊振西福岡線1L	220kV 脊振西福岡線1L	2026年発注(2カ年目)4基予定		変更	
0936272	九州	2027/10/04 08:30	2027/10/04 17:30	単日	JR九州新鳥栖ss	220kV 鳥栖JR新鳥栖線1L	JR九州新鳥栖ss 受電設備定期検査(1号側動力断路器 個別検査)		変更	
0934638	九州	2027/10/04 09:00	2027/10/09 17:00	連続	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	西谷門司線鉄塔防錆塗装修繕工事(2L)		変更	
0935250	九州	2027/10/04 09:00	2027/10/29 17:00	連続	220kV 山家線1L	220kV 山家線1L	山家甘木線赤坂蓄電所接続工事(山家線)(自線路引込工事)		変更	
0932696	九州	2027/10/05 08:00	2027/10/29 14:00	連続	220kV 熊本南熊本線2L (熊本ss～#59)	220kV 熊本南熊本線2L(熊本ss～#59)	220kV/ソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事(No.0-1～No.1架線工事2L・GW)		変更	
0935409	九州	2027/10/05 08:00	2027/10/05 17:00	単日	220kV 高野線2L	220kV 高野線2L/220kV 霧島分岐線2L	霧島分岐線電線精密点検(2L)【直営技術作業】		変更	
0935496	九州	2027/10/05 08:00	2027/10/05 14:00	単日	220kV 熊本南熊本線2L (2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線2L (2025/06 運開)/220kV 弓削分岐線2L	220kV/ソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事に伴うジャンパ開放(2L)		変更	
0936273	九州	2027/10/05 08:30	2027/10/05 17:30	単日	JR九州新鳥栖ss	220kV 鳥栖JR新鳥栖線2L	JR九州新鳥栖ss 受電設備定期検査(2号側動力断路器 個別検査)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0934575	九州	2027/10/05 09:00	2027/10/08 18:00	連続	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線1L/赤坂ss 220kV 西福岡赤坂線1L PCM(A)/赤坂ss 220kV 西福岡赤坂線1L PCM(B)/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂ss 6-110(＃1MTr2次)/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 DD盤/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 TP盤/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 LR盤/赤坂ss 220kV西福岡赤坂線 転送送信盤1.2L(A)1L赤TT [ロック]/赤坂ss 220kV西福岡赤坂線 転送送信盤1.2L(B)1L赤TT [ロック]/赤坂ss 66kV母線保護盤(西福岡赤坂1L関係) [ロック]/赤坂ss 66kV母線保護盤(43JKロック、43AT手動)/赤坂ss 制御補助盤(6-110関係)/赤坂ss 計量器盤(＃1MTr関係) [ロック]/赤坂ss トランスジューサー盤(＃1MTr関係) [ロック]/赤坂ss 220kV自動オシロ(西福岡赤坂1L関係) [ロック]	赤坂ss他保護・制御装置取替工事のうち制御装置の取替を実施する。 (撤去)監視制御盤、遠方監視制御装置ほか (新設)電気所サーバ(サーバ架)、電気所サーバ(入出力架)		変更	
0934832	九州	2027/10/05 09:00	2027/10/06 17:00	連続	大隅ss	大隅ss 220kV1号母線/大隅ss 20T-10(20T-10) [加圧停止]/大隅ss 220kV1号母線 BP盤	大隅ssTC整備工事を実施する		変更	
0935410	九州	2027/10/05 09:00	2027/10/05 17:00	単日	220kV 霧島分岐線2L	220kV 霧島分岐線2L/220kV 高野線2L	高野線電線他改修工事(1期)第4延線(2L)に伴うジャンパ開放		変更	
0935235	九州	2027/10/05 17:00	2027/12/01 17:00	連続	220kV 高野線2L(南九州SS～No.63)	220kV 高野線2L(南九州SS～No.63)	高野線電線他改修工事(1期)第4延線(2L)架線工事		変更	
0935499	九州	2027/10/06 09:00	2027/10/28 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線2L(2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線2L(2025/06 運開)	【2026】保安対策(熊本地区)のうち電線付属品修繕工事 220kV熊本南熊本線2L		変更	
0934569	九州	2027/10/06 09:10	2027/10/07 17:50	連続	古賀ss	古賀ss 220kV1号母線/古賀ss 20T-10(＃1、＃2母線連絡用)[加圧停止]/古賀ss 電気所サーバ入出力架1 220kV1号母線PT2次プラグ [ロック]	【新設】IP電気所サーバ(サーバ架×1、入出力架×7) 【撤去】電気所サーバ(サーバ架×1、入出力架×6)、計量器盤×1		変更	
0934567	九州	2027/10/07 07:30	2027/10/07 18:30	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV 2号母線/唐津ss 20-50 [加圧停止]/唐津ss 220kV2号 主要変圧器/唐津ss 6-120 [加圧停止]/唐津ss 20-120 (＃2主変1次) [加圧停止]/唐津ss 20T-10 [加圧停止]	唐津ss 220kV1号 碍子洗浄装置 220kV2号母線 旧20-31母線側碍子 碍洗ノズル外部点検を行う。		変更	
0934670	九州	2027/10/07 07:30	2027/10/07 18:30	単日	大平sws	大平sws 220kV 大平人吉線1L	大平SWS 220kV 1号母線外部点検		変更	
0936271	九州	2027/10/07 07:30	2027/10/07 18:30	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV 2号母線/唐津ss 20-50 [加圧停止]/唐津ss 220kV2号 主要変圧器/唐津ss 6-120 [加圧停止]/唐津ss 20-120 (＃2主変1次) [加圧停止]/唐津ss 20T-10 [加圧停止]	唐津ss 220kV2号母線 母線外部点検を行う。		変更	
0936337	九州	2027/10/07 08:00	2027/10/07 18:00	単日	東大分ss	東大分ss 220kV 東大分線1L 43CA [ロック]/新大分ss 220kV 新大分連絡線1L 43CA[ロック]/大分ss 220kV 東大分線1L 43CA[ロック]/新大分ss 220kV 新大分連絡線1L 43CB[ロック]/東大分ss 220kV 東大分線1L 43CB[ロック]/東大分ss 220kV 東大分線1L 43RCA[ロック]/東大分ss 220kV 東大分線1L 43RCB[ロック]/東大分ss 20-10[加圧停止]/東大分ss 東大分端1L PCM+DZ盤 43JKA [ロック]/東大分ss 東大分端1L PCM+DZ盤 43JKB [ロック]	東大分ss 20-10 220KVガスしゃ断器外部点検		変更	
0934833	九州	2027/10/07 09:00	2027/10/07 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV2号母線/大隅ss 20T-10(20T-10) [加圧停止]/大隅ss 220kV2号母線 BP盤	大隅ssTC整備工事を実施する		変更	
0934671	九州	2027/10/08 07:30	2027/10/08 18:30	単日	大平sws	大平sws 220kV 大平人吉線2L	大平SWS 220kV 2号母線外部点検		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0934579	九州	2027/10/12 07:00	2027/10/15 18:00	連続	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線2L/赤坂ss 220kV 西福岡赤坂線2L PCM(A)/赤坂ss 220kV 西福岡赤坂線2L PCM(B)/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器/赤坂ss 6-120(＃2MTr2次)/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 DD盤/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 TP盤/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 LR盤/赤坂ss 220kV西福岡赤坂線 転送送信盤1.2L(A)2L赤TT [ロック]/赤坂ss 220kV西福岡赤坂線 転送送信盤1.2L(B)2L赤TT [ロック]/赤坂ss 66kV母線保護盤(西福岡赤坂2L関係) [ロック]/赤坂ss 66kV母線保護盤(43JKロック、43AT手動)/赤坂ss 制御補助盤(6-120関係) [ロック]/赤坂ss 計量器盤(＃1MTTr関係) [ロック]/赤坂ss トランスジュサー盤(＃2MTTr関係) [ロック]/赤坂ss 220kV自動オシロ(西福岡赤坂2L関係) [ロック]	赤坂ss他保護・制御装置取替工事のうち制御装置の取替を実施する。 (撤去)監視制御盤、遠方監視制御装置ほか (新設)電気所サーバ(サーバ架)、電気所サーバ(入出力架)		変更	
0934632	九州	2027/10/12 09:00	2027/10/15 17:00	連続	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	苅田分岐線・36、38鉄塔防錆塗装修繕工事(1L)		変更	
0934994	九州	2027/10/12 09:00	2027/10/22 17:00	連続	豊前ss	220kV 大分北線1L/豊前ss 20-50/豊前ss 220kV 大分北線1L DZ盤/豊前ss 220kV 大分北線1L PCM(A)/豊前ss 220kV 大分北線1L PCM(B)/豊前ss 220kV[1-2] PD自動切替盤/豊前ss オシロ送信装置/豊前ss 220kV 1-2母線BP+DZ盤 (220kV大分北線1L)/豊前ss 脱調分離装置/豊前ss 220kV トランスジュサー盤(3)/豊前ss SSC遮断装置(A)/豊前ss SSC遮断装置(B)	豊前変電所 監視制御装置ほか取替工事(220kV大分北線1L)		変更	
0935306	九州	2027/10/12 09:00	2027/10/22 17:00	連続	速見ss	速見ss 220kV 大分北線1L/速見ss 20-50 [加圧停止]/速見ss 220kV 大分北線1L PCM+DZ(A)/速見ss 220kV 大分北線1L PCM+DZ(B)/速見ss 220kV 母線保護 (速見分岐線1号関係) [ロック]/速見ss 220kVトランスジュサー盤 (速見分岐線1号関係) [ロック]/速見ss 自動オシロ送信盤2 20-50 CT2次プラグ[引出し]	速見ss 220kV大分北線保護装置取替工事(1L)		変更	
0935316	九州	2027/10/12 09:00	2027/10/22 17:00	連続	西大分ss	西大分ss 220kV 大分北線1L/西大分ss 20-50 [加圧停止]/西大分ss 220kV 大分北線1L PCM+DZ(A)/西大分ss 220kV 大分北線1L PCM+DZ(B)/西大分ss 220kV母線保護盤 (20-50関係) [ロック]/西大分ss 自動オシロ送信盤(1) 20-50 CT2次プラグ[引出し]/西大分ss 220kV電圧自動切替盤(1) 大分北線1L PT2次プラグ[引出し]/西大分ss 220kV変換器盤(20-50関係) [ロック]/西大分ss 変換器盤(1) (大分1L関係) [ロック]/西大分ss SSC起動装置(A) (大分北線1L関係) [ロック]/西大分ss SSC起動装置(B) (大分北線1L関係) [ロック]/西大分ss 同期投入盤 大分北線1L PT2次プラグ[引出し]	西大分ss 220kV大分北線保護装置取替工事(1L)		変更	
0934570	九州	2027/10/12 09:10	2027/10/14 17:50	連続	古賀ss	古賀ss 220kV2号母線/古賀ss 20T-10(＃1、＃2母線連絡用)[加圧停止]/古賀ss 220kV[1-2] BP+LB盤/古賀ss 220kV[1-2] BU盤/古賀ss 電気所サーバ入出力架1 220kV2号母線PT2次プラグ/古賀ss 電気所サーバ入出力架1 220kV1号母線連絡CT2次プラグ [ロック]	【新設】IP電気所サーバ(サーバ架×1、入出力架×7) 【撤去】電気所サーバ(サーバ架×1、入出力架×6)、計量器盤×1		変更	
0935308	九州	2027/10/13 08:00	2027/10/13 18:00	単日	速見ss	速見ss 220kV 速見分岐線1L/速見ss 20-50 [加圧停止]	速見ss 220kV速見分岐線1L(P201～P202) 屋外鉄構外部点検		変更	
0935236	九州	2027/10/18 08:00	2027/10/23 17:00	連続	220kV 高野線2L(南九州SS～No.63)	220kV 高野線2L(南九州SS～No.63)	高野線防錆塗装修繕工事2027(2L)		変更	
0934637	九州	2027/10/18 09:00	2027/10/20 17:00	連続	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	苅田分岐線・37-1鉄塔防錆塗装修繕工事(2L)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0935040	九州	2027/10/18 09:00	2027/10/19 18:00	連続	中央ss	220kV 山家線1L/中央ss 20-170[加圧停止]	中央ss 20-173 線路PD 66kV 母線PD 簡易点検を行う。		変更	
0935041	九州	2027/10/18 09:00	2027/10/19 18:00	連続	中央ss	220kV 山家線1L/中央ss 20-170[加圧停止]/中央ss 220kV[1-2] BP+LB 盤 常時監視ロック/中央ss 220kV[1-4] BP+LB 盤 常時監視ロック/中央ss 220kV 山家線1L(A+DZ)/中央ss 220kV 山家線1L(B+DZ)	中央ss 20-170 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(パネ)を行う。		変更	
0935260	九州	2027/10/18 09:00	2027/10/18 17:00	単日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	大分幹線地線金具他修繕工事(大分北線1L)		変更	
0935261	九州	2027/10/18 09:00	2027/10/23 17:00	連続	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	大分幹線がしい金具他修繕工事(大分北線1L)		変更	
0935263	九州	2027/10/18 09:00	2027/10/23 17:00	連続	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L/220kV 速見分岐線1L	2026年度鉄塔防錆塗装修繕工事(速見分岐線1L)		変更	
0935264	九州	2027/10/18 09:00	2027/10/23 17:00	連続	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	2026年度鉄塔防錆塗装修繕工事(大分幹線1L)		変更	
0935415	九州	2027/10/18 09:00	2027/10/21 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	管内送電線電線付属品修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線1号線		変更	
0935416	九州	2027/10/18 09:00	2027/10/20 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事(武雄地区)(西佐世保武雄線1号線)		変更	
0935417	九州	2027/10/18 09:00	2027/10/21 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	管内送電線架線金具修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線1号線		変更	
0935419	九州	2027/10/18 09:00	2027/10/22 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	【西佐世保武雄線1号線】がしい金具修繕		変更	
0935450	九州	2027/10/19 08:00	2027/10/19 18:00	単日	久留米ss	久留米ss 220kV 鳥栖木佐木線1L (2026/11 運開) [受電停止]/久留米ss 220kV 鳥栖木佐木線2L (2026/11 運開) [受電停止]/久留米ss 20-30[加圧停止]/久留米ss 20-40[加圧停止]	久留米ss 20-120 GISユニット 外部点検(12年点検)		変更	
0934917	九州	2027/10/19 09:00	2027/10/26 17:00	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	熊本幹線スペース修繕工事		変更	
0935269	九州	2027/10/19 09:00	2027/10/21 17:00	連続	220kV 東佐世保分岐線1L	220kV 東佐世保分岐線1L/220kV 西佐世保武雄線1L (2026/05 運開)	【東佐世保分岐線1号線】鉄塔防錆		変更	
0935451	九州	2027/10/20 08:00	2027/10/20 18:00	単日	久留米ss	久留米ss 220kV 鳥栖木佐木線2L (2026/11 運開)/久留米ss 220kV 鳥栖木佐木線2L PCM+DZ(B)/久留米ss 20-40[加圧停止]/久留米ss 220kV 鳥栖木佐木線2L PCM+DZ(A)	久留米ss 20-40 GISユニット 外部点検【母線PT、線路PT含む】(12年点検)		変更	
0935498	九州	2027/10/20 09:00	2027/10/26 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線2L (2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線2L (2025/06 運開)	2026年度鉄塔防錆塗装修繕工事【2026-2027】 220kV熊本南熊本線2L		変更	
0936373	九州	2027/10/21 08:30	2027/12/01 17:30	連続	220kV 大平人吉線1L (2025/11 運開)	220kV 大平人吉線1L (2025/11 運開)	改修前:・2、鉄塔1基 A410(2)×2 0.5km 改修後:・2、鉄塔1基 A410(2)×2 0.5km シングルワーレン構造鋼管鉄塔の建替 工事区間:・0-1〜・3		変更	
0936267	九州	2027/10/25 08:30	2027/10/29 17:30	連続	220kV 唐津西九州線1L	220kV 唐津西九州線1L	作業鉄塔:・40		変更	
0934636	九州	2027/10/25 09:00	2027/10/27 17:00	連続	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	苅田分岐線・38鉄塔防錆塗装修繕工事(2L)		変更	
0935251	九州	2027/10/25 09:00	2027/10/27 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	管内送電線電線付属品修繕工事(佐賀地区)木佐木線1号線		変更	
0935265	九州	2027/10/25 09:00	2027/10/30 17:00	連続	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	大分幹線がしい金具他修繕工事(大分北線2L)		変更	
0935267	九州	2027/10/25 09:00	2027/10/30 17:00	連続	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L/220kV 速見分岐線2L	2026年度鉄塔防錆塗装修繕工事(速見分岐線2L)		変更	
0935268	九州	2027/10/25 09:00	2027/10/30 17:00	連続	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	2026年度鉄塔防錆塗装修繕工事(大分幹線2L)		変更	
0935317	九州	2027/10/25 09:00	2027/10/25 17:00	単日	西大分ss	220kV 大分北線2L/西大分ss 20-60[加圧停止]	西大分ss 220kV大分幹線2L(大分線)(P104〜P105) 屋外鉄構外部点検		変更	
0935420	九州	2027/10/25 09:00	2027/10/27 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事(武雄地区)(西佐世保武雄線2号線)		変更	
0935421	九州	2027/10/25 09:00	2027/10/28 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	管内送電線電線付属品修繕工事(武雄地区)(西佐世保武雄線2号線)		変更	
0935422	九州	2027/10/25 09:00	2027/10/28 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	管内送電線架線金具修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線2号線		変更	
0935424	九州	2027/10/25 09:00	2027/10/29 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	【西佐世保武雄線2号線】がしい金具修繕		変更	
0935270	九州	2027/10/26 09:00	2027/10/28 17:00	連続	220kV 東佐世保分岐線2L	220kV 東佐世保分岐線2L/220kV 西佐世保武雄線2L (2026/05 運開)	【東佐世保分岐線2号線】鉄塔防錆		変更	
0936268	九州	2027/10/28 08:30	2027/10/29 17:30	毎日	220kV 唐津西九州線1L	220kV 唐津西九州線1L/66kV 唐津神田線1L	作業鉄塔:・1,3,5		変更	
0934628	九州	2027/10/28 09:00	2027/10/29 17:00	連続	220kV 南苅田線	220kV 南苅田線	南苅田北九州線・7,9鉄塔防錆塗装修繕工事		変更	
0934918	九州	2027/10/28 09:00	2027/11/04 17:00	連続	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	熊本幹線スペース修繕工事		変更	
0935253	九州	2027/10/28 09:00	2027/10/30 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	管内送電線電線付属品修繕工事(佐賀地区)木佐木線2号線		変更	
0934560	九州	2027/10/29 08:00	2027/10/29 18:00	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 唐津西九州線1L/西九州ss 20-50 [加圧停止]	西九州ss 20-53 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。		変更	
0935497	九州	2027/10/29 08:00	2027/10/29 14:00	単日	220kV 熊本南熊本線2L (2025/06 運開)/220kV 月引分岐線2L	220kV 熊本南熊本線2L (2025/06 運開)/220kV 月引分岐線2L	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事に伴うジャンパ接続(2L)		変更	
0935126	九州	2027/10/29 09:00	2027/10/29 17:00	単日	熊本ss	500kV 熊本幹線2L/熊本ss 50-60[加圧停止]	熊本SS 50-60 現地制御盤表示器修繕		変更	
0936267	九州	2027/11/01 08:30	2027/11/01 17:30	単日	220kV 唐津西九州線1L	220kV 唐津西九州線1L	作業鉄塔:・40		変更	
0934628	九州	2027/11/01 09:00	2027/11/02 17:00	連続	220kV 南苅田線	220kV 南苅田線	南苅田北九州線・7,9鉄塔防錆塗装修繕工事		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0935307	九州	2027/11/01 09:00	2027/11/11 17:00	連続	速見ss	速見ss 220kV 大分北線2L/速見ss 20-60 [加圧停止]/速見ss 220kV 大分北線2L PCM+DZ(A)/速見ss 220kV 大分北線2L PCM+DZ(B)/速見ss 220kV 母線保護盤 (速見分岐2号関係) [ロック]/速見ss 220kVトランスジュサ盤 (220kV速見分岐線2号関係) [ロック]/速見ss 自動オシロ送信盤2 20-60CT2次プラグ[引出し]	速見ss 220kV大分北線保護装置取替工事を実施する。		変更	
0935318	九州	2027/11/01 09:00	2027/11/11 17:00	連続	西大分ss	西大分ss 220kV 大分北線2L/西大分ss 20-60 [加圧停止]/西大分ss 220kV 大分北線2L PCM+DZ(A)/西大分ss 220kV 大分北線2L PCM+DZ(B)/西大分ss 220kV母線保護盤 (20-60関係) [ロック]/西大分ss 自動オシロ送信盤(1) 20-60 CT2次プラグ[引出し]/西大分ss 220kV電圧自動切替盤(1) 大分北線2L PT2次プラグ[引出し]/西大分ss SSC起動装置(A)(大分北線2L関係) [ロック]/西大分ss 220kV変換器盤(20-60関係) [ロック]/西大分ss 変換器盤(1) (大分2L関係) [ロック]/西大分ss SSC起動装置(B) (大分北線2L関係) [ロック]/西大分ss 同期投入盤 大分北線1L PT2次プラグ[引出し]	西大分ss 220kV大分北線保護装置取替工事(2L)		変更	
0934672	九州	2027/11/02 08:00	2027/11/02 18:00	単日	熊本ss	220kV 熊本日田線2L (2027/02 運開)/熊本ss 20-20[加圧停止]	熊本SS 20-20GCB外部点検		変更	
0935237	九州	2027/11/02 08:00	2027/11/12 18:00	連続	220kV 松島火力線北線1L	220kV 松島火力線北線1L	<TCL-27-003>松島火力線北線1L 電線路細密点検他		変更	
0935310	九州	2027/11/02 08:00	2027/11/02 18:00	単日	速見ss	速見ss 220kV 速見分岐線2L/速見ss 20-60 [加圧停止]	速見ss 220kV速見分岐線2L(P203~P204) 屋外鉄構外部点検		変更	
0934679	九州	2027/11/02 09:00	2027/12/16 17:00	連続	220kV 熊本日田線2L (2027/02 運開)	220kV 熊本日田線2L (2027/02 運開)	熊本日田線一部変更工事(国武・平野地区)のうち架線工事(2L)・96~・103		変更	
0934680	九州	2027/11/02 09:00	2027/12/16 17:00	連続	220kV 熊本日田線2L (2027/02 運開)	220kV 熊本日田線2L (2027/02 運開)	熊本日田線一部変更工事(国武・平野地区)のうち引込変更工事(2L)既・149~日田ss		変更	
0932695	九州	2027/11/04 08:00	2027/11/25 14:00	連続	220kV 熊本南熊本線1L (熊本ss~#59)	220kV 熊本南熊本線1L(熊本ss~#59)	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事(・0-1~・1架線工事1L)		変更	
0935491	九州	2027/11/04 08:30	2027/11/04 14:00	単日	220kV 熊本南熊本線1L (2025/06 運開)/220kV 弓削分岐線1L	220kV 熊本南熊本線1L (2025/06 運開)/220kV 弓削分岐線1L	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事に伴うジャンパ開放(1L)		変更	
0936272	九州	2027/11/04 08:30	2027/11/04 17:30	単日	JR九州新鳥栖ss	220kV 鳥栖JR新鳥栖線1L	JR九州新鳥栖ss 受電設備定期検査(1号側動力断路器 個別検査)		変更	
0935091	九州	2027/11/04 09:00	2027/11/11 17:00	連続	西九州ss	220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 220kV 松島火力線北線1L DZ盤/西九州ss 220kV 松島火力線北線1L PCM(A)/西九州ss 220kV 松島火力線北線1L PCM(B)/西九州ss 220kV 松島火力線北線1L 43DZ[ロック]/西九州ss 220kV 松島火力線北線1L 43CA[ロック]/西九州ss 220kV 松島火力線北線1L 43CB[ロック]/西九州ss 20-90[加圧停止]/西九州ss 松島火力線北線故障点標定装置 20-90関係 [ロック]/西九州ss 220kV PD自動切替盤(2) 20-90関係 [ロック]/西九州ss 220kV自動オシロ送信装置(No.3) 20-90関係 [ロック]/西九州ss 220kV現地制御装置 入出力架(5) A系 [ロック]/西九州ss 220kV現地制御装置 入出力架(5) B系 20-90関係 [ロック]/西九州ss 220kV脱調分離(2) 20-90関係 [ロック]/西九州ss 220kV8D盤 20-90関係 [ロック]/西九州ss 220kV母線保護盤 20-90関係 [ロック]/西九州ss 系統動揺測定装置(No.3) 20-90関係 [ロック]	西九州ss220kV松島火力線北線保護装置取替工事(1L関係切替)		変更	
0935301	九州	2027/11/04 09:00	2027/11/05 17:00	毎日	東佐世保ss	東佐世保ss 220kV 松島火力線北線1L	東佐世保ss 20-93LPD 簡易点検		変更	
0935302	九州	2027/11/04 09:00	2027/11/11 17:00	連続	東佐世保ss	220kV 松島火力線北線1L/東佐世保ss 20-90[加圧停止]	東佐世保ss220kV松島火力線北線保護装置取替工事(1L関係切替)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0935493	九州	2027/11/04 09:00	2027/11/10 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線1L (2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線1L (2025/06 運開)	2026年度鉄塔防錆塗装修繕工事【2026-2027】 220kV熊本南熊本線1L		変更	
0934584	九州	2027/11/04 09:10	2027/11/04 17:50	単日	南福岡ss	南福岡ss 220kV1号母線	南福岡ss 20-120 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧を行う)。		変更	
0936273	九州	2027/11/05 08:30	2027/11/05 17:30	単日	JR九州新鳥栖ss	220kV 鳥栖JR新鳥栖線2L	JR九州新鳥栖ss 受電設備定期検査(2号側動力断路器 個別検査)		変更	
0934585	九州	2027/11/05 09:10	2027/11/05 17:50	単日	南福岡ss	南福岡ss 220kV2号母線	南福岡ss 20-120 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧を行う)。		変更	
0936269	九州	2027/11/08 08:30	2027/11/09 17:30	毎日	220kV 唐津西九州線2L	220kV 唐津西九州線2L	作業鉄塔・13.5		変更	
0936270	九州	2027/11/08 08:30	2027/11/13 17:30	連続	220kV 唐津西九州線2L	220kV 唐津西九州線2L	作業鉄塔・40		変更	
0936667	九州	2027/11/08 08:30	2027/12/09 17:30	連続	西九州ss	220kV 唐津西九州線2L/西九州ss 20-60	ガス断路器×2(20-61、20-62)		新規	
0934629	九州	2027/11/08 09:00	2027/11/17 17:00	連続	220kV 西谷3号線	220kV 西谷3号線	西谷南線鉄塔防錆塗装修繕工事		変更	
0934643	九州	2027/11/08 09:00	2027/11/08 17:00	単日	西谷ss	220kV 西谷3号線/西谷ss 20-70	西谷ss 220kV電力ケーブル(西谷3L) 外部点検を行う。		変更	
0934646	九州	2027/11/09 08:30	2027/11/10 17:30	連続	西谷ss	220kV 西谷3号線/西谷ss 20-70	西谷ss 20-70 GIS 外部点検(12年点検)を行う		変更	
0934647	九州	2027/11/09 08:30	2027/11/09 17:30	単日	西谷ss	220kV 西谷3号線/西谷ss 20-70/西谷ss 220kV1号母線	西谷ss 20-70 GIS 外部点検(12年点検)を行う		変更	
0935086	九州	2027/11/09 08:30	2027/11/09 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 20-90[加圧停止]	西九州ss 20-93 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検		変更	
0935087	九州	2027/11/09 08:30	2027/11/09 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 20-90 [加圧停止]	西九州ss 20-93 ヒンジ部分解体点検に伴う、分岐母線取外付修繕		変更	
0935088	九州	2027/11/09 08:30	2027/11/09 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 20-90 [加圧停止]	西九州ss 20-93 線路PD コンデンサー形計器用変圧器測定試験(簡易点検)		変更	
0935089	九州	2027/11/09 08:30	2027/11/09 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 20-90 [加圧停止]	西九州ss 220kV1号 碓子洗浄装置 20-93 碓洗ノズル外部点検		変更	
0935090	九州	2027/11/09 08:30	2027/11/09 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 20-90 [加圧停止]	西九州ss 220kV1号 碓子洗浄装置 20-93LPD 碓洗ノズル外部点検		変更	
0934920	九州	2027/11/09 09:00	2027/11/10 17:00	連続	500kV 東九州幹線1L	500kV 東九州幹線1L	東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事(2027年度)(東九州幹線1L)		変更	
0934921	九州	2027/11/09 09:00	2027/11/12 17:00	連続	500kV 東九州幹線1L	500kV 東九州幹線1L	東九州幹線がいにし金具他修繕工事(東九州幹線1L)		変更	
0934648	九州	2027/11/10 08:30	2027/11/10 17:30	単日	西谷ss	220kV 西谷3号線/西谷ss 20-70/西谷ss 220kV2号母線	西谷ss 20-70 GIS 外部点検(12年点検)を行う		変更	
0932044	九州	2027/11/10 09:00	2027/11/12 17:00	毎日	220kV 熊本日田線2L (2027/02 運開)	220kV 熊本日田線2L (2027/02 運開)	2026年度鉄塔防錆塗装修繕工事 220kV熊本日田線2L		変更	
0934597	九州	2027/11/10 09:00	2027/11/10 16:00	単日	伊都ss	伊都ss 220kV 脊振伊都線2L/伊都ss 20-20 [加圧停止]/伊都ss 220kV2号送電用変圧器/伊都ss 6-120 [加圧停止]	伊都ss 66kV電力ケーブル(6-120) 電力ケーブル外部点検を行う。		変更	
0934598	九州	2027/11/10 09:00	2027/11/10 18:00	単日	伊都ss	伊都ss 220kV 脊振伊都線2L/伊都ss 220kV 脊振伊都線2L PCM(A)/伊都ss 220kV 脊振伊都線2L PCM(B)/伊都ss 20-20 [加圧停止]/伊都ss 220kV2号送電用変圧器/伊都ss 6-120 [加圧停止]/伊都ss 220kV2号送電用変圧器 主変保護盤	伊都ss 20-20 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(パネ)を行う。		変更	
0934599	九州	2027/11/10 09:00	2027/11/10 18:00	単日	伊都ss	220kV 脊振伊都線2L/伊都ss 220kV 脊振伊都線2L PCM(A)/伊都ss 220kV 脊振伊都線2L PCM(B)/伊都ss 20-20 [加圧停止]/伊都ss 66kV[1-2] 43BP+43LB[ロック]/伊都ss 220kV2号送電用変圧器/伊都ss 6-120 [加圧停止]	伊都ss 6-120 66KVガス絶縁開閉装置外部点検(パネ)を行う。		変更	
0934682	九州	2027/11/10 09:00	2027/11/10 17:00	単日	220kV 熊本日田線2L (2027/02 運開)	220kV 熊本日田線2L (2027/02 運開)	管内送電設備(熊本地区)のうかがいにし金具修繕工事 220kV熊本日田線 2L		変更	
0935437	九州	2027/11/10 09:00	2027/11/11 18:00	連続	東福岡ss	東福岡ss 220kV 山家東福岡線1L 220kV自動オシロ送信盤/東福岡ss 220kV 山家東福岡線1L 電気所サーバ入出力架(C T)/東福岡ss 220kV 山家東福岡線1L/東福岡ss 20-50 [加圧停止]/東福岡ss 220kV 山家東福岡線1L DZ盤/東福岡ss 220kV 山家東福岡線1L PD自動切替盤/東福岡ss 220kV 山家東福岡線1L PCM(A)/東福岡ss 220kV 山家東福岡線1L PCM(B)	東福岡ss220kV母線保護装置、220kVPT切替盤の取替を行う。		変更	
0934919	九州	2027/11/11 09:00	2027/11/12 17:00	連続	500kV 東九州幹線1L	500kV 東九州幹線1L	東九州幹線地線金具修繕工事(東九州幹線1L)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0935438	九州	2027/11/12 09:00	2027/11/15 18:00	連続	東福岡ss	東福岡ss 220kV 山家東福岡線2L 220kV 自動オンロ送信盤/東福岡ss 220kV 山家東福岡線2L 電気所サーバ入出力架(C T)/東福岡ss 220kV 山家東福岡線2L/東福岡ss 20-60 [加圧停止]/東福岡ss 220kV 山家東福岡線2L DZ盤/東福岡ss 220kV 山家東福岡線2L PD自動切替盤/東福岡ss 220kV 山家東福岡線2L PCM(A)/東福岡ss 220kV 山家東福岡線2L PCM(B)	東福岡ss220kV母線保護装置、220kVPT切替盤の取替を行う。		変更	
0934998	九州	2027/11/15 09:00	2027/11/25 17:00	連続	豊前ss	220kV 大分北線2L/豊前ss 20-60/豊前ss 220kV 大分北線2L DZ盤/豊前ss 220kV 大分北線2L PCM(A)/豊前ss 220kV 大分北線2L PCM(B)/豊前ss 220kV[1-2] PD自動切替盤/豊前ss 220kV 1-2母線 BP+DZ盤 (220kV大分北線2L)/豊前ss 脱調分離装置/豊前ss SSC遮断装置(A)/豊前ss SSC遮断装置(B)/豊前ss 220kV トランス ジュウサー盤(3)/豊前ss オンロ送信装置	豊前変電所 監視制御装置ほか取替工事(220kV大分北線2L)		変更	
0935022	九州	2027/11/15 09:00	2027/11/19 18:00	連続	中央ss	中央ss 500kV 熊本幹線2L/中央ss 500kV 熊本幹線2L PCM+DZ(A)/中央ss 500kV 熊本幹線2L PCM+DZ(B)/中央ss 500kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/中央ss 50-60[加圧停止]	中央ss 50-60 550KVガス絶縁開閉装置外部点検を行う。		変更	
0934667	九州	2027/11/16 07:10	2027/11/16 18:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV1号母線	人吉SS 3号主変(20P19~20P20)鉄構外部点検(緩み防止含)		変更	
0934571	九州	2027/11/16 08:00	2027/11/17 19:00	連続	東福岡ss	東福岡ss 220kV 東福岡住吉線1L 220kV 自動オンロ送信盤/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線1L 電気所サーバ入出力架(C T)/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線1L/東福岡ss 20-70 [加圧停止]/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線1L PD自動切替盤/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線1L PCM+DZ(A)/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線1L PCM+DZ(B)/住吉ss 6-110/住吉ss 220kV1号 主要変圧器	東福岡ss220kV母線保護装置、220kVPT切替盤の取替を行う。		変更	
0935238	九州	2027/11/16 08:00	2027/11/26 18:00	連続	220kV 松島火力線北線2L	220kV 松島火力線北線2L	<TCL-27-004>松島火力線北線2L 電線路細密点検他		変更	
0935092	九州	2027/11/16 09:00	2027/11/24 17:00	連続	西九州ss	220kV 松島火力線北線2L/西九州ss 220kV 松島火力線北線2L DZ盤/西九州ss 220kV 松島火力線北線2L PCM(A)/西九州ss 220kV 松島火力線北線2L PC M(B)/西九州ss 220kV 松島火力線北線2L 43DZ[ロック]/西九州ss 220kV 松島火力線北線2L 43CA[ロック]/西九州ss 220kV 松島火力線北線2L 43CB[ロック]/西九州ss 20-100[加圧停止]/西九州ss 220kV母線保護盤 20-100関係 [ロック]/西九州ss 松島火力線北線故障点標定装置 20-100関係 [ロック]/西九州ss 220kV PD自動切替盤(2) 20-100関係 [ロック]/西九州ss 220kV自動オンロ送信装置(No.3) 20-100関係 [ロック]/西九州ss 220kV現地制御装置 入出力架(5) A系 20-100関係 [ロック]/西九州ss 220kV現地制御装置 入出力架(5) B系 20-100関係 [ロック]/西九州ss 系統動揺測定装置(No.3) 20-100関係 [ロック]/西九州ss 220kV脱調分離(2) 20-100関係 [ロック]/西九州ss 220kV8D盤 20-100関係 [ロック]	西九州ss220kV松島火力線北線保護装置取替工事(2L関係切替)		変更	
0935303	九州	2027/11/16 09:00	2027/11/24 17:00	連続	東佐世保ss	220kV 松島火力線北線2L/東佐世保ss 20-100[加圧停止]	東佐世保ss220kV松島火力線北線保護装置取替工事(2L関係切替)		変更	
0934668	九州	2027/11/17 07:10	2027/11/17 18:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV2号母線	人吉SS 3号主変(20P19~20P20)鉄構外部点検(緩み防止含)		変更	
0934923	九州	2027/11/17 09:00	2027/11/18 17:00	連続	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事(2027年度)(東九州幹線2L)		変更	
0934924	九州	2027/11/17 09:00	2027/11/20 17:00	連続	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	東九州幹線がいにし金具他修繕工事(東九州幹線2L)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0934572	九州	2027/11/18 08:00	2027/11/19 19:00	連続	東福岡ss	東福岡ss 220kV 東福岡住吉線2L 220kV 自動オンロ送信盤/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線2L 電気所サーバ入出力架(C T)/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線2L/東福岡ss 20-80 [加圧停止]/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線2L PD自動切替盤/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線2L PCM+DZ(A)/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線2L PCM+DZ(B)/住吉ss 220kV2号 主要変圧器/住吉ss 6-120	東福岡ss220kV母線保護装置、220kVPT切替盤の取替を行う。		変更	
0935284	九州	2027/11/18 08:30	2027/11/19 17:30	毎日	北佐賀ss	北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線2L/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線2L CR-A/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線2L CR-B/北佐賀ss 20-60 [加圧停止]/北佐賀ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック	北佐賀ss 20-60ユニット 220KVガス絶縁周辺装置外部点検		変更	
0935285	九州	2027/11/18 08:30	2027/11/19 17:30	毎日	北佐賀ss	北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線2L/北佐賀ss 20-60 [加圧停止]/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線2L CR-A/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線2L CR-B/北佐賀ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック	北佐賀ss 20-60 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(空気を)を行う		変更	
0934922	九州	2027/11/19 09:00	2027/11/20 17:00	連続	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	東九州幹線地線金具修繕工事(東九州幹線2L)		変更	
0934573	九州	2027/11/22 08:00	2027/11/24 19:00	連続	東福岡ss	東福岡ss 220kV 東福岡住吉線3L 220kV 自動オンロ送信盤/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線3L 電気所サーバ入出力架(C T)/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線3L/東福岡ss 20-90 [加圧停止]/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線3L PD自動切替盤/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線3L PCM+DZ(A)/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線3L PCM+DZ(B)/住吉ss 220kV3号 主要変圧器/住吉ss 6-130	東福岡ss220kV母線保護装置、220kVPT切替盤の取替を行う。		変更	
0934673	九州	2027/11/22 09:00	2027/11/27 17:00	連続	220kV 海崎線1L	220kV 海崎線1L	2026年度鉄塔防錆塗装修繕工事(海崎線1L)		変更	
0934555	九州	2027/11/24 08:30	2027/11/26 17:30	毎日	220kV 都城線1L	220kV 都城線1L	220kV都城線ボルトナット修繕工事(1L)を実施。作業場所:・3・5・8・10・13・16・26・29・31・34		変更	
0935258	九州	2027/11/24 09:00	2027/12/13 17:00	連続	220kV 北九州豊前線2L	220kV 北九州豊前線2L	大分幹線架空地線張替工事(頂吉地区)に伴う連続停止【2L】		変更	
0935452	九州	2027/11/25 08:00	2027/11/25 18:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L/木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L PCM+DZ(A)/木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L PCM+DZ(B)/木佐木ss 20-50[加圧停止]/木佐木ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	木佐木ss 20-50 GCB 外部点検		変更	
0935492	九州	2027/11/25 08:30	2027/11/25 14:00	単日	220kV 熊本南熊本線1L (2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線1L (2025/06 運開)/220kV 弓削分岐線1L	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事に伴うジャンパ接続(1L)		変更	
0935453	九州	2027/11/26 08:00	2027/11/26 18:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線2L/木佐木ss 20-60[加圧停止]	木佐木ss 20-63 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。		変更	
0935454	九州	2027/11/26 08:00	2027/11/26 18:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線2L/木佐木ss 20-60[加圧停止]/木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線2L PCM+DZ(A)/木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線2L PCM+DZ(B)/木佐木ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	木佐木ss 20-60 GCB 外部点検		変更	
0935455	九州	2027/11/26 08:00	2027/11/26 18:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木ss 20-63 線路PD簡易点検		変更	
0934674	九州	2027/11/29 09:00	2027/12/04 17:00	連続	220kV 海崎線2L	220kV 海崎線2L	2026年度鉄塔防錆塗装修繕工事(海崎線2L)		変更	
0936374	九州	2027/12/01 08:30	2027/12/01 17:30	単日	220kV 大平人吉線1L (2025/11 運開)	220kV 大平人吉線1L (2025/11 運開)	改修前:・2、鉄塔1基 A410(2)×2 0.5km 改修後:・2、鉄塔1基 A410(2)×2 0.5km シングルワーレン構造鋼管鉄塔の建替 工事区間:・0-1~・3		変更	
0935244	九州	2027/12/01 09:00	2027/12/10 17:00	連続	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	東福岡幹線ダンパ修繕工事(2027)		変更	
0935245	九州	2027/12/01 09:00	2027/12/10 17:00	連続	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	東福岡幹線スベーサ修繕工事(2027)		変更	
0935246	九州	2027/12/01 09:00	2027/12/10 17:00	連続	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	東福岡幹線鉄塔防錆塗装工事(2026-2027)		変更	
0935411	九州	2027/12/02 09:00	2027/12/02 17:00	単日	220kV 霧島分岐線2L	220kV 霧島分岐線2L/220kV 高野線2L	高野線電線他改修工事(1期)第4延線(2L)に伴うジャンパ接続		変更	
0935412	九州	2027/12/02 17:00	2027/12/03 17:00	連続	220kV 霧島分岐線2L	220kV 霧島分岐線2L/220kV 高野線2L	高野線電線他改修工事(1期)第4延線(2L)に伴う社内検査電気試験		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0935124	九州	2027/12/06 08:00	2027/12/10 18:00	連続	熊本ss	熊本ss 500kV 熊本幹線1L/熊本ss 50-50[加圧停止]/熊本ss 500kV 熊本幹線1L PCM+DZ(A)/熊本ss 500kV 熊本幹線1L PCM+DZ(B)	熊本ss 50-50 550KVガス絶縁開閉装置外部点検を行う。		変更	
0934909	九州	2027/12/06 09:00	2027/12/15 17:00	連続	500kV 脊振幹線1L	500kV 脊振幹線1L	脊振幹線径間スベーサ修繕工事(2027)		変更	
0934911	九州	2027/12/06 09:00	2027/12/15 17:00	連続	500kV 脊振幹線1L	500kV 脊振幹線1L	脊振幹線鉄塔防錆塗装工事(2026-2027)		変更	
0934556	九州	2027/12/07 08:30	2027/12/09 17:30	毎日	220kV 都城線2L	220kV 都城線2L	220kV都城線ボルトナット修繕工事(2L)を実施。 作業場所:・3・5・8・10・13・16・26・29・31・34		変更	
0935127	九州	2027/12/13 08:00	2027/12/17 18:00	連続	熊本ss	熊本ss 500kV 熊本幹線2L/熊本ss 50-60[加圧停止]/熊本ss 500kV 熊本幹線2L PCM+DZ(A)/熊本ss 500kV 熊本幹線2L PCM+DZ(B)	熊本ss 50-60 550KVガス絶縁開閉装置外部点検を行う。		変更	
0935320	九州	2027/12/14 10:00	2027/12/14 12:00	単日	西大分ss	西大分ss 20-70[加圧停止]/西大分ss 20-73[切]	西大分ss 20-73 開閉試験		変更	
0934820	九州	2027/12/16 08:00	2027/12/16 18:00	単日	霧島ss	霧島ss 20T-10(220KV#A、#B母線連絡用)[加圧停止]/霧島ss 220kV #B母線/霧島ss 220kV2号 主要変圧器	霧島ss 20T-10 220kVガスしゃ断器外部点検(東芝、GSR、2000A)を行う		変更	
0934681	九州	2027/12/16 09:00	2027/12/16 17:00	単日	220kV 熊本日田線2L (2027/02 運開)	220kV 熊本日田線2L (2027/02 運開)	熊本日田線一部変更工事(国武・平野地区)のうち架線工事(2L)・96～103【電気試験】		変更	
0934626	九州	2027/12/17 10:00	2027/12/17 13:00	単日	中央ss	220kV 筑豊線1L/筑豊ss 220kV1号母線/中央ss 220kV筑豊線1L PCM「14 3RC」[ロック]/中央ss 220kV筑豊線1L DZ「143KH」[仮保護]/筑豊ss 220kV筑豊線1L PCM「143RC」[ロック]/筑豊ss 電気所サーバ入出力架(1)「220kV1号母線PT2次プラグ」[引抜き]	筑豊ss20T-10CB取替工事		変更	
0935500	九州	2028/01/04 09:00	2028/01/04 13:00	単日	220kV 熊本南熊本線2L	220kV 熊本南熊本線2L	熊本南熊本線一部変更工事(益城地区)に伴うジャンパ開放 220kV熊本南熊本線 2L ・59開放		変更	
0935502	九州	2028/01/04 09:00	2028/02/21 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線2L (2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線2L (2025/06 運開)	熊本南熊本線一部変更工事(益城地区)2L架線工事(鉄塔組立含む)		変更	
0934926	九州	2028/01/11 09:00	2028/03/24 17:00	連続	500kV 佐賀幹線1L (2027/03 運開)	500kV 佐賀幹線1L (2027/03 運開)	佐賀幹線電線張替工事(2期)第3延線【1L】		変更	
0934927	九州	2028/01/11 09:00	2028/03/24 17:00	連続	500kV 佐賀幹線1L (2027/03 運開)	500kV 佐賀幹線1L (2027/03 運開)	佐賀幹線電線張替工事(2期)第13延線【1L】		変更	
0934928	九州	2028/01/11 09:00	2028/03/24 17:00	連続	500kV 佐賀幹線1L (2027/03 運開)	500kV 佐賀幹線1L (2027/03 運開)	佐賀幹線電線張替工事(2期)第5延線【1L】		変更	
0934929	九州	2028/01/11 09:00	2028/03/24 17:00	連続	500kV 佐賀幹線1L (2027/03 運開)	500kV 佐賀幹線1L (2027/03 運開)	佐賀幹線電線張替工事(2期)第8延線【1L】		変更	
0934930	九州	2028/01/11 09:00	2028/03/24 17:00	連続	500kV 佐賀幹線1L (2027/03 運開)	500kV 佐賀幹線1L (2027/03 運開)	佐賀幹線電線張替工事(2期)第10延線【1L】		変更	
0934645	九州	2028/01/17 09:00	2028/01/21 17:00	連続	西谷ss	220kV 西谷3号線/西谷ss 20-70/西谷ss 220kV 西谷3号線 CR-A/西谷ss 220kV 西谷3号線 CR-B/西谷ss 220kV 西谷3号線 DZ盤/西谷ss 220kV V[1-2] 43LB[ロック]/西谷ss 220kV 電気所サーバ 入出力架5 西谷3L PC T プラグ【引出し】[ロック]/西谷ss 西谷ss 220kVVPD自動切替盤 西谷3L PT プラグ【引出し】/西谷ss 220kV自動オンロ送信盤(1) 西谷3L CTプラグ【引出し】/西谷ss 西谷ss 220kV母線保護 西谷3L CTプラグ【引出し】 赤T・T【外し】 常時監視【ロック】	西谷ss 220kV西谷3号線保護装置取替工事を実施 【新設】 ・220kVPCM+DZ(A)(B) 【撤去】 ・220kVPCM(A)、(B)、220kVDZ		変更	
0934811	九州	2028/01/17 09:00	2028/01/21 17:00	連続	高野sws	220kV 大隅線1L/高野sws 220kV 大隅線1L BP盤/高野sws 220kV 大隅線1L D Z盤/高野sws 220kV 大隅線1L 電気所サーバ/高野sws 220kV 大隅線1L PCM +DZ/高野sws 220kV 大隅線1L PT自動切替盤/高野sws 220kV 大隅線1L 220kV自動オンロ送信盤/高野sws 20-10[加圧停止]	220kV都城線保護装置を2系列化し、保護機能の信頼度向上を図る。		変更	
0934822	九州	2028/01/17 09:00	2028/01/21 17:00	連続	大隅ss	220kV 大隅線1L/大隅ss 220kV 大隅線1L PCM+DZ/大隅ss 20-10[加圧停止]	大隅ssTC整備工事を実施する		変更	
0934823	九州	2028/01/17 09:00	2028/01/21 17:00	連続	大隅ss	220kV 大隅線1L/大隅ss 20-10[加圧停止]/大隅ss 220kV 大隅線1L PCM+DZ	新設:PCM+DZ×2 (川内NPSから流用) 撤去:PCM×2、DZ×1		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0934959	九州	2028/01/17 09:00	2028/01/21 17:00	連続	北九州ss	北九州ss 220kV[3-4] 43LB[ロック]/北九州ss 西谷3L 制御端末(BCU)A系、B系 PCTフラグ、赤T.T [ロック]/北九州ss 220kVオシロ送信盤(2) 西谷3L CTフラグ [ロック]/北九州ss 220kV#3,4母線保護 西谷3L PCTフラグ、赤T.T、43JK [ロック]/北九州ss 220kV3,4PD自動切替盤 西谷3L PTフラグ [ロック]/北九州ss 220kV 西谷3号線/北九州ss 220kV 西谷3号線 C R-A/北九州ss 220kV 西谷3号線 C R-B/北九州ss 220kV 西谷3号線 DZ盤/北九州ss 20-170	北九州ss 220kV西谷3号線保護装置取替工事		変更	
0934800	九州	2028/01/18 08:00	2028/01/20 17:00	連続	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線・43～・44(※) 1L 径間スベーサ取替 ※直接での実施区間は請負会社の実施区間との兼ね合いで変更の可能性あり		変更	
0934801	九州	2028/01/18 09:00	2028/01/20 17:00	連続	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	220kV大隅線スベーサ修繕工事(1L)を実施する。 実施箇所:・27～・43		変更	
0935247	九州	2028/01/18 09:00	2028/01/27 17:00	連続	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	東福岡幹線ダンパ修繕工事(2027)		変更	
0935248	九州	2028/01/18 09:00	2028/01/27 17:00	連続	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	東福岡幹線スベーサ修繕工事(2027)		変更	
0935249	九州	2028/01/18 09:00	2028/01/27 17:00	連続	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	東福岡幹線鉄塔防錆塗装工事(2026-2027)		変更	
0936376	九州	2028/01/19 08:30	2028/03/09 17:30	連続	220kV 大平人吉線2L (2025/11 運開)	220kV 大平人吉線2L (2025/11 運開)	改修前:・2、鉄塔1基 A410(2)×2 0.5km 改修後:・2、鉄塔1基 A410(2)×2 0.5km シングルワーレン構造鋼管鉄塔の建替 工事区間:・0-1～・3		変更	
0932040	九州	2028/01/19 09:00	2028/01/21 17:00	毎日	220kV 熊本日田線1L (2027/02 運開)	220kV 熊本日田線1L (2027/02 運開)	2026年度鉄塔防錆塗装修繕工事 220kV熊本日田線1L		変更	
0934675	九州	2028/01/19 09:00	2028/03/07 17:00	連続	220kV 熊本日田線1L (2027/02 運開)	220kV 熊本日田線1L (2027/02 運開)	熊本日田線一部変更工事(国武・平野地区)のうち引込変更工事(1L)既・149～日田ss		変更	
0934676	九州	2028/01/19 09:00	2028/03/07 17:00	連続	220kV 熊本日田線1L (2027/02 運開)	220kV 熊本日田線1L (2027/02 運開)	熊本日田線一部変更工事(国武・平野地区)のうち架線工事(1L)・96～・103		変更	
0934678	九州	2028/01/19 09:00	2028/01/19 17:00	単日	220kV 熊本日田線1L (2027/02 運開)	220kV 熊本日田線1L (2027/02 運開)	管内送電設備(熊本地区)のうちのいい金具修繕工事 220kV 熊本日田線 1L		変更	
0934805	九州	2028/01/24 08:00	2028/01/28 18:00	連続	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	OPGW張替 ・59～・60間2L側OPGW		変更	
0934812	九州	2028/01/24 09:00	2028/01/28 17:00	連続	高野sws	220kV 大隅線2L/高野sws 220kV 大隅線2L BP盤/高野sws 220kV 大隅線2L DZ盤/高野sws 220kV 大隅線2L 電気所サー・V/高野sws 220kV 大隅線2L PCM+DZ/高野sws 220kV 大隅線2L PT自動切替盤/高野sws 220kV 大隅線2L 220kV自動オシロ送信盤/高野sws 20-20[加圧停止]	220kV都城線保護装置を2系列化し、保護機能の信頼度向上を図る。		変更	
0934824	九州	2028/01/24 09:00	2028/01/28 17:00	連続	大隅ss	220kV 大隅線2L/大隅ss 220kV 大隅線2L PCM+DZ/大隅ss 20-20[加圧停止]	大隅ssTC整備工事を実施する		変更	
0934825	九州	2028/01/24 09:00	2028/01/28 17:00	連続	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線2L/大隅ss 220kV 大隅線2L PCM+DZ/大隅ss 20-20[加圧停止]	新設:PCM+DZ×2 (川内NPSから流用) 撤去:PCM×2、DZ×1		変更	
0936428	九州	2028/01/24 09:10	2028/01/24 17:50	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/西福岡ss 220kV[2-3] BP+LB盤 常時監視ロック/西福岡ss 220kV1号母線/西福岡ss 20T-10(#1 #2母線連絡) [加圧停止]	西福岡ss 20T-10 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(GC B)を行う。		変更	
0934592	九州	2028/01/25 09:10	2028/01/25 17:50	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/西福岡ss 220kV[2-3] BP+LB盤 常時監視ロック/西福岡ss 220kV3号母線/西福岡ss 20T-20(#2 #3母線連絡) [加圧停止]	西福岡ss 20T-20 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(GC B)を行う。		変更	
0936429	九州	2028/01/25 09:10	2028/01/25 17:50	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV2号母線/西福岡ss 20T-20(#2 #3母線連絡)[加圧停止]/西福岡ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/西福岡ss 220kV[2-3] BP+LB盤 常時監視ロック	西福岡ss 20T-20 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(GC B)を行う。		変更	
0934912	九州	2028/02/01 09:00	2028/02/10 17:00	連続	500kV 脊振幹線2L	500kV 脊振幹線2L	脊振幹線径間スベーサ修繕工事(2027)		変更	
0934914	九州	2028/02/01 09:00	2028/02/10 17:00	連続	500kV 脊振幹線2L	500kV 脊振幹線2L	脊振幹線鉄塔防錆塗装工事(2026-2027)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0935427	九州	2028/02/01 09:00	2029/10/19 17:00	連続	到津ss	220kV 到津線1L/到津ss 220kV 到津線1L PCM(A)/到津ss 220kV 到津線1L PCM(B)/到津ss 20-70/到津ss 220kV BP+LB 20-70個別/到津ss 自動オシロ送信盤 20-70個別/到津ss 到津ss 電気所サーバ 20-70個別	到津ss220kV総合更新工事(20-70GIS取替工事)		変更	
0936330	九州	2028/02/01 09:00	2029/10/19 17:00	連続	槻田sws	220kV 到津線1L/槻田sws 220kV 到津線1L PCM+DZ(A)/槻田sws 220kV 到津線1L PCM+DZ(B)/槻田sws 20-70/槻田sws 220kV自動オシロ送信盤 20-70関係個別ロック [ロック]/槻田sws 電気所サーバ出力架 20-70関係個別ロック [ロック]/槻田sws 220kV[1-2]BP+LB盤 20-70関係個別ロック [ロック]	槻田sws20-70GIS取替工事		変更	
0934803	九州	2028/02/07 08:00	2028/02/14 18:00	連続	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	がいにし取替 ・69、76、78、83、84、87、89、93		変更	
0934804	九州	2028/02/07 09:00	2028/02/09 17:00	連続	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	220kV大隅線スベータ修繕工事(2L)を実施する。 実施箇所:・27～・43		変更	
0934806	九州	2028/02/07 09:00	2028/02/12 17:00	連続	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	作業箇所:・45、47、56、58		変更	
0935122	九州	2028/02/15 09:00	2028/02/15 17:00	単日	熊本ss	500kV 熊本幹線1L/熊本ss 50-50[加圧停止]	熊本ss 50-50ユニット 50-50GIS ガスBgUT測定ほかを行う。		変更	
0936375	九州	2028/02/19 08:30	2028/03/08 17:30	連続	220kV 大平人吉線2L (2025/11 運開)	220kV 大平人吉線2L (2025/11 運開)	架空地線張替 大平PS(・0.1)～・14 IACSR97mm2 → AC150mm2 ・10～・14は2022年12月に改修済		変更	
0935501	九州	2028/02/21 09:00	2028/02/21 13:00	単日	220kV 熊本南熊本線2L	220kV 熊本南熊本線2L	熊本南熊本線一部変更工事(益城地区)に伴うジャンパ接続 220kV熊本南熊本線2L ・59接続		変更	
0935503	九州	2028/02/21 13:00	2028/02/21 17:00	単日	220kV 熊本南熊本線2L (2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線2L (2025/06 運開)	熊本南熊本線一部変更工事(益城地区)2L電気試験		変更	
0936802	九州	2028/02/22 09:00	2028/03/02 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線2L	220kV 熊本南熊本線2L	熊本三池線がいにし外取替工事(大津地区)のうち熊本南熊本線2L		新規	
0936803	九州	2028/02/22 09:00	2028/02/22 13:00	単日	220kV 熊本南熊本線2L	220kV 熊本南熊本線2L	熊本三池線がいにし外取替工事(大津地区)に伴うジャンパ開放・接続 220kV熊本南熊本線2L ・59開放		新規	
0936804	九州	2028/03/02 09:00	2028/03/02 13:00	単日	220kV 熊本南熊本線2L	220kV 熊本南熊本線2L	熊本三池線がいにし外取替工事(大津地区)に伴うジャンパ開放・接続 220kV熊本南熊本線2L ・59接続		新規	
0934991	九州	2028/03/04 09:00	2028/03/04 17:00	単日	豊前ss	豊前ss 20-50[加圧停止]/豊前ss 220kV 大分北線1L PCM(A)/豊前ss 2 20kV[1-2] 43LB[ロック]	豊前ss 220kV大分北線1L(A) 動作試験(デジタル)を行う		変更	
0934995	九州	2028/03/04 09:00	2028/03/04 17:00	単日	豊前ss	豊前ss 20-60[加圧停止]/豊前ss 220kV 大分北線2L PCM(A)/豊前ss 2 20kV[1-2] 43LB[ロック]	豊前ss 220kV大分北線2L(A) 動作試験(デジタル)を行う		変更	
0934992	九州	2028/03/05 09:00	2028/03/05 17:00	単日	豊前ss	豊前ss 20-50[加圧停止]/豊前ss 220kV 大分北線1L PCM(B)/豊前ss 2 20kV[1-2] 43LB[ロック]	豊前ss 220kV大分北線1L(B) 動作試験(デジタル)を行う		変更	
0934996	九州	2028/03/05 09:00	2028/03/05 17:00	単日	豊前ss	豊前ss 20-60 [加圧停止]/豊前ss 220kV 大分北線2L PCM(B)/豊前ss 2 20kV[1-2] 43LB[ロック]	豊前ss 220kV大分北線2L(B) 動作試験(デジタル)を行う		変更	
0934993	九州	2028/03/06 09:00	2028/03/06 17:00	単日	豊前ss	豊前ss 20-50[加圧停止]/豊前ss 220kV 大分北線1L DZ盤	豊前ss 220kV大分北線1L(DZ) 動作試験(デジタル)を行う		変更	
0934997	九州	2028/03/06 09:00	2028/03/06 17:00	単日	豊前ss	豊前ss 20-60[加圧停止]/豊前ss 220kV 大分北線2L DZ盤	豊前ss 220kV大分北線2L(DZ) 動作試験(デジタル)を行う		変更	
0935487	九州	2028/03/06 09:00	2028/03/17 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線1L	220kV 熊本南熊本線1L	熊本三池線がいにし外取替工事(大津地区)のうち熊本南熊本線1L		変更	
0935494	九州	2028/03/06 09:00	2028/03/06 13:00	単日	220kV 熊本南熊本線1L	220kV 熊本南熊本線1L	熊本三池線がいにし外取替工事(大津地区)に伴うジャンパ開放 220kV熊本南熊本線1L ・59開放		変更	
0934677	九州	2028/03/07 09:00	2028/03/07 17:00	単日	220kV 熊本日田線1L (2027/02 運開)	220kV 熊本日田線1L (2027/02 運開)	熊本日田線一部変更工事(国武・平野地区)のうち架線工事 (1L)・96～・103【電気試験】		変更	
0934807	九州	2028/03/09 08:00	2028/03/15 17:00	連続	220kV 鹿児島南線1L	220kV 鹿児島南線1L	防錆塗装		変更	
0934814	九州	2028/03/09 08:00	2028/03/09 18:00	単日	鹿児島ss	220kV 鹿児島南線1L[受電停止]/鹿児島ss 220kV母線(南線1L側)/鹿児島ss 220kV1号 主要変圧器 [配融+バンク融通]	鹿児島ss 220kV母線 PD(南線1L側) コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。		変更	
0934815	九州	2028/03/09 08:00	2028/03/09 18:00	単日	鹿児島ss	220kV 鹿児島南線1L/鹿児島ss 20-10 [加圧停止]/鹿児島ss 220kV母線(南線1L側)	鹿児島ss 20-10 220kVガスしゃ断器外部点検(日立、OFPTB、4000A)を行う		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0936377	九州	2028/03/09 08:30	2028/03/09 17:30	単日	220kV 大平人吉線2L (2025/11 運開)	220kV 大平人吉線2L (2025/11 運開)	改修前:・2、鉄塔1基 A410(2)×2 0.5km 改修後:・2、鉄塔1基 A410(2)×2 0.5km シングルワーレン構造鋼管鉄塔の建替 工事区間:・0-1～・3		変更	
0934813	九州	2028/03/09 09:00	2028/03/10 17:00	毎日	鹿児島ss	鹿児島ss 220kV 鹿児島南線1L/鹿児島ss 20-10 [加圧停止]	鹿児島ss(代表)220kV鹿児島南線1L(20P1～20P2)屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0936358	九州	2028/03/10 08:00	2028/03/10 18:00	単日	南九州ss	220kV 鹿児島南線1L	南九州ss 20-12 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。		変更	
0934818	九州	2028/03/13 08:00	2028/03/13 18:00	単日	鹿児島ss	鹿児島ss 20-110(220kV1号主要変圧器)/鹿児島ss 220kV母線(南線1L側)/鹿児島ss 220kV1号 主要変圧器	鹿児島ss 20-110 220kVガスしゃ断器外部点検(日立、OFPTB, 2000A)を行う		変更	
0934808	九州	2028/03/16 08:00	2028/03/21 17:00	連続	220kV 鹿児島南線2L	220kV 鹿児島南線2L	防錆塗装		変更	
0934816	九州	2028/03/16 08:00	2028/03/16 18:00	単日	鹿児島ss	220kV 鹿児島南線2L/鹿児島ss 20-20 [加圧停止]/鹿児島ss 220kV母線(南線2L側)	鹿児島ss 20-20 220kVガスしゃ断器外部点検(日立、OFPTB, 4000A)を行う。		変更	
0934817	九州	2028/03/16 09:00	2028/03/17 17:00	毎日	鹿児島ss	鹿児島ss 220kV 鹿児島南線2L/鹿児島ss 20-20 [加圧停止]	鹿児島ss 220kV鹿児島南線2L(20P2～20P3)屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0934819	九州	2028/03/17 08:00	2028/03/17 18:00	単日	鹿児島ss	鹿児島ss 220kV母線(南線2L側)/鹿児島ss 220kV2号 主要変圧器	鹿児島ss 20-120 220kVガスしゃ断器外部点検(日立、OFPTB, 2000A)を行う		変更	
0936359	九州	2028/03/17 08:00	2028/03/17 18:00	単日	南九州ss	220kV 鹿児島南線2L	南九州ss 20-22 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。		変更	
0935495	九州	2028/03/17 09:00	2028/03/17 13:00	単日	220kV 熊本南熊本線1L	220kV 熊本南熊本線1L	熊本三池線がいし外取替工事(大津地区)に伴うジャンパ接続220kV熊本南熊本線1L・59接続		変更	
0935227	九州	2028/03/22 09:00	2028/04/26 09:00	連続	220kV 鳥栖木佐木線2L (2026/11 運開)(#36～木佐木ss)	220kV 鳥栖木佐木線2L (2026/11 運開) (#36～木佐木ss)	鳥栖三池線総合更新工事(西島地区)2L停止【一部使用開始】		変更	
0936328	九州	2028/03/22 09:00	2028/03/22 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線2L (2026/11 運開)	220kV 鳥栖木佐木線2L (2026/11 運開)	鳥栖三池線2L関連停止【鳥栖三池線総合更新工事(西島地区)に伴うJP開放		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
1003011	沖縄	2026/04/01 09:00	2026/04/02 17:00	毎日	西原幹線1号	西原幹線1号	西原幹線1号 前田線電線張替に伴う保安停止		新規	
1003012	沖縄	2026/04/01 09:00	2026/04/03 17:00	毎日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号 がいいし調査		新規	
1003013	沖縄	2026/04/06 09:00	2026/04/06 17:00	単日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号 がいいし調査		新規	
1003014	沖縄	2026/04/07 09:00	2026/04/10 17:00	毎日	友寄幹線2号	友寄幹線2号	友寄幹線2号 がいいし調査		新規	
1002720	沖縄	2026/04/13 09:00	2026/04/14 17:00	毎日	西那覇友寄幹線1号	西那覇友寄幹線1号	西那覇友寄幹線1号 CB定期点検		変更	
1002726	沖縄	2026/04/15 09:00	2026/04/16 17:00	毎日	西那覇友寄幹線2号	西那覇友寄幹線2号	西那覇友寄幹線2号 CB定期点検		変更	
1003015	沖縄	2026/04/23 09:00	2026/04/24 17:00	毎日	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号 がいいし調査		新規	
1002681	沖縄	2026/05/01 09:00	2026/05/01 17:00	単日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 がいいし調査		変更	
1002628	沖縄	2026/05/07 09:00	2026/05/08 17:00	毎日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号 がいいし調査		変更	
1002631	沖縄	2026/05/11 09:00	2026/05/12 17:00	毎日	友寄幹線2号	友寄幹線2号	友寄幹線2号 がいいし調査		変更	
1002630	沖縄	2026/05/13 09:00	2026/05/14 17:00	毎日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号 がいいし調査		変更	
1003016	沖縄	2026/05/15 09:00	2026/05/16 17:00	毎日	友寄幹線2号	友寄幹線2号	友寄幹線2号 がいいし調査		新規	
1002706	沖縄	2026/05/18 09:00	2026/05/19 17:00	毎日	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号 腕金ボルト取替工事		変更	
1003017	沖縄	2026/05/18 09:00	2026/05/18 17:00	単日	渡口幹線1号	渡口幹線1号	渡口幹線1号 保安停止		新規	
1002707	沖縄	2026/05/19 09:00	2026/05/19 17:00	単日	渡口幹線2号	渡口幹線2号	渡口幹線2号 保安停止		変更	
1002633	沖縄	2026/05/20 09:00	2026/05/23 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 保安停止		変更	
1003018	沖縄	2026/05/25 09:00	2026/05/26 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 保安停止		新規	
1003019	沖縄	2026/06/01 09:00	2026/06/06 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 保安停止		新規	
1003020	沖縄	2026/06/08 09:00	2026/06/09 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 CB定期点検		新規	
1003021	沖縄	2026/06/08 09:00	2026/06/12 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 保安停止		新規	
1003022	沖縄	2026/06/15 09:00	2026/06/16 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 CB定期点検		新規	
1003023	沖縄	2026/06/15 09:00	2026/06/19 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 保安停止		新規	
1002638	沖縄	2026/06/22 09:00	2026/06/22 17:00	単日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 がいいし調査		変更	
1002686	沖縄	2026/06/22 09:00	2026/06/22 17:00	単日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 がいいし調査		変更	
1002678	沖縄	2026/06/24 09:00	2026/06/26 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 がいいし調査		変更	
1002679	沖縄	2026/06/24 09:00	2026/06/26 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 がいいし調査		変更	
1002643	沖縄	2026/06/29 09:00	2026/06/29 17:00	単日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 がいいし調査		変更	
1003024	沖縄	2026/06/29 09:00	2026/06/29 17:00	単日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 がいいし調査		新規	
1002688	沖縄	2026/07/01 09:00	2026/07/04 17:00	連続	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 複導体がいし取替		変更	
1003025	沖縄	2026/07/01 09:00	2026/07/01 17:00	単日	渡口幹線1号	渡口幹線1号	渡口幹線1号 保安停止		新規	
1003026	沖縄	2026/07/03 09:00	2026/07/03 17:00	単日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 がいいし調査		新規	
1002612	沖縄	2026/07/06 09:00	2026/07/10 17:00	毎日	西原幹線2号	西原幹線2号	西原幹線2号 がいいし調査		変更	
1002691	沖縄	2026/07/06 09:00	2026/07/11 17:00	連続	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 複導体がいし取替		変更	
1002611	沖縄	2026/07/13 09:00	2026/07/17 17:00	毎日	西原幹線1号	西原幹線1号	西原幹線1号 がいいし調査		変更	
1002692	沖縄	2026/07/13 09:00	2026/07/17 17:00	連続	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 複導体がいし取替		変更	
1002695	沖縄	2026/07/21 09:00	2026/07/25 17:00	連続	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 複導体がいし取替		変更	
1003027	沖縄	2026/07/21 09:00	2026/07/21 17:00	単日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 がいいし調査		新規	
1003028	沖縄	2026/07/22 09:00	2026/07/22 17:00	単日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 がいいし調査		新規	
1003029	沖縄	2026/07/24 09:00	2026/07/24 17:00	単日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 がいいし調査		新規	
1002696	沖縄	2026/07/27 09:00	2026/08/01 17:00	単日	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 複導体がいし取替		変更	
1003030	沖縄	2026/07/27 09:00	2026/07/31 17:00	毎日	西原幹線1号	西原幹線1号	西原幹線1号 鉄塔部材取替		新規	
1003031	沖縄	2026/08/03 09:00	2026/08/07 17:00	連続	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 複導体がいし取替		新規	
1003032	沖縄	2026/08/03 09:00	2026/08/07 17:00	毎日	西原幹線2号	西原幹線2号	西原幹線2号 鉄塔部材取替		新規	
1003033	沖縄	2026/08/03 09:00	2026/08/04 17:00	毎日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号 CB定期点検		新規	
1003034	沖縄	2026/08/05 09:00	2026/08/06 17:00	毎日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 CB定期点検		新規	
1003035	沖縄	2026/08/10 09:00	2026/08/10 17:00	単日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 がいいし調査		新規	
1003036	沖縄	2026/08/10 09:00	2026/08/15 17:00	連続	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 複導体がいし取替		新規	
1003037	沖縄	2026/08/10 09:00	2026/08/10 17:00	単日	具志川火力線1号	具志川火力線1号	具志川火力線1号 塔体及び腕金塗装		新規	
1003038	沖縄	2026/08/12 09:00	2026/08/12 17:00	単日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 がいいし調査		新規	
1003039	沖縄	2026/08/12 09:00	2026/08/12 17:00	単日	具志川火力線1号	具志川火力線1号	具志川火力線1号 塔体及び腕金塗装		新規	
1002634	沖縄	2026/08/13 09:00	2026/08/14 17:00	毎日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号 塔体及び腕金塗装工事		変更	
1003040	沖縄	2026/08/17 09:00	2026/08/19 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 がいいし調査		新規	
1003041	沖縄	2026/08/17 09:00	2026/08/22 17:00	連続	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 複導体がいし取替		新規	
1003042	沖縄	2026/08/24 09:00	2026/08/26 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 がいいし調査		新規	
1003043	沖縄	2026/08/24 09:00	2026/08/26 17:00	連続	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 複導体がいし取替		新規	
1003044	沖縄	2026/08/29 09:00	2026/08/29 17:00	単日	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 複導体がいし取替		新規	
1003045	沖縄	2026/08/31 09:00	2026/08/31 17:00	単日	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 複導体がいし取替		新規	
1002621	沖縄	2026/09/01 09:00	2026/09/05 17:00	毎日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号 OPGWへの張替		変更	
1003046	沖縄	2026/09/01 09:00	2026/09/01 17:00	単日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 保安停止		新規	
1003047	沖縄	2026/09/01 09:00	2026/09/02 17:00	毎日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号 支持がいし点検、鉄構補修		新規	
1003048	沖縄	2026/09/02 09:00	2026/09/02 17:00	単日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 がいいし調査		新規	
1003049	沖縄	2026/09/03 09:00	2026/09/04 17:00	毎日	友寄幹線2号	友寄幹線2号	友寄幹線2号 支持がいし点検、鉄構補修		新規	
1003050	沖縄	2026/09/03 09:00	2026/09/04 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 がいいし調査		新規	
1002626	沖縄	2026/09/07 09:00	2026/09/12 17:00	毎日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号 OPGWへの張替		変更	
1003051	沖縄	2026/09/07 09:00	2026/09/08 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 がいいし調査		新規	
1003052	沖縄	2026/09/09 09:00	2026/09/10 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 がいいし調査		新規	
1003053	沖縄	2026/09/11 09:00	2026/09/12 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 がいいし調査		新規	
1002627	沖縄	2026/09/14 09:00	2026/09/18 17:00	毎日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号 OPGWへの張替		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026-2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
1002698	沖縄	2026/09/14 09:00	2026/09/14 17:00	単日	大平幹線3号	大平幹線3号	大平幹線3号 CB定期点検		変更	
1003054	沖縄	2026/09/16 09:00	2026/09/18 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 がいいし調査		新規	
1003055	沖縄	2026/09/16 09:00	2026/09/18 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 がいいし調査		新規	
1002629	沖縄	2026/09/22 09:00	2026/09/25 17:00	毎日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号 OPGWへの張替		変更	
1003056	沖縄	2026/09/24 09:00	2026/09/26 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 がいいし調査		新規	
1003057	沖縄	2026/09/24 09:00	2026/09/26 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 がいいし調査		新規	
1003058	沖縄	2026/09/26 09:00	2026/09/26 17:00	単日	具志川火力線1号	具志川火力線1号	具志川火力線1号 縦ブスがいいし取替		新規	
1002632	沖縄	2026/09/28 09:00	2026/09/30 17:00	毎日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号 保安停止(天顔線OPGW張替)		変更	
1003059	沖縄	2026/09/28 09:00	2026/09/28 17:00	単日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 がいいし調査		新規	
1003060	沖縄	2026/09/28 09:00	2026/09/28 17:00	単日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 がいいし調査		新規	
1003061	沖縄	2026/09/29 09:00	2026/09/30 17:00	毎日	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号 支持がいいし点検、鉄構補修		新規	
1002703	沖縄	2026/10/01 09:00	2026/10/02 17:00	毎日	渡口幹線1号	渡口幹線1号	渡口幹線1号 支持がいいし取替		変更	
1002697	沖縄	2026/10/05 09:00	2026/10/09 17:00	毎日	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 支持がいいし取替		変更	
1003062	沖縄	2026/10/05 09:00	2026/10/06 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 架空地線ダンパ取替に伴う保安停止		新規	
1002700	沖縄	2026/10/13 09:00	2026/10/15 17:00	毎日	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号 支持がいいし取替		変更	
1002613	沖縄	2026/10/19 09:00	2026/10/22 17:00	毎日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号 塔体及び腕金塗装		変更	
1002614	沖縄	2026/10/19 09:00	2026/10/22 17:00	毎日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号 塔体及び腕金塗装		変更	
1003063	沖縄	2026/10/19 09:00	2026/10/24 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 鉄塔部材補修に伴う養生展開		新規	
1003064	沖縄	2026/10/19 09:00	2026/10/24 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 鉄塔部材補修に伴う養生展開		新規	
1002619	沖縄	2026/10/26 09:00	2026/10/30 17:00	毎日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 がいいし調査		変更	
1002620	沖縄	2026/10/26 09:00	2026/10/30 17:00	毎日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 がいいし調査		変更	
1003065	沖縄	2026/10/26 09:00	2026/10/31 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 鉄塔部材補修に伴う養生展開		新規	
1003066	沖縄	2026/10/26 09:00	2026/10/31 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 鉄塔部材補修に伴う養生展開		新規	
1003067	沖縄	2026/11/02 09:00	2026/11/02 17:00	単日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 がいいし調査		新規	
1003068	沖縄	2026/11/04 09:00	2026/11/05 17:00	毎日	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 架空地線金具およびプレート取替		新規	
1003069	沖縄	2026/11/04 09:00	2026/11/05 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 がいいし調査		新規	
1003070	沖縄	2026/11/09 09:00	2026/11/12 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 がいいし調査		新規	
1003071	沖縄	2026/11/16 09:00	2026/11/16 17:00	単日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 がいいし調査		新規	
1002684	沖縄	2026/11/17 09:00	2026/11/20 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 がいいし調査		変更	
1002685	沖縄	2026/11/17 09:00	2026/11/20 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 がいいし調査		変更	
1003072	沖縄	2026/11/24 09:00	2026/11/25 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 電力線ダンパ取替		新規	
1003073	沖縄	2026/11/24 09:00	2026/11/25 17:00	毎日	渡口幹線2号	渡口幹線2号	渡口幹線2号 鉄塔部材取替		新規	
1003074	沖縄	2026/11/26 09:00	2026/11/27 17:00	毎日	渡口幹線1号	渡口幹線1号	渡口幹線1号 鉄塔部材取替		新規	
1003075	沖縄	2026/12/01 09:00	2026/12/04 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 鉄塔部材補修に伴う養生撤去		新規	
1003076	沖縄	2026/12/01 09:00	2026/12/04 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 鉄塔部材補修に伴う養生撤去		新規	
1002709	沖縄	2026/12/07 09:00	2026/12/08 17:00	毎日	石川幹線1号	石川幹線1号	石川幹線1号 CB定期点検		変更	
1003077	沖縄	2026/12/07 09:00	2026/12/10 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 鉄塔部材補修に伴う養生撤去		新規	
1003078	沖縄	2026/12/07 09:00	2026/12/10 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 鉄塔部材補修に伴う養生撤去		新規	
1002714	沖縄	2026/12/09 09:00	2026/12/10 17:00	毎日	石川幹線2号	石川幹線2号	石川幹線2号 CB定期点検		変更	
1003079	沖縄	2026/12/14 09:00	2026/12/16 17:00	毎日	新米野比幹線1号	新米野比幹線1号	新米野比幹線1号 腕金部材取替		新規	
1003080	沖縄	2026/12/17 09:00	2026/12/19 17:00	毎日	新米野比幹線2号	新米野比幹線2号	新米野比幹線2号 腕金部材取替		新規	
1003081	沖縄	2026/12/17 09:00	2026/12/17 17:00	単日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 保安停止		新規	
1003082	沖縄	2026/12/23 09:00	2026/12/25 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 鉄塔部材取替		新規	
1003083	沖縄	2027/01/05 09:00	2027/01/06 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 塔体及び腕金塗装		新規	
1002635	沖縄	2027/01/07 09:00	2027/01/08 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 塔体及び腕金塗装		変更	
1003084	沖縄	2027/01/12 09:00	2027/01/13 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 塔体及び腕金塗装		新規	
1003085	沖縄	2027/01/14 09:00	2027/01/15 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 塔体及び腕金塗装		新規	
1002636	沖縄	2027/01/18 09:00	2027/01/19 17:00	毎日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号 塔体及び腕金塗装		変更	
1002637	沖縄	2027/01/18 09:00	2027/01/19 17:00	毎日	具志川火力線1号	具志川火力線1号	具志川火力線1号 塔体及び腕金塗装		変更	
1002675	沖縄	2027/01/20 09:00	2027/01/22 17:00	毎日	石川幹線1号	石川幹線1号	石川幹線1号 部材取替		変更	
1002734	沖縄	2027/01/20 09:00	2027/01/21 17:00	毎日	渡口幹線2号	渡口幹線2号	渡口幹線2号 CB定期点検		更新	
1002676	沖縄	2027/01/25 09:00	2027/01/27 17:00	毎日	石川幹線2号	石川幹線2号	石川幹線2号 部材取替		変更	
1002732	沖縄	2027/01/25 09:00	2027/01/26 17:00	毎日	渡口幹線1号	渡口幹線1号	渡口幹線1号 CB定期点検		変更	
1003086	沖縄	2027/02/01 09:00	2027/02/02 17:00	毎日	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号 腕金ボルト取替工事		新規	
1002744	沖縄	2027/03/01 09:00	2027/03/25 17:00	連続	西原幹線2号	西原幹線2号	西原幹線2号 電線張替		更新	
1002870	沖縄	2027/04/01 09:00	2027/04/03 17:00	毎日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号 がいいし調査		更新	
1002871	沖縄	2027/04/01 09:00	2027/04/03 17:00	連続	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 複導体がいいし取替		更新	
1002872	沖縄	2027/04/01 09:00	2027/04/03 17:00	毎日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号 保安停止		更新	
1002873	沖縄	2027/04/05 09:00	2027/04/06 17:00	毎日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号 がいいし調査		更新	
1002874	沖縄	2027/04/05 09:00	2027/04/09 17:00	連続	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 複導体がいいし取替		更新	
1002875	沖縄	2027/04/05 09:00	2027/04/06 17:00	毎日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号 保安停止		更新	
1002876	沖縄	2027/04/07 09:00	2027/04/09 17:00	毎日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 がいいし調査		更新	
1002877	沖縄	2027/04/07 09:00	2027/04/09 17:00	毎日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 保安停止		更新	
1002878	沖縄	2027/04/12 09:00	2027/04/17 17:00	連続	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 複導体がいいし取替		更新	
1002879	沖縄	2027/04/12 09:00	2027/04/13 17:00	毎日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 保安停止		更新	
1002880	沖縄	2027/04/12 09:00	2027/04/13 17:00	毎日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 がいいし調査		更新	
1002881	沖縄	2027/04/14 09:00	2027/04/15 17:00	毎日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号 塔体及び腕金塗装工事		更新	
1003087	沖縄	2027/04/14 09:00	2027/04/15 17:00	毎日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号 塔体及び腕金塗装		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画(2026・2027年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
1002882	沖縄	2027/04/16 09:00	2027/04/17 17:00	毎日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 塔体及び腕金塗装工事		更新	
1002883	沖縄	2027/04/16 09:00	2027/04/17 17:00	毎日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 塔体及び腕金塗装		更新	
1002885	沖縄	2027/04/19 09:00	2027/04/24 17:00	連続	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 複導体がいし取替		更新	
1002886	沖縄	2027/04/19 09:00	2027/04/20 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 塔体及び腕金塗装工事		更新	
1002888	沖縄	2027/04/21 09:00	2027/04/22 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 塔体及び腕金塗装工事		更新	
1002889	沖縄	2027/04/26 09:00	2027/04/28 17:00	連続	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 複導体がいし取替		更新	
1002890	沖縄	2027/04/26 09:00	2027/04/27 17:00	毎日	石川幹線1号	石川幹線1号	石川幹線1号 塔体及び腕金塗装		更新	
1002891	沖縄	2027/04/28 09:00	2027/04/28 17:00	毎日	石川幹線2号	石川幹線2号	石川幹線2号 塔体及び腕金塗装		更新	
1002892	沖縄	2027/04/30 09:00	2027/04/30 17:00	毎日	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 複導体がいし取替		更新	
1002893	沖縄	2027/04/30 09:00	2027/04/30 17:00	毎日	石川幹線2号	石川幹線2号	石川幹線2号 塔体及び腕金塗装		更新	
1002894	沖縄	2027/05/06 09:00	2027/05/07 17:00	連続	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 複導体がいし取替		更新	
1002895	沖縄	2027/05/10 09:00	2027/05/15 17:00	連続	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 複導体がいし取替		更新	
1002896	沖縄	2027/05/10 09:00	2027/05/11 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 塔体及び腕金塗装工事		更新	
1002897	沖縄	2027/05/12 09:00	2027/05/13 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 塔体及び腕金塗装工事		更新	
1002898	沖縄	2027/05/14 09:00	2027/05/15 17:00	毎日	具志川火力線1号	具志川火力線1号	具志川火力線1号 がいい調査		更新	
1002899	沖縄	2027/05/17 09:00	2027/05/22 17:00	連続	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 複導体がいし取替		更新	
1002900	沖縄	2027/05/17 09:00	2027/05/17 17:00	毎日	具志川火力線1号	具志川火力線1号	具志川火力線1号 がいい調査		更新	
1002901	沖縄	2027/05/18 09:00	2027/05/20 17:00	毎日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号 がいい調査		更新	
1002902	沖縄	2027/05/21 09:00	2027/05/22 17:00	毎日	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号 がいい調査		更新	
1002903	沖縄	2027/05/24 09:00	2027/05/25 17:00	連続	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 複導体がいし取替		更新	
1002904	沖縄	2027/05/24 09:00	2027/05/25 17:00	毎日	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号 がいい調査		更新	
1002905	沖縄	2027/05/26 09:00	2027/05/29 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 がいい調査		更新	
1002908	沖縄	2027/06/01 09:00	2027/06/01 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 がいい調査		更新	
1002909	沖縄	2027/06/02 09:00	2027/06/04 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 がいい調査		更新	
1002910	沖縄	2027/06/07 09:00	2027/06/11 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 がいい調査		更新	
1002911	沖縄	2027/06/14 09:00	2027/06/15 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 塔体及び腕金塗装		更新	
1002912	沖縄	2027/06/16 09:00	2027/06/17 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 塔体及び腕金塗装		更新	
1002913	沖縄	2027/06/18 09:00	2027/06/19 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 塔体及び腕金塗装		更新	
1002914	沖縄	2027/06/21 09:00	2027/06/22 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 塔体及び腕金塗装		更新	
1002919	沖縄	2027/07/05 09:00	2027/07/05 17:00	毎日	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号 終端部点検		更新	
1002920	沖縄	2027/07/06 09:00	2027/07/06 17:00	毎日	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号 終端部点検		更新	
1002922	沖縄	2027/07/12 09:00	2027/07/12 17:00	毎日	大平幹線2号	沖縄幹線2号	牧港第一変電所 沖縄幹線2号 DZ取替(解線)		更新	
1002923	沖縄	2027/07/17 09:00	2027/07/17 17:00	毎日	大平幹線2号	沖縄幹線2号	牧港第一変電所 沖縄幹線2号 DZ取替(接続)		更新	
1002925	沖縄	2027/08/09 09:00	2027/08/10 17:00	毎日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号 CB、D1、GL、LA定期点検		更新	
1002929	沖縄	2027/08/12 09:00	2027/08/13 17:00	毎日	友寄幹線2号	友寄幹線2号	友寄幹線2号 CB、D1、GL、LA定期点検		更新	
1002936	沖縄	2027/08/18 09:00	2027/08/19 17:00	毎日	那覇幹線1号	那覇幹線1号	那覇幹線1号 CB、D1、GL、LA定期点検		更新	
1002940	沖縄	2027/08/23 09:00	2027/08/24 17:00	毎日	那覇幹線2号	那覇幹線2号	那覇幹線2号 CB、D1、GL、LA定期点検		変更	
1002945	沖縄	2027/09/03 09:00	2027/09/03 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川火力変電所 具志川幹線1号 DZ取替(解線)		更新	
1002946	沖縄	2027/09/10 09:00	2027/09/10 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川火力変電所 具志川幹線1号 DZ取替(接続)		更新	
1002947	沖縄	2027/09/13 09:00	2027/09/13 17:00	毎日	大平幹線1号	大平幹線1号	牧港第一変電所 大平幹線1号 DZ取替(解線)		更新	
1002950	沖縄	2027/09/18 09:00	2027/09/18 17:00	毎日	大平幹線1号	大平幹線1号	牧港第一変電所 大平幹線1号 DZ取替(接続)		更新	
1002951	沖縄	2027/09/21 09:00	2027/09/21 17:00	毎日	大平幹線2号	大平幹線2号	牧港第一変電所 大平幹線2号 DZ取替(解線)		更新	
1002954	沖縄	2027/09/28 09:00	2027/09/28 17:00	毎日	大平幹線2号	大平幹線2号	牧港第一変電所 大平幹線2号 DZ取替(接続)		更新	
1002958	沖縄	2027/10/12 09:00	2027/10/13 17:00	毎日	西原幹線1号	西原幹線1号	西原幹線1号 CB、D1、GL、PD定期点検		更新	
1002962	沖縄	2027/10/14 09:00	2027/10/15 17:00	毎日	西原幹線2号	西原幹線2号	西原幹線2号 CB、D1、GL、PD定期点検		更新	
1002967	沖縄	2027/10/18 09:00	2027/10/19 17:00	毎日	大平幹線1号	大平幹線1号	大平幹線1号 CB、D1、GL点検		更新	
1002972	沖縄	2027/10/21 09:00	2027/10/21 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 PCM取替(解線)		更新	
1002973	沖縄	2027/10/28 09:00	2027/10/29 17:00	連続	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 PCM取替(接続)主後一休型		更新	
1002974	沖縄	2027/11/10 09:00	2027/11/10 12:00	毎日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号 金武火力変 132kV BP+HBR取替(解線)		更新	
1002975	沖縄	2027/11/10 13:00	2027/11/10 17:00	毎日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 金武火力変 132kV BP+HBR取替(解線)		更新	
1002976	沖縄	2027/11/11 09:00	2027/11/11 12:00	毎日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号 金武火力変 132kV BP+HBR取替(解線)		更新	
1002978	沖縄	2027/11/13 09:00	2027/11/13 12:00	毎日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 金武火力変 132kV BP+HBR取替(解線)		更新	
1002979	沖縄	2027/11/19 09:00	2027/11/19 12:00	毎日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号 金武火力変 132kV BP+HBR取替(接続)		更新	
1002980	沖縄	2027/11/19 13:00	2027/11/19 17:00	毎日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 金武火力変 132kV BP+HBR取替(接続)		更新	
1002981	沖縄	2027/11/20 09:00	2027/11/20 12:00	毎日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 金武火力変 132kV BP+HBR取替(接続)		更新	
1002983	沖縄	2027/11/23 09:00	2027/11/23 12:00	毎日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号 金武火力変 132kV BP+HBR取替(接続)		更新	
1002984	沖縄	2027/12/01 09:00	2027/12/04 17:00	毎日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 支持がいし取替、避雷型アークホーン取付		更新	
1002985	沖縄	2027/12/01 09:00	2027/12/04 17:00	毎日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 保安停止		更新	
1002988	沖縄	2027/12/06 09:00	2027/12/10 17:00	毎日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 保安停止		更新	
1002989	沖縄	2027/12/06 09:00	2027/12/10 17:00	毎日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 支持がいし取替、避雷型アークホーン取付		更新	
1002990	沖縄	2027/12/13 09:00	2027/12/18 17:00	毎日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 保安停止		更新	
1002991	沖縄	2027/12/13 09:00	2027/12/18 17:00	毎日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 支持がいし取替、避雷型アークホーン取付		更新	
1002992	沖縄	2027/12/20 09:00	2027/12/20 17:00	毎日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 支持がいし取替、避雷型アークホーン取付		更新	
1002993	沖縄	2028/02/01 09:00	2028/02/16 17:00	連続	西原幹線2号	西原幹線2号	西原幹線(仮設鉄塔)移設に伴う電線張替		更新	
1002994	沖縄	2028/02/17 09:00	2028/03/02 17:00	連続	西原幹線1号	西原幹線1号	西原幹線(仮設鉄塔)移設に伴う電線張替		更新	

2028年度以降の地域間連系線の 運用容量に長期間影響を与える件名

2025年 1月21日

電力広域的運営推進機関

- 年間作業停止計画は翌年度・翌々年度分について調整・承認することが、業務規程で定められている。
- それに加え、長期的な予見性を確保するため、第3年度（2028年度）以降の具体化している地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名について、以下のとおり公表する。
- なお、今回の公表で対象となっている件名は現段階では確定したものではない。今後、送配電等業務指針第244条（作業停止計画の調整における考慮事項）の規定に基づき調整を進め、次年度にその結果に基づき、2027・2028年度年間作業停止計画として承認を行うこととなる。

（該当件名）

No.	連系線	停止（制約）設備	主要作業件名	作業時期・期間（予定）
①	東北東京間	福島東幹線山線1,2L	福島東幹線No.16他 鉄塔防錆塗装工事	1L：2028年10月05日～11月02日（29日間） 2L：2028年11月06日～12月06日（31日間）
②		新福島(変)変圧器	新福島変電所4号変圧器取替工事	3B：2028年06月01日～06月15日（15日間） 4B：2027年12月01日～2029年04月18日（505日間）※ ※2027年度年間作業停止計画（参考で記載）
③		いわき幹線1,2L 新福島(変)2B	275kV屋外鉄構補強工事（6期）	1L：2028年04月10日～04月14日（5日間） 04月24日～06月02日（40日間） 07月17日～08月15日（30日間） 09月18日～10月06日（19日間） 10月23日～10月27日（5日間） 11月06日～11月24日（19日間） 2029年01月08日～02月02日（26日間） 02月19日～03月02日（12日間） 2L：2028年04月03日～04月07日（5日間） 04月17日～04月21日（5日間） 06月05日～07月14日（40日間） 08月16日～09月15日（31日間） 10月09日～10月20日（12日間） 10月30日～11月03日（5日間） 11月27日～12月22日（26日間） 2029年01月29日～02月16日（19日間） 2B：2028年10月09日～10月20日（12日間）

2028年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名

(該当件名)

No.	連系線	停止（制約）設備	主要作業件名	作業時期・期間（予定）
④	東京中部間 (佐久間FC)	佐久間東幹山線1,2L	電線張替、鉄塔建替	2025年09月10日～2028年04月17日（951日間）※ ※2025年度より作業中（参考で記載）
⑤	東京中部間 (佐久間FC) (東清水FC)	佐久間FC 東清水1,2,3FC	東清水1,3FC 佐久間東幹線運開後の系統連系試験に伴う停止	2028年04月～06月
⑥		佐久間FC 東清水1,3FC	新佐久間FC系統連系試験に伴う停止	2028年06月～10月
⑦		佐久間FC 東清水1,2,3FC	新佐久間FC組合せ試験に伴う停止	2028年10月～11月
⑧		佐久間FC 東清水1,3FC	新佐久間FC系統連系試験に伴う停止	2028年11月～12月
⑨	東京中部間 (東清水2FC)	田代幹線中線1,2L	駿河変電所GIS化 関連引込変更工事	1L：2029年03月01日～03月12日（12日間） 2L：2029年03月13日～03月24日（12日間）
⑩	東京中部間 (新信濃FC)	新信濃1,2FC	TC（遠方監視制御装置）取替	1FC：2028年10月23日～10月31日（9日間） 2FC：2028年10月10日～10月17日（8日間）
⑪		高根馬瀬線1回線停止に伴う新信濃FC制約	高根馬瀬線電線張替工事	2028年06月06日～06月30日（25日間）
⑫	東京中部間 (飛騨信濃FC)	飛騨信濃1,2極	154kVGISユニット改造・課電試験ほか	1極：2028年10月10日～10月30日（21日間） 2極：2028年11月07日～11月27日（21日間）
⑬	中地域 交流ループ	東部障糸線1,2L (中部エリア地内)	北部変電所GCS改造	1L：2028年04月03日～04月14日（12日間） 2L：2028年04月17日～04月28日（12日間）
⑭		加賀東金津線1,2L (北陸エリア地内)	加賀東金津線鉄塔建替・電線張替工事	1L：2028年09月27日～11月10日（45日間） 2029年05月15日～06月28日（45日間） 2030年07月01日～08月23日（54日間） 2L：2028年05月06日～06月28日（54日間） 2029年07月02日～08月16日（46日間）

(該当件名)

No.	連系線	停止(制約)設備	主要作業件名	作業時期・期間(予定)
⑮	中地域 交流ループ	加賀幹線1,2L (北陸エリア地内)	加賀幹線電線張替工事	1L: 2029年06月29日～09月26日(90日間) 2L: 2028年06月12日～09月08日(89日間)
⑯		東金津新福井線1,2L (北陸エリア地内)	東金津新福井線鉄塔建替工事	1L: 2028年06月29日～08月12日(45日間) 2L: 2028年08月22日～09月22日(32日間)
⑰		加賀福光線1,2L (北陸エリア地内)	500kV GIS 甲母線ガス漏れ修理	1L: 2028年04月10日～04月20日(11日間) 2L: 2028年04月01日～04月09日(9日間) 2028年04月21日～05月03日(13日間)
⑱		加賀福光線1,2L (北陸エリア地内)	500kV GIS 乙母線ガス漏れ修理	1L: 2028年11月22日～12月02日(11日間) 2L: 2028年11月13日～11月21日(9日間) 2028年12月03日～12月15日(13日間)
⑲		北近江線1,2L (関西エリア地内)	500kV北近江開閉所新設に伴う引 き込み	2L: 2029年10月02日～12月21日(81日間) 1L: 2030年01月08日～03月29日(81日間)
⑳		北近江線2L (関西エリア地内)	北近江線改良工事	2030年09月11日～10月27日(48日間) 2031年03月03日～06月30日(120日間)
㉑		若狭幹線(山) 1,2L (関西エリア地内)	若狭幹線(山) 改良工事 に伴う保安停止 若狭幹線(山) 鉄塔組立・架線工事	1L: 2031年09月24日～12月19日(87日間) 2032年04月01日～06月30日(91日間) 2032年10月01日～12月17日(78日間) 2033年03月01日～06月30日(122日間) 2L: 2033年09月11日～12月23日(104日間)
㉒	関西中国間	新岡山幹線1,2L	新岡山幹線電線張替工事【2工区】	2L: 2028年09月16日～11月29日(75日間) 1L: 2028年03月18日～05月31日(75日間) ※ ※2027年度年間作業停止計画(参考で記載)
㉓	中国四国間	本四連系線1L	ケーブル張替、接続部細密点検ほか	2028年04月01日～06月30日(91日間)
㉔	中国九州間	関門連系線1,2L	関門連系線電線張替工事	1L: 2028年03月17日～05月29日(74日間) 2029年03月01日～06月04日(96日間) 2L: 2028年10月02日～12月14日(74日間)

【作業概要】


項目	内容
作業箇所	福島東幹線山線
主要作業内容	福島東幹線No.16他鉄塔防錆塗装工事
停止(制約)設備	福島東幹線山線1、2L
作業停止期間 (予定)	1L：2028年10月05日～2028年11月02日（29日間） 2L：2028年11月06日～2028年12月06日（31日間）
作業の必要性	経年による発錆箇所の防錆塗装を実施

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

①東北東京間：福島東幹線山線No.16他鉄塔防錆塗装工事

【概略図】

設備診断の結果から部材の亜鉛メッキの減耗による発錆の防錆塗装を実施。

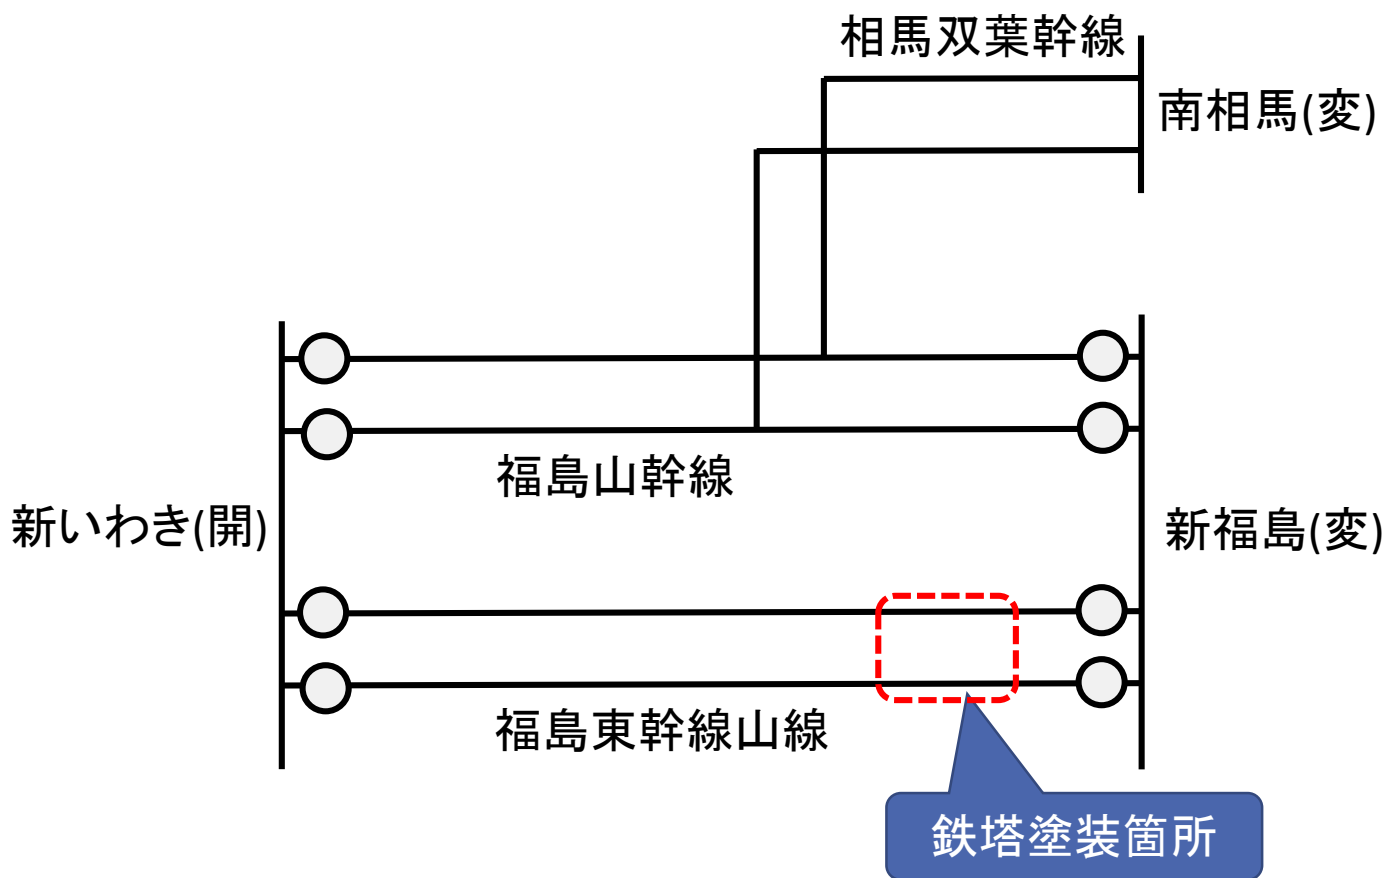

【作業概要】


項目	内容
作業箇所	新福島変電所
主要作業内容	新福島変電所4号変圧器取替工事
停止(制約)設備	新福島変電所3B、4B
作業停止期間 (予定)	3B：2028年06月01日～2028年06月15日（15日間） 4B：2027年12月01日～2029年04月18日（505日間）
作業の必要性	新福島変電所主変4号は経年劣化と部品の廃型による設備更新および屋外鉄構補強

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

②東北東京間：新福島変電所4号変圧器取替工事

【概略図】

経年劣化と部品の廃型による設備更新のため、変圧器取替を実施する。

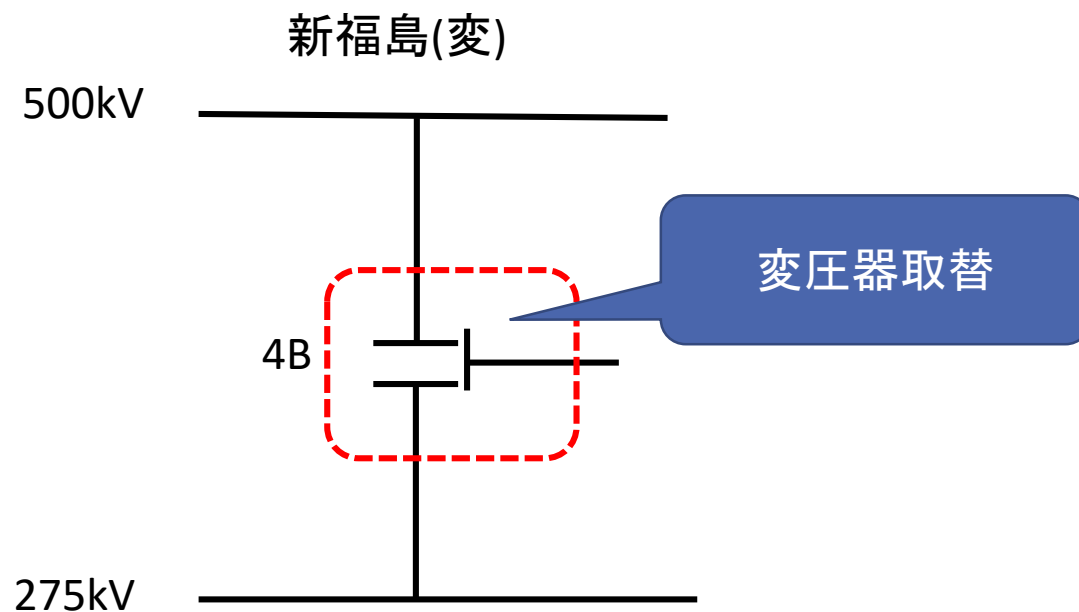


【作業概要】

項目	内容
作業箇所	いわき幹線1,2L 新福島変電所2号変圧器
主要作業内容	275kV屋外鉄構補強工事（6期）
停止(制約)設備	いわき幹線1,2L 新福島変電所2号変圧器
作業停止期間 (予定)	1L：2028年04月10日～04月14日（5日間） 04月24日～06月02日（40日間） 07月17日～08月15日（30日間） 09月18日～10月06日（19日間） 10月23日～10月27日（5日間） 11月06日～11月24日（19日間） 2029年01月08日～02月02日（26日間） 02月19日～03月02日（12日間） 2L：2028年04月03日～04月07日（5日間） 04月17日～04月21日（5日間） 06月05日～07月14日（40日間） 08月16日～09月15日（31日間） 10月09日～10月20日（12日間） 10月30日～11月03日（5日間） 11月27日～12月22日（26日間） 2029年01月29日～02月16日（19日間） 2B：2028年10月09日～10月20日（12日間）
作業の必要性	設備健全性確保に伴う鉄構補強、ボルト修理および基礎補強

【概略図】

・鉄構の強度不足解消のため、屋外鉄構補強および基礎補強工事を実施。

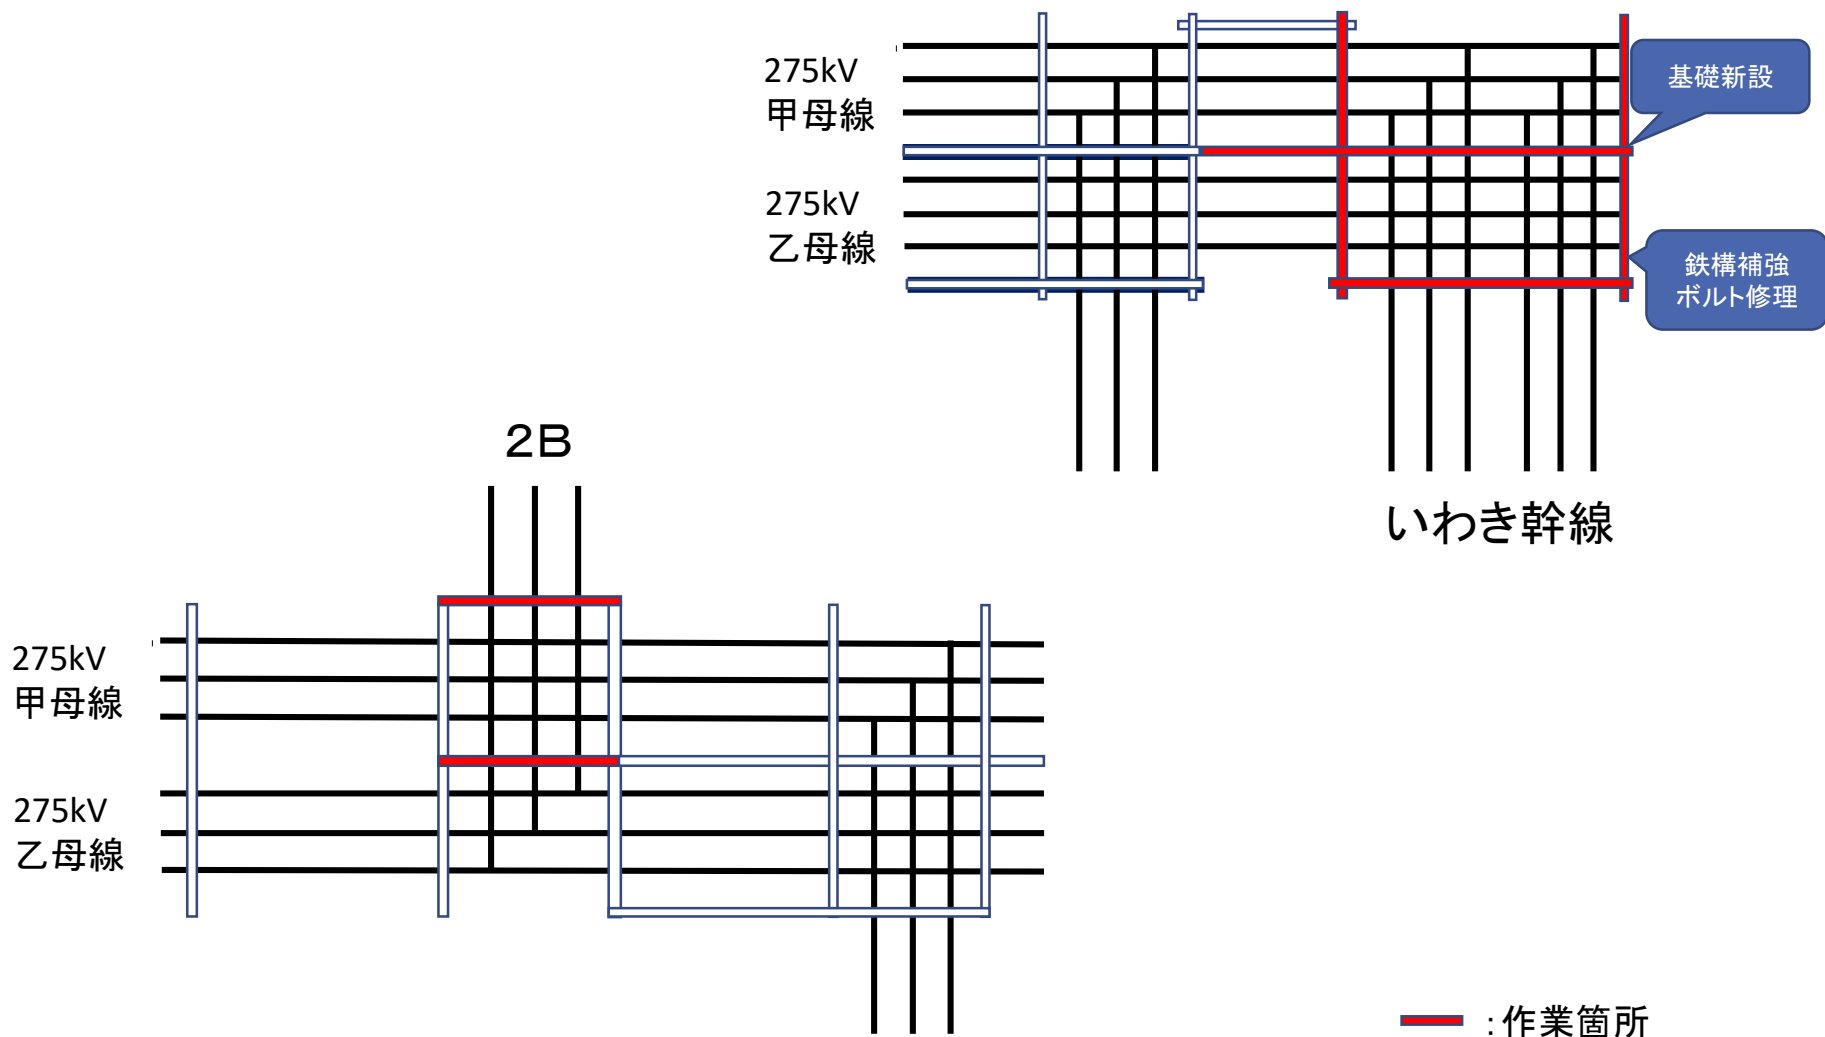

④東京中部間：佐久間東幹山線1,2L 電線張替、鉄塔建替工事

【作業概要】

項目	内容
作業箇所	佐久間東幹山線1、2L
主要作業内容	電線張替、鉄塔建替工事
停止(制約)設備	佐久間東幹山線1、2L
作業停止期間 (予定)	2025年09月10日～2028年4月17日（951日間）
作業の必要性	東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画における、更なる90万kWの増強対策として工事を実施

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

【作業概要】

項目	内容
作業箇所	佐久間FC、東清水1、2、3FC
主要作業内容	東清水1,3FC 佐久間東幹線運開後の系統連系試験に伴う停止
停止(制約)設備	佐久間FC、東清水1、2、3FC
作業停止期間 (予定)	2028年04月～06月
作業の必要性	佐久間東幹山線全線運開に伴い、系統連系試験が必要なため

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

【作業概要】

項目	内容
作業箇所	佐久間FC、東清水1、3FC
主要作業内容	新佐久間FC系統連系試験に伴う停止
停止(制約)設備	佐久間FC、東清水1、3FC
作業停止期間 (予定)	2028年06月～10月
作業の必要性	東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画における更なる90万kWの増強対策として工事を実施

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

⑦東京中部間：新佐久間FC組合せ試験に伴う停止

【作業概要】

項目	内容
作業箇所	佐久間FC、東清水1、2、3FC
主要作業内容	新佐久間FC組合せ試験に伴う停止
停止(制約)設備	佐久間FC、東清水1、2、3FC
作業停止期間 (予定)	2028年10月～11月
作業の必要性	東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画における更なる90万kWの増強対策として工事を実施

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

⑧東京中部間：新佐久間FC系統連系試験に伴う停止


【作業概要】

項目	内容
作業箇所	佐久間FC、東清水1、3FC
主要作業内容	新佐久間FC系統連系試験に伴う停止
停止(制約)設備	佐久間FC、東清水1、3FC
作業停止期間 (予定)	2028年11月～12月
作業の必要性	東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画における更なる90万kWの増強対策として工事を実施

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

- ④東京中部間：佐久間東幹山線1,2L 電線張替、鉄塔建替
 ⑤⑥⑦⑧東京中部間：新佐久間FC系統連系試験に伴う停止ほか

【概略図】

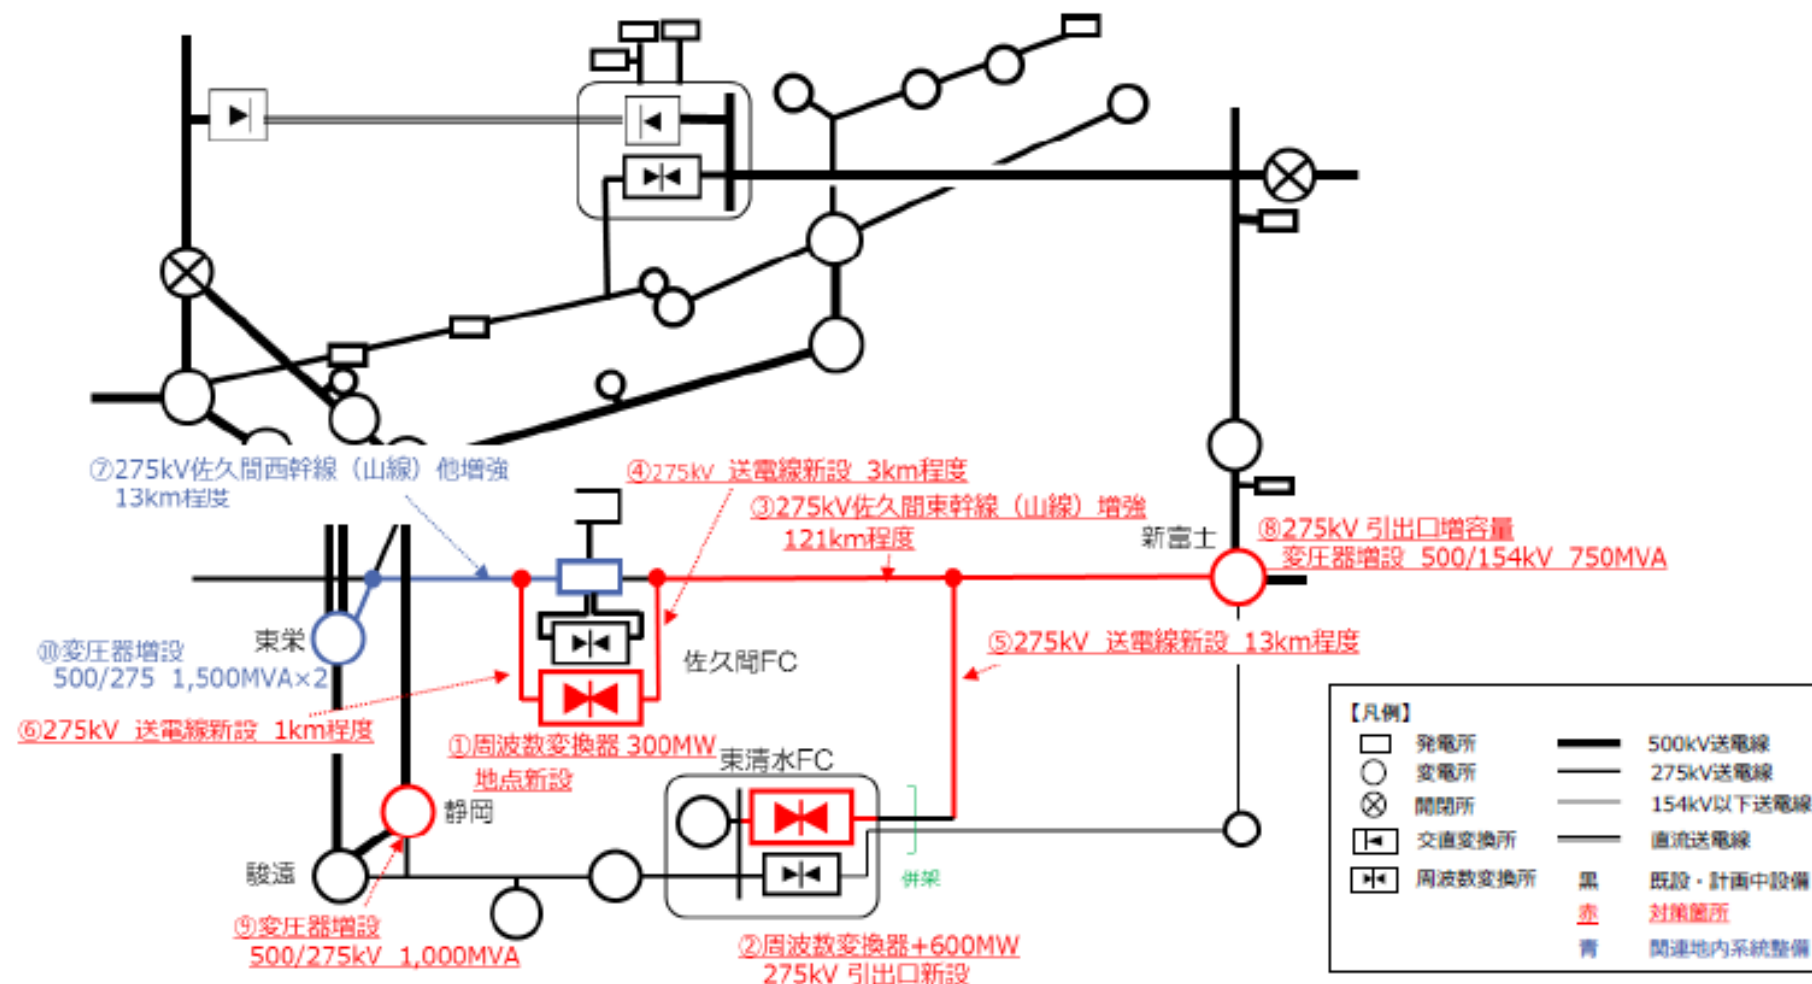


【作業概要】

項目	内容
作業箇所	田代幹線中線
主要作業内容	駿河変電所GIS化関連引込変更工事
停止(制約)設備	田代幹線中線1、2L
作業停止期間 (予定)	1L：2029年03月01日～2029年03月12日（12日間） 2L：2029年03月13日～2029年03月24日（12日間）
作業の必要性	駿河変電所154kV気中設備のGIS化に伴い、154kV田代幹線中線1、2Lの新設鉄構への引き込みを実施（154kV田代幹線山線と154kV田代幹線中線の交差引き込み解消を含む）

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

【概略図】 駿河(変)構内への154kV田代幹線山線と田代幹線中線の交差引き込み解消（案）

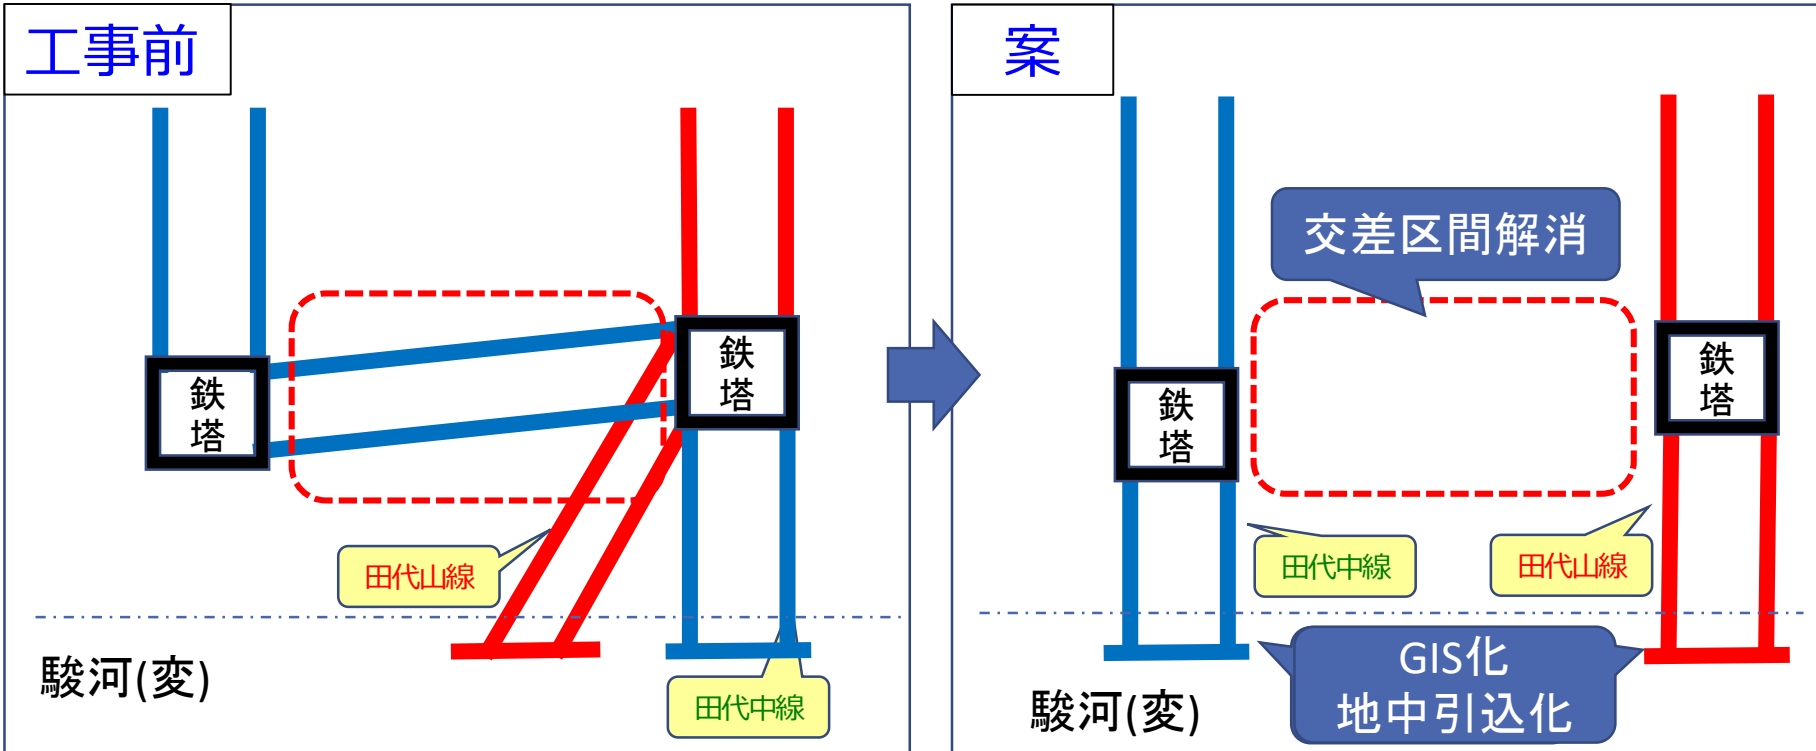


- ・上図の通り、田代幹線山線2回線と田代幹線中線2回線の交差引き込みを解消
- ・危険防止で田代幹線山線の停止が必要
- ・引き留め鉄構～GIS間のケーブル接続工事も実施

【作業概要】

項目	内容
作業箇所	新信濃変電所
主要作業内容	TC（遠方監視制御装置）取替
停止(制約)設備	新信濃1FC、2FC
作業停止期間 (予定)	1FC：2028年10月23日～2028年10月31日（9日間） 2FC：2028年10月10日～2028年10月17日（8日間）
作業の必要性	更新計画に伴うTC（遠方監視制御装置）取替

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

【概略図】

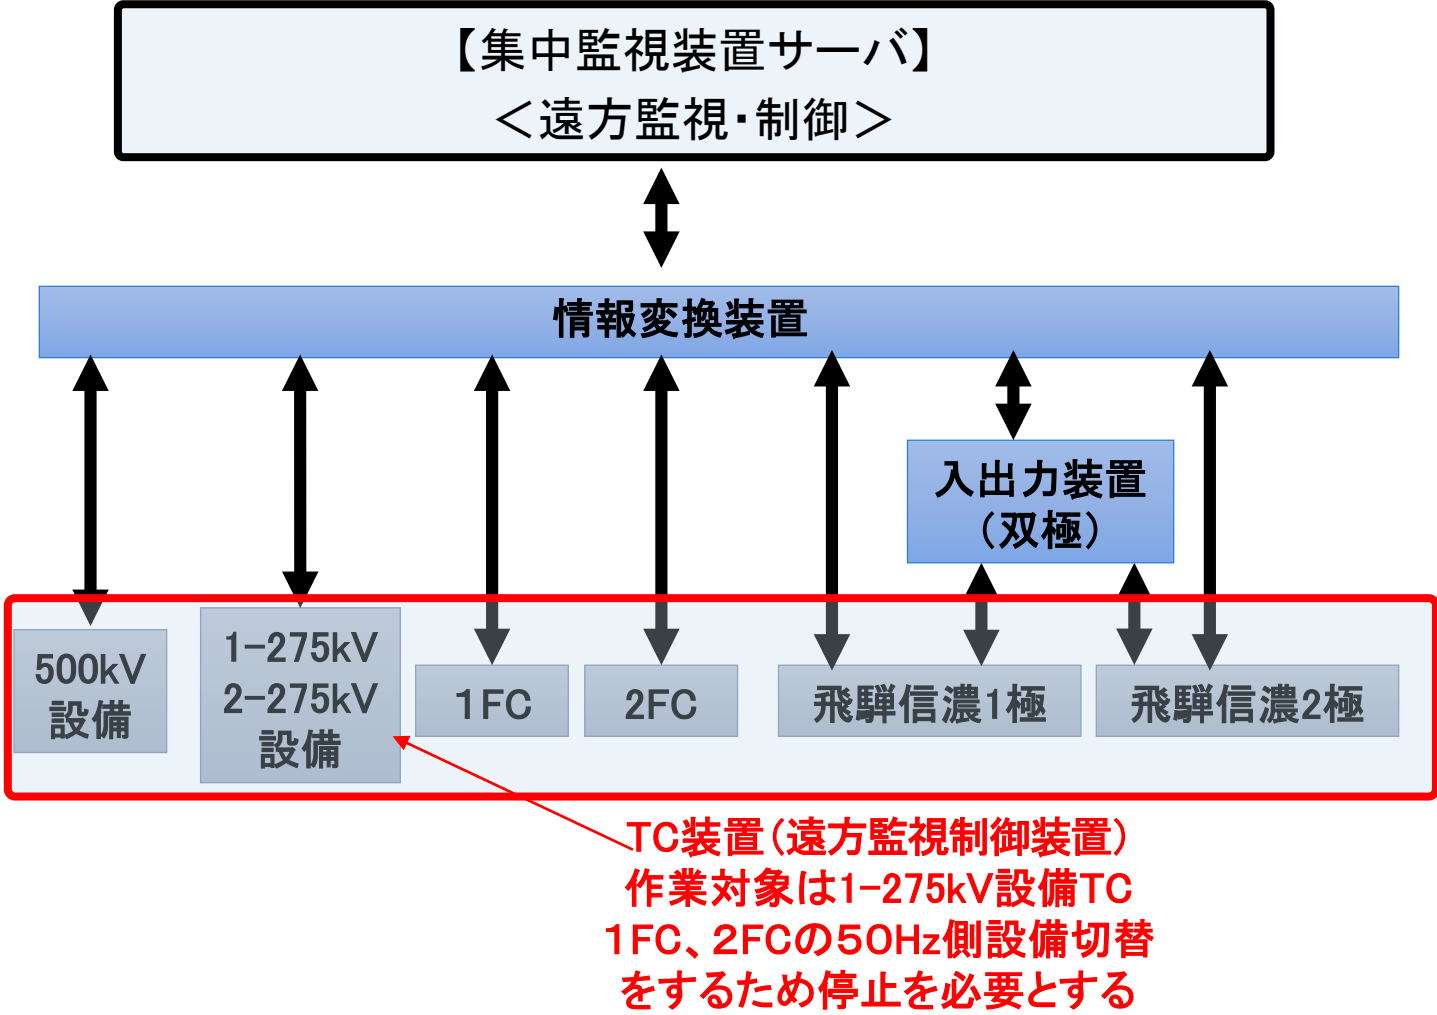

【作業概要】

項目	内容
作業箇所	高根馬瀬線
主要作業内容	高根馬瀬線電線張替工事
停止(制約)設備	新信濃1、2FC
作業停止期間 (予定)	2028年06月06日～2028年06月30日（25日間）
作業の必要性	設備保全、高経年設備の更新


⑪東京中部間：高根馬瀬線電線張替工事

【概略図】

<凡例>

500kV
 275kV
 154kV(77kV)

送電線: 単線で表示
 母線: 単母線で表示
 変圧器: 実際の台数とは異なる

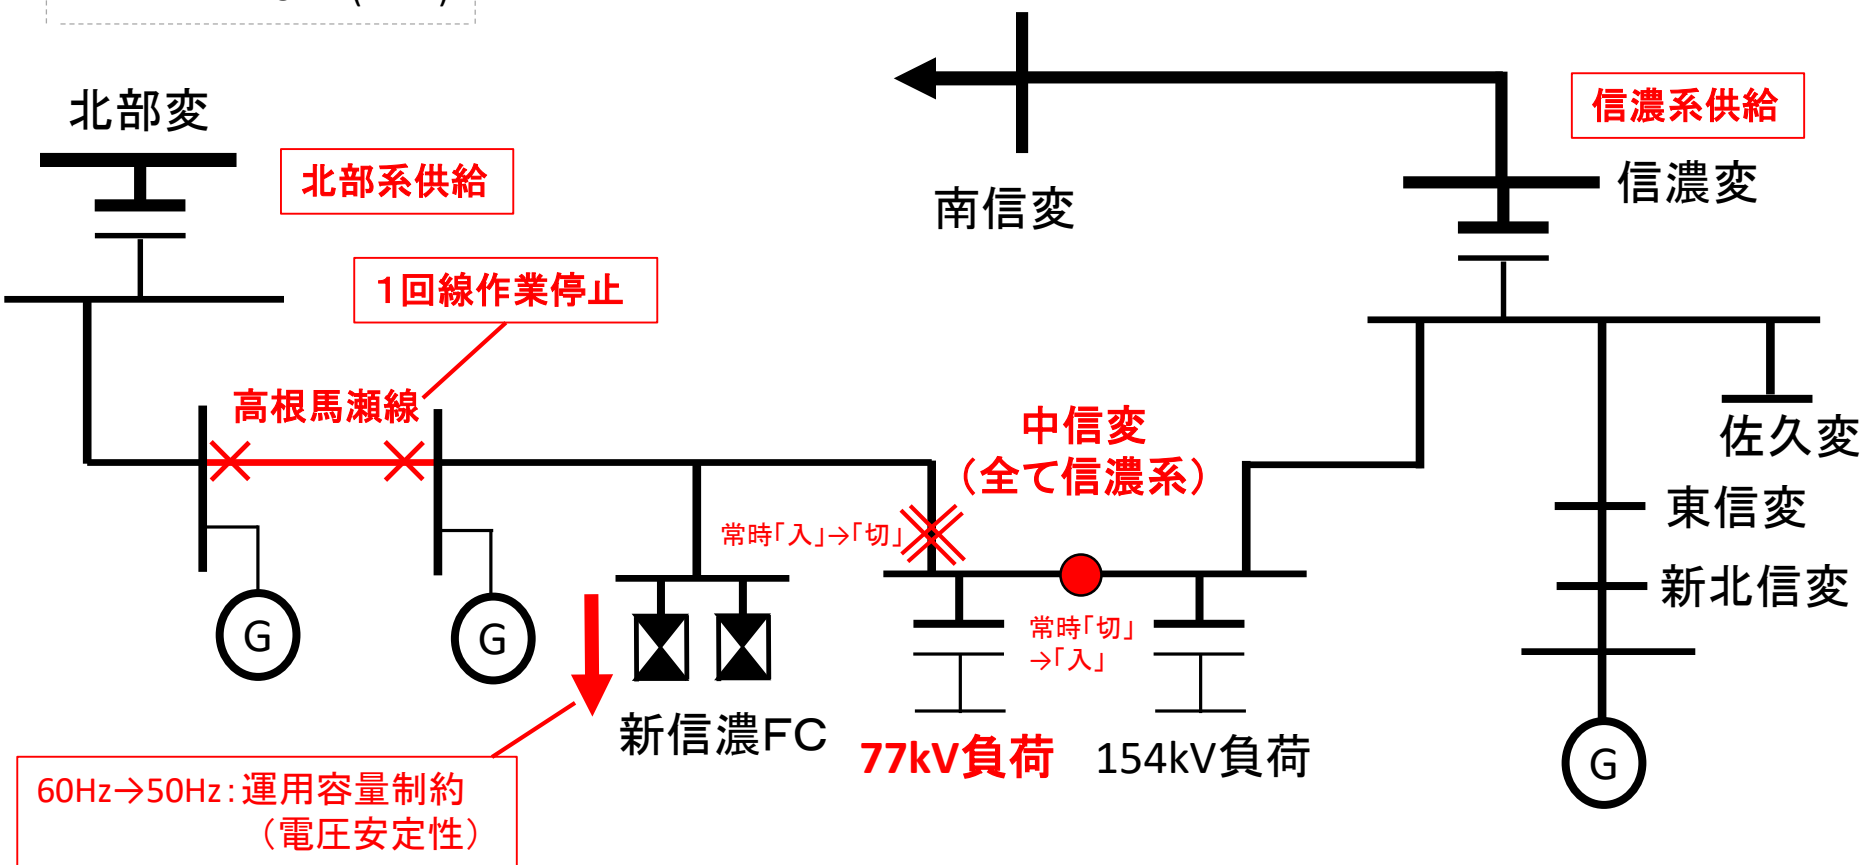

【作業概要】


項目	内容
作業箇所	飛騨変換所
主要作業内容	154kV GISユニット改造・課電試験・系統連系試験
停止(制約)設備	飛騨信濃FC1、2極
作業停止期間 (予定)	1 極：2028年10月10日～10月30日（21日間） 2 極：2028年11月07日～11月27日（21日間）
作業の必要性	静止型無効電力補償装置の新規設置に伴い、事前にGIS改造が必要なため

【概略図】

<凡例>

- 500kV
- 275kV
- 154kV(77kV)

送電線：単線で表示
母線：単母線で表示
※1極分のみ表示

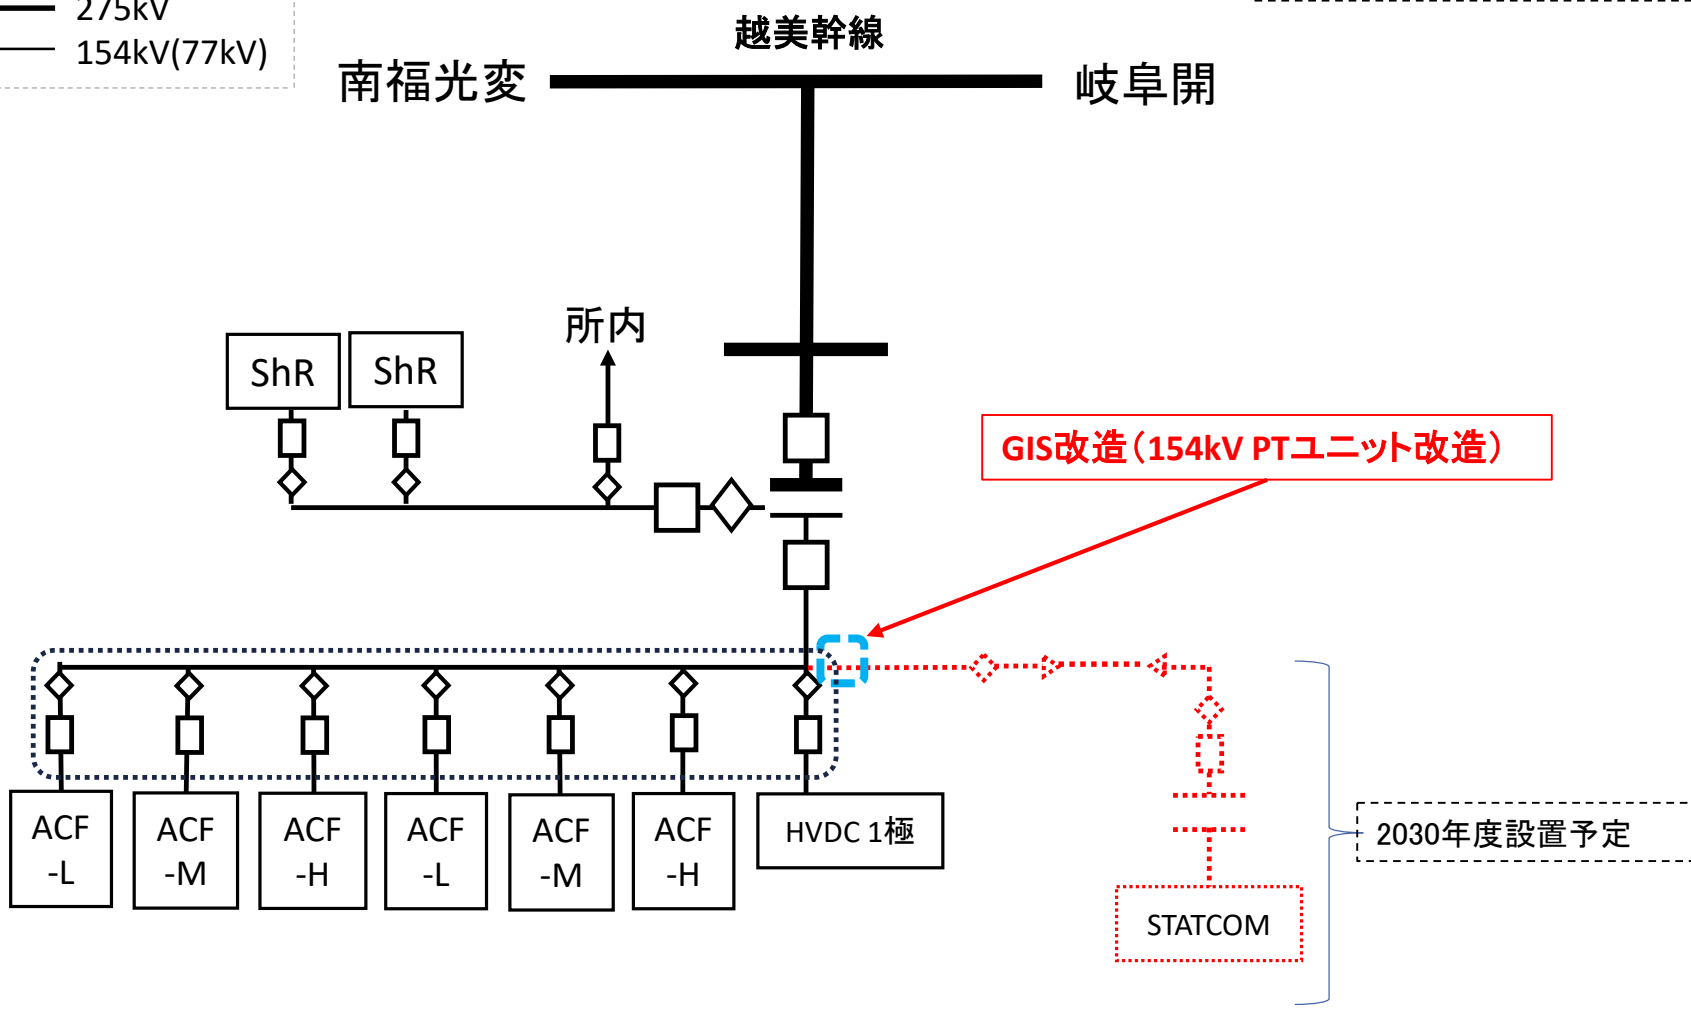

【作業概要】

項目	内容
作業箇所	北部変電所
主要作業内容	500kV 東部幹線GCSユニット改造
停止(制約)設備	東部幹線1、2L
作業停止期間 (予定)	1L：2028年04月03日～2028年04月14日（12日間） 2L：2028年04月17日～2028年04月28日（12日間）
作業の必要性	関西送配電との第二連系（北近江－関ヶ原間）構築に伴う短地絡容量超過対策


【概略図】

<凡例>

- 500kV
- 275kV
- 154kV(77kV)

※工事対象遮断器のみ 

この他に断路器および避雷器の取替も実施予定

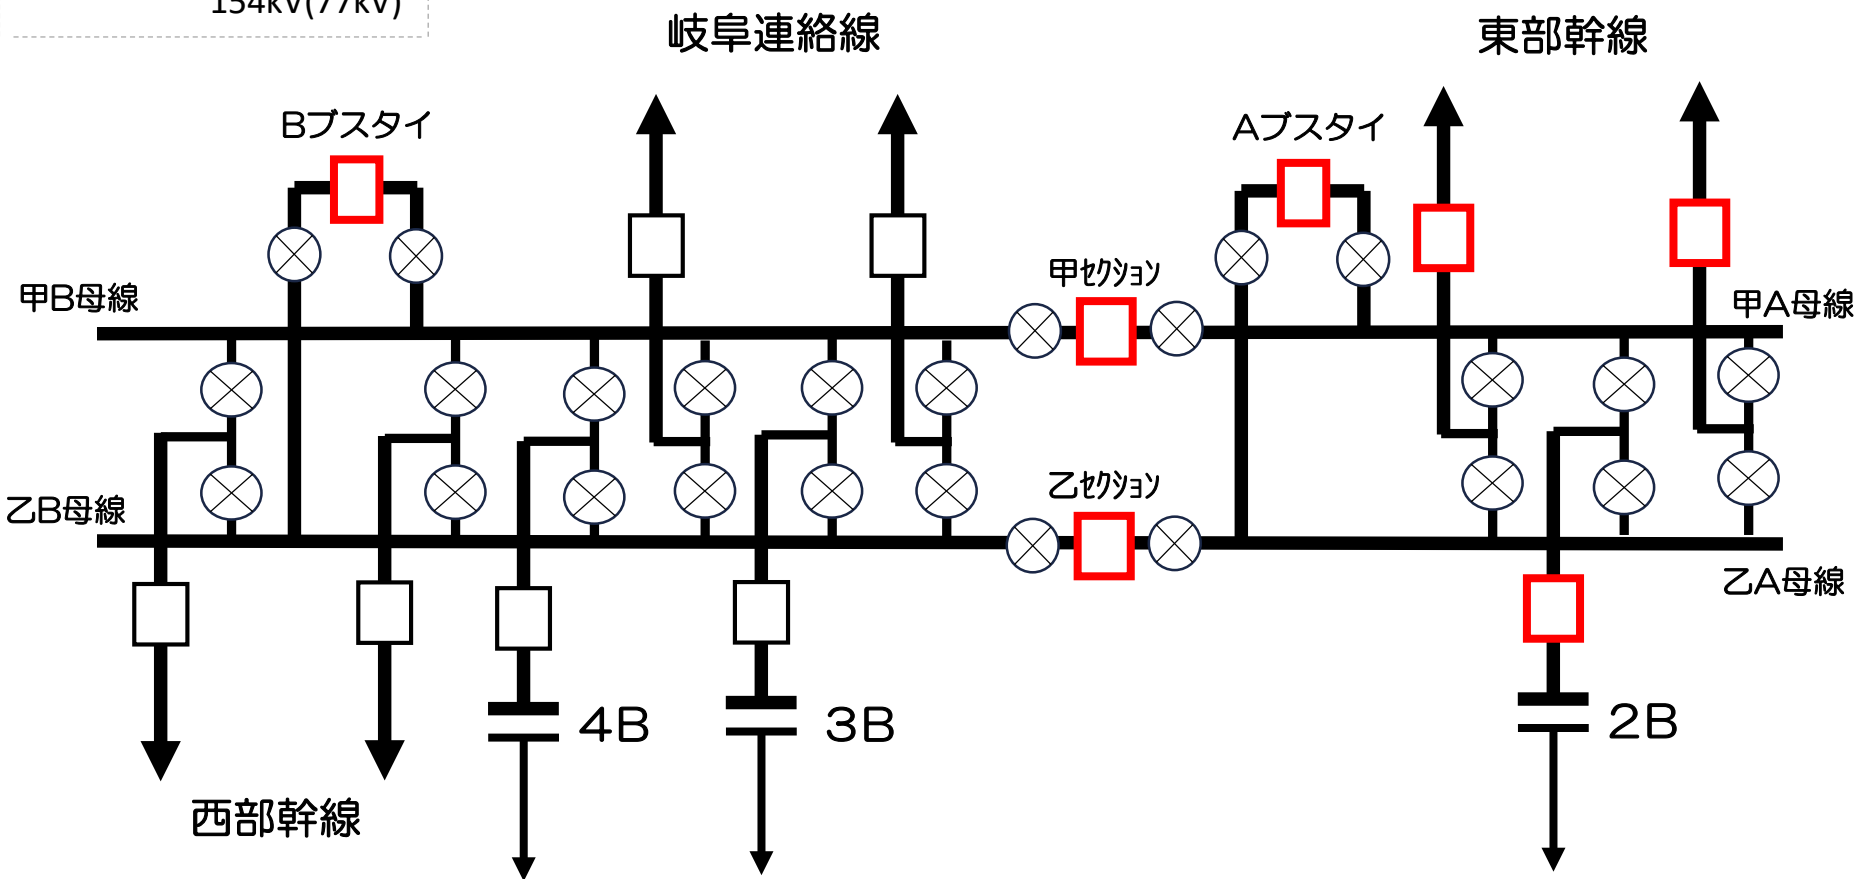

【作業概要】

項目	内容
作業箇所	加賀東金津線
主要作業内容	加賀東金津線 鉄塔建替工事No.15～No.20他 加賀東金津線 電線張替工事No.26～No.39他
停止(制約)設備	加賀東金津線1L、2L
作業停止期間 (予定)	1L：2028年09月27日～2028年11月10日（45日間） 2029年05月15日～2029年06月28日（45日間） 2030年07月01日～2030年08月23日（54日間） 2L：2028年05月06日～2028年06月28日（54日間） 2029年07月02日～2029年08月16日（46日間）
作業の必要性	設備保全、高経年設備の更新

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

⑮中地域交流ループ（北陸エリア地内）：加賀幹線電線張替工事

【作業概要】

項目	内容
作業箇所	加賀幹線
主要作業内容	加賀幹線 電線張替工事No.130～No.139他
停止(制約)設備	加賀幹線 1L、2L
作業停止期間 (予定)	1L：2029年06月29日～2029年09月26日（90日間） 2L：2028年06月12日～2028年09月08日（89日間）
作業の必要性	設備保全、高経年設備の更新

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

【作業概要】


項目	内容
作業箇所	東金津新福井線1L、2L
主要作業内容	東金津新福井線 鉄塔建替No.20～No.23
停止(制約)設備	東金津新福井線1L、2L
作業停止期間 (予定)	1L：2028年06月29日～2028年08月12日（45日間） 2L：2028年08月22日～2028年09月22日（32日間）
作業の必要性	設備保全、高経年設備の更新

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

- ⑭中地域交流ループ（北陸エリア地内）：加賀東金津線鉄塔建替・電線張替工事
 ⑮中地域交流ループ（北陸エリア地内）：加賀幹線電線張替工事
 ⑯中地域交流ループ（北陸エリア地内）：東金津新福井線鉄塔建替工事

【概略図】

設備保全、高経年設備の改修

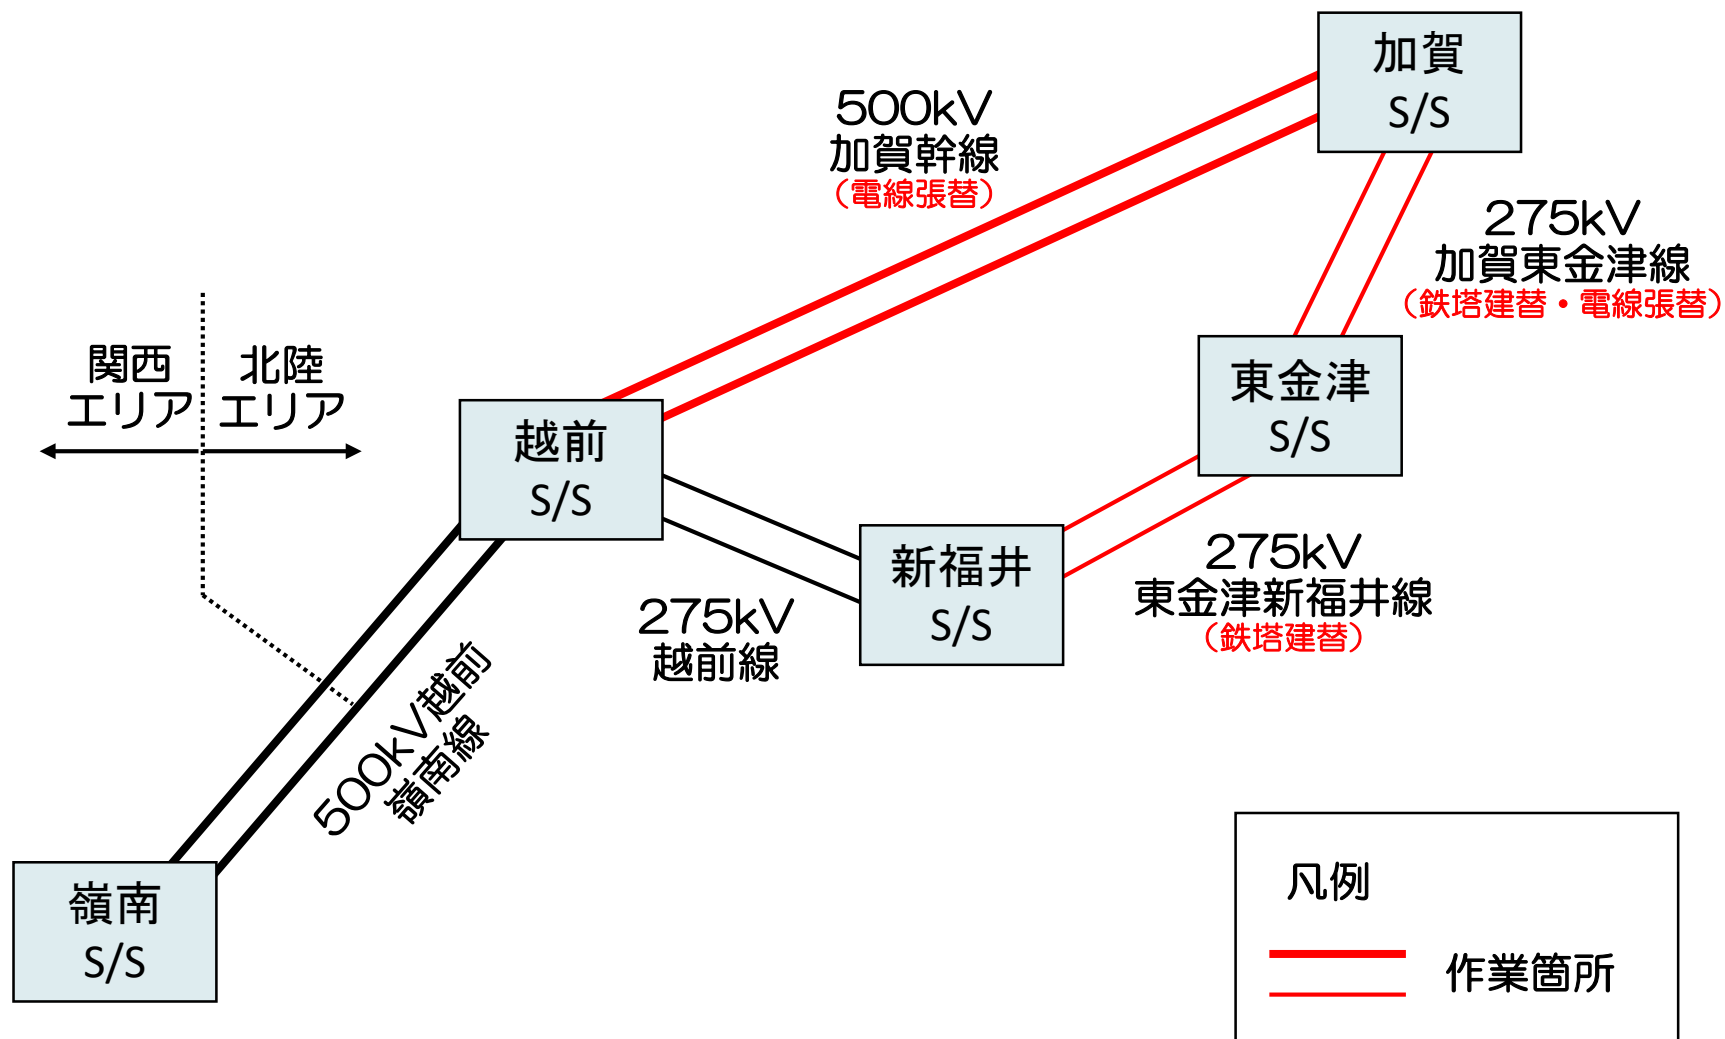

【作業概要】

項目	内容
作業箇所	加賀S/S 500kV甲母線、加賀福光線1L、2L
主要作業内容	500kV甲母線ガス漏れ修理
停止(制約)設備	加賀福光線1L、2L
作業停止期間 (予定)	1L：2028年04月10日～2028年04月20日（11日間） 2L：2028年04月01日～2028年04月10日（9日間） 2028年04月21日～2028年05月03日（13日間）
作業の必要性	設備保全

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中


【作業概要】

項目	内容
作業箇所	加賀S/S 500kV乙母線、加賀福光線1L、2L
主要作業内容	500kV乙母線ガス漏れ修理
停止(制約)設備	加賀福光線1L、2L
作業停止期間 (予定)	1L：2028年11月22日～2028年12月02日（11日間） 2L：2028年11月13日～2028年11月21日（9日間） 2028年12月03日～2028年12月15日（13日間）
作業の必要性	設備保全

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

- ⑪中地域交流ループ（北陸エリア地内）：500kV GIS 甲母線ガス漏れ修理
⑫中地域交流ループ（北陸エリア地内）：500kV GIS 乙母線ガス漏れ修理

【概略図】

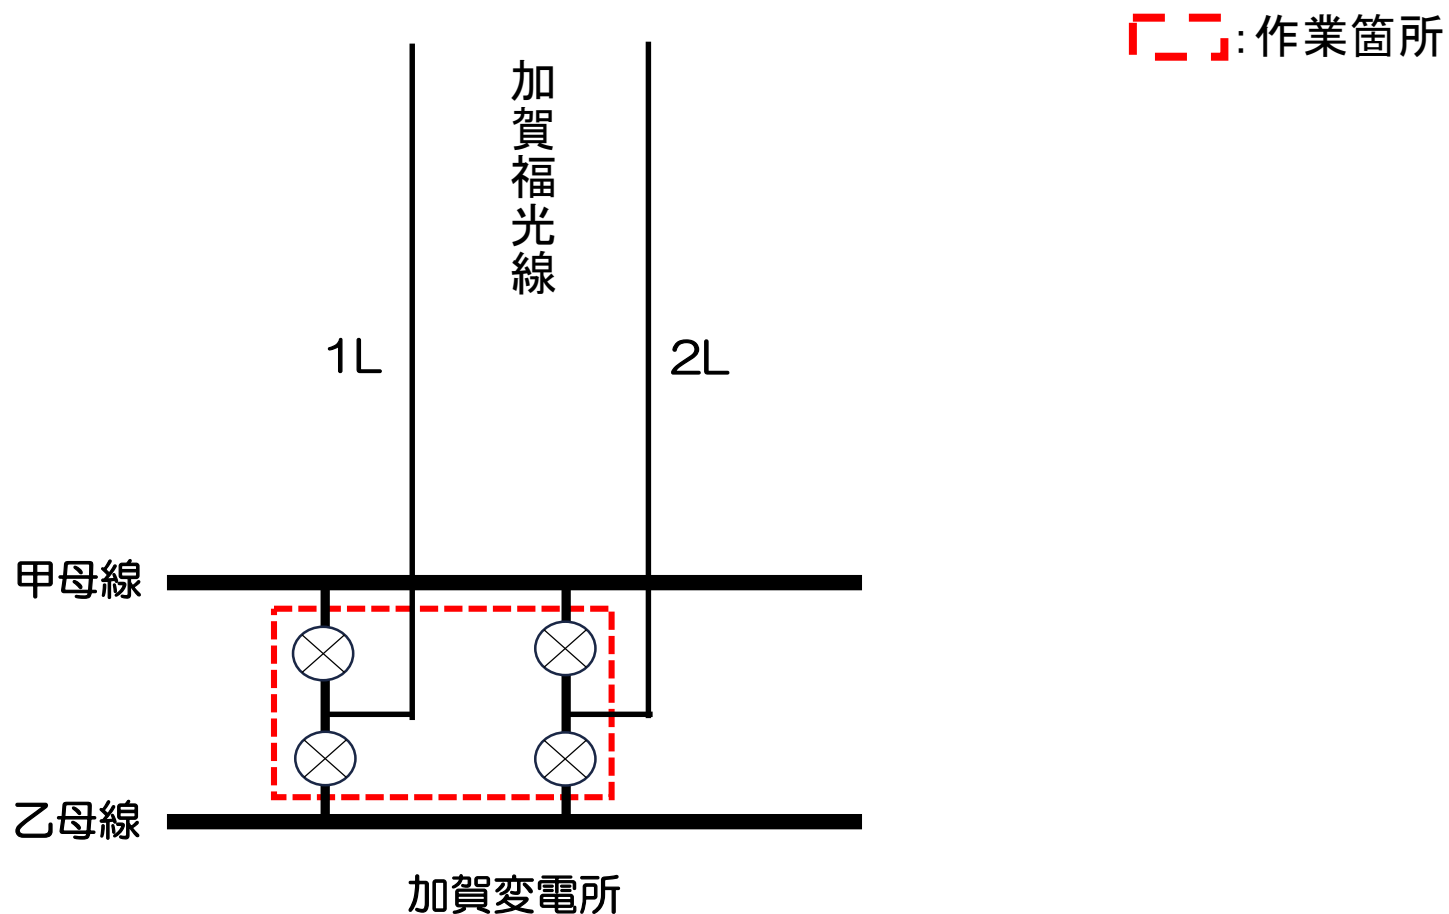

⑭中地域交流ループ（関西エリア地内）：北近江開閉所新設工事


【作業概要】

項目	内容
作業箇所	北近江線
主要作業内容	500kV北近江開閉所新設に伴うπ引き込み
停止(制約)設備	北近江線1、2L(嶺南変電所 ～ 東近江開閉所)
作業停止期間 (予定)	2L：2029年10月2日～2029年12月21日（81日間） 1L：2030年01月8日～2030年03月29日（81日間）
作業の必要性	中部関西間連系線新設

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

⑬中地域交流ループ（関西エリア地内）：北近江開閉所新設工事

【概略図】

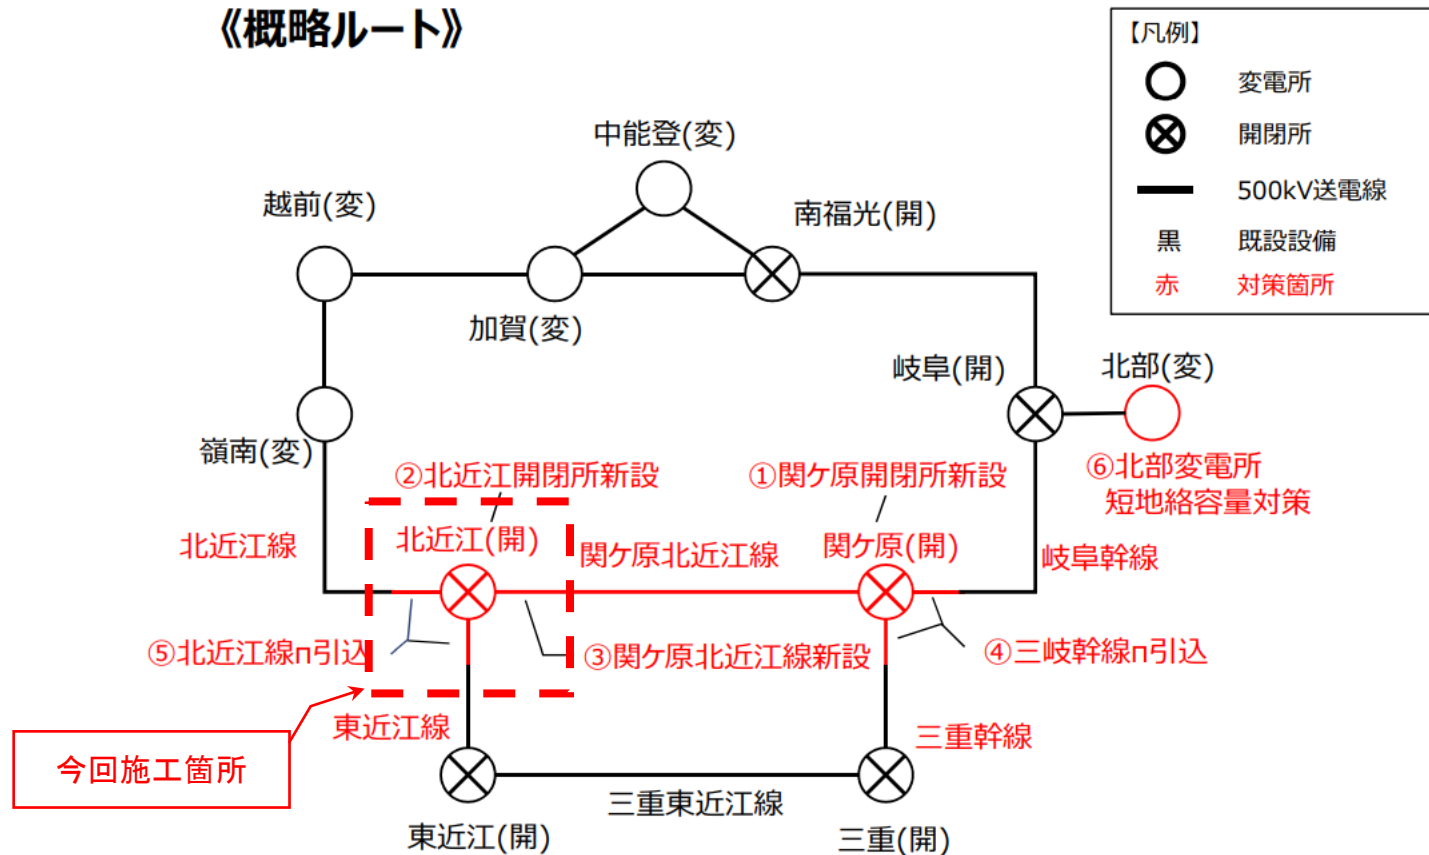

出典：電力広域の運用推進機関

「中部関西間連系線に係る広域系統整備計画」より抜粋


https://www.occto.or.jp/assets/kouikikeitou/seibikeikaku/chubukansai/files/20240628_seibikeikaku.pdf

【作業概要】

項目	内容
作業箇所	北近江線2L
主要作業内容	北近江線乙17-19改良工事
停止(制約)設備	北近江線2L(嶺南変電所 ～ 東近江開閉所)
作業停止期間 (予定)	2030年09月11日～2030年10月27日(48日間) 2031年03月03日～2031年06月30日(120日間)
作業の必要性	経年劣化に伴う部材腐食等が確認されたため、設備更新を図る

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

【概略図】

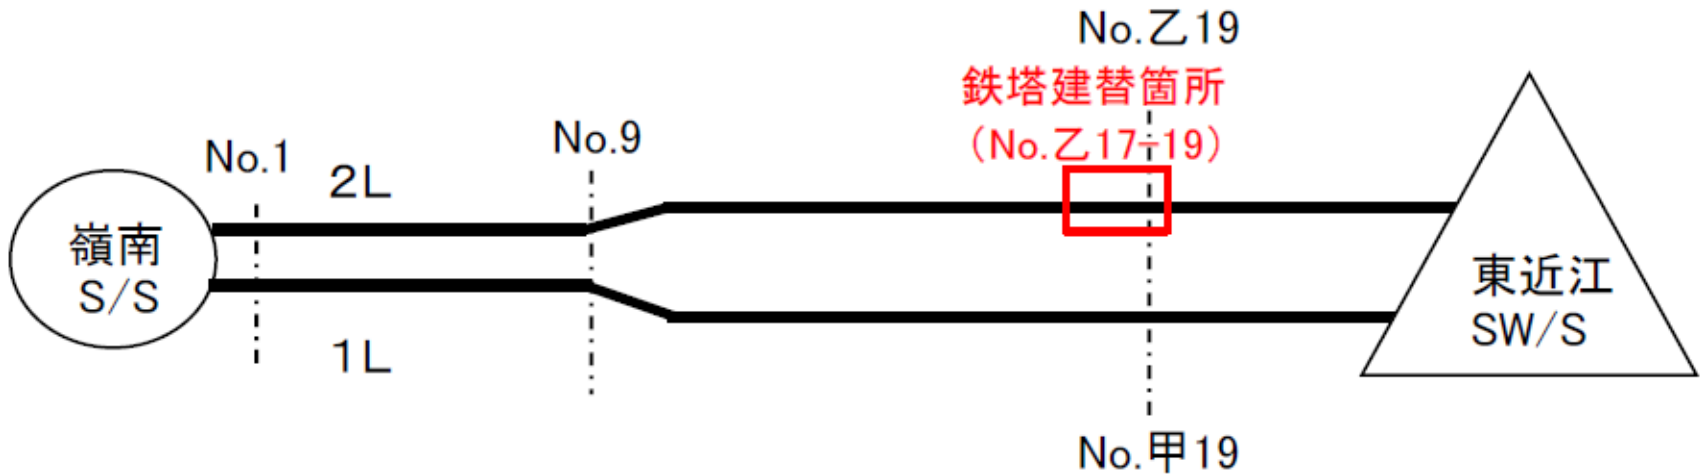


②①中地域交流ループ（関西エリア地内）：若狭幹線（山）改良工事

【作業概要】

項目	内容
作業箇所	若狭幹線（山）
主要作業内容	若狭幹線（山）改良工事に伴う保安停止 若狭幹線（山）改良工事（鉄塔組立・架線工事）
停止(制約)設備	若狭幹線（山）1、2L（嶺南変電所～京北開閉所）
作業停止期間 （予定）	1L：2031年09月24日～2031年12月19日（87日間） 2032年04月01日～2032年06月30日（91日間） 2032年10月01日～2032年12月17日（78日間） 2033年03月01日～2033年06月30日（122日間） 2L：2033年09月11日～2033年12月23日（104日間）
作業の必要性	設備保全、高経年設備の更新

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

【概略図】

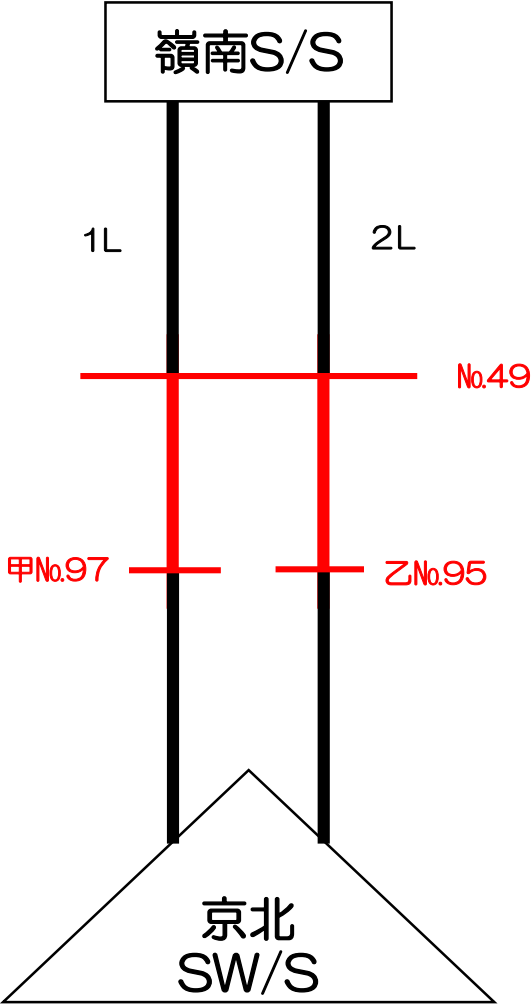


【作業概要】

項目	内容
作業箇所	新岡山幹線
主要作業内容	新岡山幹線電線張替工事【2工区】
停止(制約)設備	新岡山幹線2L
作業停止期間 (予定)	2028年09月16日～2028年11月29日（75日間）
作業の必要性	電線寿命到達時期までに張替が必要なため

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

【概略図】

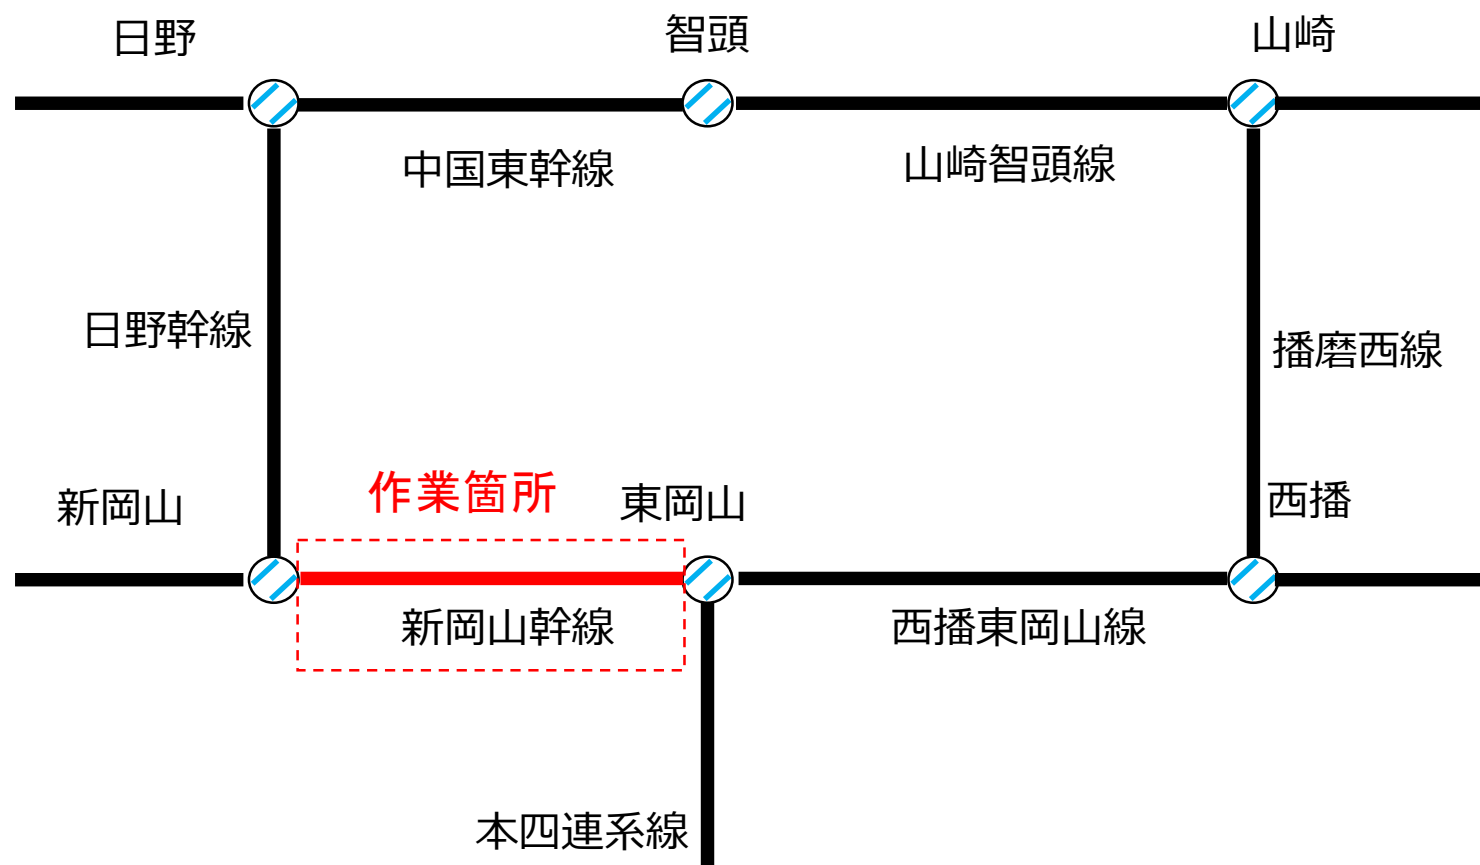


【作業概要】

項目	内容
作業箇所	本四連系線
主要作業内容	ケーブル張替、接続部細密点検ほか
停止(制約)設備	本四連系線1L
作業停止期間 (予定)	2028年04月01日～2028年06月30日（91日間）
作業の必要性	ケーブル地絡事故の調査のためにケーブル更新が必要

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

【概略図】

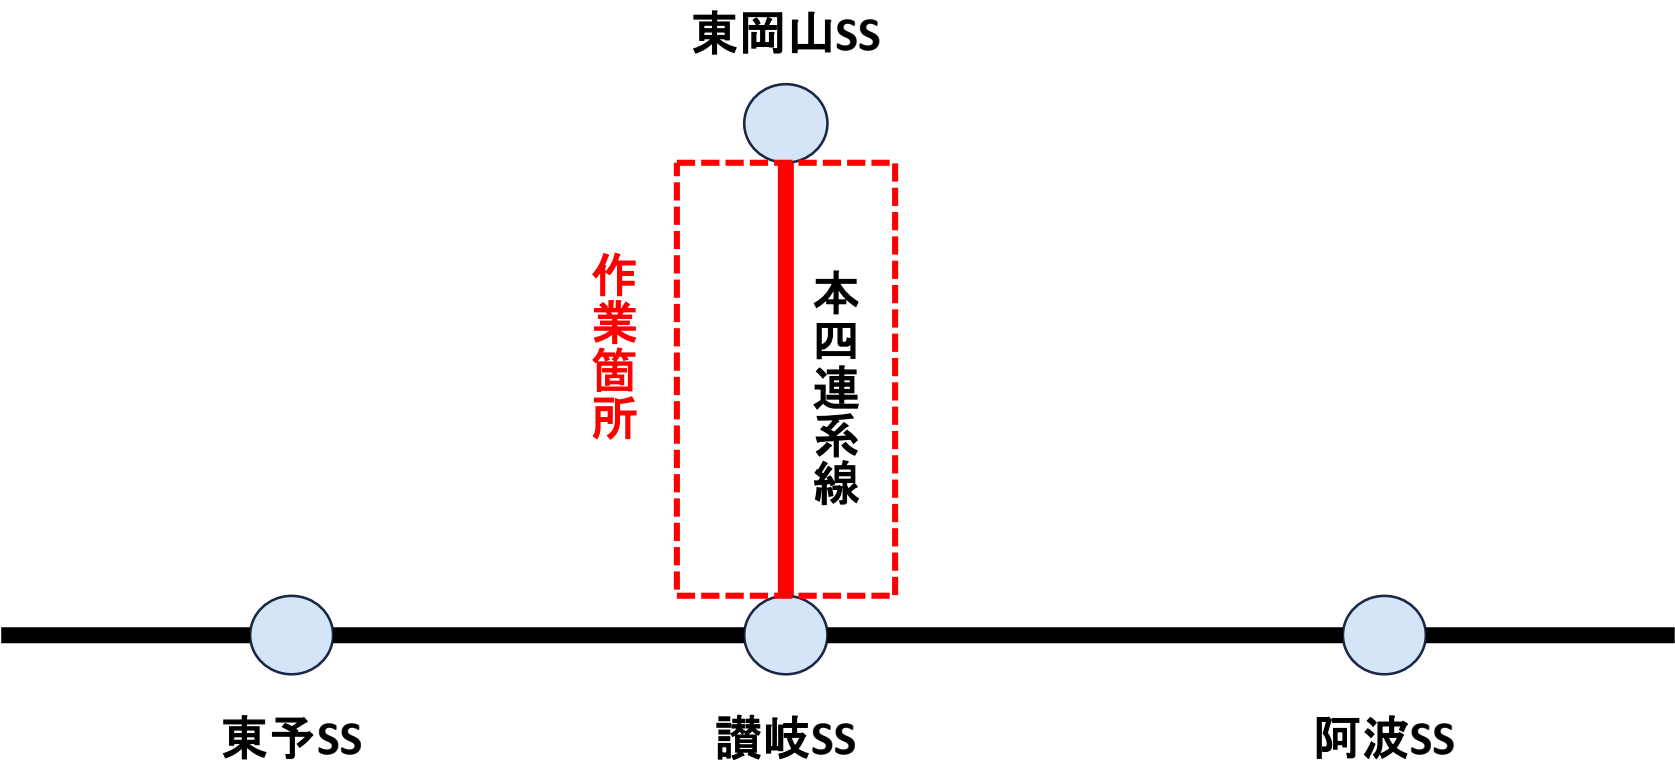


【作業概要】

項目	内容
作業箇所	関門連系線
主要作業内容	電線張替工事
停止(制約)設備	関門連系線1、2L
作業停止期間 (予定)	1L：2028年03月17日～05月29日（74日間） 2029年03月01日～06月04日（96日間） 2L：2028年10月02日～12月14日（74日間）
作業の必要性	高経年設備の更新

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

【概略図】

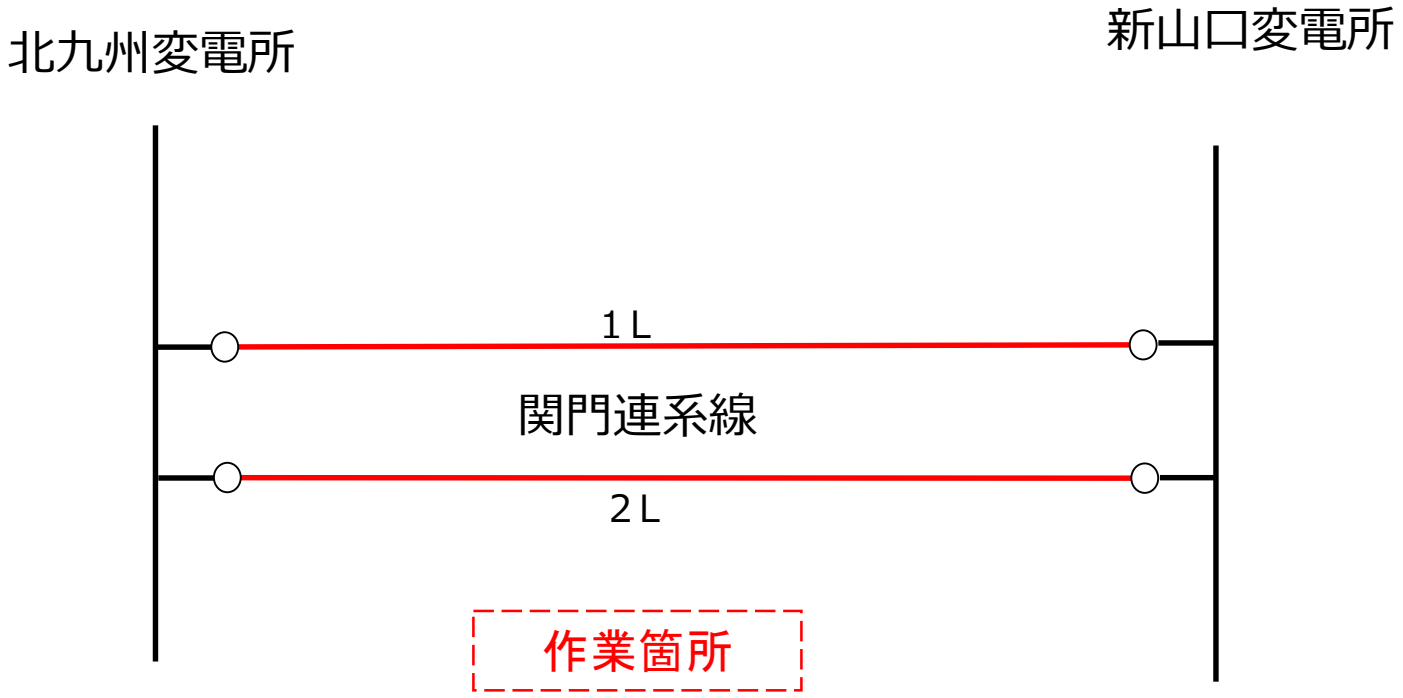

ウェブサイト公表文

[事業者へのお知らせ](#)

[運用容量・マージン](#)

2026・2027年度の広域連系系統等の作業停止計画について

更新日：2026年01月30日
掲載開始日：2026年01月30日

業務規程第168条の規定に基づき、2026・2027年度の広域連系系統等の作業停止計画を別紙のとおり公表します。なお、系統情報サービスにも掲載しています。

別紙

[2026・2027年度の年間作業停止計画\(OKB\)](#) 

[広域連系系統等の作業停止計画調整・確認結果について（2026・2027年度の年間計画）\(OKB\)](#) 

参考資料

2028年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間（1か月程度以上）影響を与える主な件名について、以下のとおり公表します

[2028年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名\(OKB\)](#) 

関連リンク

- ・ [系統情報サービス](#)  > その他情報 > 各種情報参照 > 各種情報（カテゴリ：作業停止計画）
情報NO:OT2026XXXXXXXXXX「2026・2027年度の年間作業停止計画」
- ・ [系統情報サービス](#)  > その他情報 > 各種情報参照 > 各種情報（カテゴリ：作業停止計画）
情報NO:OT2026XXXXXXXXXX「広域連系系統等の作業停止計画調整・確認結果について（2026・2027年度の年間計画）」
- ・ [系統情報サービス](#)  > その他情報 > 各種情報参照 > 各種情報（カテゴリ：作業停止計画）
情報NO:OT2026XXXXXXXXXX「2028年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名」

[一覧へ戻る](#)

