

第1号議案

容量市場システム開発に係るレビュー業務支援の期間延長による
業務委託契約の変更について（案）

KPMG コンサルティング(株)との「容量市場に係る業務設計支援業務及びシステム開発に係るPMO支援等業務委託契約」について、契約の変更を行う。


1. 契約変更理由

容量市場システム(一次開発)の開発について、2019年12月リリースから2020年10月リリースへ開発期間を延長したことを受け、レビュー業務支援の委託期間についても延長する必要が生じたため。

2. 契約変更内容

支援業務の委託期間を以下のとおりとする。

変更前	変更後（期間変更部分下線）
契約期間 2018年5月9日 ～2019年12月20日	契約期間 2018年5月9日 ～ <u>2020年10月30日</u>
内 業務設計支援業務：2018年5月9日 ～2019年3月29日	内 業務設計支援業務：2018年5月9日 ～2019年3月29日
内 PMO支援等業務 プロジェクトマネジメント支援：2019年3月 ～2019年12月20日	内 PMO支援等業務 プロジェクトマネジメント支援：2019年3月 ～2019年12月20日
レビュー業務支援：2019年3月 ～2019年12月20日	レビュー業務支援：2019年3月 ～ <u>2020年10月30日</u>

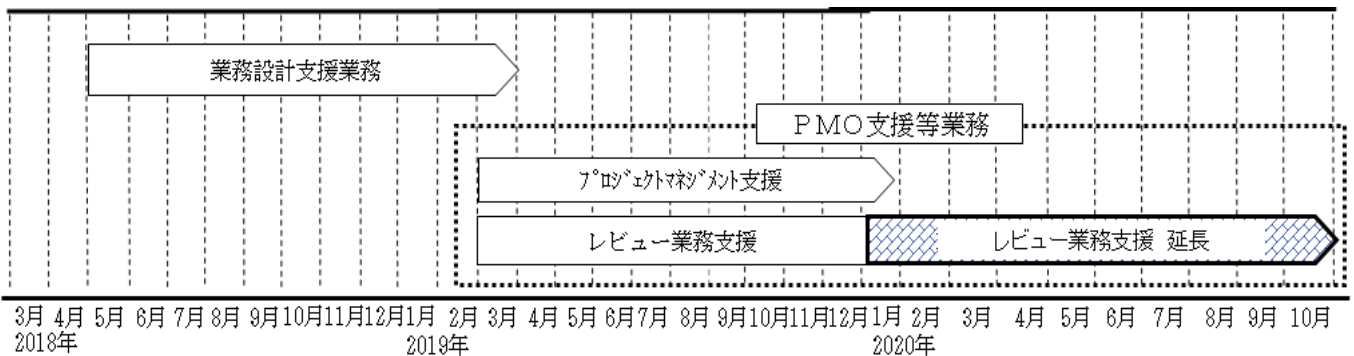

3. 契約先

KPMG コンサルティング(株)

4. 契約の公表

「会計・調達業務の細則に関する規定」第23条(契約の公表)に基づき、契約締結後、契約先及び契約締結日を公表する。契約金額に関しては、契約先が公表に同意していないため、非公表とする。

5. 工数と契約金額の妥当性について

別紙2のとおり、工数は2019年12月21日から2020年3月31日までは1人月、2020年4月1日から2020年10月30日までは1.5人月の必要最小限とし、契約金額は単価が現行契約と同等であり、妥当であると考えられる。

6. 参考

契約の経緯は以下のとおり。

1) 原契約

第154回理事会（2018年5月9日開催）第5号議案

「容量市場に係る業務設計支援業務及びシステム開発に係るPMO支援等業務委託の契約締結について」

2) 1回目の変更：業務設計支援業務期間の延長

第174回理事会（2018年10月25日開催）第4号議案

「容量市場に係る業務設計支援業務及びシステム開発に係るPMO支援等業務委託契約の変更について」

3) 2回目の変更：PMO支援等業務の開始時期の変更

第182回理事会（2018年12月28日開催）第4号議案

「容量市場に係る業務設計支援業務及びシステム開発に係るPMO支援等業務委託契約の変更について」

今回の契約変更は3回目となる。

以上

【添付資料】

別紙1 変更契約書(案) 【非公表】

別紙2 容量市場開発/PMO支援等業務委託に関する工数と契約金額 【非公表】

別紙1及び別紙2は、「会計・調達業務の細則に関する規定」第23条(契約の公表)に基づき、契約先が契約金額の公表に同意していないため、非公表とする。
